

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 13 <table border="1"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادر کننده</td> <td>تسهيلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سريال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GNRAL</td> <td>HD</td> <td>000</td> <td>GE</td> <td>RT</td> <td>0013</td> <td>G00</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهيلات	رشته	نوع مدرک	سريال	نسخه	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0013	G00	شماره صفحه : 1 از 41
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهيلات	رشته	نوع مدرک	سريال	نسخه											
BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0013	G00											

طرح نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن

MONTHLY PROGRESS REPORT # 13

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک

G00	JUL. 2022	IFI	P.Ghadamian	M.Fakharian	M.Mehrshad	
Rev.	Date	Purpose of Issue/Status	Prepared by:	Checked by:	Approved by:	CLIENT Approval
Class:4		CLIENT Doc. Number (F-Number): F0Z-707079				
Status: IDC: Inter-Discipline Check IFC: Issued For Comment IFA: Issued For Approval AFD: Approved For Design AFC: Approved For Construction AFP: Approved For Purchase AFQ: Approved For Quotation IFI: Issued For Information AB-R: As-Built for CLIENT Review AB-A: As-Built -Approved						

REVISION RECORD SHEET



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض و ابنیه تحت الارض

عمومی و مشترک



شماره پیمان:

053 - 073 - 9184

MONTHLY PROGRESS REPORT # 13

نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه
G00	0013	RT	GE	000	HD	GNRAL	BK

شماره صفحه : 2 از 41

PAGE	G00	G01	G02	G03	G04
1	X				
2	X				
3	X				
4	X				
5	X				
6	X				
7	X				
8	X				
9	X				
10	X				
11	X				
12	X				
13	X				
14	X				
15	X				
16	X				
17	X				
18	X				
19	X				
20	X				
21	X				
22	X				
23	X				
24	X				
25	X				
26	X				
27	X				
28	X				
29	X				
30	X				
31	X				
32	X				
33	X				
34	X				
35	X				
36	X				
37	X				
38	X				
39	X				
40	X				
41	X				
42	X				
43	X				
44	X				
45	X				
46	X				
47	X				
48	X				
49	X				
50	X				
51	X				
52	X				
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					

PAGE	G00	G01	G02	G03	G04
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پارس  TE	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 13							شماره صفحه : 3 از 41	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0013		G00

فهرست مطالب

1	مشخصات قراردادی پروژه	4
2	معرفی پروژه	5
3	گزارش مدیریتی پروژه	8
4	گزارش فعالیت های انجام شده	9
5	جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی/تحت الارض /سطح الارض)	12
6	بخش کنترل پروژه	13
7	وضعیت مدارک مهندسی	19
8	بخش مالی پروژه	20
9	بخش تدارکات کالا	21
10	نمودار سازمانی پیمانکار	22
11	مکاتبات با کارفرما	24
12	مشکلات و موانع	29
13	موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت	30
14	بخش کنترل پروژه	31
15	ضمائم	32

* گزارش QC و ترنس میتال لیست به پیوست می باشد.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 13							شماره صفحه : 4 از 41	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0013		G00

1 مشخصات قراردادی پروژه

نام پروژه: نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک / بخش سطح الارض و

ابنیه تحت الارض

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

کارفرمای اصلی:

اهواز، کوی فداییان اسلام، ساختمان 5 طبقه / تهران، خیابان شهید دستگردی،

تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

علیرضا محمدی خواه (سرپرست طرح های نگهداشت و افزایش

مجری و نماینده کارفرمای اصلی:

تولید ناحیه گچساران)

شرکت توسعه پتروایران

کارفرما (پیمانکار عمومی):

تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

مدیر پروژه و نماینده کارفرما (پیمانکار منصور مهرشاد

عمومی):

مشارکت “هیرگان انرژی-طرح و بازرسی”

پیمانکار EPC:

تهران، اتوبان همت - خیابان شیراز جنوبی - کوچه یاس - پلاک 13

مدیر پروژه و نماینده پیمانکار: محمد فخاریان

تاریخ شروع پروژه: 1400/04/02

تاریخ پایان پروژه: 1402/04/01

شماره قرارداد: BK-00-CO-0001

شماره پروژه (در سیستم کارفرمای 971020

اصلی):

مبلغ پیمان (یورو): 35,909,880 یورو

مدت پیمان: 24 ماه

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 13							شماره صفحه : 5 از 41	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0013		G00

2 معرفی پروژه

میدان نفتی بینک از میداین نفتی ایران است که در استان بوشهر، در فاصله ۲۰ کیلومتری از شمال بندر گناوه و در ساحل خلیج فارس مستقر می باشد. این میدان از شمال با میدان نفتی گلخاری، میدان نفتی بی بی حکیمه و میدان نفتی سیاهمکان و از جنوب با میدان نفتی خارگ، در دریا هم جوار است. حجم ذخیره در جای نفت خام این میدان در حدود ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون بشکه برآورد می شود. میدان نفتی بینک در افق آسماری دارای ابعادی به طول ۴۲ کیلومتر و عرض متوسط ۶ کیلومتر است. سازندهای آسماری و جهرم این میدان به دلیل ارتباط فشاری مناسب، به عنوان یک مخزن واحد محسوب می شوند.


تاسیسات سرچاهی مربوط به 6 حلقه چاه توسعه ای (که 2 حلقه از این 6 حلقه نیاز به برق رسانی و دیگر تسهیلات مرتبط جهت مصارف پمپ درون چاهی می باشد) و انجام اصلاحات در 4 حلقه چاه تعمیری موجود (به همراه برق رسانی جهت مصارف پمپ درون چاهی و دیگر تسهیلات مورد نیاز) در دستور کار این طرح قرار دارد. آب مورد نیاز حفاری چاه ها می بایست از طریق تانکر (یا خط لوله موقت) از دره گپ گناوه/خلیج فارس تامین گردد. ضمناً احداث 6 خط لوله جریانی جدید از چاه های توسعه ای پیش گفته به مجموعه بوستر-کلاستر بینک و توسعه چندراهه موجود بوستر-کلاستر بینک جزو شرح کار این پروژه است.

با هدف افزایش تولید نفت از میدان بینک، افزایش ظرفیت ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (و احداث ردیف تراکم و مستحداثات مورد نیاز جدید) به میزان 15 م ف م ر نیز جزو شرح کار این پروژه می باشد.

همچنین احداث 44 کیلومتر خط لوله 8 اینچ انتقال گاز از ایستگاه تقویت فشار گاز بینک تا ایستگاه تزریق گاز سیاهمکان و 5,2 کیلومتر خط لوله 4 اینچ انتقال مایعات گازی از ایستگاه تقویت فشار گاز بینک به واحد بهره برداری بینک نیز در تعهد پیمانکار می باشد.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 13							شماره صفحه : 7 از 41	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0013		G00

S/L	Well Name/Location	Reservoir
1	W 008 N	Asmari
2	W 018 S	Asmari
3	W 046 S	Bangestan
4	W028	Bangestan
5	W 035	Bangestan
6	W 007 S	Bangestan
7	Well 14	Bangestan
8	Well 12	Bangestan
9	Well 15	Bangestan
10	Well 05	Bangestan

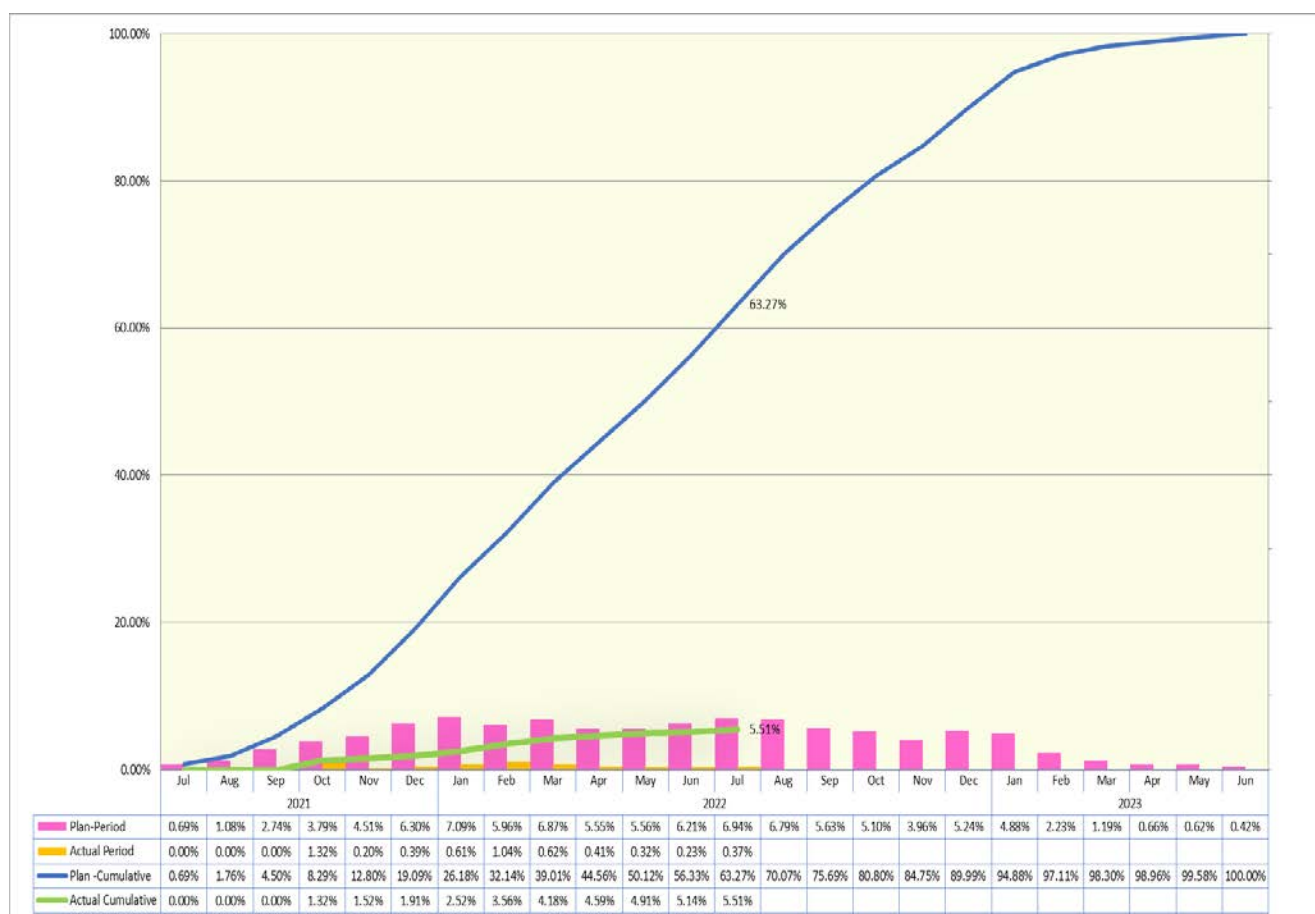

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 13							شماره صفحه : 9 از 41	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0013		G00

4 گزارش فعالیت های انجام شده

1-4 مدیریت پروژه /عمومی

- شرکت در جلسات هفتگی بررسی پیشرفت پروژه
- انجام تست روزانه تب سنجی و اکسیمتری و توزیع ماسک پرسنل
- پیگیری اخذ اشتراک تلفن ثابت و سرویس اینترنت دائمی برای کارگاه
- پیگیری اخذ اشتراک برق دائمی (شبکه) برای کارگاه
- ادامه ارسال رویه ها و مدارک مربوط به برنامه ریزی و QC
- تهیه برنامه زمانبندی 36 ماهه کل پروژه براساس تغییر اولویت چاهها (مطابق آخرین نقطه نظرات کارفرما)
- کنترل و نظارت مستمر بر حسن انجام ضبط و ربط محیط کار General Housekeeping طبق برنامه
- ارائه خدمات رفاهی به کارفرمای محترم بر اساس قرارداد

2-4 بخش مهندسی (E)

1-2-4 مهندسی سطح الارض /ابنيه تحت الارض پروژه

- ارسال مدارک مهندسی مطابق برنامه زمانبندی پروژه
- بررسی و اصلاح مدارک براساس نظرات کارفرما
- ارسال مدارک MR مربوط به ژئوممبران و ژئوتکستایل - لوکیشن 018
- مدرک Civil and Structural drawings لوکیشن 28 مطابق برنامه زمانبندی
- ارسال گزارش ژئوتکنیک مربوط به لوکیشن 035، 008 و 007 مطابق برنامه زمانبندی
- ارسال مدرک PMR مربوط به Fire Fighting Equipment مطابق برنامه زمانبندی
- ارسال TBE مربوط به Gas Compressors مطابق نظرات کارفرما
- ارسال مدارک PMR و MTO های مربوط به بخش ایمنی - بسته GCS
- ارسال گزارش ژئوتکنیک مربوط به چاههای 12 و 14 مطابق برنامه زمانبندی
- ارسال P&ID های مربوط به بسته GCS مطابق نظرات کارفرما
- ارسال PMR های مربوط به WHCP/HPU لوکیشن 018، 028، 035 و 008
- ارسال برخی MTO های بخش پاییننگ مطابق برنامه زمانبندی
- ارسال مدرک Unit Plot Plan مربوط به بسته خطوط لوله مطابق برنامه زمانبندی
- ارسال PMR مربوط به LCS بسته GCS مطابق برنامه زمانبندی

2-2-4 مهندسی تحت الارض پروژه

- (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پارس 	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 13							شماره صفحه : 10 از 41	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0013		G00

3-4 فعالیتهای مرتبط با کالا (P)

1-3-4 کالای سطح الارض / ابنیه تحت الارض پروژه

- معرفی سازنده منتخب گسکت سرچاهی بسته های W018S و W028
- معرفی سازنده منتخب تیوب - فیتینگ ابزار دقیق سرچاهی بسته های W018S و W028
- معرفی سازنده منتخب فیتینگ سرچاهی بسته های W018S و W028
- معرفی سازنده منتخب فلنج سرچاهی بسته های W018S و W028
- معرفی سازنده منتخب سینی - کابل ابزار دقیق سرچاهی بسته های W018S و W028
- برگزاری جلسه PIM درخصوص قرارداد WHCP
- مذاکره با وندور Control Valve
- نهایی سازی پیشنهادات Air Gas Cooler
- مذاکره با وندور On / Off Valve
- ارسال اعلام برای سازندگان Tank

2-3-4 کالای تحت الارض پروژه

- (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)

4-4 فعالیتهای اجرایی (C)

- اجرای عملیات آرماتور بندی فونداسیون حوضچه OBM چاه شماره 28
- اجرای عملیات قالب بندی دیوار دستک پل کیلومتر 0+344
- اجرای عملیات بارگیری و حمل خاکهای مازاد محوطه چاه 46 به خارج از لوکیشن
- اجرای عملیات خاکریزی ، تسطیح و کمپکت جاده دسترسی چاه شماره 28
- اجرای عملیات آرماتور بندی و قالب بندی ، بتن ریزی فونداسیون مخزن ساختمان مناطق نفت خیز
- اجرای عملیات خاکبرداری لوکیشن چاه شماره 46
- اجرای عملیات آرماتور بندی پد اصلی چاه شماره 28
- اجرای عملیات تسطیح و رگلاژ کف فونداسیون سوله انبار تجهیز کارگاه
- اجرای عملیات قالب بندی فونداسیون بچینگ

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 13								شماره صفحه : 11 از 41
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0013	G00	

- اجرای عملیات خاکبرداری مسیر انحرافی حوزه آبریز چاه 28
- اجرای عملیات بتن ریزی پد Treatment
- اجرای عملیات بتن ریزی روی لوله درین سلر چاه 28
- اجرای عملیات بتن ریزی دستک پل کیلومتر 0+195 جاده چاه شماره 28
- اجرای عملیات خاکریزی ، تسطیح و کمپکت جاده دسترسی چاه شماره 28
- اجرای عملیات آرماتوربندی پد اصلی چاه شماره 28
- اجرای عملیات خاکبرداری فونداسیون سوله انبار تجهیز کارگاه
- اجرای عملیات نصب و جوشکاری لوله خروجی آب کف سلر چاه 28
- اجرای عملیات بتن ریزی مگر پد اصلی لوکیشن چاه 28
- اجرای عملیات بتن ریزی مگر حوضچه OBM چاه شماره 28

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 13							شماره صفحه : 12 از 41	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0013		G00

5 جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی / سطح الارض)

BINAK OILFIELD DEVELOPMENT SURFACE WORK-PACKAGES BASED ON PACKAGES					
Code	Description	W.F. (Total)	Last Progress%	This Period	Up to now Progress%
	Total Project	100.000%	5.14%	0.37%	5.51%
1	GENERAL	5.32%	39.98%	2.94%	42.92%
1-1	General	5.32%	39.98%	2.94%	42.92%
2	SUB-Surface DEVELOPMENT	18.18%	6.98%	0.72%	7.70%
2-1	Engineering	0.36%	26.92%	6.61%	33.52%
2-2	Procurement	11.14%	0.97%	0.10%	1.08%
2-3	Construction	6.68%	15.91%	1.42%	17.33%
3	SURFACE DEVELOPMENT	76.49%	2.27%	0.11%	2.38%
3-1	Engineering	2.37%	27.15%	2.92%	30.07%
3-2	Procurement	59.19%	1.85%	0.02%	1.87%
3-3	Construction	13.92%	0.00%	0.00%	0.00%
3-4	Commissioning, Startup & Handover	1.01%	0.00%	0.00%	0.00%

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 13							شماره صفحه : 13 از 41	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0013		G00

6 بخش کنترل پروژه
جدول میزان پیشرفت کل پروژه (عمومی / سطح الارض)

Description	W.F. (Disc)	W.F. (Total)	Roll-Up	Last Progress%	This Period	Up to now Progress%
Total Project	100.000%	100.000%	100.00%	5.14%	0.37%	5.51%
GENERAL	1.136%	1.136%	1.136%	39.985%	2.935%	42.92%
Project Management	23.600%	0.268%	0.268%	48.739%	1.120%	49.86%
Project Insurance	13.470%	0.153%	0.153%	90.000%	0.000%	90.00%
Service to Company	35.400%	0.402%	0.402%	26.415%	4.924%	31.34%
Training Courses	7.310%	0.083%	0.083%	0.000%	0.000%	0.00%
GC Mobilization & Demobilization	20.220%	0.230%	0.230%	58.760%	0.000%	58.76%
SUB-Surface DEVELOPMENT	52.342%	52.342%	52.338%	6.980%	0.716%	7.70%
Package 01-New Well # W018S	5.210%	2.727%	2.723%	29.978%	0.747%	30.724%
Package 02-New Well # W028 (Bangestan)	7.125%	3.729%	3.729%	23.922%	6.118%	30.040%
Package 03-New Well # W046S (Bangestan)	33.462%	17.515%	17.515%	7.778%	0.379%	8.16%
Package 04-New Well # W035 (Bangestan)	8.669%	4.538%	4.538%	9.110%	0.386%	9.50%
Package 05-New Well # W008N	2.760%	1.445%	1.445%	2.860%	0.377%	3.24%
Package 06-New Well # W007S/Manifold Extension (Bangestan)	12.934%	6.770%	6.770%	1.058%	0.225%	1.28%
Package 07-Workover # 14	7.666%	4.013%	4.012%	0.772%	0.237%	1.01%
Package 08-Workover # 12	6.237%	3.265%	3.264%	1.055%	0.162%	1.22%
Package 09-Workover # 15	9.335%	4.886%	4.886%	0.710%	0.179%	0.89%
Package 10-Workover # 05	6.602%	3.456%	3.456%	0.993%	0.003%	1.00%
SURFACE DEVELOPMENT	46.522%	46.522%	46.522%	2.272%	0.108%	2.38%
Package 11- EPC Pipeline 8" & 4"	15.529%	7.224%	7.224%	2.079%	0.135%	2.21%
Package 12- EPC # Compressor Station	84.471%	39.298%	39.298%	2.321%	0.101%	2.42%

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پارس  HIRGAN ENERGY 	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 13							شماره صفحه : 14 از 41	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0013		G00

ضرایب وزنی فعالیت ها (W-F) (عمومی / سطح الارض) :

Cde	Description	W.F.(Discp.)	WF.(Total)
		100.00%	100.000%
1	GENERAL	5.32%	5.32%
1-1	Project Management	100.00%	5.32%
2	SUB-Surface DEVELOPMENT	18.18%	18.18%
2-1	Engineering	1.99%	0.36%
2-2	Procurement	61.26%	11.14%
2-3	Construction	36.75%	6.68%
3	SURFACE DEVELOPMENT	76.49%	76.49%
3-1	Engineering	3.09%	2.37%
3-2	Procurement	77.39%	59.19%
3-3	Construction	18.20%	13.92%
3-4	Commissioning, Startup & Handover	1.3%	1.01%



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض و ابنیه تحت الارض

عمومی و مشترک



شماره پیمان:


053 - 073 - 9184

MONTHLY PROGRESS REPORT # 13

پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0013	G00

شماره صفحه : 15 از 41

نمودار پیشرفت بخش عمومی

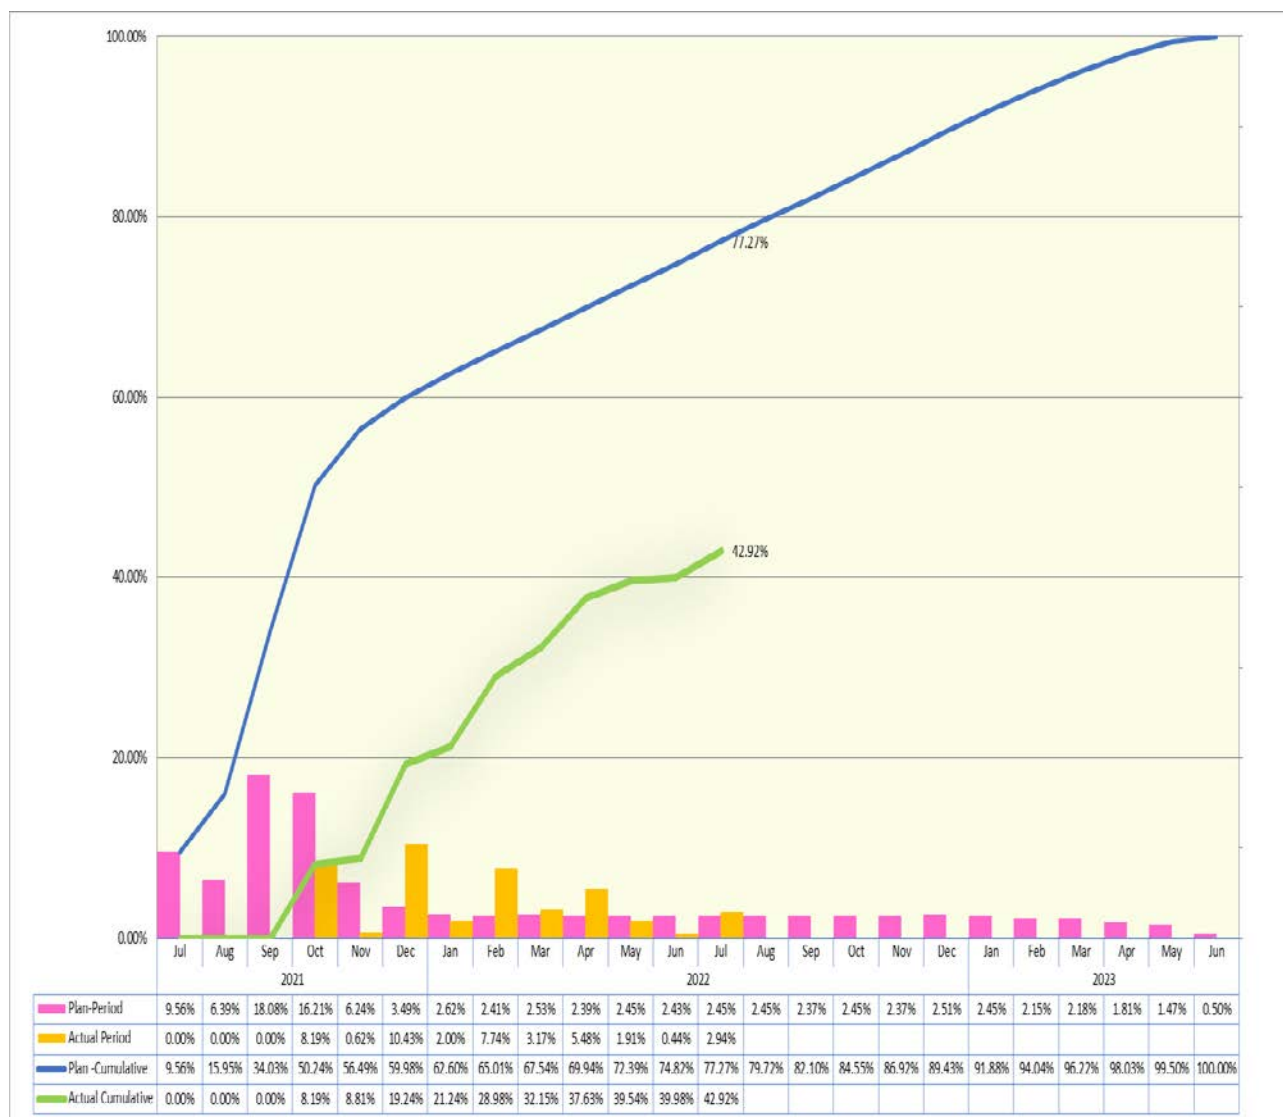



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض و ابنیه تحت الارض

عمومی و مشترک



شماره پیمان:


053 - 073 - 9184


MONTHLY PROGRESS REPORT # 13

نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه
G00	0013	RT	GE	000	HD	GNRAL	BK

شماره صفحه : 16 از 41

نمودار پیشرفت بخش ابنیه تحت الارض

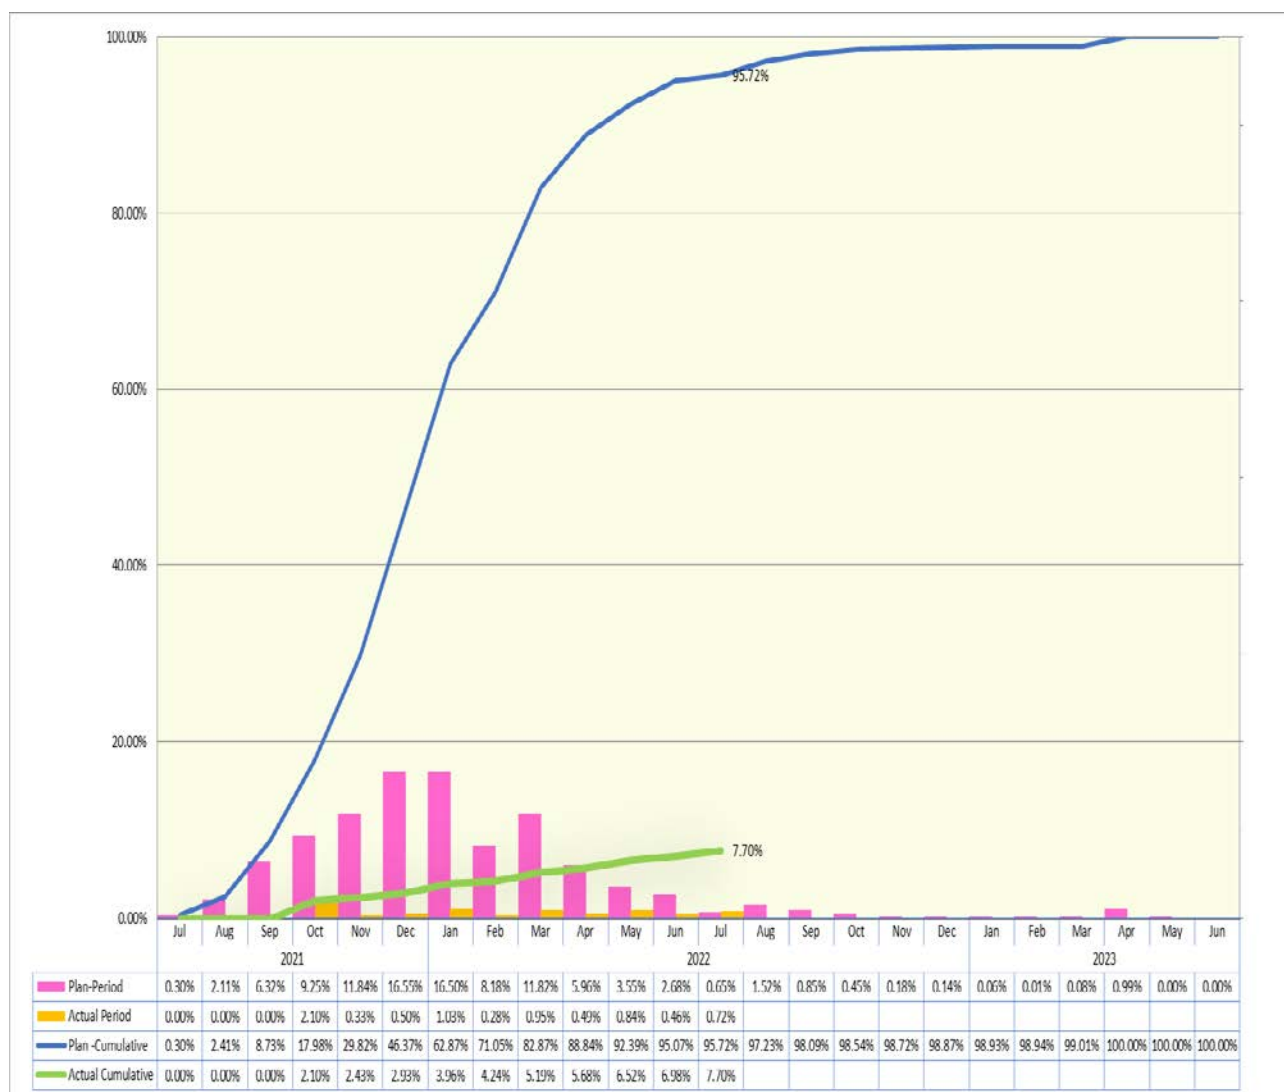


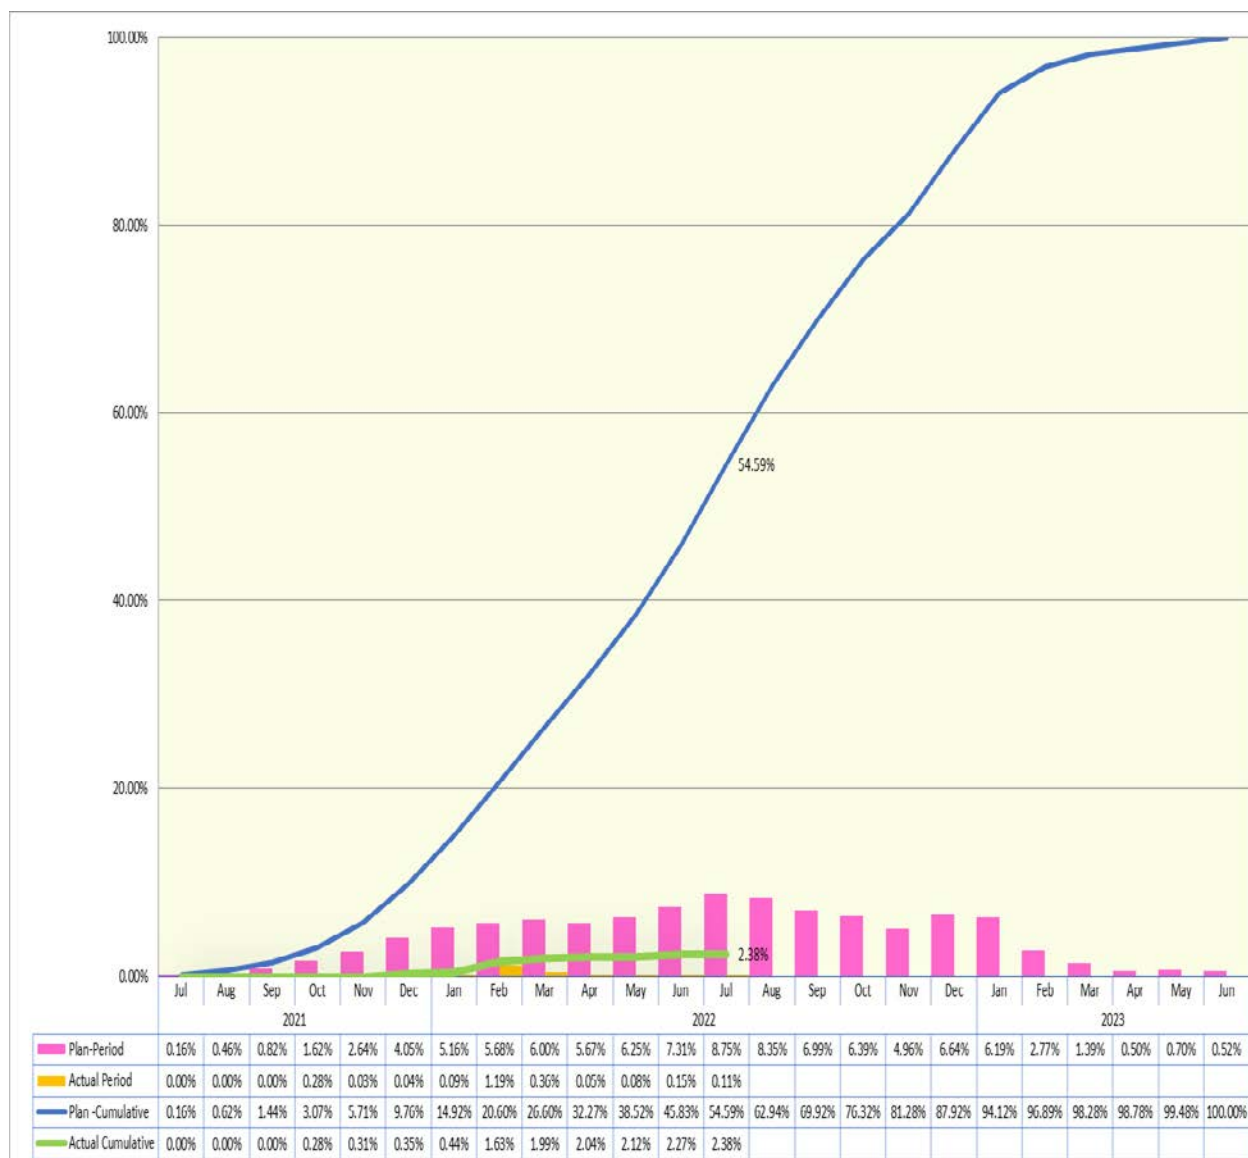

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 13							شماره صفحه : 18 از 41	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0013		G00

جدول و نمودار پیشرفت EPC:

Total Project	100%	5.51%
Engineering	2.73%	30.53%
Procurement	70.33%	1.75%
Construction	20.60%	5.62%
Commissioning, Startup & Handover	1.01%	0.0%
Project Management	5.32%	42.92%

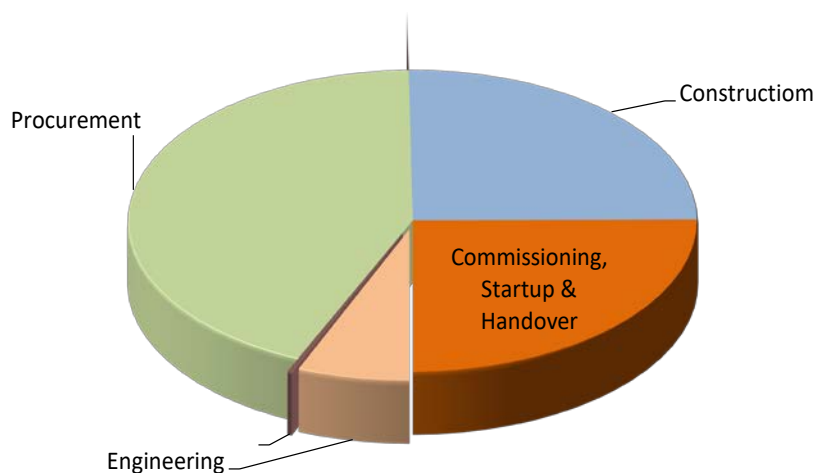

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پارس  HIRGAN ENERGY 	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 13								شماره صفحه : 19 از 41
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0013	G00	

7 وضعیت مدارک مهندسی

گزارش آخرین وضعیت مدارک مهندسی																					
		PM	PR	ME	HV	PI	PL	IN	SA	EL	TE	CV	AR	ST	GE	GT	QC	TP	SU	CO	
کل مدارک	Proj. Management	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	33
	Common	-	9	7	8	29	33	23	17	75	8	31	10	26	39	1	43	0	0	0	359
	WELLHEAD FACIL	0	59	8	60	225	42	123	64	202	0	79	30	126	42	10	0	0	12	10	1092
	PIPELINE	0	19	4	0	23	23	72	17	25	0	3	0	2	7	2	0	0	2	1	200
	GCS	0	91	72	20	61	0	114	32	107	30	11	12	102	8	2	0	0	1	1	664
مجموع کل مدارک		32	178	91	88	338	98	332	130	409	38	124	52	256	97	15	43	0	15	12	2348
تعداد کل مدارک ارسال شده	IFI	2	0	14	1	44	17	57	20	20	5	12	0	2	14	1	0	0	1	0	210
	IFC	8	64	17	14	30	5	53	26	49	4	17	27	3	6	8	12	0	5	0	348
	IFA	4	104	23	0	21	14	53	15	35	4	12	2	4	3	0	2	0	1	0	297
	AFC/AFD	32	2	17	3	8	16	3	11	24	13	16	7	22	5	2	0	0	0	0	181
مجموع کل مدارک ارسال شده		46	170	71	18	103	52	166	72	128	26	57	36	31	28	11	14	0	7	0	1036

		نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض							
		عمومی و مشترک							
شماره پیمان:		MONTHLY PROGRESS REPORT # 12						شماره صفحه : 20 از 41	
053 – 073 – 9184		پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
		BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008	G00

8 بخش مالی پروژه

آخرین وضعیت	تاریخ رسید وجه	پیشرفت مالی نسبت به وزن	پیشرفت مالی %۱۰۰	صورت وضعیت تایید شده	صورت وضعیت کل ادعا شده (یورو)	صورت وضعیت ارائه شده	پرداخت پیش پرداخت به پیمانکار – ریال	ضمانت نامه ارائه شده به کار فرما – ریال	مبلغ پیمان یورو	واحد	وزن	بخش اصلی / الحاقیه ۱	شرح فعالیت
پرداخت شده	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۰۰٪	۱۰۰٪		۷۱۸,۱۹۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۱۷۷,۹۸۸,۷۵۶,۶۱۷	۱۷۷,۹۸۸,۷۵۶,۶۱۷	۳۵,۹۰۹,۸۸۰	-	-	اصلی	پیش پرداخت
پرداخت شده	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۰۰٪	۳۰۰٪		۱,۰۷۷,۲۹۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۲۸۰,۵۷۶,۴۶۰,۸۹۸		۳۵,۹۰۹,۸۸۰			اصلی	قسط دوم پیش پرداخت (۳٪ مبلغ پیمان)
عدم تایید			۱۲.۸۸٪		۱۰۱,۰۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	-	-	۹۸۰,۰۰۰	-	-	اصلی	برآورد کارکرد (WPA) بخش مهندسی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ الی ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ -G۰۰-۱۴۰۰
تایید جهت تهیه صورت وضعیت			۱۳.۶۷٪		۱۳۳,۹۳۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۳			۹۸۰,۰۰۰			اصلی	برآورد کارکرد (WPA) بخش مهندسی- شماره ۱ (به روز شده)(G۰۱_۰۰۰۱-BK-HD-WPA-E)
عدم تایید			۴.۶۲٪		۴۳۰,۰۴۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۹			۹,۳۱۱,۹۶۰			اصلی	برآورد کارکرد (WPA) بخش های عمومی و اجرا- شماره ۱ منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ □۰۰
تایید جهت تهیه صورت وضعیت			۶.۹۲٪		۶۴۴,۳۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۹			۹,۳۱۱,۹۶۰			اصلی	برآورد کارکرد (WPA) بخش های عمومی و اجرا- شماره ۱ (به روز شده) از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ الی ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ □۰۱
بصورت الحساب و در چند قسط پرداخت شده			۱۷.۰۸٪		۱۶۷,۴۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۹			۹۸۰,۰۰۰			اصلی	صورت وضعیت شماره ۱ مهندسی (منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶)
بصورت الحساب و در چند قسط پرداخت شده			۴.۵۴٪		۴۲۳,۱۹۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۹			۹,۶۷۳,۶۱۳			اصلی	صورت وضعیت شماره ۱ عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸)
پرداختی						۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					اصلی	دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت ۱ مهندسی و ۱ اجرا
			۱۹.۱۵٪		۱۸۷,۶۷۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۶			۹۸۰,۰۰۰			اصلی	برآورد کارکرد (WPA) شماره ۲ مهندسی (منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹)
			۹.۱۸٪		۸۸۷,۸۹۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۶			۹,۶۷۳,۶۱۳			اصلی	برآورد کارکرد (WPA) شماره ۲ عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹)
پرداختی						۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					اصلی	دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت ۱ مهندسی و ۱ اجرا
پرداختی						۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۶۰,۵۸۹,۳۴۰,۶۴۷					اصلی	دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت ۱ مهندسی و ۱ اجرا
پرداخت نشده			۱۹.۱۵٪		۱۸۷,۶۷۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۴			۹۸۰,۰۰۰			اصلی	صورت وضعیت شماره ۲ مهندسی (منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۰)
پرداخت نشده			۶.۹۵٪		۶۷۲,۱۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۷			۹,۶۷۳,۶۱۳			اصلی	صورت وضعیت شماره ۲ عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۰)
			۲۵.۷۶٪		۲۵۲,۴۵۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۸			۹۸۰,۰۰۰			اصلی	برآورد کارکرد بخش مهندسی- شماره ۳(BK-HD)- □ □ □ -۰۰۰۰۳□□ □ □
			۹.۴۰٪		۹۰۹,۴۷۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۹			۹,۶۷۳,۶۱۳			اصلی	برآورد کارکرد بخش های عمومی و اجرا- شماره ۳(□ □ □ -□ □ □ -۰۰۰۰۳□□ □ □)
پرداخت نشده			۲۵.۷۶٪		۲۵۲,۴۵۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۵			۹۸۰,۰۰۰				صورت وضعیت شماره ۳ مهندسی (از ۰۱/۰۱/۱۴۰۱ تا ۳۱/۰۳/۱۴۰۱)
پرداخت نشده			۸.۹۳٪		۸۶۳,۸۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۵			۹,۶۷۳,۶۱۳				صورت وضعیت شماره ۳ عمومی و اجرا (از ۰۱/۰۱/۱۴۰۱ تا ۳۱/۰۳/۱۴۰۱)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شماره صفحه : 21 از 41
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12							
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008	G00

9 بخش تدارکات کالا



 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12							شماره صفحه : 24 از 41	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008		G00

11 مکاتبات با کارفرما

1-11 مکاتبات وارده از کارفرما :

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
1	دعوت به جلسه بررسی مدل سه بعدی ایستگاه جدید تقویت فشار گاز بینک	1401/03/21	5999
2	تعیین درصد تجهیزات ساخت داخل و خارج و مجوز خرید کالای بخش خارجی	1401/03/21	6001
3	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسسمیتال ها	1401/03/21	6060
4	عدم رضایت از عملکرد تیم برنامه ریزی	1401/03/22	6200
5	ویرایش اول دستورالعمل نحوه تدوین و رسیدگی به لایحه تاخیرات پیمان	1401/03/24	6404
6	برآورد کارکرد بخش های عمومی و اجرا-شماره 3	1401/03/24	6398
7	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسسمیتال ها	1401/03/24	6393
8	برآورد کارکرد بخش مهندسی شماره 3	1401/03/24	6390
9	صورتحجلسه جمع بندی نظرات بر روی معماری ساختمان کنترل GCS	1401/03/24	6376
10	خط لوله تامین آب مورد نیاز حفاری موقعیت W0185 میدان بینک	1401/03/24	6358
11	شرایط ناهموار جاده دسترسی به دکل 35 فتح	1401/03/25	6558
12	مدارک بدون پاسخ از سوی کارفرمای محترم تا رسیدن 17/02/1401	1401/03/25	6561
13	صورتحجلسه بررسی مدل سه بعدی 60٪ ایستگاه جدید تقویت فشار گاز بینک	1401/03/25	6598
14	فهرست تفکیکی کالا و خدمات ساخت داخل و خارج و مجوز خرید کالا از خارج کشور	1401/03/26	6663
15	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسسمیتال ها	1401/03/28	6925
16	عدم اثر بخشی خدمات بهداری (آمبولانس)	1401/03/29	6921
17	صورتحجلسه بررسی مشکلات اجرایی مورخ 24/03/1401	1401/03/29	6958
18	موافقت با برگزاری جلسات SIL,HAZOP,HAZID	1401/03/30	7064
19	پاسخ به عدم رضایت مندی کارفرما از عملکرد بخش برنامه ریزی این پیمانکار	1401/03/31	7156
20	پاسخ به درخواست بررسی ویرایش DO6 داده برگ فنی کمپرسورهای پروژه	1401/03/31	7170
21	صورتحجلسه نهایی سازی نتایج مطالعات مهندسی ارزش	1401/04/01	7372
22	نیاز به پمپ Oil Sump Pit	1401/04/04	7593
23	جلسه PIM مربوط به قرار داد پکیج WHCP	1401/04/07	7935
24	فهرست تفکیکی کالا و خدمات ساخت داخل و خارج و مجوز خرید کالا از	1401/04/08	6663
25	پاسخ ذینفع اصلی طرح به شماره نامه های 0415,0333,0384,0410,0411	1401/04/08	8061

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پارس  HIRGAN ENERGY 	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12								شماره صفحه : 25 از 41
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008	G00	

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
26	مدارک پشتیبان جهت بررسی ویرایش D06 داده برگ فنی کمپرسورهای پروژ	1401/04/08	8072
27	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسسمیتال ها	1401/04/08	8087
28	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسسمیتال ها	1401/04/11	8164
29	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسسمیتال ها	1401/04/11	8171
30	نتیجه بررسی لیست مدارک مهندسی (پاسخ ترانسسمیتال شماره 1047)	1401/04/11	8182
31	نتیجه بررسی گزارش هفتگی شماره 54	1401/04/12	8284
32	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسسمیتال ها	1401/04/14	8409
33	اعلام معادل یورویی پیش پرداخت های اول و دوم	1401/04/15	8470
34	صورتحساب بررسی مشخصات فنی کمپرسورهای گازی پروژه	1401/04/15	8485
35	پاسخ به نظرات کارفرمای طرح در خصوص مدرک General Civil Layout-W028D02	1401/04/18	8616
36	معرفی سازنده منتخب فیتینگ سر چاهی بسته های W028 و W018S	1401/04/21	8860
37	پاسخ به نظرات کارفرمای محترم در خصوص مدرک مکانیکال دیتاشیت کمپرسورهای گازی (D04)	1401/04/21	8861
38	معرفی سازنده منتخب سینی کابل ابزار دقیق سرچاهی بسته های W028 و W018S	1401/04/22	8903
39	پاسخ معرفی سازنده منتخب توپک ران و توپک گیر پروژه	1401/04/22	8905
40	پاسخ به نامه قرارداد خرید WHCP و هماهنگی جلسه PIM	1401/04/22	8906

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12							شماره صفحه : 26 از 41	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008		G00

2-11 مکاتبات صادره به کارفرما :

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
1	ارائه فایل NAVIS مدل سه بعدی 30٪ - بسته خطوط لوله	1401/03/21	0402
2	ارسال برخی تجهیزات IT (مربوط به تسهیلات مورد نیاز کارفرما)	1401/03/22	0403
3	پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 مهندسی (منتهی به تاریخ 1400/12/29)	1401/03/22	0404
4	پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ 29/12/1400)	1401/03/22	0405
5	زمان بندی انجام مطالعات HAZOP، SIL و HAZID	1401/03/22	0406
6	متابع تامین لوله های اصلی پروژه	1401/03/22	0407
7	معرفی سازنده منتخب سینی-کابل ابزار دقیق سرچاهی بسته های W018S و W028	1401/03/23	0408
8	معرفی سازنده منتخب فیتینگ سرچاهی بسته های W018S و W028	1401/03/23	0409
9	معرفی سازنده منتخب فلنج سرچاهی بسته های W018S و W028	1401/03/23	0410
10	معرفی سازنده منتخب گسکت سرچاهی بسته های W018S و W028	1401/03/23	0411
11	معرفی سازنده منتخب تیوب- فیتینگ ابزار دقیق سرچاهی بسته های W018S و W028	1401/03/23	0412
12	درخواست پرداخت مبلغ از حساب مشترک فیما بین (پیش پرداخت شرکت کاردانان شرق- سازنده WHCP)	1401/03/24	0413
13	درخواست پرداخت مبلغ از حساب مشترک فیما بین (قسط بیمه تمام خطر پروژه)	1401/03/24	0414
14	پاسخ به نظرات NISOC درخصوص مدرک " W028 - General Civil Layout (D02)"	1401/03/25	0415
15	معرفی سازنده منتخب توپک ران و توپک گیر بسته خطوط لوله	1401/03/25	0416
16	ارسال گزارش هفتگی شماره 52 (منتهی به تاریخ 24/03/1401)	1401/03/25	0417
17	صورت وضعیت شماره 3 مهندسی (از 1401/01/01 تا 1401/02/31)	1401/03/25	0418
18	صورت وضعیت شماره 3 عمومی و اجرا (از 1401/01/01 تا 1401/02/31)	1401/03/25	0419
19	پاسخ به عدم رضایتمندی کارفرما از عملکرد بخش ریزی این پیمانکار	1401/03/28	0420
20	درخواست مجوز انتشار نسخ کاغذی مدارک با وضعیت AFC	1401/03/29	0421
21	پیگیری اخذ بازخورد بر روی مدرک " TBE For Gas Dehydration Package (GCS)"	1401/04/01	0422
22	ارسال گزارش هفتگی شماره 53 (منتهی به تاریخ 1401/04/01)	1401/04/01	0423
23	جلسه پیش - بازرسی (PIM) مربوط به قرارداد پکیج WHCP بسته های W018S، W028، W035 و W008N	1401/04/05	0424
24	وضعیت متر یال انتخابی خطوط لوله جریانی و پایپینگ سرچاهی	1401/04/06	0425

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پارس 	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12							شماره صفحه : 27 از 41	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008		G00

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
25	اثر بخشی خدمات بهداری (آمبولانس) این پیمانکار	1401/04/06	0426
26	ارسال گزارش هفتگی شماره 54 (منتهی به تاریخ 08/04/1401)	1401/04/08	0427
27	خواست جلسه حضوری مدیریتی جهت همفکری در راستای بهبود روند پیشرفت پروژه	1401/04/11	0428
28	درخواست مجدد جهت تایید قرارداد پکیج WHCP و هماهنگی جهت جلسه پیش-بازرسی (PIM)	1401/04/11	0429
29	پیگیری اخذ سند مالی و صورتحساب مربوط به صورت وضعیت های پرداخت شده	1401/04/11	0430
30	پیگیری اعلام معادل یورویی علی الحساب تأدیه شده بابت پیش پرداخت های اول و دوم	1401/04/11	0431
31	درخواست پرداخت مبلغ از حساب مشترک فیما بین (مطالبات پیمانکاران دست دوم)	1401/04/14	0432
32	تدقیق اطلاعات فرایندی و کنترلی Wellhead	1401/04/14	0433
33	نقاط عملکردی مربوط به PSHH و PSL قبل و بعد از Chock Flange (تاسیسات سرچاهی)	1401/04/14	0434
34	پاسخ به نظرات NISOC درخصوص مدرک GCS; PMR For Total Flooding (System(D00	1401/04/15	0435
35	معادل یورویی صحیح علی الحساب تأدیه شده بابت پیش پرداخت های اول و دوم	1401/04/15	0436
36	پاسخ به نقطه نظرات مطروحه بر روی گزارش هفتگی شماره 54	1401/04/15	0437
37	ارسال گزارش هفتگی شماره 55 (منتهی به تاریخ 1401/04/15)	1401/04/15	0438
38	تبعات مالی/زمانی اولیه منتج از تغییر در مشخصات فنی پکیج های کمپرسور گاز GCS	1401/04/15	0439
39	KOM و PIM مربوط به قرارداد پکیج WHCP - نیازمندی ها	1401/04/20	0440
40	روکش سربی برای کابل های عبوری از نواحی فرایندی و کابل آرموردار برای سیستم پیجینگ	1401/04/21	0441
41	پاسخ به نظرات NISOC بر روی (D00) TBE ادوات ابزار دقیق سرچاهی	1401/04/22	0442

3-11 لیست صورتجلسات پروژه

ردیف	عنوان صورت جلسه	تاریخ صورت جلسه	شماره صورت جلسه	ملاحظات
1	بررسی مدل سه بعدی 60٪ ایستگاه جدید تقویت فشار گاز بینک	1401/03/22		
2	صورتجلسه بررسی مشکلات اجرایی مورخ 24/03/1401	1401/03/24		
3	تحويل و تحول خط لوله آبرانی به چاه w018	1401/03/25		
4	صورتجلسه نهایی سازی نتایج مطالعات مهندسی ارزش - نیاز به پمپ Oil Sump Pit	1401/03/29		
5	صورتجلسه بررسی پیشرفت پروژه میدان بینک	1401/03/29		

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12							شماره صفحه : 28 از 41	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008		G00

ردیف	عنوان صورت جلسه	تاریخ صورت جلسه	شماره صورت جلسه	ملاحظات
6	صورتجلسه بررسی زمانبندی بازنگری شده	1401/04/05		
7	صورتجلسه بررسی مشخصات فنی کمپرسورهای گازی پروژه	1401/04/07		

4-11 لیست مکاتبات بدون پاسخ

ردیف	عنوان/خلاصه نامه	تاریخ نامه	شماره نامه	ملاحظات
1	پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 مهندسی (منتهی به تاریخ 1400/12/29)	1401/03/22	0404	
2	پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ 29/12/1400)	1401/03/22	0405	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12							شماره صفحه : 29 از 41	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008		G00

12-مشکلات و موانع

- مشکلات مربوط به جذب نیرو و تکمیل چارت سازمانی پروژه و همچنین محدودیت حضور پرسنل پروژه در شرکت بدلیل بیماری کرونا و ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی و حضور حداقلی پرسنل در محل کار.
- عدم هماهنگی بین کامنتهای پترو ایران و کارفرمای اصلی.
- با توجه به عدم پرداخت مالی پروژه و معوق ماندن درخواستهای مالی اعلام شده (صورت وضعیت شماره 2 مهندسی ، صورت وضعیت شماره 2 بخش عمومی و اجرا ، و همچنین ارائه مستندات مربوط به 3٪ پیش پرداخت) موجب شده است جریان نقدینگی پروژه به شدت منفی شود .

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12							شماره صفحه : 30 از 41	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008		G00

13 موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت

- دریافت با تاخیر نظرات کارفرمای محترم بر روی مدارک ارسالی
- وجود برخی تناقضات در نظرات کارفرمایان (شرکت پتروایران و شرکت مناطق نفتخیز جنوب) درخصوص مدارک ارسالی
- تاخیر در دریافت اطلاعات نهایی مورد نیاز درخصوص WHCP از (بخش تحت الارض) کارفرمای محترم
- تاخیر در نهایی سازی وضعیت طرح مدیریت پسماند چاه ها (توسط کارفرمای محترم) و بالتبع تاخیر در نهایی سازی نقشه ها و کندی پیشرفت کار اجرایی مربوطه
- تغییر برنامه استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و در نتیجه تغییر برنامه کلی پروژه
- نامشخص بودن تاریخ دقیق استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و در نتیجه متاثر شدن برنامه آماده سازی لوکیشن چاه ها و خرید اقلام مربوطه مورد نیاز
- عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 2 مهندسی توسط کارفرمای محترم
- عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 2 عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم
- عدم پرداخت قسط دوم (3٪) پیش پرداخت توسط کارفرمای محترم
- محدودیت های ایجاد شده در تامین کالای ساخت داخل کشور و متعاقب آن سو استفاده برخی شرکت های لوله ساز داخلی و افزایش بی دلیل قیمت ها
- افزایش بی رویه کلیه قیمت های مهندسی، خرید و اجرا علیرغم عدم تغییر نرخ تسعیر ارز نیمایی

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12								شماره صفحه : 31 از 41
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008	G00	

14 بخش کنترل پروژه

- 1-14 برنامه زمان بندی پروژه
- 2-14 لیست مدارک ارسال شده طی دوره
- 2-14 لیست مدارک دارای تاخیر در پاسخ از سوی کارفرما
- 3-14 جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12							شماره صفحه : 32 از 41	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008		G00

15 ضمايم

پیوست شماره یک: برنامه زمان بندی پروژه

پس از نهایی سازی زمانبندی ارسالی، ارائه خواهد شد

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12							شماره صفحه : 33 از 41	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008		G00

پیوست شماره دو : لیست مدارک ارسال شده طی دوره

	Transmittal Date	Document Number	Document Title	POI
1	11-Jun-22	BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0020	Standard Drawing For Cable Pull Pit	AFC
2	11-Jun-22	BK-W007S-PEDCO-110-PR-DG-0001	ESD Block Diagram - Extension of Binak B/C Manifold	IFC
3	11-Jun-22	BK-PPL-PEDCO-320-PR-CE-0001	Cause & Effect Diagram	IFC
4	11-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PR-BD-0001	ESD Block Diagram	IFC
5	11-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-TE-PY-0002	Telecomm. Equipment Layout For Control Building	IFC
6	11-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0072	Foundation Drawing For Fire Shed	IFA
7	11-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0073	Structural Drawing For Fire Shed	IFA
8	11-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-HV-DG-0001	HVAC Flow Diagram For Control Building	IFC
9	11-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PI-DW-0001	Standard Pipe Support Drawings	IFI
10	11-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-HV-DG-0004	HVAC I&C Diagram For Extension of Existing Elect. Building	IFC
11	11-Jun-22	BK-W035-PEDCO-110-GT-RT-0001	Geotechnical Investigation Report - W035	IFC
12	11-Jun-22	BK-W008N-PEDCO-110-GT-RT-0001	Geotechnical Investigation Report - W008N	IFC
13	11-Jun-22	BK-W007S-PEDCO-110-GT-RT-0001	Geotechnical Investigation Report - W007S	IFC
14	11-Jun-22	BK-W046S-PEDCO-110-SA-PY-0002	Safety & Fire Fighting Equipment Location Layout - W046S	IFC
15	11-Jun-22	BK-W046S-PEDCO-110-SA-PY-0003	Escape Route & Safety Sign Layout - W046S	IFC
16	11-Jun-22	BK-PPL-PEDCO-320-IN-DW-0001	Typical Instrument Installation Drawing	IFI
17	11-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-SA-MR-0004	PMR For Fire Fighting Equipment	IFI
18	11-Jun-22	BK-PPL-PEDCO-320-CV-RT-0001	Site Visit Report (Civil Work) - 8" & 4" Pipelines	IFI
19	11-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0003	Architectural Drawing For Gas Compressors Shelter	IFC
20	11-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0001	TBE For Gas Compressors	IFI
21	12-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0005	Panels & Junction Box List	IFA

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12								شماره صفحه : 34 از 41
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008	G00	

	Transmittal Date	Document Number	Document Title	POI
22	12-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0009	Instrument /F&G Cable List	IFA
23	12-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-IN-LD-0002	ESD Logic Diagram	IFC
24	12-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0003	Calculation Note For Flow Element Sizing	IFC
25	12-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0007	Emission and Effluent Summary	IFC
26	12-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-IN-MT-0002	MTO For Instrument/F&G Cable	IFC
27	12-Jun-22	BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0012	Monthly Progress Report	IFI
28	13-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0021	Data Sheets For IRP Panel	IFC
29	14-Jun-22	BK-PPL-PEDCO-320-CV-PY-0001	Civil Layout For Pig Receiver Area (In Siahmakan G.I. Station)	IFC
30	14-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0010	F&G Cause and Effect Diagram For Buildings	IFC
31	14-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PI-DW-0003	Piping Key Plan	IFC
32	14-Jun-22	BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-DW-0017	Standard Drawing For Septic Tank	IFA
33	14-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-SA-MR-0002	PMR For Deluge Valve & Water Spray	IFI
34	14-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-SA-MR-0003	PMR For Safety Equipment	IFI
35	14-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-SA-MR-0005	PMR For Safety Signs	IFI
36	14-Jun-22	BK-W046S-PEDCO-110-SA-MT-0001	MTO For Fire Fighting & Safety Equipment - W046S	IFI
37	14-Jun-22	BK-W046S-PEDCO-110-SA-MT-0002	MTO For Safety Sign - W046S	IFI
38	15-Jun-22	BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-DG-0002	WHCP HYDRAULIC/PNEUMATIC DIAGRAMS-WELLHEADS	AFC
39	15-Jun-22	BK-GNRAL-HD-000-PM-SH-0001	Detailed Schedule & Updating	AFD
40	15-Jun-22	BK-PPL-PEDCO-320-IN-DG-0002	Instrument Hook-up Diagram	IFC
41	15-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0005	Control System Loop Diagram	IFC
42	15-Jun-22	BK-BK14-PEDCO-110-GT-RT-0001	Geotechnical Investigation Report - BK14	IFC
43	15-Jun-22	BK-BK12-PEDCO-110-GT-RT-0001	Geotechnical Investigation Report - BK12	IFC
44	15-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-EL-LI-0002	Electrical Power & Control Cable Schedule	IFC

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12							شماره صفحه : 35 از 41	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008		G00

	Transmittal Date	Document Number	Document Title	POI
45	15-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-EL-RT-0001	Electrical Network (Load Flow, Motor Starting & Short Circuit) Study Report	IFC
46	15-Jun-22	BK-W007S-PEDCO-110-CV-PY-0003	General Civil Layout - - Extension of Binak B/C Manifold	IFC
47	18-Jun-22	BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-DT-0001	Data Sheets For WHCP/HPU - Wellheads	IFA
48	18-Jun-22	BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0006	Data Sheets For Control/Regulator valves - Extension of Binak B/C Manifold	IFA
49	18-Jun-22	BK-W028-PEDCO-110-CV-PY-0002	Civil and Structural drawings - W028	IFA
50	18-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PI-DT-0001	Data Sheets For Strainers	IFC
51	19-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0002	P&ID - Gas Compression Inlet Gas Pipeline (Binak)	IFA
52	19-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0003	P&ID - Gas Compression Inlet Gas Pipeline (Golkhari)	IFA
53	19-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0004	P&ID - Slug Catcher System	IFA
54	19-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0005	P&ID - Gas Compression Inlet Knock Out Drum	IFA
55	19-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0006	P&ID - 1st Stage Gas Compression Suction Drums	IFA
56	19-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0007	P&ID - 1st Stage Gas Compression Compressors	IFA
57	19-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0008	P&ID - 1st Stage Gas Compression Air Coolers	IFA
58	19-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0009	P&ID - 2nd Stage Gas Compression Suction Drums	IFA
59	19-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0010	P&ID - 2nd Stage Gas Compression Compressors	IFA
60	19-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0011	P&ID - 2nd Stage Gas Compression Air Coolers	IFA
61	19-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0012	P&ID - 2nd Stage Gas Compression Discharge Drum	IFA
62	19-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0013	P&ID - Gas Compression Dehydration Package	IFA
63	19-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0014	P&ID - Lean Glycol Storage Tank	IFA
64	19-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0015	P&ID - Instrument & Plant Air System	IFA
65	19-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0016	P&ID - Nitrogen Generation System	IFA
66	19-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0017	P&ID - Close Drain System	IFA

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12							شماره صفحه : 36 از 41	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008		G00

	Transmittal Date	Document Number	Document Title	POI
67	19-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0018	P&ID - Corrosion Inhibitor Package	IFA
68	19-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0019	P&ID - Methanol Injection Package	IFA
69	19-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0020	P&ID - LP Flare System	IFA
70	19-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0021	P&ID - Oily Water Sewer	IFA
71	19-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0022	P&ID - Fuel Gas System	IFA
72	19-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0023	P&ID - Diesel Oil System	IFA
73	19-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0024	P&ID - Potable Water System	IFA
74	19-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0025	P&ID - Glycol Sump Drum	IFA
75	19-Jun-22	BK-GNRL-HD-000-GE-RT-0050	Delay Analysis Report	IFI
76	19-Jun-22	BK-W028-PEDCO-110-IN-MR-0001	PMR For WHCP/HPU - W028	IFI
77	19-Jun-22	BK-W035-PEDCO-110-IN-MR-0001	PMR For WHCP/HPU - W035	IFI
78	19-Jun-22	BK-W008N-PEDCO-110-IN-MR-0001	PMR For WHCP/HPU - W008N	IFI
79	19-Jun-22	BK-PPL-PEDCO-320-IN-DG-0007	Instrument & F&G Junction Box Termination Diagram	IFC
80	19-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0003	Mechanical Data Sheets For 1st Stage Gas Air Coolers	IFA
81	19-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0005	Mechanical Data Sheets For 2nd Stage Gas Air Coolers	IFA
82	19-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0027	Mechanical Data Sheets For Overhead Traveling Cranes	AFC
83	19-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0017	Mechanical Data Sheets For Fire Water Storage Tank	IFC
84	20-Jun-22	BK-W018S-PEDCO-110-IN-MR-0001	PMR For WHCP/HPU - W018S	IFI
85	20-Jun-22	BK-W018S-PEDCO-110-ST-DW-0002	Platform Structure Drawing - W018S	IFA
86	20-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-EL-DG-0011	Wiring Diagram For Interposing Relay Panel (IRP)	IFC
87	20-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-EL-LI-0005	Electrical I/O Signal List	IFC
88	21-Jun-22	BK-SSGRL-PEDCO-110-ME-DT-0002	Data Sheets For Potable Water Tank of Well Pads	IFA
89	21-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PR-RT-0001	Flare Network Study Report	IFA

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پارس  HIRGAN ENERGY 
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12							شماره صفحه : 37 از 41
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008	G00

	Transmittal Date	Document Number	Document Title	POI
90	21-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PR-RT-0002	Flare Radiation & Dispersion Study Report	IFA
91	21-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0072	Foundation Drawing For Fire Shed	AFC
92	21-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0073	Structural Drawing For Fire Shed	AFC
93	21-Jun-22	BK-W028-PEDCO-110-ST-DW-0002	Platform Structure Drawing - W028	IFC
94	21-Jun-22	BK-GNRAL-PEDCO-000-ME-DC-0001	Mechanical Design Criteria	IFA
95	21-Jun-22	BK-PPL-PEDCO-320-IN-LI-0002	I/O List For Control /ESD System	IFC
96	22-Jun-22	BK-W018S-PEDCO-110-CV-MR-0001	PMR For Geomembrane - W018S	IFI
97	22-Jun-22	BK-W028-PEDCO-110-CV-MR-0001	PMR For Geomembrane - W028	IFI
98	22-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0001	Calculation Note For Outdoor Area Lighting System	IFC
99	22-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0003	Area Lighting & Small Power Layout	IFC
100	22-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PI-RT-0004	PDMS Model Review Report (60%)-GCS	IFC
101	22-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0003	Process Data Sheets For 1st Stage Gas Air Coolers	IFA
102	22-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0005	Process Data Sheets For 2nd Stage Gas Air Coolers	IFA
103	22-Jun-22	BK-PPL-PEDCO-320-IN-LD-0001	Control System Logic Diagram	IFC
104	22-Jun-22	BK-PPL-PEDCO-320-IN-LI-0004	Panels & Junction Box List	IFC
105	22-Jun-22	BK-PPL-PEDCO-320-IN-LI-0005	Set Point & Alarm List	IFC
106	22-Jun-22	BK-PPL-PEDCO-320-ME-DT-0001	Data Sheets For Pig Traps	IFA
107	25-Jun-22	BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0004	PMR For ON/OFF & Shutdown Valves - Extension of Binak B/C Manifold	IFI
108	25-Jun-22	BK-BK12-PEDCO-110-CV-RT-0001	Site Visit Report (Civil Work) - BK12	IFC
109	25-Jun-22	BK-BK15-PEDCO-110-CV-RT-0001	Site Visit Report (Civil Work) - BK15	IFC
110	25-Jun-22	BK-GNRAL-HD-000-PM-PG-0001	Progress S-curves & Updating	IFA
111	25-Jun-22	BK-PPL-PEDCO-320-IN-DG-0005	Control System Loop Diagram	IFC
112	25-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0011	Data Sheets For Control/Regulator Valves	IFC

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12							شماره صفحه : 38 از 41
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008	G00

	Transmittal Date	Document Number	Document Title	POI
113	25-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0002	Instrument Hook-up Diagram	IFA
114	25-Jun-22	BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0003	Data Sheets For Pressure/Diff. Pressure Transmitter	IFA
115	25-Jun-22	BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0012	Data Sheets For LBV	IFA
116	25-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0007	PROCESS CCTV Equipment Layout for GCS Area	IFA
117	26-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-TE-PY-0005	Telecomm Equipment Layout For Area	IFA
118	27-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0009	Architectural Drawing For CCTV Control Room- Binak DU	IFC
119	27-Jun-22	BK-BK14-PEDCO-110-CV-RT-0001	Site Visit Report (Civil Work) - BK14	IFA
120	27-Jun-22	BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-DW-0017	Standard Drawing For Septic Tank	AFC
121	27-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-TE-PY-0001	Telecomm. Equipment Layout For Electrical Building	AFC
122	27-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PI-MT-0001	MTO For Pipes	IFI
123	27-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PI-MT-0005	MTO For Gaskets	IFI
124	27-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-EL-MR-0010	PMR For Local Control Station (LCS)	IFI
125	27-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-IN-BD-0002	Block Diagram For PROCESS CCTV	IFC
126	27-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0010	Cable Schedule For PROCESS CCTV	IFC
127	27-Jun-22	BK-PPL-PEDCO-320-PI-PY-0001	Unit Plot Plan For Pig Receiver Area (in Siahmakan G.I. Station)	IFC
128	28-Jun-22	BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0005	PMR For Control Valves - Extension of Binak B/C Manifold	IFI
129	28-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-PI-DT-0003	Data Sheets and MTO For Piping Special Items	IFC
130	28-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0008	Architectural Drawing For CCTV Control Room- Binak GCS	IFC
131	28-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-IN-MT-0001	MTO for Bulk Item and Installation Accessories	IFI
132	28-Jun-22	BK-GCS-PEDCO-120-IN-MT-0003	MTO For Instrument/F&G Junction box and Gland	IFI
133	1-Jul-22	BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0008	Instrument & F&G Junction Box Termination Diagram	IFA
134	1-Jul-22	BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0006	F&G System Loop Diagram	IFC
135	1-Jul-22	BK-GCS-PEDCO-120-PI-DW-0005	U/G Piping Plan	IFC

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12							شماره صفحه : 39 از 41	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008	G00	

	Transmittal Date	Document Number	Document Title	POI
136	3-Jul-22	BK-W028-PEDCO-110-PI-RT-0001	PDMS Model Review Report (60%) - W028	IFC
137	3-Jul-22	BK-GNRAL-PEDCO-220-EL-LI-0001	Electrical Load List	AFC
138	4-Jul-22	BK-W018S-PEDCO-110-IN-TB-0001	TBE/TBA For WHCP/HPU - W018S	IFI
139	4-Jul-22	BK-W028-PEDCO-110-IN-TB-0001	TBE/TBA For WHCP/HPU - W028	IFI
140	4-Jul-22	BK-W035-PEDCO-110-IN-TB-0001	TBE/TBA For WHCP/HPU - W035	IFI
141	4-Jul-22	BK-W008N-PEDCO-110-IN-TB-0001	TBE/TBA For WHCP/HPU - W008N	IFI
142	5-Jul-22	BK-BK05-PEDCO-110-CV-RT-0001	Site Visit Report (Civil Work) - BK05	IFC
143	5-Jul-22	BK-W007S-PEDCO-110-PI-RT-0002	PDMS Model Review Report (60%) - Extension of Binak B/C Manifold	IFC
144	5-Jul-22	BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0006	Data Sheets For Local Control Stations (LCS)	AFC
145	5-Jul-22	BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0013	Data Sheets For NGR	AFC
146	5-Jul-22	BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0010	Data Sheets For Power & Control Cables	IFA
147	5-Jul-22	BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0011	Data Sheets For Power Transformers	IFA
148	5-Jul-22	BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DG-0001	Electrical Typical Schematic Diagrams For LV Panels of Well Pads	IFI
149	5-Jul-22	BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-SL-0002	Single Line Diagram For LV Switchgear of Well Pads	IFA
150	5-Jul-22	BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0025	TBE For CCTV System	IFI
151	5-Jul-22	BK-W007S-PEDCO-110-CV-PY-0003	General Civil Layout - - Extension of Binak B/C Manifold	IFA
152	6-Jul-22	BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0006	Standard Drawing For Existing Pipeline Crossing	AFC
153	6-Jul-22	BK-BK15-PEDCO-110-GT-RT-0001	Geotechnical Investigation Report - BK15	IFI
154	11-Jul-22	BK-GNRAL-PEDCO-000-ME-SP-0001	Specification For Pressure Vessels	IFA
155	13-Jul-22	BK-PPL-PEDCO-320-PI-RT-0002	Wall Thickness Calculation Report	IFA
156	13-Jul-22	BK-GCS-PEDCO-120-GE-RT-0002	Value Engineering Study Report	IFA
157	13-Jul-22	BK-PPL-PEDCO-320-GE-RT-0002	Value Engineering Study Report	IFA
158	13-Jul-22	BK-SSGRL-PEDCO-110-GE-RT-0002	Value Engineering Study Report	IFA

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پارس 	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12								شماره صفحه : 40 از 41
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008	G00	

	Transmittal Date	Document Number	Document Title	POI
159	13-Jul-22	BK-BK12-PEDCO-110-EL-MR-0001	PMR For Transformers - BK12	IFC
160	13-Jul-22	BK-BK14-PEDCO-110-EL-MR-0001	PMR For Transformers - BK14	IFC
161	13-Jul-22	BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0008	PMR For Transformers - W007S	IFC
162	13-Jul-22	BK-W018S-PEDCO-110-PI-TB-0003	TBE For Flanges - W018S	IFI
163	13-Jul-22	BK-W046S-PEDCO-110-EL-MR-0001	PMR For Transformers - W046S	IFC
164	13-Jul-22	BK-BK05-PEDCO-110-EL-MR-0001	PMR For Transformers - BK05	IFC
165	13-Jul-22	BK-BK15-PEDCO-110-EL-MR-0001	PMR For Transformers - BK15	IFC
166	13-Jul-22	BK-GNRAL-PEDCO-000-PR-DB-0001	Process Basis Of Design	IFA
167	13-Jul-22	BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0001	Data Sheets For Pressure & Diff. Pressure Gauge	IFA
168	13-Jul-22	BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0002	Data Sheets For Temperature Gauge	IFA
169	13-Jul-22	BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0005	Area Electrical Cable Route & Section Layout	IFC
170	13-Jul-22	BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0014	Pipeline Standard Drawing For River Crossing	AFC

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12							شماره صفحه : 41 از 41	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008		G00

پیوست شماره سه: جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)
(در پیوست)

پیوست شماره چهار: عکسهایی از عملیات اجرایی
(در پیوست)
