



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض و ابنیه تحت الارض
عمومی و مشترک



شماره پیمان:

053-073-9184

MONTHLY PROGRESS REPORT # 14

نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه
G00	00014	RT	GE	000	HD	GNRAL	BK

شماره صفحه: 1 از 42

طرح نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن

MONTHLY PROGRESS REPORT # 14

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک

G00	AUG. 2022	IFI	P.Ghadamian	M.Fakharian	M.Mehrshad	
Rev.	Date	Purpose of Issue/Status	Prepared by:	Checked by:	Approved by:	CLIENT Approval
Class:3	CLIENT Doc. Number (F-Number): F0Z-707080					

Status:

IDC: Inter-Discipline Check
IFC: Issued For Comment
IFA: Issued For Approval
AFD: Approved For Design
AFC: Approved For Construction
AFP: Approved For Purchase
AFQ: Approved For Quotation
IFI: Issued For Information
AB-R: As-Built for CLIENT Review
AB-A: As-Built –Approved



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض و ابنیه تحت الارض
عمومی و مشترک



شماره پیمان:

053-073-9184

MONTHLY PROGRESS REPORT # 14

نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه
G00	00014	RT	GE	000	HD	GNRAL	BK

شماره صفحه: 2 از 42

REVISION RECORD SHEET

PAGE	G00	G01	G02	G03	G04
1	X				
2	X				
3	X				
4	X				
5	X				
6	X				
7	X				
8	X				
9	X				
10	X				
11	X				
12	X				
13	X				
14	X				
15	X				
16	X				
17	X				
18	X				
19	X				
20	X				
21	X				
22	X				
23	X				
24	X				
25	X				
26	X				
27	X				
28	X				
29	X				
30	X				
31	X				
32	X				
33	X				
34	X				
35	X				
36	X				
37	X				
38	X				
39	X				
40	X				
41	X				
42	X				
43	X				
44	X				
45	X				
46	X				
47	X				
48	X				
49	X				
50	X				
51	X				
52	X				
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					

PAGE	G00	G01	G02	G03	G04
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 14							شماره صفحه : 3 از 42
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	00014	G00

فهرست مطالب

1	مشخصات قراردادی پروژه	4
2	معرفی پروژه	5
3	گزارش مدیریتی پروژه	8
4	گزارش فعالیت‌های انجام شده	9
5	جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی/تحت الارض /سطح الارض)	12
6	بخش کنترل پروژه	13
7	وضعیت مدارک مهندسی	19
8	بخش مالی پروژه	20
9	بخش تدارکات کالا	21
10	نمودار سازمانی پیمانکار	22
11	مکاتبات با کارفرما	24
12	مشکلات و موانع	30
13	موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت	31
14	بخش کنترل پروژه	32
15	ضمائم	33

* گزارش QC و ترنس میتال لیست به پیوست می باشد.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 14								شماره صفحه : 4 از 42
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهيلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	00014	G00	

1 مشخصات قراردادی پروژه

نام پروژه: نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک/ بخش سطح الارض و

ابنیه تحت الارض

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

کارفرمای اصلی:

اهواز، کوی فداییان اسلام، ساختمان 5 طبقه / تهران، خیابان شهید دستگردی،

تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

علیرضا محمدی خواه (سرپرست طرح های نگهداشت و افزایش

مجری و نماینده کارفرمای اصلی:

تولید ناحیه گچساران)

شرکت توسعه پتروایران

کارفرما (پیمانکار عمومی):

تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

مدیر پروژه و نماینده کارفرما (پیمانکار منصور مهرشاد

عمومی):

مشارکت “هیرگان انرژی-طرح و بازرسی”

پیمانکار EPC:

تهران، اتوبان همت- خیابان شیراز جنوبی- کوچه یاس - پلاک 13

محمد فخاریان

مدیر پروژه و نماینده پیمانکار:

1400/04/02

تاریخ شروع پروژه:

1402/04/01

تاریخ پایان پروژه:

BK-00-CO-0001

شماره قرارداد:

971020

شماره پروژه (در سیستم کارفرمای

اصلی):

35,909,880 یورو

مبلغ پیمان (یورو):

24 ماه

مدت پیمان:

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: 053-073-9184	<table><tr><th colspan="8">MONTHLY PROGRESS REPORT # 14</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سرپال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهيلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>G00</td><td>00014</td><td>RT</td><td>GE</td><td>000</td><td>HD</td><td>GNRAL</td><td>BK</td></tr></table>	MONTHLY PROGRESS REPORT # 14								نسخه	سرپال	نوع مدرک	رشته	تسهيلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	G00	00014	RT	GE	000	HD	GNRAL	BK	شماره صفحه: 5 از 42
MONTHLY PROGRESS REPORT # 14																										
نسخه	سرپال	نوع مدرک	رشته	تسهيلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
G00	00014	RT	GE	000	HD	GNRAL	BK																			

2 معرفی پروژه

میدان نفتی بینک از میادین نفتی ایران است که در استان بوشهر، در فاصله ۲۰ کیلومتری از شمال بندر گناوه و در ساحل خلیج فارس مستقر می‌باشد. این میدان از شمال با میدان نفتی گلخاری، میدان نفتی بی‌بی حکیمه و میدان نفتی سیاهمکان و از جنوب با میدان نفتی خارگ، در دریا هم‌جوار است. حجم ذخیره در جای نفت خام این میدان در حدود ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون بشکه برآورد می‌شود. میدان نفتی بینک در افق آسماری دارای ابعادی به طول ۴۲ کیلومتر و عرض متوسط ۶ کیلومتر است. سازندهای آسماری و جهرم این میدان به دلیل ارتباط فشاری مناسب، به عنوان یک مخزن واحد محسوب می‌شوند.


تاسیسات سرچاهی مربوط به ۶ حلقه چاه توسعه ای (که ۲ حلقه از این ۶ حلقه نیاز به برق رسانی و دیگر تسهیلات مرتبط جهت مصارف پمپ درون چاهی می‌باشد) و انجام اصلاحات در ۴ حلقه چاه تعمیری موجود (به همراه برق رسانی جهت مصارف پمپ درون چاهی و دیگر تسهیلات مورد نیاز) در دستور کار این طرح قرار دارد. آب مورد نیاز حفاری چاه ها می بایست از طریق تانکر (یا خط لوله موقت) از دره گپ گناوه/خلیج فارس تامین گردد. ضمناً احداث ۶ خط لوله جریانی جدید از چاه های توسعه ای پیش گفته به مجموعه بوستر-کلاستر بینک و توسعه چندراهه موجود بوستر-کلاستر بینک جزو شرح کار این پروژه است.

با هدف افزایش تولید نفت از میدان بینک، افزایش ظرفیت ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (و احداث ردیف تراکم و مستحذات مورد نیاز جدید) به میزان ۱۵ م ف م ر نیز جزو شرح کار این پروژه می باشد.

همچنین احداث ۴۴ کیلومتر خط لوله ۸ اینچ انتقال گاز از ایستگاه تقویت فشار گاز بینک تا ایستگاه تزریق گاز سیاهمکان و ۵٫۲ کیلومتر خط لوله ۴ اینچ انتقال مایعات گازی از ایستگاه تقویت فشار گاز بینک به واحد بهره برداری بینک نیز در تعهد پیمانکار می‌باشد.

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053-073-9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 14							شماره صفحه : 6 از 42	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	00014	G00	

کلیات توضیحات فوق الذکر شرح کار در شماتیک زیر ارائه شده است.

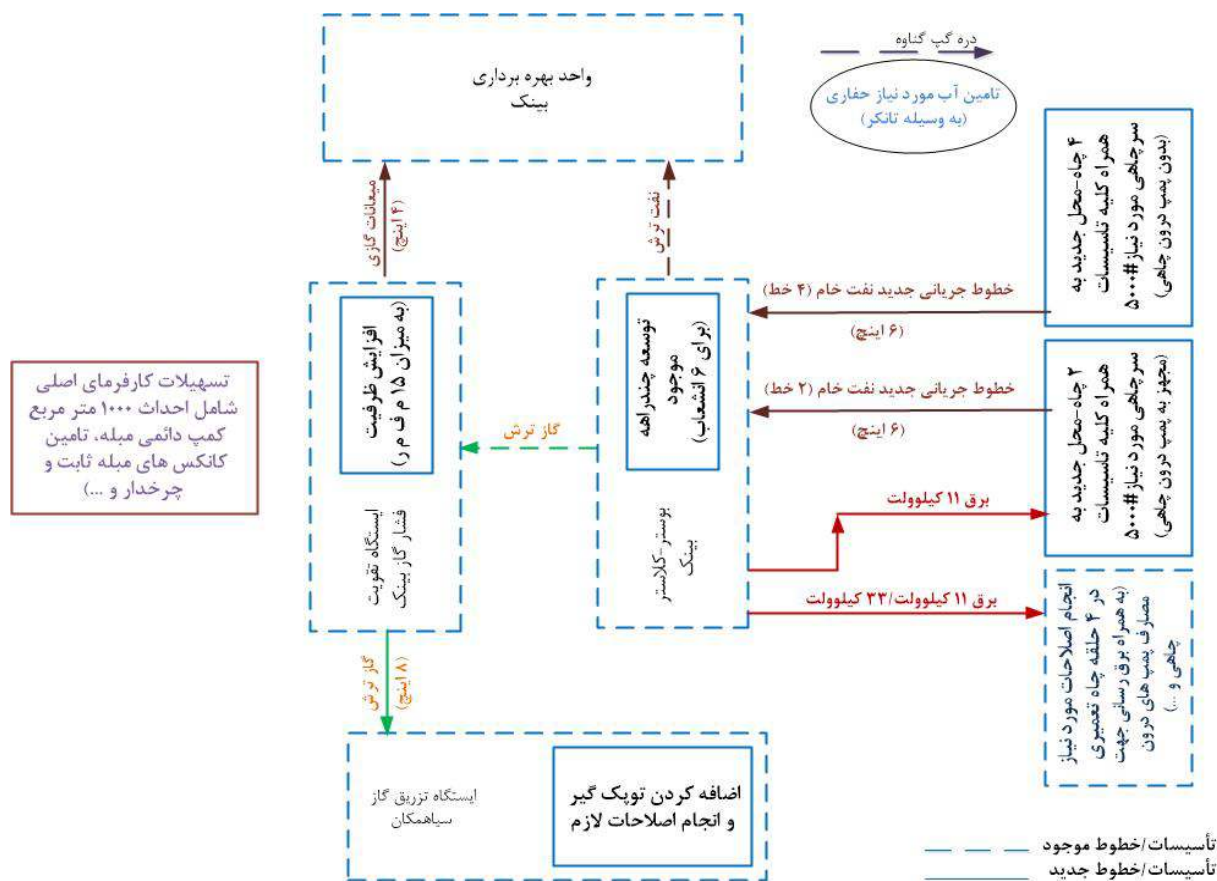

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 14								شماره صفحه : 7 از 42
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهيلات	رشته	نوع مدرک	سريال	نسخه	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	00014	G00	

S/L	Well Name/Location	Reservoir
1	W 008 N	Asmari
2	W 018 S	Asmari
3	W 046 S	Bangestan
4	W028	Bangestan
5	W 035	Bangestan
6	W 007 S	Bangestan
7	Well 14	Bangestan
8	Well 12	Bangestan
9	Well 15	Bangestan
10	Well 05	Bangestan



	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 14							شماره صفحه : 9 از 42
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهيلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	00014	G00

4 گزارش فعالیت های انجام شده

1-4 مدیریت پروژه /عمومی

- شرکت در جلسات هفتگی بررسی پیشرفت پروژه
- انجام تست روزانه تب سنجی و اکسیمتری و توزیع ماسک پرسنل
- پیگیری اخذ اشتراک تلفن ثابت و سرویس اینترنت دائمی برای کارگاه
- پیگیری اخذ اشتراک برق دائمی (شبکه) برای کارگاه
- ادامه ارسال رویه ها و مدارک مربوط به برنامه ریزی و QC
- تهیه برنامه زمانبندی 36 ماهه کل پروژه براساس تغییر اولویت چاهها (مطابق آخرین نقطه نظرات کارفرما)
- کنترل و نظارت مستمر بر حسن انجام ضبط و ربط محیط کار General Housekeeping طبق برنامه
- ارائه خدمات رفاهی به کارفرمای محترم بر اساس قرارداد

2-4 بخش مهندسی (E)

1-2-4 مهندسی سطح الارض /ابنیه تحت الارض پروژه

- ارسال مدارک مهندسی مطابق برنامه زمانبندی پروژه
- ارسال برخی مدارک PMR مربوط به بخش برق مطابق برنامه زمانبندی
- ارسال برخی مدارک PMR مربوط به بخش ابزار دقیق مطابق نظرات کارفرما
- ارسال دیتاشیت های فرآیندی مربوط به پمپ ها مطابق نظرات کارفرما
- ارسال مدرک TBE مربوط به Pig Traps مطابق پیشنهاد سازندگان
- ارسال گزارشات HAZOP و HAZID مربوط به تسهیلات سرچاهی
- ارسال گزارشات HAZOP و HAZID مربوط به بسته GCS
- ارسال گزارشات HAZOP و HAZID مربوط به بسته خطوط لوله
- گزارش سایت ویزیت چاههای 15 و 12 مطابق نظرات کارفرما
- ارسال گزارش ژئوتکنیک لوکیشن 46 و چاه شماره BK05
- ارسال مدرک Process Simulation Report مطابق نظرات کارفرما
- ارسال مدارک دیتاشیت فرایندی Gas Air Coolers مطابق نظرات کارفرما
- ارسال مدرک QRA Report
- بررسی و اصلاح مدارک براساس نظرات کارفرما
- ارسال گزارش مدل سه بعدی 60٪ چاههای لوکیشن 028
- ارسال مجدد مدرک TBE مربوط به WHCP لوکیشن های 18,28,35 و 008
- ارسال گزارش مدل سه بعدی 60٪ بسته چندراهه

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان:	MONTHLY PROGRESS REPORT # 14							شماره صفحه : 10 از 42
053 – 073 – 9184	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهيلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	00014	G00

- ارسال دیتاشیتهای بخش برق براساس نظرات کارفرما
- ارسال گزارش مهندسی ارزش بسته های PPL، GCS و سرچاهی
- ارسال مدرک PMR مربوط به ترانسفورمر چاهها براساس برنامه زمانبندی
- ارسال نسخه نهایی برنامه زمانبندی پروژه براساس 36 ماه
- ارسال مدرک Civil and Structural drawings لوکیشن 28 مطابق نظرات کارفرما

2-2-4 مهندسی تحت الارض پروژه

- (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)

4-3-4 فعالیتهای مرتبط با کالا (P)

1-3-4 کالای سطح الارض/ابنیه تحت الارض پروژه

- برگزاری جلسه با سازندگان کابل
- بررسی کامنت های TBE و مذاکره با وندور Gas Dehydration Package
- ارسال مدارک فنی سازنده WHCP به کارفرما جهت اخذ تاییدیه
- ارسال درخواست بازرسی WHCP
- مکاتبات فنی با سازندگان Control Valve کلاستر
- مکاتبات فنی با سازندگان مخازن تحت فشار GCS
- مکاتبات فنی با سازندگان کولرهای هوایی GCS
- مکاتبات فنی با سازندگان پمپ های GCS

2-3-4 کالای تحت الارض پروژه

- (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)

4-4-4 فعالیتهای اجرایی (C)

- اجرای عملیات آرماتور بندی فونداسیون حوضچه OBM چاه شماره 28
- اجرای عملیات قالب بندی دیوار دستک پل کیلومتر 0+344
- اجرای عملیات بارگیری و حمل خاکهای مازاد محوطه چاه 46 به خارج از لوکیشن
- اجرای عملیات خاکبرداری لوکیشن چاه شماره 46

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 14								شماره صفحه : 11 از 42
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	00014	G00	

- اجرای عملیات آرماتوربندی پد اصلی چاه شماره 28
- اجرای عملیات قالب بندی فونداسیون بچینگ
- اجرای عملیات آرماتوربندی پد اصلی چاه شماره 28
- اجرای عملیات آرماتوربندی و قالب بندی فونداسیون سوله انبار تجهیز کارگاه
- اجرای عملیات بتن ریزی دستک پل کیلومتر 0+344 جاده چاه شماره 28
- اجرای عملیات بتن ریزی پد بتنی چاه 28 پارت سوم

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 14								شماره صفحه : 12 از 42
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	00014	G00	

5 جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی / سطح الارض)

BINAK OILFIELD DEVELOPMENT SURFACE WORK-PACKAGES BASED ON PACKAGES					
Code	Description	W.F. (Total)	Last Progress%	This Period	Up to now Progress%
	Total Project	100.000%	5.51%	0.21%	5.71%
1	GENERAL	5.32%	42.92%	2.22%	45.14%
1-1	General	5.32%	42.92%	2.22%	45.14%
2	SUB-Surface DEVELOPMENT	18.18%	7.70%	0.12%	7.82%
2-1	Engineering	0.36%	33.52%	3.62%	37.15%
2-2	Procurement	11.14%	1.08%	0.00%	1.08%
2-3	Construction	6.68%	17.33%	0.13%	17.46%
3	SURFACE DEVELOPMENT	76.49%	2.38%	0.09%	2.47%
3-1	Engineering	2.37%	30.07%	2.88%	32.95%
3-2	Procurement	59.19%	1.87%	0.00%	1.87%
3-3	Construction	13.92%	0.00%	0.00%	0.00%
3-4	Commissioning, Startup & Handover	1.01%	0.00%	0.00%	0.00%

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان:	MONTHLY PROGRESS REPORT # 14							شماره صفحه : 13 از 42	
053 - 073 - 9184	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهيلات	رشته	نوع مدرک	سريال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	00014		G00

6 بخش کنترل پروژه


جدول میزان پیشرفت کل پروژه (عمومی / سطح الارض)

Description	W.F. (Disc)	W.F. (Total)	Roll-Up	Last Progress%	This Period	Up to now Progress%
Total Project	100.000%	100.000%	100.00%	5.51%	0.21%	5.71%
GENERAL	1.136%	1.136%	1.136%	42.920%	2.217%	45.14%
Project Management	23.600%	0.268%	0.268%	49.860%	0.704%	50.56%
Project Insurance	13.470%	0.153%	0.153%	90.000%	0.000%	90.00%
Service to Company	35.400%	0.402%	0.402%	31.339%	3.742%	35.08%
Training Courses	7.310%	0.083%	0.083%	0.000%	0.000%	0.00%
GC Mobilization & Demobilization	20.220%	0.230%	0.230%	58.760%	0.000%	58.76%
SUB-Surface DEVELOPMENT	52.342%	52.342%	52.338%	7.696%	0.120%	7.82%
Package 01-New Well # W018S	5.210%	2.727%	2.723%	30.724%	0.031%	30.755%
Package 02-New Well # W028 (Bangestan)	7.125%	3.729%	3.729%	30.040%	0.715%	30.755%
Package 03-New Well # W046S (Bangestan)	33.462%	17.515%	17.515%	8.157%	0.077%	8.23%
Package 04-New Well # W035 (Bangestan)	8.669%	4.538%	4.538%	9.497%	0.014%	9.51%
Package 05-New Well # W008N	2.760%	1.445%	1.445%	3.237%	0.068%	3.31%
Package 06-New Well # W007S/Manifold Extension (Bangestan)	12.934%	6.770%	6.770%	1.283%	0.102%	1.38%
Package 07-Workover # 14	7.666%	4.013%	4.012%	1.009%	0.028%	1.04%
Package 08-Workover # 12	6.237%	3.265%	3.264%	1.217%	0.035%	1.25%
Package 09-Workover # 15	9.335%	4.886%	4.886%	0.889%	0.023%	0.91%
Package 10-Workover # 05	6.602%	3.456%	3.456%	0.995%	0.283%	1.28%
SURFACE DEVELOPMENT	46.522%	46.522%	46.522%	2.380%	0.089%	2.47%
Package 11- EPC Pipeline 8" & 4"	15.529%	7.224%	7.224%	2.214%	0.059%	2.27%
Package 12- EPC # Compressor Station	84.471%	39.298%	39.298%	2.422%	0.097%	2.52%

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 14							شماره صفحه : 14 از 42
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	00014	G00

ضرایب وزنی فعالیت ها (W-F) (عمومی / سطح الارض) :

Cde	Description	W.F.(Discp.)	WF.(Total)
		100.00%	100.000%
1	GENERAL	5.32%	5.32%
1-1	Project Management	100.00%	5.32%
2	SUB-Surface DEVELOPMENT	18.18%	18.18%
2-1	Engineering	1.99%	0.36%
2-2	Procurement	61.26%	11.14%
2-3	Construction	36.75%	6.68%
3	SURFACE DEVELOPMENT	76.49%	76.49%
3-1	Engineering	3.09%	2.37%
3-2	Procurement	77.39%	59.19%
3-3	Construction	18.20%	13.92%
3-4	Commissioning, Startup & Handover	1.3%	1.01%

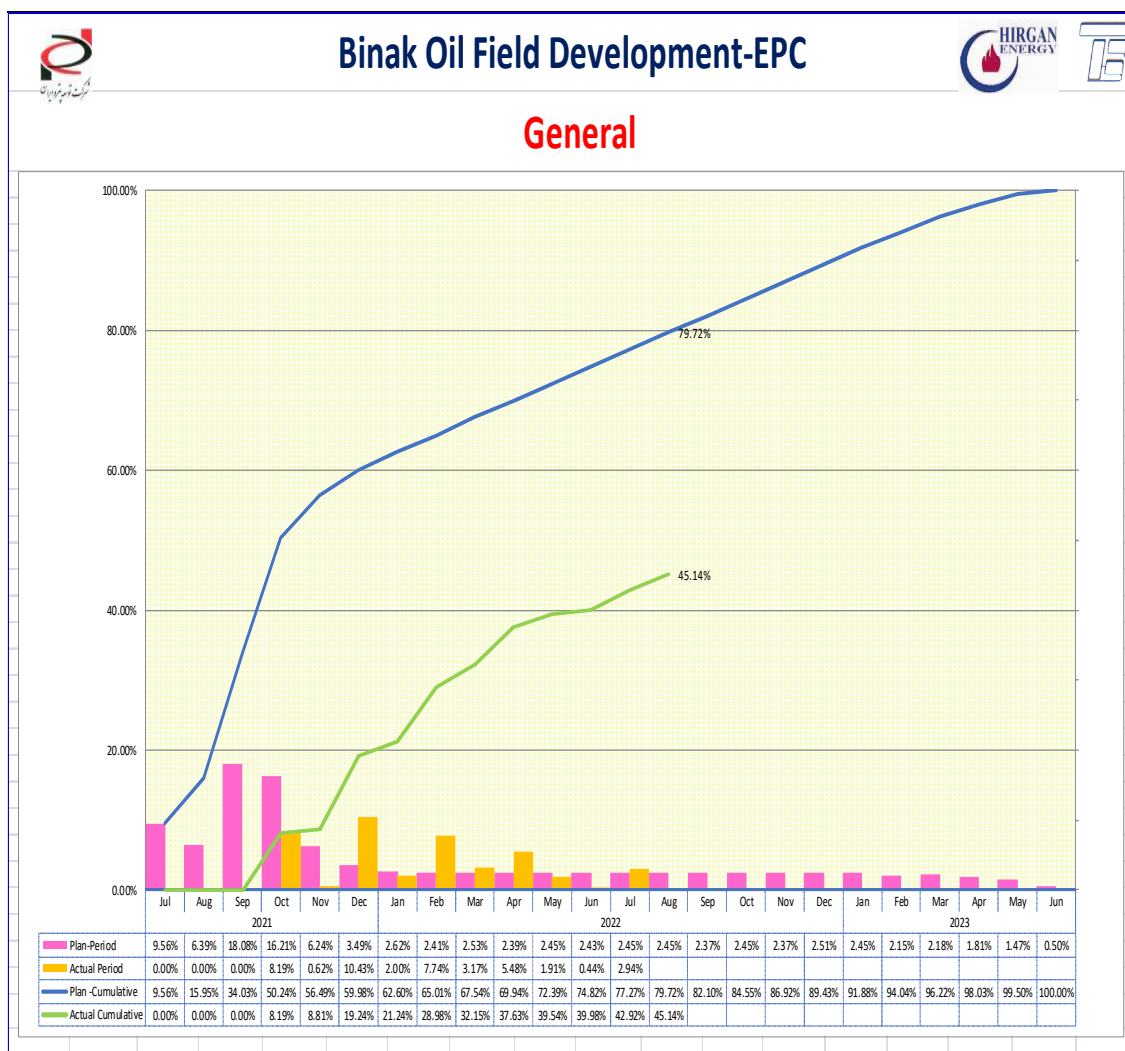






	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	<table><tr><th colspan="8">MONTHLY PROGRESS REPORT # 14</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>G00</td><td>00014</td><td>RT</td><td>GE</td><td>000</td><td>HD</td><td>GNRAL</td><td>BK</td></tr></table>	MONTHLY PROGRESS REPORT # 14								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	G00	00014	RT	GE	000	HD	GNRAL	BK	شماره صفحه : 18 از 42
MONTHLY PROGRESS REPORT # 14																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
G00	00014	RT	GE	000	HD	GNRAL	BK																			

جدول و نمودار پیشرفت EPC :

Total Project	100%	5.51%
Engineering	2.73%	30.53%
Procurement	70.33%	1.75%
Construction	20.60%	5.62%
Commissioning, Startup & Handover	1.01%	0.0%
Project Management	5.32%	42.92%

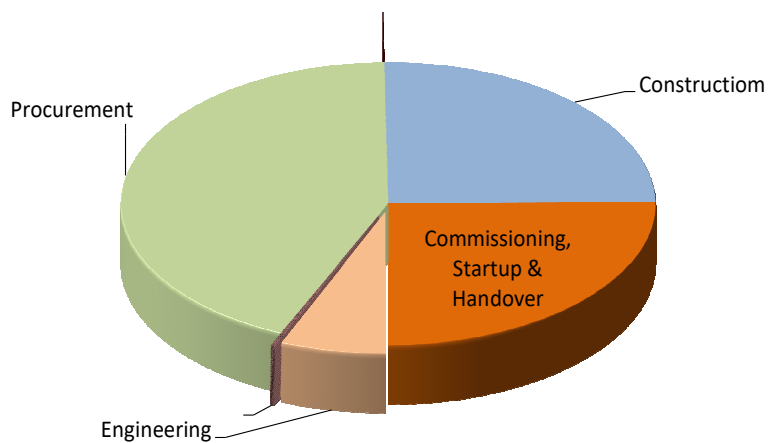

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 14								شماره صفحه : 19 از 42
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهيلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	00014	G00	

7 وضعیت مدارک مهندسی

		گزارش آخرین وضعیت مدارک مهندسی																			
		PM	PR	ME	HV	PI	PL	IN	SA	EL	TE	CV	AR	ST	GE	GT	QC	TP	SU	CO	
کل مدارک	Proj. Management	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	31
	Common	-	11	11	8	28	32	24	17	75	8	28	11	26	39	1	44	0	0	0	363
	WELLHEAD FACILITIES	0	43	8	60	225	42	126	64	206	0	79	30	126	40	10	0	0	12	10	1081
	PIPELINE	0	19	4	0	22	22	57	5	24	0	3	0	2	7	2	0	0	4	1	172
	GCS	0	90	72	18	60	0	113	32	96	29	11	12	111	8	2	0	0	1	1	656
Total Doc		30	163	95	86	335	96	320	118	401	37	121	53	265	95	15	44	0	17	12	2303
تعداد کل مدارک ارسال شده	IFI	2	0	16	1	45	17	61	20	28	5	13	0	2	24	3	0	0	1	0	238
	IFC	8	52	14	14	31	2	53	26	43	4	10	28	5	6	8	13	0	5	0	322
	IFA	4	98	26	2	20	14	53	9	47	4	18	2	4	3	0	2	0	1	0	307
	AFC/AFD	32	3	17	3	9	18	5	18	24	13	17	8	22	5	2	0	0	0	0	196
Total Isu		46	153	73	20	105	51	172	73	142	26	58	38	33	38	13	15	0	7	0	1063

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12							شماره صفحه : 20 از 42
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008	
								G00

8 بخش مالی پروژه

آخرین وضعیت	تاریخ رسید وجه	پیشرفت مالی نسبت به وزن	پیشرفت مالی %۱۰۰	صورت وضعیت تایید شده	صورت وضعیت کل ادعا شده(یورو)	صورت وضعیت ارائه شده	پرداخت پیش پرداخت به پیمانکار – ریال	ضمانت نامه ارائه شده به کار فرما – ریال	مبلغ پیمان یورو	واحد	وزن	بخش اصلی / الحاقیه ۱	شرح فعالیت
پرداخت شده	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۰۰٪	۱۰۰٪		۷۱۸,۱۹۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۱۷۷,۹۸۸,۷۵۶,۶۱۷	۱۷۷,۹۸۸,۷۵۶,۶۱۷	۳۵,۹۰۹,۸۸۰	-	-	اصلی	پیش پرداخت
پرداخت شده	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۰۰٪	۳۰۰٪		۱,۰۷۷,۳۹۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۲۸۰,۵۷۶,۴۶۰,۸۹۸		۳۵,۹۰۹,۸۸۰			اصلی	قسط دوم پیش پرداخت (۳٪ مبلغ پیمان)
عدم تایید			۱۲.۸۸٪		۱۰۱,۰۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	-	-	۹۸۰,۰۰۰	-	-	اصلی	برآورد کلرکرد (WPA) بخش مهندسی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ الی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ -G۰۰
تایید جهت تهیه صورت وضعیت			۱۳.۶۷٪		۱۳۳,۹۳۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۳			۹۸۰,۰۰۰			اصلی	برآورد کلرکرد (WPA) بخش مهندسی- شماره ۱ (به روز شده)(BK-HD-WPA-E-۰۰۰۱_G۰۱)
عدم تایید			۴.۶۳٪		۴۳۰,۰۴۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۹			۹,۳۱۱,۹۶۰			اصلی	برآورد کلرکرد (WPA) بخش های عمومی واجرا- شماره ۱ منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ -G۰۰
تایید جهت تهیه صورت وضعیت			۶.۹۳٪		۶۴۴,۳۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۹			۹,۳۱۱,۹۶۰			اصلی	برآورد کلرکرد(WPA) بخش های عمومی واجرا- شماره ۱ (به روز شده) از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ الی ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ -G۰۱
بصورت الحساب و در چند قسط پرداخت شده			۱۷.۰۸٪		۱۶۷,۴۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۹			۹۸۰,۰۰۰			اصلی	صورت وضعیت شماره ۱ مهندسی (منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶)
بصورت الحساب و در چند قسط پرداخت شده			۴.۵۴٪		۴۲۳,۱۹۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۹			۹۶۷۳,۶۱۳			اصلی	صورت وضعیت شماره ۱ عمومی واجرا (منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸)
پرداختی						۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					اصلی	دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت ۱ مهندسی و ۱ اجرا
			۱۹.۱۵٪		۱۸۷,۶۷۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۶			۹۸۰,۰۰۰			اصلی	برآورد کلرکرد (WPA) شماره ۲ مهندسی (منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹)
			۹.۱۸٪		۸۸۷,۸۹۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۶			۹۶۷۳,۶۱۳			اصلی	برآورد کلرکرد(WPA) شماره ۲ عمومی واجرا (منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹)
پرداختی						۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					اصلی	دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت ۱ مهندسی و ۱ اجرا
پرداختی						۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۶۰,۵۸۹,۳۴۰,۶۴۷					اصلی	دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت ۱ مهندسی و ۱ اجرا
پرداخت نشده			۱۹.۱۵٪		۱۸۷,۶۷۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۴			۹۸۰,۰۰۰			اصلی	صورت وضعیت شماره ۲ مهندسی (منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۰)
پرداخت نشده			۶.۹۵٪		۶۷۲,۱۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۷			۹۶۷۳,۶۱۳			اصلی	صورت وضعیت شماره ۲ عمومی واجرا (منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۰)
			۲۵.۷۶٪		۲۵۲,۴۵۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۸			۹۸۰,۰۰۰			اصلی	برآورد کلرکرد بخش مهندسی- شماره ۳(BK-HD-WPA-E-۰۰۰۳_G۰۰)
			۹.۴۰٪		۹۰۹,۴۷۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۹			۹۶۷۳,۶۱۳			اصلی	برآورد کلرکرد بخش های عمومی واجرا- شماره ۳(BK-HD-WPA-C-۰۰۰۳_G۰۰)
پرداخت نشده			۲۵.۷۶٪		۲۵۲,۴۵۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۵			۹۸۰,۰۰۰				صورت وضعیت شماره ۳ مهندسی (از ۰۱/۰۱/۱۴۰۱ تا ۳۱/۰۳/۱۴۰۱)
پرداخت نشده			۸.۹۳٪		۸۶۳,۸۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۵			۹۶۷۳,۶۱۳				صورت وضعیت شماره ۳ عمومی واجرا (از ۰۱/۰۲/۱۴۰۱ تا ۰۱/۰۱/۱۴۰۱)

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: 053-073-9184	<table><tr><th colspan="8">MONTHLY PROGRESS REPORT # 12</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادرکننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>GNRAL</td><td>PEDCO</td><td>000</td><td>GE</td><td>RT</td><td>0008</td><td>G00</td></tr></table>	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12								پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008	G00	شماره صفحه : 21 از 42
MONTHLY PROGRESS REPORT # 12																										
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008	G00																			

9 بخش تدارکات کالا



 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	<table><tr><th colspan="8">MONTHLY PROGRESS REPORT # 12</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>G00</td><td>0008</td><td>RT</td><td>GE</td><td>000</td><td>PEDCO</td><td>GNRAL</td><td>BK</td></tr></table>	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	G00	0008	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK	شماره صفحه : 24 از 42
MONTHLY PROGRESS REPORT # 12																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
G00	0008	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK																			

11 مکاتبات با کارفرما

11-1 مکاتبات وارده از کارفرما :

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
1	معرفی سازنده منتخب فیتینگ سر چاهی بسته های W018S و W028	1401/04/21	8860
2	پاسخ به نظرات کارفرمای محترم در خصوص مدرک مکانیکال دیتاشیت کمپرسورهای گازی (D04)	1401/04/21	8861
3	معرفی سازنده منتخب سینی کابل ابزار دقیق سرچاهی بسته های W018S و W028	1401/04/22	8903
4	پاسخ معرفی سازنده منتخب توپک ران و توپک گیر پروژه	1401/04/22	8905
5	پاسخ به نامه قرارداد خرید WHCP و هماهنگی جلسه PIM	1401/04/22	8906
6	تدقیق اطلاعات فرایندی و کنترلی whcp	1401/04/25	9063
7	پاسخ به نظرات ارائه شده بر روی (D00) TBE ادوات ابزار دقیق سر چاهی	1401/04/25	9064
8	ارسال نسخه تایید شده صورت وضعیت	1401/04/25	9086
9	برنامه زمانبندی	1401/04/29	9361
10	روکش سربی برای کابل های عبوری از نواحی فرایندی و کابل آرموردار برای سیستم پیچینگ	1401/05/01	9413
11	معرفی سازنده منتخب تیوپ - فیتینگ ابزار دقیق سر چاهی بسته های W028, W018S	1401/05/01	9435
12	ایجاد و توسعه فضای سبز پروژه بینک	1401/05/03	9619
13	پاسخ شرکت مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها	1401/05/08	9891
14	پاسخ شرکت مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها	1401/05/08	9896
15	اطلاعات فرایند / کنترلی اصلاح شده و نهایی wellhead	1401/05/09	10015
16	دعوت به جلسه بررسی شرایط فرایندی و تعیین نرخ خوردگی پروژه	1401/05/09	10024
17	دعوت به جلسه بررسی مدل سه بعدی 30٪ - بسته خطوط لوله بینک	1401/05/09	10027
18	پاسخ شرکت مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها	1401/05/10	10055
19	اقدامات انجام شده در راستای مسئولیت های اجتماعی	1401/05/12	10226
20	تولید زود هنگام از موقعیت چاه W018S	1401/05/18	10526
21	ابلاغیه تغییرات در مشخصات فنی کمپرسورهای گاز GCS	1401/05/19	10544

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان:	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12							شماره صفحه : 25 از 42	
053 – 073 – 9184	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008	G00	

11-2 مکاتبات صادره به کارفرما :

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
1	روکش سربی برای کابل های عبوری از نواحی فرآیندی و کابل آرموردار برای سیستم پیجینگ	1401/04/21	0441
2	پاسخ به نظرات NISOC بر روی (TBE) D00 ادوات ابزار دقیق سرچاهی	1401/04/21	0442
3	ارسال گزارش هفتگی شماره 56 (منتهی به تاریخ 22/04/1401)	1401/04/22	0443
4	زمان بندی مطالعات تکمیلی HAZID	1401/04/22	0444
5	پیگیری مجدد دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 مهندسی (منتهی به تاریخ 1400/12/29)	1401/04/29	0445
6	پیگیری مجدد دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ 1400/12/29)	1401/04/29	0446
7	پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 3 مهندسی (از 01/01/1401 تا 31/02/1401)	1401/04/29	0447
8	پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 3 عمومی و اجرا (از 01/01/1401 تا 31/02/1401)	1401/04/29	0448
9	پاسخ تکمیلی به نظرات NISOC بر روی (TBE) D00 ادوات ابزار دقیق سرچاهی	1401/04/29	0449
10	اطلاعات فرایندی/کنترلی اصلاح شده و نهایی Wellhead	1401/04/29	0450
11	درخواست تعیین تکلیف نهایی "طرح جدید مدیریت پسماند بسته موقعیت چاه W035"	1401/04/29	0451
12	درخواست تعیین تکلیف نهایی "طرح جدید مدیریت پسماند بسته چاه تعمیر BK 14"	1401/04/29	0452
13	ارسال گزارش هفتگی شماره 57 (منتهی به تاریخ 29/04/1401)	1401/04/29	0453
14	صورجلسات KOM و PIM مربوط به قرارداد پکیج های WHCP	1401/04/29	0454
15	تبعات اولیه تغییرکاری "طرح جدید مدیریت پسماند بسته W028" - توضیحات تکمیلی	1401/05/01	0455
16	تامین برق کمپ از خط موجود NISOC - مستندات تکمیلی	1401/05/01	0456
17	درخواست واریز علی الحساب ماهیانه به حساب مشترک فیما بین، بابت تنخواه/حقوق پرسنل پروژه	1401/05/01	0457

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12								شماره صفحه : 26 از 42
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008	G00	

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
18	پیگیری درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان	1401/05/01	0458
19	درخواست اضافه شدن میان پرداخت در بخش کالای پروژه	1401/05/01	0459
20	درخواست واریز مبالغ صورت وضعیت ها به حساب مشترک، پس از اخذ تاییدیه NISOC	1401/05/01	0460
21	سازنده منتخب تیوب- فیتینگ ابزار دقیق سرچاهی بسته های W018S و W028 - توضیحات تکمیلی	1401/05/03	0461
22	سازنده منتخب توپک ران و توپک گیر بسته خطوط لوله -توضیحات تکمیلی	1401/05/03	0462
23	سازنده منتخب سینی -کابل ابزار دقیق سرچاهی بسته های W018S و W028 - توضیحات تکمیلی)	1401/05/03	0463
24	تبعات اولیه تغییر کاری "طرح جدید مدیریت پسماند بسته موقعیت چاه W046S"	1401/05/03	0464
25	اضافه کاری منتج از جداسازی سیستم خنک کاری و روانکاری در پکیج های کمپرسور گاز GCS	1401/05/03	0465
26	برآورد کارکرد بخش مهندسی- شماره 4-(BK-HD-WPA-E-0003_G00)	1401/05/04	0466
27	پیگیری مجدد اخذ بازخورد بر روی مدرک Gas Dehydration TBE For Package:GCS	1401/05/04	0467
28	درخواست مجوز شروع به کار اجرایی در کلاستر بینک	1401/05/05	0468
29	ارسال گزارش هفتگی شماره 58 (منتهی به تاریخ 05/05/1401)	1401/05/05	0469
30	برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی- شماره 4-(BK-HD-WPA-C-0004_G00)	1401/05/05	0470
31	WHCP؛ مدارک عمومی و طراحی/مهندسی سازنده (14010508)	1401/05/08	0471
32	درخواست پرداخت مبلغ از حساب مشترک فیما بین (ساختمانهای پیش ساخته کمپ- صورت وضعیت 4)	1401/05/10	0472
33	درخواست جلسه و بازدید میدانی(نهایی سازی Tie-in، محل دیزل ژنراتور GCS و محل توپک گیر LBV خط سیاهمکان)	1401/05/10	0473
34	درخواست پرداخت مبلغ از حساب مشترک فیما بین(مطالبات تامین کنندگان کارگاه)	1401/05/12	0474
35	برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی- شماره 4-(BK-HD-WPA-C-0004_G00)	1401/05/12	0475

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان:	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12							شماره صفحه : 27 از 42	
053 – 073 – 9184	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008		G00

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
	(0004_G01)		
36	ارسال گزارش هفتگی شماره 59 (منتهی به تاریخ 12/05/1401)	1401/05/12	0476
37	درخواست مجوز انتشار نسخ کاغذی مدارک با وضعیت AFC	1401/05/15	0477
38	WHCP مدرک FAT Procedure_G00 سازنده (15/05/1401)	1401/05/15	0478
39	پیگیری سوم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 مهندسی (منتهی به تاریخ 1400/12/29)	1401/05/15	0479
40	پیگیری سوم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ 1400/12/29)	1401/05/15	0480
41	پیگیری مجدد دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 3 مهندسی (از 01/01/1401 تا 31/02/1401)	1401/05/15	0481
42	پیگیری مجدد دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 3 عمومی و اجرا (از 01/01/1401 تا 31/02/1401)	1401/05/15	0482
43	اقدامات صورت گرفته در راستای مسؤولیت های اجتماعی	1401/05/15	0483
44	ارسال گزارش هفتگی شماره 60 (منتهی به تاریخ 1401/05/18)	1401/05/19	0484

11-3 لیست صورتجلسات پروژه

ردیف	عنوان صورت جلسه	تاریخ صورت جلسه	شماره صورت جلسه	ملاحظات
1	تغییرات در مشخصات فنی کمپرسورهای گاز GCS	1401/05/09		
2	بررسی شرایط فرایندی و تعیین نرخ خوردگی پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان بینک	1401/05/12		
3				
4				
5				
6				
7				

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان:	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12							شماره صفحه : 28 از 42	
053 – 073 – 9184	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008		G00

11-4 لیست مکاتبات بدون پاسخ

ردیف	عنوان/خلاصه نامه	تاریخ نامه	شماره نامه	ملاحظات
1	پیگیری مجدد دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 مهندسی (منتهی به تاریخ 1400/12/29)	1401/04/29	0445	
2	پیگیری مجدد دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ 1400/12/29)	1401/04/29	0446	
3	پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 3 مهندسی (از 01/01/1401 تا 31/02/1401)	1401/04/29	0447	
4	پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 3 عمومی و اجرا (از 01/01/1401 تا 31/02/1401)	1401/04/29	0448	
5	درخواست تعیین تکلیف نهایی "طرح جدید مدیریت پسماند بسته موقعیت چاه W035"	1401/04/29	0451	
6	درخواست تعیین تکلیف نهایی "طرح جدید مدیریت پسماند بسته چاه تعمیری BK 14"	1401/04/29	0452	
7	تبعات اولیه تغییرکاری "طرح جدید مدیریت پسماند بسته W028" - توضیحات تکمیلی	1401/05/01	0455	
8	پیگیری درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان	1401/05/01	0458	
9	تبعات اولیه تغییر کاری "طرح جدید مدیریت پسماند بسته موقعیت چاه W046S"	1401/05/03	0464	
10	اضافه کاری منتج از جداسازی سیستم خنک کاری و روانکاری در پکیج های کمپرسور گاز GCS	1401/05/03	0465	
11	برآورد کارکرد بخش مهندسی- شماره 4-BK-HD-WPA-E-) (0003_G00	1401/05/04	0466	
12	پیگیری مجدد اخذ بازخورد بر روی مدرک Gas TBE For Dehydration Package:GCS	1401/05/04	0467	
13	برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی- شماره 4-BK-HD-) (WPA-C-0004_G00	1401/05/05	0470	
14	برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی- شماره 4-BK-HD-) (WPA-C-0004_G01	1401/05/12	0475	
15	پیگیری سوم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 مهندسی (منتهی به تاریخ 1400/12/29)	1401/05/15	0479	
16	پیگیری سوم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ 1400/12/29)	1401/05/15	0480	

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان:	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12							شماره صفحه : 29 از 42
053 – 073 – 9184	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008	G00

ردیف	عنوان/خلاصه نامه	تاریخ نامه	شماره نامه	ملاحظات
17	پیگیری مجدد دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 3 مهندسی (از 01/01/1401 تا 31/02/1401)	1401/05/15	0481	
18	پیگیری مجدد دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره 3 عمومی و اجرا (از 01/01/1401 تا 31/02/1401)	1401/05/15	0482	

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان:	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12							شماره صفحه : 30 از 42
053 – 073 – 9184	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008	G00

12-مشکلات و موانع

- مشکلات مربوط به جذب نیرو و تکمیل چارت سازمانی پروژه و همچنین محدودیت حضور پرسنل پروژه در شرکت بدلیل بیماری کرونا و ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی و حضور حداقلی پرسنل در محل کار.
- عدم هماهنگی بین کامنتهای پترو ایران و کارفرمای اصلی.
- با توجه به عدم پرداخت مالی پروژه و معوق ماندن درخواستهای مالی اعلام شده (صورت وضعیت شماره 2 مهندسی ، صورت وضعیت شماره 2 بخش عمومی و اجرا ، و همچنین عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 3 مهندسی ، صورت وضعیت شماره 3 بخش عمومی و اجرا) موجب شده است جریان نقدینگی پروژه به شدت منفی شود .

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053-073-9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12							شماره صفحه : 31 از 42	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهيلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008	G00	

13 موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت

- دریافت با تاخیر نظرات کارفرمای محترم بر روی مدارک ارسالی
- وجود برخی تناقضات در نظرات کارفرمایان (شرکت پتروایران و شرکت مناطق نفتخیز جنوب) درخصوص مدارک ارسالی
- تاخیر در دریافت اطلاعات نهایی موردنیاز درخصوص WHCP از (بخش تحت الارض) کارفرمای محترم
- تاخیر در نهایی سازی وضعیت طرح مدیریت پسماند چاه ها (توسط کارفرمای محترم) و بالتبع تاخیر در نهایی سازی نقشه ها و کندی پیشرفت کار اجرایی مربوطه
- تغییر برنامه استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و در نتیجه تغییر برنامه کلی پروژه
- نامشخص بودن تاریخ دقیق استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و در نتیجه متاثر شدن برنامه آماده سازی لوکیشن چاه ها و خرید اقلام مربوطه موردنیاز
- عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 2 مهندسی توسط کارفرمای محترم
- عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 2 عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم
- محدودیت های ایجاد شده در تامین کالای ساخت داخل کشور و متعاقب آن سو استفاده برخی شرکت های لوله ساز داخلی و افزایش بی دلیل قیمت ها
- افزایش بی رویه کلیه قیمت های مهندسی، خرید و اجرا علیرغم عدم تغییر نرخ تسعیر ارز نیمایی

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12								شماره صفحه : 32 از 42
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008	G00	

14 بخش کنترل پروژه

- 14-1 برنامه زمان بندی پروژه
- 14-2 لیست مدارک ارسال شده طی دوره
- 14-2 لیست مدارک دارای تاخیر در پاسخ از سوی کارفرما
- 14-3 جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12								شماره صفحه : 33 از 42
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008	G00	

15 ضمايم

پیوست شماره یک: برنامه زمان بندی پروژه

پس از نهایی سازی زمانبندی ارسالی، ارائه خواهد شد

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان:	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12							شماره صفحه : 34 از 42	
053 – 073 – 9184	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهيلات	رشته	نوع مدرک	سريال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008		G00

پیوست شماره دو : لیست مدارک ارسال شده طی دوره

POI	Document Title	Document Number	Transmittal Date	ROW
IFA	Wall Thickness Calculation Report	BK-PPL-PEDCO-320-PI-RT-0002	1401/04/22	1
IFA	Value Engineering Study Report	BK-GCS-PEDCO-120-GE-RT-0002	1401/04/22	2
IFA	Value Engineering Study Report	BK-PPL-PEDCO-320-GE-RT-0002	1401/04/22	3
IFA	Value Engineering Study Report	BK-SSGRL-PEDCO-110-GE-RT-0002	1401/04/22	4
IFC	PMR For Transformers - BK12	BK-BK12-PEDCO-110-EL-MR-0001	1401/04/22	5
IFC	PMR For Transformers - BK14	BK-BK14-PEDCO-110-EL-MR-0001	1401/04/22	6
IFC	PMR For Transformers - W007S	BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0008	1401/04/22	7
IFI	TBE For Flanges - W018S	BK-W018S-PEDCO-110-PI-TB-0003	1401/04/22	8
IFC	PMR For Transformers - W046S	BK-W046S-PEDCO-110-EL-MR-0001	1401/04/22	9
IFC	PMR For Transformers - BK05	BK-BK05-PEDCO-110-EL-MR-0001	1401/04/22	10
IFC	PMR For Transformers - BK15	BK-BK15-PEDCO-110-EL-MR-0001	1401/04/22	11
IFA	Process Basis Of Design	BK-GNRAL-PEDCO-000-PR-DB-0001	1401/04/22	12
IFA	Data Sheets For Pressure & Diff. Pressure Gauge	BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0001	1401/04/22	13
IFA	Data Sheets For Temperature Gauge	BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0002	1401/04/22	14
IFC	Area Electrical Cable Route & Section Layout	BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0005	1401/04/22	15
AFC	Pipeline Standard Drawing For River Crossing	BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0014	1401/04/22	16
IFA	Drainage Philosophy	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PH-0001	1401/04/25	17
AFD	Detailed Schedule & Updating	BK-GNRAL-HD-000-PM-SH-0001	1401/04/25	18
IFA	Progress S-curves & Updating	BK-GNRAL-HD-000-PM-PG-0001	1401/04/25	19
IFI	TBE For Flanges - W028	BK-W028-PEDCO-110-PI-TB-0003	1401/04/25	20
IFA	BINAK Oil Field Project Overall Well Location/Facilities Layout	BK-SSGRL-PEDCO-110-CV-PY-0001	1401/04/26	21

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12								شماره صفحه : 35 از 42
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008	G00	

POI	Document Title	Document Number	Transmittal Date	ROW
IFA	Civil and Structural drawings -W028	BK-W028-PEDCO-110-CV-PY-0002	1401/04/26	22
IFA	Data Sheets For LV Switchgear of Well Pads	BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DT-0008	1401/04/26	23
IFA	11KV Over Head Line Study Report	BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-RT-0004	1401/04/26	24
IFA	33KV Over Head Line Study Report	BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-RT-0005	1401/04/26	25
IFA	Data Sheets For Expansion of MV Switchgear	BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0004	1401/04/26	26
IFA	Data Sheets For LV Switchgear	BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0005	1401/04/26	27
IFA	Existent MV Switchgear Expansion Single Line Diagram	BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0003	1401/04/26	28
AFC	Standard Drawing For Sewerage & Drainage Details	BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0007	1401/04/26	29
IFI	Electrical Typical Schematic Diagrams For MV panel	BK-GCS-PEDCO-120-EL-DG-0001	1401/04/26	30
IFI	Electrical Typical Schematic Diagrams For LV panel	BK-GCS-PEDCO-120-EL-DG-0002	1401/04/26	31
IFA	Data Sheets For Remote Control Panel	BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0015	1401/04/28	32
IFA	Data Sheets For Distribution & Lighting Panels	BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0016	1401/04/28	33
IFA	Standard Drawing For Civil Underground Crossings	BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0008	1401/04/28	34
IFA	HVAC Calculation Note For Control Building	BK-GCS-PEDCO-120-HV-CN-0001	1401/04/28	35
IFC	Data Sheets For Manual valves	BK-GCS-PEDCO-120-PI-DT-0002	1401/04/28	36
IFC	Calculation Note for offsite flood control system	BK-GCS-PEDCO-120-CV-CN-0002	1401/04/29	37
IFI	Monthly Progress Report	BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0013	1401/04/29	38
IFC	HVAC System Duct Plan For Control Building	BK-GCS-PEDCO-120-HV-PY-0003	1401/04/29	39
IFC	HVAC I&C Diagram For Control Building	BK-GCS-PEDCO-120-HV-DG-0002	1401/04/29	40
AFC	Pipeline Standard Drawing For Irish Crossing	BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0007	1401/04/29	41
IFC	Calculation Report for Gas Compressors Shelter	BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0003	1401/05/01	42
IFC	Structural Drawing For Gas Compressor Shelter	BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0060	1401/05/01	43
IFC	Instrument Location Layout	BK-PPL-PEDCO-320-IN-PY-0002	1401/05/01	44

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان:	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12							شماره صفحه : 36 از 42	
053 – 073 – 9184	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008		G00

POI	Document Title	Document Number	Transmittal Date	ROW
IFC	Data Sheets For Orifice Plate/Restriction Orifice	BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0013	1401/05/01	45
IFC	Control System Logic Diagram	BK-GCS-PEDCO-120-IN-LD-0001	1401/05/01	46
IFA	Calculation Note For Pumps	BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0001	1401/05/01	47
IFA	Process Data Sheets For Slug Pumps	BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0020	1401/05/01	48
AFD	Specification For Environmental Job	BK-GNRAL-PEDCO-000-SA-SP-0004	1401/05/01	49
IFA	HVAC Flow Diagram For Control Building	BK-GCS-PEDCO-120-HV-DG-0001	1401/05/01	50
AFC	Hazard Source List - W046S	BK-W046S-PEDCO-110-SA-LI-0001	1401/05/01	51
IFA	Data Sheets For Distribution & Lighting Panels of Well Pads	BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DT-0011	1401/05/01	52
IFA	Pipeline Standard Drawing For Cover Slabs And Set-On-Weight	BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0013	1401/05/02	53
IFA	Standard Drawing For Earth Pit	BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0037	1401/05/02	54
IFA	Calculation Note For Flood Control	BK-SSGRL-PEDCO-110-CV-CN-0001	1401/05/02	55
IFA	Civil and Structural drawings -W046S	BK-W046S-PEDCO-110-CV-PY-0002	1401/05/02	56
IFI	Standard Drawing For Slope Protection Details	BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0002	1401/05/02	57
IFI	Standard Detail For Pipe Bedding	BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0039	1401/05/02	58
IFA	Specification For Atmospheric Above Ground Welded Steel Tanks	BK-GNRAL-PEDCO-000-ME-SP-0002	1401/05/02	59
IFA	Specification For Chemical Injection Package	BK-GCS-PEDCO-120-ME-SP-0008	1401/05/02	60
IFI	PMR For Pig Traps	BK-PPL-PEDCO-320-ME-MR-0001	1401/05/02	61
IFA	Site visit report - manifold extension	BK-W007S-PEDCO-110-SU-RT-0001	1401/05/02	62
IFC	Cable Trench and Duct Bank Layout	BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0002	1401/05/03	63
AFC	General Civil Layout - - Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-CV-PY-0003	1401/05/03	64
IFC	Electrical Cable Route & Section Layout For Building & Shelter	BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0006	1401/05/03	65
IFA	Electrical Load List	BK-GCS-PEDCO-120-EL-LI-0001	1401/05/03	66
IFA	Calculation Note For Drum Sizing	BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0002	1401/05/04	67

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان:	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12							شماره صفحه : 37 از 42	
053 – 073 – 9184	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008		G00

POI	Document Title	Document Number	Transmittal Date	ROW
IFA	Process Data Sheets For Inlet Gas K.O. Drum	BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0001	1401/05/04	68
IFA	Process Data Sheets For 1st Stage G.C. Suction Drums	BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0002	1401/05/04	69
IFA	Process Data Sheets For 2nd Stage G.C. Suction Drums	BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0004	1401/05/04	70
IFA	Process Data Sheets For Discharge Gas K.O. Drum	BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0006	1401/05/04	71
IFA	Process Data Sheets For Diesel Oil Drum	BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0007	1401/05/04	72
IFA	Process Data Sheets For Instrument Air Receiver	BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0008	1401/05/04	73
IFA	Process Data Sheets For Nitrogen Receiver	BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0009	1401/05/04	74
IFA	Process Data Sheets For Close Drain Drum	BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0010	1401/05/04	75
IFA	Process Data Sheets For Elevated Potable Water Tank	BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0011	1401/05/04	76
IFA	Process Data Sheets For Flare K.O. Drum	BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0012	1401/05/04	77
IFA	Process Data Sheets For Fuel Gas K.O. Drum	BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0013	1401/05/04	78
IFA	Process Data Sheets For Slug Catcher	BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0014	1401/05/04	79
AFC	Hazard Source List - W018S	BK-W018S-PEDCO-110-SA-LI-0001	1401/05/04	80
AFC	Hazard Source List - W028	BK-W028-PEDCO-110-SA-LI-0001	1401/05/04	81
AFC	Hazard Source List - W035	BK-W035-PEDCO-110-SA-LI-0001	1401/05/04	82
AFC	Hazard Source List - W008N	BK-W008N-PEDCO-110-SA-LI-0001	1401/05/04	83
IFA	Instrument Hook-up Diagram - Wellheads	BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-DG-0001	1401/05/04	84
IFA	Calculation Note For LV Capacitor Bank of Well Pads	BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0010	1401/05/04	85
IFA	Data Sheets For LV Capacitor Bank of Well Pads	BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DT-0006	1401/05/04	86
IFA	Data Sheets For Power Transformers of Well Pads	BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DT-0010	1401/05/04	87
IFA	Installation Detail & Notes for Connection OHL to Gantries for Wells	BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DW-0002	1401/05/04	88
IFA	Overall Single Line Diagram of Well Pads	BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-SL-0001	1401/05/04	89
IFA	Single Line Diagram For Capacitor Banks of Well Pads	BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-SL-0005	1401/05/04	90

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان:	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12							شماره صفحه : 38 از 42	
053 – 073 – 9184	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008		G00

POI	Document Title	Document Number	Transmittal Date	ROW
IFC	HSE Operation Control Procedure	BK-GNRL-HD-000-PM-HP-0004	1401/05/04	91
AFC	HVAC & Plumbing Design Criteria	BK-GNRL-PEDCO-000-HV-DC-0001	1401/05/04	92
IFA	PIPING MATERIAL SPECIFICATION	BK-PPL-PEDCO-320-PI-SP-0001	1401/05/04	93
IFA	Data Sheets For Barred Tee	BK-PPL-PEDCO-320-PL-DT-0002	1401/05/04	94
IFI	Site Visit Report (Civil Work) - GCS	BK-GCS-PEDCO-120-CV-RT-0001	1401/05/04	95
IFI	MTO For Civil Works - W028	BK-W028-PEDCO-110-CV-MT-0001	1401/05/04	96
IFC	Instrument Cable Trench/Route Layout Drawing	BK-PPL-PEDCO-320-IN-PY-0003	1401/05/04	97
AFD	Specification For Pipeline Stress Analysis	BK-GNRL-PEDCO-000-PL-SP-0010	1401/05/05	98
		HOLD	1401/05/05	99
IFA	Instrument Location Layout Drawing - W018S	BK-W018S-PEDCO-110-IN-PY-0001	1401/05/05	100
AFC	Data Sheets For Temperature Gauge - Wellheads	BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-DT-0003	1401/05/05	101
IFI	Instrument Earthing Typical Diagram	BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0001	1401/05/05	102
AFD	Architectural Design Criteria	BK-GNRL-PEDCO-000-AR-DC-0001	1401/05/08	103
IFC	NDT Procedure	BK-GNRL-PEDCO-000-QC-PR-0018	1401/05/08	104
AFC	Data Sheets For 11 KV Over Head Line Equipment	BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DT-0012	1401/05/08	105
AFC	Data Sheets For 33 KV Over Head Line Equipment	BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DT-0013	1401/05/08	106
IFI	PMR For Capacitor Bank - W046S	BK-W046S-PEDCO-110-EL-MR-0006	1401/05/08	107
IFI	PMR For Capacitor Bank - W007S	BK-W007S-PEDCO-110-EL-MR-0012	1401/05/08	108
IFI	PMR For Capacitor Bank - BK14	BK-BK14-PEDCO-110-EL-MR-0006	1401/05/08	109
IFI	PMR For Capacitor Bank - BK12	BK-BK12-PEDCO-110-EL-MR-0006	1401/05/08	110
IFI	PMR For Capacitor Bank - BK15	BK-BK15-PEDCO-110-EL-MR-0006	1401/05/08	111
IFI	PMR For Capacitor Bank - BK05	BK-BK05-PEDCO-110-EL-MR-0006	1401/05/08	112
IFA	Calculation Note For Control Valve Sizing	BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0006	1401/05/08	113

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان:	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12							شماره صفحه : 39 از 42	
053 – 073 – 9184	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008		G00

POI	Document Title	Document Number	Transmittal Date	ROW
IFA	Mechanical Data Sheets For 1st Stage G.C. Suction Drums	BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0002	1401/05/08	114
IFI	PMR For Field Instrumentations - W018S	BK-W018S-PEDCO-110-IN-MR-0002	1401/05/08	115
IFI	PMR For Field Instrumentations - W028	BK-W028-PEDCO-110-IN-MR-0002	1401/05/08	116
IFI	PMR For Field Instrumentations - W046S	BK-W046S-PEDCO-110-IN-MR-0002	1401/05/08	117
IFI	PMR For Field Instrumentations - W035	BK-W035-PEDCO-110-IN-MR-0002	1401/05/08	118
IFI	PMR For Field Instrumentations - W008N	BK-W008N-PEDCO-110-IN-MR-0002	1401/05/08	119
IFI	Instrument Earthing Typical Diagram	BK-PPL-PEDCO-320-IN-DG-0001	1401/05/08	120
IFA	Calculation Note For Lighting System of Well Pads Area	BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0004	1401/05/08	121
IFA	Data Sheets For Pressure Gauge - Wellheads	BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-DT-0002	1401/05/08	122
IFA	Instrument/F&G Cable Trench/Route Layout Drawing	BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0004	1401/05/08	123
AFD	Specification For Instrumentation	BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0001	1401/05/08	124
IFI	Site Visit Report (Civil Work) - BK05	BK-BK05-PEDCO-110-CV-RT-0001	1401/05/09	125
IFI	MTO For Instrument Cable Tray/Ladder	BK-GCS-PEDCO-120-IN-MT-0005	1401/05/09	126
IFA	Mechanical Data Sheets For Fire Water Jockey Pumps	BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0028	1401/05/09	127
IFA	Mechanical Data Sheets For Fire Water Main Pumps - Diesel Engine Driven	BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0030	1401/05/09	128
IFA	Control/ESD/F&G System Block Diagram Configuration	BK-GCS-PEDCO-120-IN-BD-0001	1401/05/09	129
AFC	P&ID - Total Flooding System For Extension of Existing Elect. Building	BK-GCS-PEDCO-120-SA-PI-0002	1401/05/09	130
IFI	PMR For Fire Water Pump	BK-GCS-PEDCO-120-ME-MR-0011	1401/05/09	131
AFD	Corrosion Study & Material Selection Report	BK-PPL-PEDCO-320-PI-RT-0001	1401/05/09	132
IFI	TBE For Pig Traps	BK-PPL-PEDCO-320-ME-TB-0001	1401/05/10	133
IFA	Rough Grading Plans -W046S	BK-W046S-PEDCO-110-CV-DW-0001	1401/05/10	134
IFI	Typical Instrument Installation Drawing - Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-IN-DW-0001	1401/05/10	135
IFI	PMR For ControlSystem/Console/Furniture - Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0001	1401/05/10	136

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان:	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12							شماره صفحه : 40 از 42	
053 - 073 - 9184	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهيلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008		G00

POI	Document Title	Document Number	Transmittal Date	ROW
IFI	HAZID Report For WHF & Flow lines	BK-SSGRL-PEDCO-110-GE-RT-0003	1401/05/10	137
IFI	HAZOP Report For Binak B/C Manifold Extension	BK-SSGRL-PEDCO-110-GE-RT-0004	1401/05/10	138
IFI	SIL Report For Binak B/C Manifold Extension	BK-SSGRL-PEDCO-110-GE-RT-0005	1401/05/10	139
IFI	HAZID Report For Pipeline	BK-PPL-PEDCO-320-GE-RT-0003	1401/05/10	140
IFI	HAZOP Report For Pipeline	BK-PPL-PEDCO-320-GE-RT-0004	1401/05/10	141
IFI	HAZID Report For Compressor Station	BK-GCS-PEDCO-120-GE-RT-0003	1401/05/10	142
IFI	HAZOP Report For Compressor Station	BK-GCS-PEDCO-120-GE-RT-0004	1401/05/10	143
IFI	SIL Report For Compressor Station	BK-GCS-PEDCO-120-GE-RT-0005	1401/05/10	144
IFI	Site Visit Report (Civil Work) - BK12	BK-BK12-PEDCO-110-CV-RT-0001	1401/05/10	145
IFI	Site Visit Report (Civil Work) - BK15	BK-BK15-PEDCO-110-CV-RT-0001	1401/05/10	146
IFI	Instrument Earthing Typical Diagram - Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-IN-DG-0002	1401/05/10	147
IFA	Architectural Detail Drawing For Control Building	BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0001	1401/05/12	148
IFA	Calculation Note For UPS System	BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0004	1401/05/12	149
IFA	Calculation Note for Capacitor Banks	BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0011	1401/05/12	150
IFA	Data Sheets For UPS	BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0001	1401/05/12	151
IFA	Data Sheets For DC Charger	BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0002	1401/05/12	152
IFA	Data Sheets For Capacitor Bank	BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0007	1401/05/12	153
IFA	UPS Single Line Diagram	BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0005	1401/05/12	154
IFA	Capacitor Banks Single Line Diagram	BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0007	1401/05/12	155
IFA	Block Diagram Configuration For Control/ESD/F&G System	BK-PPL-PEDCO-320-IN-BD-0001	1401/05/12	156
IFI	Geotechnical Investigation Report - W046S	BK-W046S-PEDCO-110-GT-RT-0001	1401/05/12	157
IFI	Geotechnical Investigation Report - BK05	BK-BK05-PEDCO-110-GT-RT-0001	1401/05/12	158
IFI	Standard Detail Drawing For Pressure Vessels and Heat Exchangers	BK-GNRL-PEDCO-000-ME-DW-0001	1401/05/12	159

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان:	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12							شماره صفحه : 41 از 42	
053 – 073 – 9184	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهيلات	رشته	نوع مدرک	سريال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008		G00

POI	Document Title	Document Number	Transmittal Date	ROW
IFA	Pipeline Standard Drawing For Line Marker	BK-GNRL-PEDCO-000-PL-DW-0001	1401/05/12	160
IFI	PMR For UPS System	BK-GCS-PEDCO-120-EL-MR-0005	1401/05/12	161
IFI	PMR For ESD System - Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0002	1401/05/12	162
IFI	PMR For DC Charger	BK-GCS-PEDCO-120-EL-MR-0006	1401/05/12	163
AFD	Flare, Blow Down And Relief Philosophy	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PH-0003	1401/05/12	164
IFI	Standard Detail Drawing For Storage Tanks	BK-GNRL-PEDCO-000-ME-DW-0002	1401/05/12	165
IFI	PMR For Gas Air Coolers	BK-GCS-PEDCO-120-ME-MR-0004	1401/05/12	166
IFA	Process Simulation Report	BK-GCS-PEDCO-120-PR-RT-0003	1401/05/12	167
IFA	DC Charger Single Line Diagram	BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0006	1401/05/12	168
IFI	MTO For Insulation	BK-GCS-PEDCO-120-PI-MT-0008	1401/05/12	169
AFD	Specification For On-off /Shut Down Valves(ESDV/MOV)	BK-GNRL-PEDCO-000-IN-SP-0006	1401/05/15	170
IFA	Pipeline Material Specification	BK-PPL-PEDCO-320-PL-SP-0001	1401/05/15	171
IFA	Calculation Note For Pipeline Wall Thickness	BK-PPL-PEDCO-320-PL-CN-0001	1401/05/15	172
IFA	Process Data Sheets For 1st Stage Gas Air Coolers	BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0003	1401/05/15	173
IFA	Process Data Sheets For 2nd Stage Gas Air Coolers	BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0005	1401/05/15	174
IFC	QRA Report	BK-PPL-PEDCO-320-SA-RT-0003	1401/05/15	175
IFA	Control Logic Diagram For LV Incomers and bus tie	BK-GCS-PEDCO-120-EL-LD-0001	1401/05/15	176
IFA	Specification For ESD System	BK-GNRL-PEDCO-000-IN-SP-0003	1401/05/15	177
IFA	Process Data Sheets For Gas Compressors Packages	BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0030	1401/05/15	178

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 12								شماره صفحه : 42 از 42
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0008	G00	

پیوست شماره سه: جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)
(در پیوست)

پیوست شماره چهار: عکسهایی از عملیات اجرایی
(در پیوست)
