

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																	
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16 <table border="1"> <tr> <td>نسخه</td> <td>سریال</td> <td>نوع مدرک</td> <td>رشته</td> <td>تسهیلات</td> <td>صادر کننده</td> <td>بسته کاری</td> <td>پروژه</td> </tr> <tr> <td>G00</td> <td>0016</td> <td>RT</td> <td>GE</td> <td>000</td> <td>HD</td> <td>GNRAL</td> <td>BK</td> </tr> </table>	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	G00	0016	RT	GE	000	HD	GNRAL	BK	شماره صفحه : ۱ از ۴۳
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه											
G00	0016	RT	GE	000	HD	GNRAL	BK											

طرح نگهداشت و افزایش تولید ۲۷ مخزن

MONTHLY PROGRESS REPORT # 16

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک

G00	OCT. 2022	IFI	M.Aref	M.Fakharian	M.Mehrshad	
Rev.	Date	Purpose of Issue/Status	Prepared by:	Checked by:	Approved by:	CLIENT Approval
Class: 3		CLIENT Doc. Number (F-Number): F0Z-707082				
Status: IDC: Inter-Discipline Check IFC: Issued For Comment IFA: Issued For Approval AFD: Approved For Design AFC: Approved For Construction AFP: Approved For Purchase AFQ: Approved For Quotation IFI: Issued For Information AB-R: As-Built for CLIENT Review AB-A: As-Built –Approved						

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																	
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16 <table border="1"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادر کننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GNRAL</td> <td>HD</td> <td>000</td> <td>GE</td> <td>RT</td> <td>0016</td> <td>G00</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0016	G00	شماره صفحه: ۲ از ۴۳
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0016	G00											

REVISION RECORD SHEET

PAGE	G00	G01	G02	G03	G04
1	X				
2	X				
3	X				
4	X				
5	X				
6	X				
7	X				
8	X				
9	X				
10	X				
11	X				
12	X				
13	X				
14	X				
15	X				
16	X				
17	X				
18	X				
19	X				
20	X				
21	X				
22	X				
23	X				
24	X				
25	X				
26	X				
27	X				
28	X				
29	X				
30	X				
31	X				
32	X				
33	X				
34	X				
35	X				
36	X				
37	X				
38	X				
39	X				
40	X				
41	X				
42	X				
43	X				
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					

PAGE	G00	G01	G02	G03	G04
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16								شماره صفحه: ۳ از ۴۳
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0016	G00	

فهرست مطالب

۱	مشخصات قراردادی پروژه.....	۴
۲	معرفی پروژه.....	۵
۳	گزارش مدیریتی پروژه.....	۸
۴	گزارش فعالیت‌های انجام شده.....	۹
۵	جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی/تحت الارض /سطح الارض).....	۱۳
۶	بخش کنترل پروژه.....	۱۴
۷	وضعیت مدارک مهندسی.....	۲۰
۸	بخش مالی پروژه.....	۲۱
۹	بخش تدارکات کالا.....	۲۲
۱۰	نمودار سازمانی پیمانکار.....	۲۳
۱۱	مکاتبات با کارفرما.....	۲۵
۱۲	مشکلات و موانع.....	۳۰
۱۳	موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت.....	۳۱
۱۴	بخش کنترل پروژه.....	۳۲
۱۵	ضمائم.....	۳۳

* گزارش QC و ترنسیتال لیست به پیوست می باشد.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16							شماره صفحه : ۴ از ۴۳
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0016	G00

۱ مشخصات قراردادی پروژه

نام پروژه:

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک/ بخش سطح الارض و ابنیه تحت الارض

کارفرمای اصلی:

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
اهواز، کوی فداییان اسلام، ساختمان ۵ طبقه/ تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

مجری و نماینده کارفرمای اصلی:

علیرضا محمدی خواه (سرپرست طرح های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران)

کارفرما (پیمانکار عمومی):

شرکت توسعه پتروایران
تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

مدیر پروژه و نماینده کارفرما (پیمانکار منصور مهرشاد

عمومی):

مشارکت “هیرگان انرژی-طرح و بازرسی”

پیمانکار EPC:

تهران، اتوبان همت - خیابان شیراز جنوبی - کوچه یاس - پلاک ۱۳

مدیر پروژه و نماینده پیمانکار: محمد فخاریان

تاریخ شروع پروژه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

تاریخ پایان پروژه: ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

شماره قرارداد: BK-00-CO-0001

شماره پروژه (در سیستم کارفرمای اصلی): ۹۷۱۰۲۰

مبلغ پیمان (یورو): ۳۵،۹۰۹،۸۸۰ یورو

مدت پیمان: ۲۴ ماه

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">MONTHLY PROGRESS REPORT # 16</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>G00</td><td>0016</td><td>RT</td><td>GE</td><td>000</td><td>HD</td><td>GNRAL</td><td>BK</td></tr></table>	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	G00	0016	RT	GE	000	HD	GNRAL	BK	شماره صفحه: ۵ از ۴۳
MONTHLY PROGRESS REPORT # 16																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
G00	0016	RT	GE	000	HD	GNRAL	BK																			

۲ معرفی پروژه

میدان نفتی بینک از میادین نفتی ایران است که در استان بوشهر، در فاصله ۲۰ کیلومتری از شمال بندر گناوه و در ساحل خلیج فارس مستقر می باشد. این میدان از شمال با میدان نفتی گلخاری، میدان نفتی بی بی حکیمه و میدان نفتی سیاهمکان و از جنوب با میدان نفتی خارگ، در دریا هم جوار است. حجم ذخیره در جای نفت خام این میدان در حدود ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون بشکه برآورد می شود. میدان نفتی بینک در افق آسماری دارای ابعادی به طول ۴۲ کیلومتر و عرض متوسط ۶ کیلومتر است. سازندهای آسماری و جهرم این میدان به دلیل ارتباط فشاری مناسب، به عنوان یک مخزن واحد محسوب می شوند.

تاسیسات سرچاهی مربوط به ۶ حلقه چاه توسعه ای (که ۲ حلقه از این ۶ حلقه نیاز به برق رسانی و دیگر تسهیلات مرتبط جهت مصارف پمپ درون چاهی می باشد) و انجام اصلاحات در ۴ حلقه چاه تعمیری موجود (به همراه برق رسانی جهت مصارف پمپ درون چاهی و دیگر تسهیلات مورد نیاز) در دستور کار این طرح قرار دارد. آب مورد نیاز حفاری چاه ها می بایست از طریق تانکر (یا خط لوله موقت) از دره گپ گناوه/خلیج فارس تامین گردد. ضمناً احداث ۶ خط لوله جریانی جدید از چاه های توسعه ای پیش گفته به مجموعه بوستر- کلاستر بینک و توسعه چندراهه موجود بوستر- کلاستر بینک جزو شرح کار این پروژه است.

با هدف افزایش تولید نفت از میدان بینک، افزایش ظرفیت ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (و احداث ردیف تراکم و مستحدمات مورد نیاز جدید) به میزان ۱۵ م ف م ر نیز جزو شرح کار این پروژه می باشد. همچنین احداث ۴۴ کیلومتر خط لوله ۸ اینچ انتقال گاز از ایستگاه تقویت فشار گاز بینک تا ایستگاه تزریق گاز سیاهمکان و ۵،۲ کیلومتر خط لوله ۴ اینچ انتقال مایعات گازی از ایستگاه تقویت فشار گاز بینک به واحد بهره برداری بینک نیز در تعهد پیمانکار می باشد.

کلیات توضیحات فوق الذکر شرح کار در شماتیک زیر ارائه شده است.



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض

عمومی و مشترک




شماره پیمان:

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

MONTHLY PROGRESS REPORT # 16

نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه
G00	0016	RT	GE	000	HD	GNRAL	BK

شماره صفحه: ۶ از ۴۳

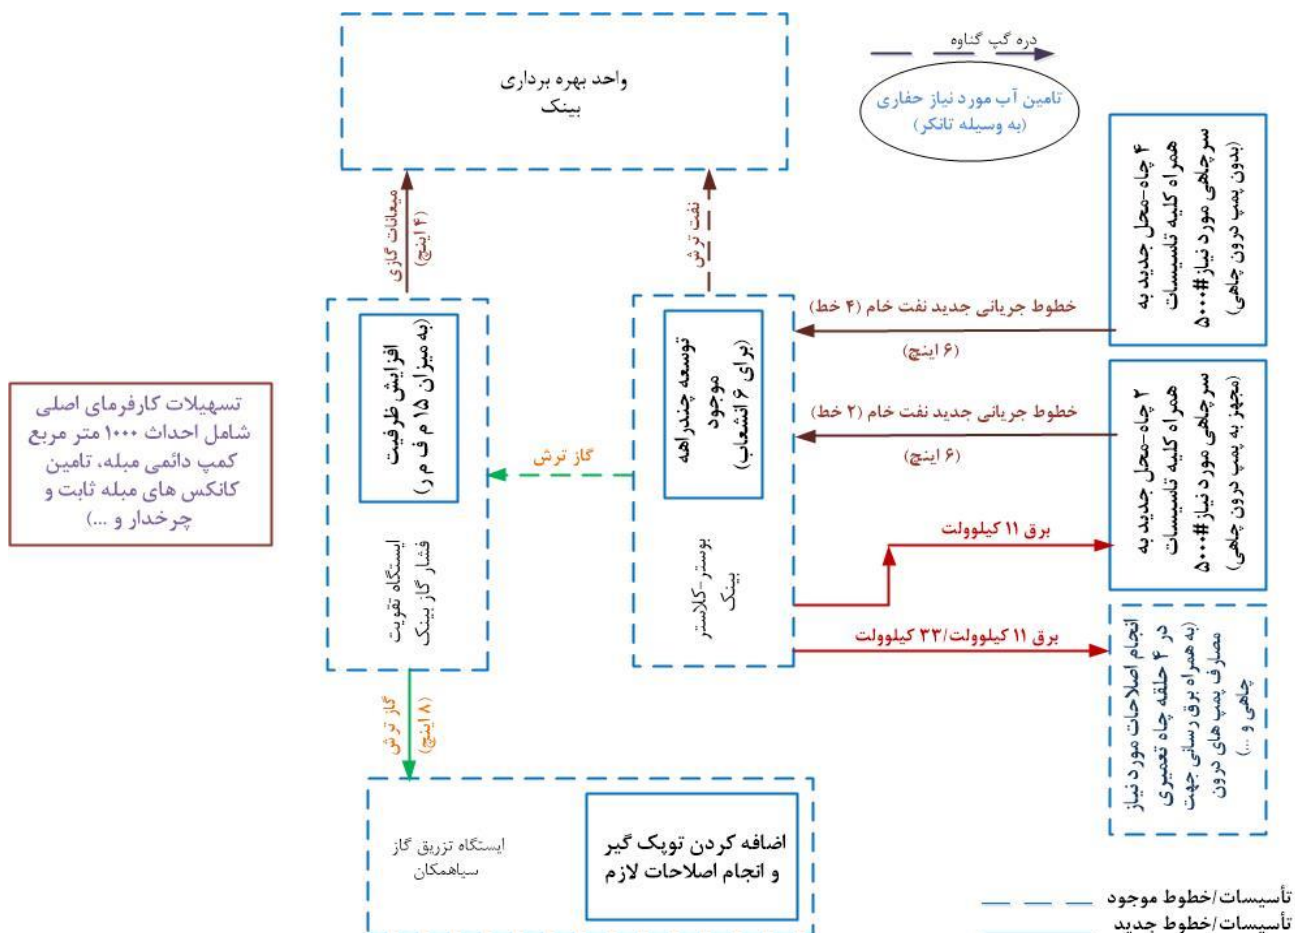

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16							شماره صفحه: ۷ از ۴۳
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0016	G00

S/L	Well Name/Location	Reservoir
1	W 008 N	Asmari
2	W 018 S	Asmari
3	W 046 S	Bangestan
4	W028	Bangestan
5	W 035	Bangestan
6	W 007 S	Bangestan
7	Well 14	Bangestan
8	Well 12	Bangestan
9	Well 15	Bangestan
10	Well 05	Bangestan

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16							شماره صفحه : ۹ از ۴۳	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0016	G00	

۴ گزارش فعالیت های انجام شده

۴-۱ مدیریت پروژه /عمومی

- شرکت در جلسات هفتگی بررسی پیشرفت پروژه
- پیگیری اخذ اشتراک تلفن ثابت و سرویس اینترنت دائمی برای کارگاه
- کنترل و نظارت مستمر بر حسن انجام ضبط و ربط محیط کار General Housekeeping طبق برنامه
- ارائه خدمات رفاهی به کارفرمای محترم بر اساس قرارداد

۴-۲ بخش مهندسی (E)

۴-۲-۱ مهندسی سطح الارض /ابنیه تحت الارض پروژه

- ارسال مدارک مهندسی مطابق برنامه زمانبندی پروژه
- بررسی و اصلاح مدارک براساس نظرات کارفرما
- ارسال مدارک P&ID مربوط به لوکیشن های سرچاهی مطابق نظرات کارفرما
- نقشه های معماری ساختمان سویچ گیر چاهها مطابق نظرات کارفرما
- ارسال گزارش لایحه تاخیرات با توجه به توافقات انجام شده
- ارسال نسخه نهایی دیتاشیت مخزن آب آشامیدنی و مخزن سوخت
- ارسال نسخه نهایی دیتاشیت های مربوط به پمپ ها در بسته GCS
- ارسال برخی دیتاشیت های بخش مکانیک بسته GCS مطابق نظرات کارفرما
- ارسال مدارک MR مربوط به LV Switchgear & MCC چاههای برقی
- ارسال MR مربوط به Pressure Vessels مطابق نظرات کارفرما
- ارسال MTO مربوط به OHL چاههای برقی مطابق برنامه زمانبندی
- ارسال SLD مربوط به LV Switchgear/MCC بسته منیفولد
- ارسال مدرک General Civil Layout لوکیشن ۳۵ مطابق نظرات کارفرما
- ارسال مدرک Rough Grading مربوط به بسته GCS مطابق نظرات کارفرما
- ارسال مدرک PMR مربوط به On/Off Valve مطابق نظرات کارفرما
- ارسال مدرک Civil and Structural drawings لوکیشن ۰۴۸
- ارسال نسخه نهایی مدرک Rough Grading مربوط به کمپ
- ارسال نسخه نهایی مدرک PFD بسته فلولاین
- ارسال TBE فلنج لوکیشن های ۰۱۸ , ۰۲۸ براساس پیشنهاد سازندگان
- ارسال مدرک Piping Plan بسته منیفولد براساس برنامه زمانبندی

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16							شماره صفحه : ۱۰ از ۴۳
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0016	G00

- ارسال مدرک PFD بسته منیفولد مطابق نظرات کارفرما
- ارسال PMR مربوط به ESD System مطابق نظرات کارفرما
- ارسال TBE Control Valve
- ارسال TBE Gasket
- ارسال TBE Flange
- ارسال TBE ON/Off Valve
- ارسال TBE Manual Valve
- ارسال TBE Sampling Connection

۴-۲-۲ مهندسی تحت الارض پروژه

- (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)

۴-۳-۴ فعالیتهای مرتبط با کالای (P)

۴-۳-۱ کالای سطح الارض/ابنیه تحت الارض پروژه

- معرفی سازنده Gas Compressor
- پیگیری دریافت مدارک فنی سازندگان On/Off Valve
- نهایی سازی TBE Control Valve
- پیگیری پاسخ کارفرما بر روی مدرک TBE Air Gas Cooler
- ارسال استعلام برای سازندگان اتصالات سرچاهی
- دریافت پیشنهادات فنی سازندگان گسکت سرچاهی
- دریافت پیشنهادات فنی سازندگان فلنج سرچاهی
- ارسال استعلام برای سازندگان شیرآلات سرچاهی
- برگزاری جلسه فنی پکیج نم زدا
- معرفی سازنده Pipe Line
- عقد قرارداد Gas Dehydration Package
- دریافت پیشنهاد مالی سازندگان مخازن تحت فشار
- دریافت پیشنهاد مالی سازندگان کولر هوایی

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16							شماره صفحه : ۱۱ از ۴۳	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0016	G00	

- برگزاری جلسه در خصوص TBE Control Valve
- دریافت پیشنهاد فنی سازندگان PG و TG
- برگزاری جلسه در خصوص TBE Control Valve

۴-۳-۲ کالای تحت الارض پروژه

- (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)

۴-۴ فعالیتهای اجرایی (C)

- اجرای عملیات بلوک چینی دیوار کانال ماد پیت چاه شماره ۲۸
- اجرای عملیات آرماتوربندی شناژ اطراف پد اصلی چاه شماره ۲۸
- اجرای عملیات نصب استراکچر سوله انبار تجهیز کارگاه
- اجرای عملیات قالب بندی پد اصلی چاه شماره ۲۸
- اجرای عملیات بتن ریزی دیوار کورال پیت چاه شماره ۲۸
- اجرای عملیات نصب تیرچه های ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز
- اجرای عملیات آرماتور بندی پد هلی کوپتر چاه ۲۸
- اجرای عملیات بتن ریزی پد هلی کوپتر چاه شماره ۲۸
- اجرای عملیات بتن ریزی مگر کانال آبهای سطحی چاه شماره ۲۸
- اجرای عملیات بتن ریزی و شیب بندی کف دیچ های پد اصلی چاه ۲۸
- اجرای عملیات آرماتور بندی و قالب بندی Oil Trap چاه ۲۸
- اجرای دیوار چینی و پلاستر دیوار اطراف پد گازوئیل چاه ۲۸
- اجرای دیوار چینی و پلاستر دیوار کانال ماد پیت چاه ۲۸
- اجرای عملیات بتن ریزی سقف ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز
- اجرای عملیات سنگ چینی زیر مگر فونداسیون ساختمان رستوران
- اجرای عملیات آرماتور بندی دیوار Oil Trap چاه ۲۸
- اجرای عملیات مخلوط ریزی اطراف پد اصلی چاه ۲۸ و جاده
- اجرای گروت ریزی زیر ستونهای سوله انبار

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک	 شرکت توسعه و تولید نفت ایران  HIRGAN ENERGY 																								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">MONTHLY PROGRESS REPORT # 16</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>G00</td><td>0016</td><td>RT</td><td>GE</td><td>000</td><td>HD</td><td>GNRAL</td><td>BK</td></tr></table>	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	G00	0016	RT	GE	000	HD	GNRAL	BK	شماره صفحه: ۱۲ از ۴۳
MONTHLY PROGRESS REPORT # 16																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
G00	0016	RT	GE	000	HD	GNRAL	BK																			

- خرید یک دستگاه کانکس نگهداری جهت مناطق نفت خیز جنوب
- ساخت پارکینگ جهت خودرو های مناطق نفت خیز جنوب
- آرماتور بندی و قالب بندی کف کانال Mud Pit به سمت Waste Pit چاه ۲۸
- عملیات مخلوط ریزی جاده چاه ۲۸
- اجرای عملیات بتن ریزی Oil Trap چاه ۲۸
- اجرای عملیات مخلوط ریزی، تسطیح و کمپکت اطراف پد اصلی چاه ۲۸ و جاده چاه ۲۸
- اجرای عملیات قالب بندی دیوار OBM چاه ۲۸
- عملیات تخریب و جمع آوری فنس و دیواره زیرین کلاستر
- دیوار چینی Warehouse تجهیز کارگاه
- ادامه جوشکاری و نصب تیر های Warehouse تجهیز کارگاه
- بتن ریزی فونداسیون ساختمان اداری و رستوران پترو ایران
- عملیات دیوار چینی دیوارهای داخلی ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز
- اجرای عملیات گراول ریزی محوطه لوکیشن چاه ۲۸
- اجرای عملیات مخلوط ریزی، تسطیح و کمپکت اطراف پد اصلی چاه ۲۸ و جاده چاه ۲۸
- عملیات دیوار چینی دیوارهای داخلی ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز
- اجرای عملیات گراول ریزی محوطه لوکیشن چاه ۲۸
- اجرای عملیات مخلوط ریزی، تسطیح و کمپکت اطراف پد اصلی چاه ۲۸ و جاده چاه ۲۸
- اجرای عملیات بتن ریزی دیوار OBM چاه ۲۸
- عملیات تخریب و جمع آوری فنس و دیواره زیرین کلاستر
- دیوار چینی Warehouse تجهیز کارگاه
- عملیات دیوار چینی دیوارهای داخلی ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز
- اجرای عملیات پلاستر دیوار سوله انبار تجهیز کارگاه
- اجرای عملیات دکاپاژ ، خاکبرداری و کمپکت بستر جاده چاه ۱۴
- اجرای عملیات نصب استراکچر ساختمان رستوران تجهیز کارگاه
- اجرای عملیات نصب استراکچر ساختمان اداری پترو ایران تجهیز کارگاه

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پارس  HIRGAN ENERGY 
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16							شماره صفحه : ۱۳ از ۴۳
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0016	G00

۵ جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی / سطح الارض)

BINAK OILFIELD DEVELOPMENT SURFACE WORK-PACKAGES BASED ON PACKAGES					
Code	Description	W.F. (Total)	Last Progress%	This Period	Up to now Progress%
	Total Project	100.000%	6.20%	1.10%	7.30%
1	GENERAL	5.32%	49.70%	6.64%	56.34%
1-1	General	5.32%	49.70%	6.64%	56.34%
2	SUB-Surface DEVELOPMENT	18.18%	7.91%	0.28%	8.19%
2-1	Engineering	0.36%	38.45%	1.54%	40.00%
2-2	Procurement	11.14%	1.08%	0.00%	1.08%
2-3	Construction	6.68%	17.65%	0.67%	18.32%
3	SURFACE DEVELOPMENT	76.49%	2.77%	0.90%	3.67%
3-1	Engineering	2.37%	37.92%	1.08%	39.00%
3-2	Procurement	59.19%	2.06%	1.13%	3.19%
3-3	Construction	13.92%	0.00%	0.00%	0.00%
3-4	Commissioning, Startup & Handover	1.01%	0.00%	0.00%	0.00%

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16							شماره صفحه : ۱۴ از ۴۳
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0016	G00

۶ بخش کنترل پروژه


جدول میزان پیشرفت کل پروژه (عمومی / سطح الارض)

Description	W.F. (Disc)	W.F. (Total)	Roll-Up	Last Progress%	This Period	Up to now Progress%
Total Project	100.000%	100.000%	100.00%	6.20%	1.10%	7.30%
GENERAL	1.136%	1.136%	1.136%	49.698%	6.640%	56.34%
Project Management	23.600%	0.268%	0.268%	52.122%	3.083%	55.21%
Project Insurance	13.470%	0.153%	0.153%	90.555%	0.000%	90.56%
Service to Company	35.400%	0.402%	0.402%	42.503%	11.050%	53.55%
Training Courses	7.310%	0.083%	0.083%	0.000%	0.000%	0.00%
GC Mobilization & Demobilization	20.220%	0.230%	0.230%	59.220%	0.000%	59.22%
SUB-Surface DEVELOPMENT	52.342%	52.342%	52.338%	7.911%	0.277%	8.19%
Package 01-New Well # W018S	5.210%	2.727%	2.723%	30.798%	0.009%	30.807%
Package 02-New Well # W028 (Bangestan)	7.125%	3.729%	3.729%	31.766%	1.213%	32.979%
Package 03-New Well # W046S (Bangestan)	33.462%	17.515%	17.515%	8.242%	0.010%	8.25%
Package 04-New Well # W035 (Bangestan)	8.669%	4.538%	4.538%	9.550%	0.010%	9.56%
Package 05-New Well # W008N	2.760%	1.445%	1.445%	3.359%	0.012%	3.37%
Package 06-New Well # W007S/Manifold Extension (Bangestan)	12.934%	6.770%	6.770%	1.425%	0.078%	1.50%
Package 07-Workover # 14	7.666%	4.013%	4.012%	1.059%	2.154%	3.21%
Package 08-Workover # 12	6.237%	3.265%	3.264%	1.286%	0.049%	1.33%
Package 09-Workover # 15	9.335%	4.886%	4.886%	0.935%	0.032%	0.97%
Package 10-Workover # 05	6.602%	3.456%	3.456%	1.303%	0.053%	1.36%
SURFACE DEVELOPMENT	46.522%	46.522%	46.522%	2.768%	0.905%	3.67%
Package 11- EPC Pipeline 8" & 4"	15.529%	7.224%	7.224%	2.718%	0.006%	2.72%
Package 12- EPC # Compressor Station	84.471%	39.298%	39.298%	2.781%	1.130%	3.91%

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16							شماره صفحه : ۱۵ از ۴۳
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0016	G00

ضرایب وزنی فعالیت ها (W-F) (عمومی / سطح الارض) :


Cde	Description	W.F.(Discp.)	WF.(Total)
		100.00%	100.000%
1	GENERAL	5.32%	5.32%
1-1	Project Management	100.00%	5.32%
2	SUB-Surface DEVELOPMENT	18.18%	18.18%
2-1	Engineering	1.99%	0.36%
2-2	Procurement	61.26%	11.14%
2-3	Construction	36.75%	6.68%
3	SURFACE DEVELOPMENT	76.49%	76.49%
3-1	Engineering	3.09%	2.37%
3-2	Procurement	77.39%	59.19%
3-3	Construction	18.20%	13.92%
3-4	Commissioning, Startup & Handover	1.3%	1.01%

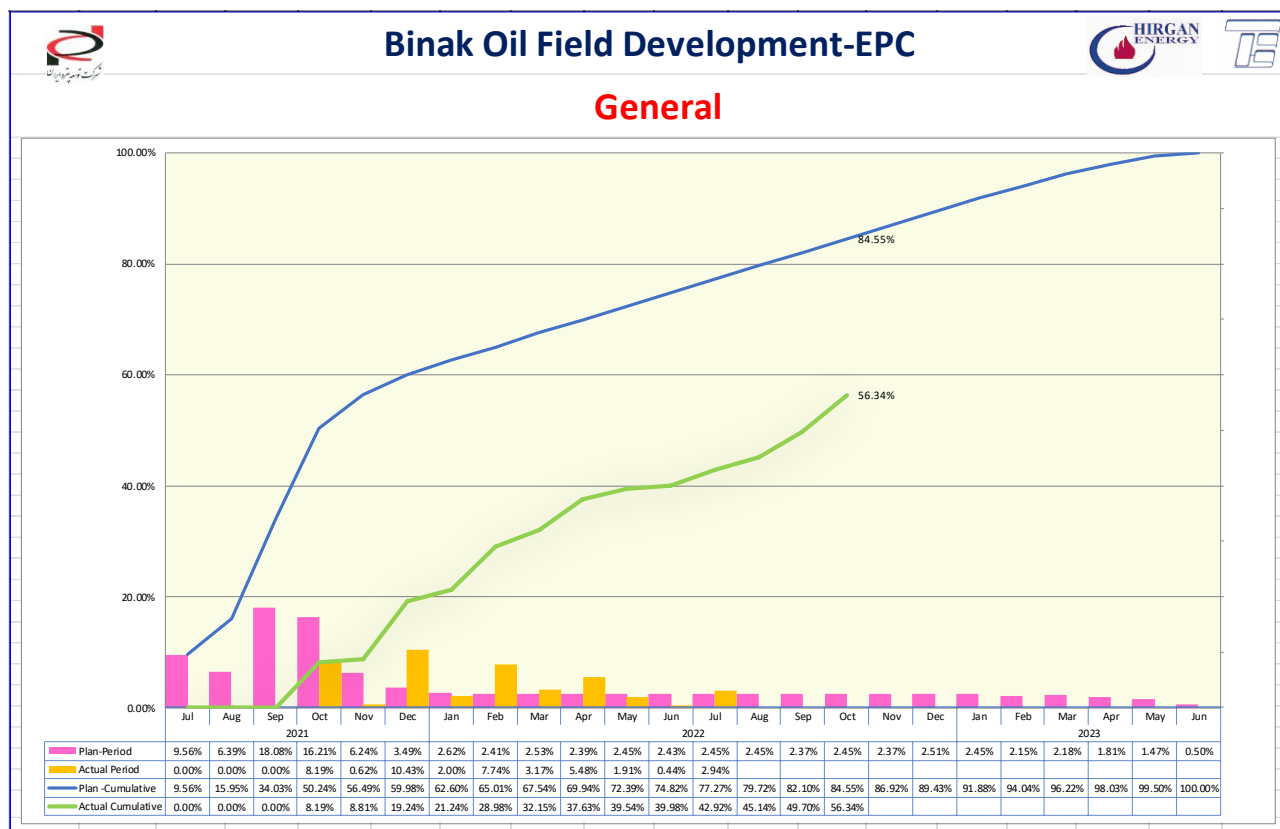



 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16							شماره صفحه : ۱۸ از ۴۳	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0016	G00	


نمودار پیشرفت بخش سطح الارض

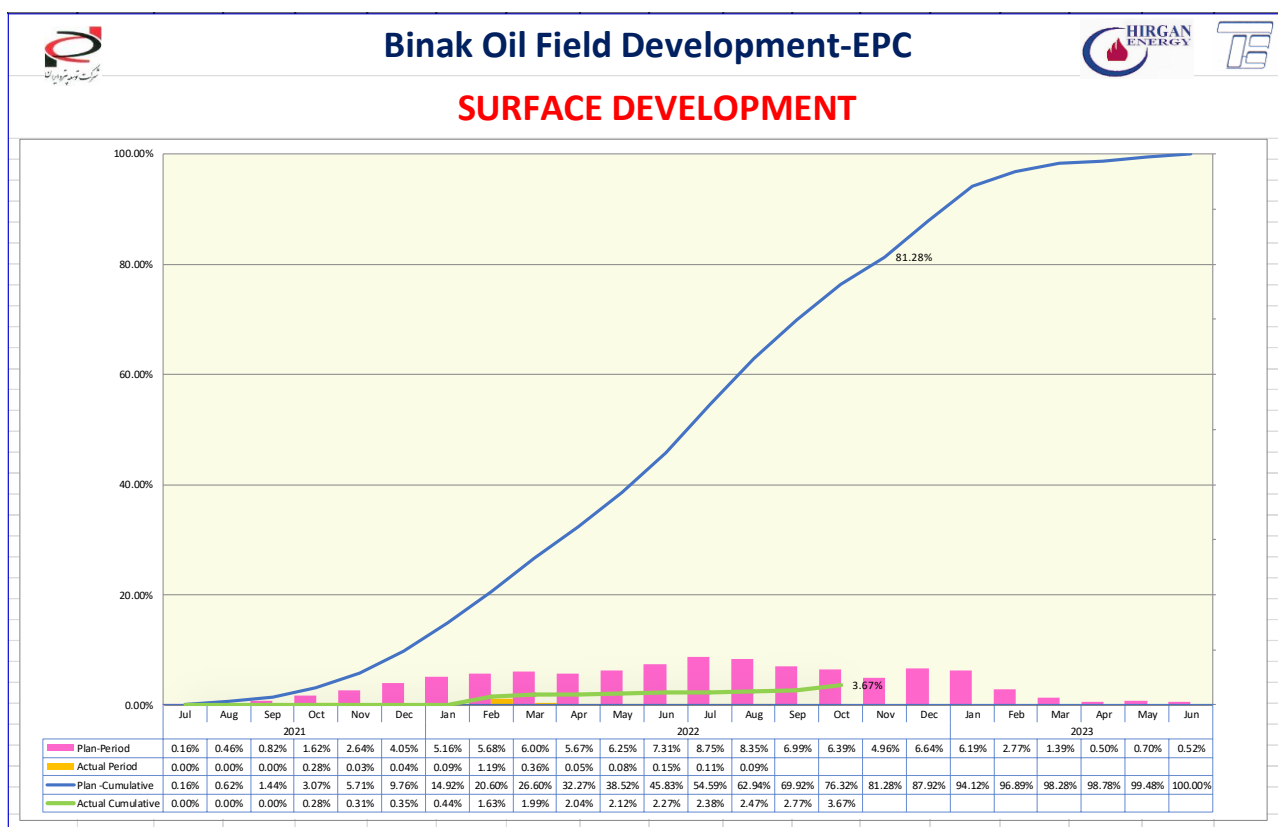

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16							شماره صفحه : ۱۹ از ۴۳	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0016	G00	

جدول و نمودار پیشرفت EPC :

	W.F.	Progress%
Total Project	100%	7.3%
Engineering	2.73%	39.13%
Procurement	70.33%	2.85%
Construction	20.60%	5.94%
Commissioning, Startup & Handover	1.01%	0.0%
Project Management	5.32%	56.34%

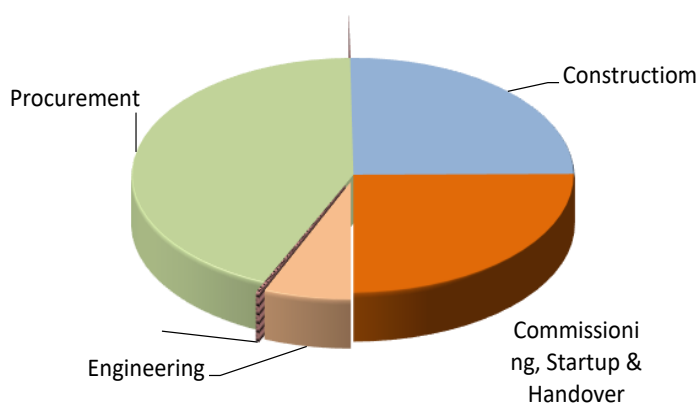

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16								شماره صفحه : ۲۰ از ۴۳
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0016	G00	

۷ وضعیت مدارک مهندسی

گزارش آخرین وضعیت مدارک مهندسی																				
		PM	PR	ME	HV	PI	PL	IN	SA	EL	TE	CV	AR	ST	GE	GT	QC	TP	SU	CO
کل مدارک	Proj. Management	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Common	-	11	11	8	28	32	24	17	75	8	28	11	26	39	1	44	0	0	0
	WELLHEAD FACILITIES	0	43	8	60	225	42	126	64	206	0	79	30	126	40	10	0	0	12	10
	PIPELINE	0	19	4	0	22	22	57	5	24	0	3	0	2	7	2	0	0	4	1
	GCS	0	90	72	18	60	0	113	32	96	29	11	12	111	8	2	0	0	1	1
Total Doc		30	163	95	86	335	96	320	118	401	37	121	53	265	95	15	44	0	17	12
تعداد کل مدارک ارسال شده	IFI	4	0	19	1	52	17	78	20	52	5	12	0	2	30	4	0	0	1	0
	IFC	10	25	5	6	34	2	55	20	43	0	6	31	15	6	8	16	0	4	0
	IFA	6	111	27	9	15	10	55	15	61	8	25	3	3	3	0	3	0	4	0
	AFC/AFD	32	17	25	4	10	19	16	18	24	13	19	8	23	5	2	0	0	0	0
Total Isu		52	153	76	20	111	48	204	73	180	26	62	42	43	44	14	19	0	9	0


	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								 
شماره پیمان: ۰۵۳-۰۷۳-۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16								شماره صفحه : ۲۱ از ۴۳
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0016	G00	

۸ بخش مالی پروژه

آخرین وضعیت	تاریخ رسید وجه	پیشرفت مالی نسبت به وزن	پیشرفت مالی ۱۰۰٪	صورت وضعیت تایید شده	صورت وضعیت کل ادعا شده(یورو)	صورت وضعیت ارائه شده	پرداخت پیش پرداخت به پیمانکار - ریال	ضمانت نامه ارائه شده به کار فرما - ریال	مبلغ پیمان یورو	واحد	وزن	بخش اصلی / الحاقیه ۱	شرح فعالیت
پرداخت شده	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۰۰٪	۱۰۰٪		۷۱۸,۱۹۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۱۷۷,۹۸۸,۷۵۶,۶۱۷	۱۷۷,۹۸۸,۷۵۶,۶۱۷	۳۵,۹۰۹,۸۸۰	-	-	اصلی	پیش پرداخت
پرداخت شده	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۰۰٪	۳۰۰٪		۱,۰۷۷,۲۹۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۲۸۰,۵۷۶,۴۶۰,۸۹۸		۳۵,۹۰۹,۸۸۰			اصلی	قسط دوم پیش پرداخت (۳٪ مبلغ پیمان)
عدم تایید			۱۲.۸۸٪		۱۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	-	-	۹۸۰,۰۰۰	-	-	اصلی	برآورد کارکرد (WPA) بخش مهندسی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ الی ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ -G۰۰-
عدم تایید			۱۳.۶۷٪		۱۳۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۳			۹۸۰,۰۰۰			اصلی	برآورد کارکرد (WPA) بخش مهندسی- شماره ۱ (به روز شده)(BK-HD-WPA-E-۰۰۰۱_G۰۱)
تایید			۴.۶۲٪		۴۳۰,۰۴۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۹			۹,۳۱۱,۹۶۰			اصلی	برآورد کارکرد (WPA) بخش های عمومی و اجرا - شماره ۱ منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ -G۰۰
تایید			۶.۹۲٪		۶۴۴,۳۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۹			۹,۳۱۱,۹۶۰			اصلی	برآورد کارکرد (WPA) بخش های عمومی و اجرا- شماره ۱ (به روز شده) از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ الی ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ -G۰۱
بصورت الحساب و در چند قسط پرداخت شده			۱۷.۰۸٪		۱۶۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۹			۹۸۰,۰۰۰			اصلی	صورت وضعیت شماره ۱ مهندسی (منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶)
بصورت الحساب و در چند قسط پرداخت شده			۴.۵۴٪		۴۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۹			۹,۶۷۳,۶۱۳			اصلی	صورت وضعیت شماره ۱ عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸)
پرداختی						۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					اصلی	دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت ۱ مهندسی و ۱ اجرا
تایید			۱۹.۱۵٪		۱۸۷,۶۷۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۶			۹۸۰,۰۰۰			اصلی	برآورد کارکرد (WPA) شماره ۲ مهندسی (منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹)
تایید			۹.۱۸٪		۸۸۷,۸۹۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۶			۹,۶۷۳,۶۱۳			اصلی	برآورد کارکرد (WPA) شماره ۲ عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹)
پرداختی						۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					اصلی	دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت ۱ مهندسی و ۱ اجرا
پرداختی						۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۶۰,۵۸۹,۳۴۰,۶۴۷					اصلی	دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت ۱ مهندسی و ۱ اجرا
پرداخت نشده			۱۹.۱۵٪		۱۸۷,۶۷۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۴			۹۸۰,۰۰۰			اصلی	صورت وضعیت شماره ۲ مهندسی (منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۰)
پرداخت نشده			۶.۹۵٪		۶۷۲,۱۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۷			۹,۶۷۳,۶۱۳			اصلی	صورت وضعیت شماره ۲ عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۰)
			۲۵.۷۶٪		۲۵۲,۴۵۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۸			۹۸۰,۰۰۰			اصلی	برآورد کارکرد بخش مهندسی- شماره ۳-BK-HD-WPA-E-G۰۰-۰۰۰۳
			۹.۴۰٪		۹۰۹,۴۷۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۹			۹,۶۷۳,۶۱۳			اصلی	برآورد کارکرد بخش های عمومی و اجرا- شماره ۳-BK-HD-WPA-E-G۰۰-۰۰۰۳
پرداخت نشده			۲۵.۷۶٪		۲۵۲,۴۵۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۵			۹۸۰,۰۰۰				صورت وضعیت شماره ۳ مهندسی (از ۰۱/۰۱/۱۴۰۱ تا ۳۱/۰۲/۱۴۰۱)
پرداخت نشده			۸.۹۳٪		۸۶۳,۸۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۵			۹,۶۷۳,۶۱۳				صورت وضعیت شماره ۳ عمومی و اجرا (از ۰۱/۰۱/۱۴۰۱ تا ۳۱/۰۲/۱۴۰۱)
تایید جهت تهیه صورت وضعیت			۳۲.۴۰٪		۳۱۷,۵۷۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۴			۹۸۰,۰۰۰				برآورد کارکرد بخش مهندسی- شماره ۴-BK-HD-WPA-E-G۰۰-۰۰۰۳
عدم تایید			۱۰.۶۲٪		۱,۰۲۷,۷۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۵			۹,۶۷۳,۶۱۳				برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی- شماره ۴-BK-HD-WPA-E-G۰۰-۰۰۰۴
تایید			۱۰.۶۲٪		۱,۰۲۷,۷۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۲			۹,۶۷۳,۶۱۳				برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی- شماره ۴-BK-HD-WPA-E-G۰۱-۰۰۰۴
پرداخت نشده			۳۲.۴۰٪		۳۱۷,۵۷۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۹			۹۸۰,۰۰۰				صورت وضعیت شماره ۴ مهندسی (از ۰۱/۰۳/۱۴۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱)
پرداخت نشده			۹.۹۲٪		۹۵۲,۶۸۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۹			۹,۶۷۳,۶۱۳				صورت وضعیت شماره ۴ ساختمان و نصب و عمومی (از ۰۱/۰۳/۱۴۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱)
در انتظار تایید			۳۹.۰۸٪			۱۴۰۱/۰۷/۰۹			۹۸۰,۰۰۰				برآورد کارکرد بخش مهندسی- شماره ۵-BK-HD-WPA-E-G۰۰-۰۰۰۵
در انتظار تایید			۱۰.۷۰٪			۱۴۰۱/۰۷/۰۹			۹,۶۷۳,۶۱۳				برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی- شماره ۵-BK-HD-WPA-E-G۰۰-۰۰۰۵

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16							شماره صفحه : ۲۲ از ۴۳	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0016	G00	

۹ بخش تدارکات کالا

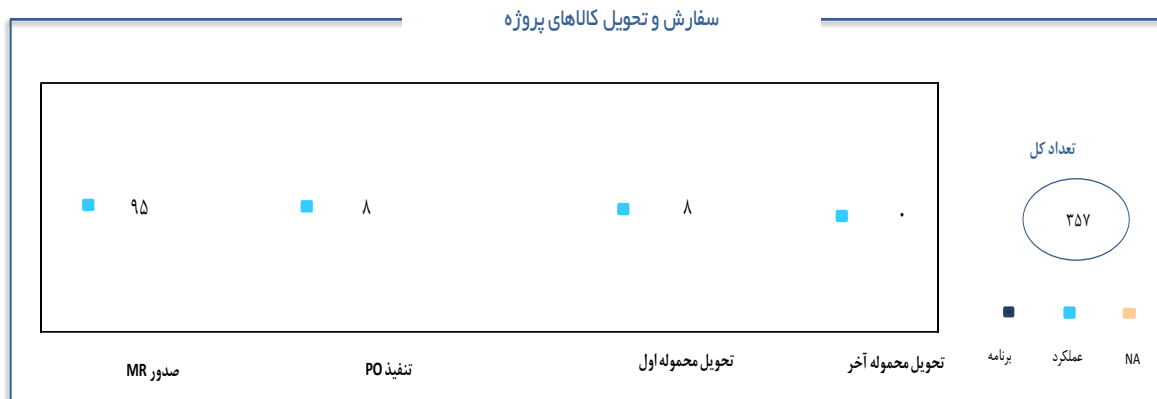

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان:	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16							شماره صفحه : ۲۳ از ۴۳	
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0016		G00

۱۰جدول سازمانی پیمانکار(نیروی انسانی و ماشین آلات)

آمار خودرو و ماشین آلات طی ماه گذشته																																		
ردیف	نوع	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	مجموع ماهیانه		
۱	بلدوزر D1۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲	گریدر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱۵
۳	لودر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱۸
۴	بیل مکانیکی pc1۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸
۵	تریلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶	تانکر آب پاش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵
۷	جرثقیل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸	تراکتور بیل دار	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۳۰
۹	کامیون	۰	۰	۱	۴	۴	۴	۵	۵	۴	۶	۱	۴	۴	۴	۵	۵	۶	۱	۴	۴	۶	۵	۵	۴	۴	۴	۴	۴	۱	۰	۰	۰	۱۳۶
۱۰	غلطک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱۵
۱۱	کارواش	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۳۰
۱۲	خودروی سواری	۲	۰	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۶۰
۱۳	خودرو وانت	۶	۰	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۱۸۰
۱۴	مخزن سوخت	۵	۰	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۱۵۰
۱۵	مخزن آب	۴	۰	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۱۲۰
۱۶	کانکس سرویس بهداشتی	۳	۰	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۹۰
۱۷	پمپ آب	۲	۰	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۶۰
۱۸	دوربین نقشه برداری	۲	۰	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۶۰
۱۹	ژنراتور	۳	۰	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۹۰
۲۰	کانکس ۱۲ متری	۴	۰	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۱۲۰
۲۱	کانکس ۶ متری	۷	۰	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۲۱۰
۲۲	کانتینر	۵	۰	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۱۵۰
۲۳	پمپ گازوئیل	۲	۰	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۶۰
۲۴	کمپرسور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵	کانکس نگهبانی	۲	۰	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۸۷
۲۶	رکتیفایر	۲	۰	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۶۰
۲۷	ویبراتور	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۸
۲۸	مولتور برق	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۳۰
۲۹	دستگاه پرش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰	کمپکتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱	تراکتور	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۳
۳۲	پمپ بتن	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴
۳۳	تراک میکسر	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۵	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۱	۱	۱	۱	۲۶
۳۴	دستگاه گمانه زنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۵	پیکور دستی	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16							شماره صفحه : ۲۵ از ۴۳	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0016		G00

۱۱ مکاتبات با کارفرما

۱۱-۱ مکاتبات وارده از کارفرما :

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
۱	اصلاح TBE ادوات ابزار دقیق سر چاهی	1401/06/20	12655
۲	ارائه مدرک C&A POWER CONSUMPTION	1401/06/20	12670
۳	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسسمیتال ها	1401/06/20	12673
۴	سیستم مدیریت ریسک در حمل و نقل	1401/06/20	12748
۵	پاسخ به پیمانکار در خصوص تغییرات مشخصات فنی کمپرسور های گاز ی طرح	1401/06/21	12700
۶	پاسخ به توضیحات تکمیلی در خصوص سازنده منتخب توپک ران و توپک گیر	1401/06/21	12701
۷	درخواست مجوز انتشار نسخ کاغذی مدارک با وضعیت AFC	1401/06/21	12765
۸	ارسال طرح جدید مدیریت پسماند بسته موقعیت چاه W00N	1401/06/21	12780
۹	ارسال صورتجلسات مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ نهایی سازی Tie-in ها، محل دیزل ژنراتور GCS و محل توپک گیر سیاهمکان	1401/06/23	12893
۱۰	پاسخ به معرفی سازنده منتخب پکیج های کمپرسور گاز ی پروژه	1401/06/23	12896
۱۱	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسسمیتال ها	1401/06/23	12929
۱۲	پاسخ به نامه با موضوع درخواست تجدید نظر در نرخ پیمان	1401/06/23	12967
۱۳	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسسمیتال ها	1401/06/28	13048
۱۴	صورتحجلسه بررسی پیشرفت طرح مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰	1401/06/28	13135
۱۵	تامین و آبرسانی به چاه های طرح بینک	1401/06/30	13305
۱۶	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسسمیتال ها	1401/07/02	13396
۱۷	پاسخ به مدارک ID_01&P و FAT Procedure_01 سازنده WHCP	1401/07/04	13469
۱۸	رئیس بازرسی فنی و کنترل / تضمین کیفیت	1401/07/06	13555
۱۹	پاسخ به نامه پیمانکار در خصوص معرفی سازنده منتخب پکیج نمزدایی GCS	1401/07/11	13915
۲۰	جانمایی پیشنهادی برای دیزل ژنراتور ایستگاه تقویت فشار گاز	1401/07/11	13920
۲۱	سیستم حفاظت الکترونیک TBE FOR CCTV	1401/07/11	13921
۲۲	دلایل عودت برخی مدارک ابزار دقیق	1401/07/11	13919

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پارس  HIRGAN ENERGY 	
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16							شماره صفحه : ۲۶ از ۴۳	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0016		G00

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
۲۳	Plan Action چاه تعمیراتی ۱۴ بینک	1401/07/16	14090
۲۴	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بیه ترانسسمیتال ها	1401/07/16	14118
۲۵	مدارک بدون پاسخ از سوی کارفرمای محترم تا سر رسید ۰۹/۰۷/۱۴۰۱	1401/07/16	14059
۲۶	نتیجه بررسی گزارش هفتگی شماره ۶۶	1401/07/16	14116
۲۷	پاسخ به نامه اقدامات اولیه مورد نیاز در طرح توسعه چند راهه کلاستر بینک	1401/07/16	14144
۲۸	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بیه ترانسسمیتال ها	1401/07/17	14176
۲۹	نهایی سازی وضعیت شارژ و UPS های ایستگاه تقویت فشار گاز و کلاستر بینک	1401/07/17	14216
۳۰	پاسخ به نامه مدارک ID&P و FAT Procedure سازنده WHCP	1401/07/17	14221
۳۱	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بیه ترانسسمیتال ها	1401/07/18	14284
۳۲	نتیجه بررسی نقشه پیشنهادی جانمایی دیزل ژنراتور جدید در واحد تراکم گاز	1401/07/19	14318
۳۳	رفع نواقص مدرک TBE For Instrument Bulk Items سرچاهی (ترانسسمیتال ۵۳۹)	1401/07/20	14389

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16							شماره صفحه : ۲۷ از ۴۳	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0016		G00

۱۱-۲ مکاتبات صادره به کارفرما:

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
۱	اقدامات اولیه مورد نیاز در طرح توسعه چندراهه کلاستر بینک	1401/06/20	0526
۲	ارسال برخی تجهیزات IT - ۷ دستگاه هارد اکسترنال (مربوط به تسهیلات مورد نیاز کارفرما)	1401/06/20	0527
۳	ارسال صورتجلسات مورخ ۰۸/۰۶/۱۴۰۱ نهایی سازی Tie-in ها، محل دیزل ژنراتور و محل توپک گیر سیاهمکان	1401/06/21	0528
۴	ارسال "طرح (اصلاح شده) جدید مدیریت پسماند بسته موقعیت چاه "W008N"	1401/06/21	0529
۵	ارسال گزارش هفتگی شماره ۶۵ (منتهی به تاریخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۱)	1401/06/22	0530
۶	معرفی سازنده منتخب لوله های (۶ اینچ) فلولاین و (۴ اینچ) خط آتش چاه ها	1401/06/23	0531
۷	معرفی سازنده منتخب پکیج نم زدای گاز GCS	1401/06/24	0532
۸	مدارک ID_01&P و FAT Procedure_01 سازنده WHCP	1401/06/27	0533
۹	ارسال نسخ کاغذی نقشه ها و فایل دیگر مدارک مهمور به مهر AFC	1401/06/28	0534
۱۰	فهرست (به روز شده) نفرات این پیمانکار جهت صدور مجوز تردد در محدوده پروژه - اصلاحیه	1401/06/28	0535
۱۱	ارسال گزارش هفتگی شماره ۶۶ (منتهی به تاریخ ۲۹/۰۶/۱۴۰۱)	1401/07/02	0536
۱۲	تامین آب مورد نیاز حفاری چاه ها	1401/07/04	0537
۱۳	پاسخ به جوابیه کارفرما درخصوص تغییرات مشخصات فنی پکیج های کمپرسور گاز GCS	1401/07/04	0538
۱۴	پیگیری تایید مدارک TBE For Instrument Bulk Items سرچاهی (ترانسمیتال ۵۳۹)	1401/07/04	0539
۱۵	فهرست به روز شده و اصلاحی نفرات این پیمانکار جهت صدور مجوز تردد در محدوده پروژه	1401/07/06	0540
۱۶	ارسال گزارش هفتگی شماره ۶۷ (منتهی به تاریخ ۰۵/۰۷/۱۴۰۱)	1401/07/09	0541
۱۷	پیگیری چهارم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره ۲ مهندسی (منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۰)	1401/07/09	0542
۱۸	پیگیری چهارم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره ۲ عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۰)	1401/07/09	0543
۱۹	پیگیری سوم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره ۳ مهندسی (از ۰۱/۰۱/۱۴۰۱ تا ۳۱/۰۲/۱۴۰۱)	1401/07/09	0544
۲۰	پیگیری سوم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره ۳ عمومی و اجرا (از ۰۱/۰۱/۱۴۰۱ تا ۳۱/۰۲/۱۴۰۱)	1401/07/09	0545

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16							شماره صفحه : ۲۸ از ۴۳	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0016		G00

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
۲۱	پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره ۴ مهندسی (از ۰۱/۰۳/۱۴۰۱ تا ۳۱/۰۴/۱۴۰۱)	1401/07/09	0546
۲۲	پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره ۴ ساختمان و نصب و عمومی (از ۰۱/۰۳/۱۴۰۱ تا ۳۱/۰۴/۱۴۰۱)	1401/07/09	0547
۲۳	برآورد کارکرد بخش مهندسی - شماره ۵ - (BK-HD-WPA-E-0005_G00)	1401/07/09	0548
۲۴	برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی - شماره ۵ - (BK-HD-WPA-C-0005_G00)	1401/07/09	0549
۲۵	مدارک بدون پاسخ از سوی کارفرمای محترم تا سررسید ۰۹/۰۷/۱۴۰۱	1401/07/10	0550
۲۶	ارسال گزارش هفتگی شماره ۶۸ (منتهی به تاریخ ۱۲/۰۷/۱۴۰۱)	1401/07/13	0551
۲۷	درخواست پرداخت مبلغ از حساب مشترک فیما بین (پیش پرداخت خرید تابلوی برق کمپ)	1401/07/16	0552
۲۸	درخواست پرداخت مبلغ از حساب مشترک فیما بین (مطالبات پیمانکاران دست دوم)	1401/07/19	0553
۲۹	قرارداد خرید پکیج های کمپرسور گاز GCS	1401/07/19	0554
۳۰	ارسال گزارش هفتگی شماره ۶۹ (منتهی به تاریخ ۲۰/۰۷/۱۴۰۱)	1401/07/20	0555
۳۱	WHCP مدرک SAT Procedure_00 سازنده	1401/07/20	0556
۳۲	درخواست قسط اول پیش پرداخت در بخش اول سفارش گذاری کالا (۴٪ مبلغ پیمان)	1401/07/20	0557
۳۳	پیگیری اخذ بازخورد بر روی مدرک "TBE For Gas Air Coolers_D00 GCS;"	1401/07/20	0558

۱۱-۳ لیست صورتجلسات پروژه

ردیف	عنوان صورت جلسه	تاریخ صورت جلسه	شماره صورت جلسه	ملاحظات
۱	صورتجلسه بررسی پیشرفت طرح مورخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۱	1401/06/20		
۲	جلسه هماهنگی کلیات توسعه کلاستر بینک	1401/06/30		
۳	تحويل کانکس نماز خانه (واحد کارخانه کلاستر بینک)	1401/07/03		
۴	بررسی شیرهای کنترلی متیفرلد بینک	1401/07/10		
۵	هماهنگی مهندسی در خصوص برق و ابزار دقیق	1401/07/19		

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16							شماره صفحه : ۲۹ از ۴۳	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0016		G00

۱۱-۴ لیست مکاتبات بدون پاسخ

ردیف	عنوان/خلاصه نامه	تاریخ نامه	شماره نامه	ملاحظات
۱	پیگیری چهارم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره ۲ مهندسی (منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۰)	1401/07/09	0542	
۲	پیگیری چهارم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره ۲ عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۰)	1401/07/09	0543	
۳	پیگیری سوم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره ۳ مهندسی (از ۰۱/۰۱/۱۴۰۱ تا ۳۱/۰۲/۱۴۰۱)	1401/07/09	0544	
۴	پیگیری سوم دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره ۳ عمومی و اجرا (از ۰۱/۰۱/۱۴۰۱ تا ۳۱/۰۲/۱۴۰۱)	1401/07/09	0545	
۵	پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره ۴ مهندسی (از ۰۱/۰۳/۱۴۰۱ تا ۳۱/۰۴/۱۴۰۱)	1401/07/09	0546	
۶	پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره ۴ ساختمان و نصب و عمومی (از ۰۱/۰۳/۱۴۰۱ تا ۳۱/۰۴/۱۴۰۱)	1401/07/09	0547	
۷	برآورد کارکرد بخش مهندسی - شماره ۵ - BK-HD-WPA-E- (0005_G00)	1401/07/09	0548	
۸	برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی - شماره ۵ - BK-HD- (WPA-C-0005_G00)	1401/07/09	0549	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16								شماره صفحه : ۳۰ از ۴۳
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0016	G00	

۱۲- مشکلات و موانع

- مشکلات مربوط به جذب نیرو و تکمیل چارت سازمانی پروژه و همچنین محدودیت حضور پرسنل پروژه در شرکت بدلیل بیماری کرونا و ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی و حضور حداقلی پرسنل در محل کار.
- عدم هماهنگی بین کامنتهای پترو ایران و کارفرمای اصلی.
- با توجه به عدم پرداخت مالی پروژه و معوق ماندن درخواستهای مالی اعلام شده (صورت وضعیت شماره ۲ مهندسی ، صورت وضعیت شماره ۲ بخش عمومی و اجرا ، و همچنین عدم پرداخت صورت وضعیت شماره ۳ و ۴ مهندسی ، صورت وضعیت شماره ۳ و ۴ بخش عمومی و اجرا) موجب شده است جریان نقدینگی پروژه به شدت منفی شود .

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پیمانکاری  HIRGAN ENERGY 	
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16							شماره صفحه : ۳۱ از ۴۳	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0016		G00

۱۳ موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت

- دریافت با تاخیر نظرات کارفرمای محترم بر روی مدارک ارسالی
- وجود برخی تناقضات در نظرات کارفرمایان (شرکت پتروایران و شرکت مناطق نفتخیز جنوب) درخصوص مدارک ارسالی
- تاخیر در نهایی سازی وضعیت طرح مدیریت پسماند چاه ها (توسط کارفرمای محترم) و بالتبع تاخیر در نهایی سازی نقشه ها و کندی پیشرفت کار اجرایی مربوطه
- تغییر برنامه استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و در نتیجه تغییر برنامه کلی پروژه
- نامشخص بودن تاریخ دقیق استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و در نتیجه متاثر شدن برنامه آماده سازی لوکیشن چاه ها و خرید اقلام مربوطه مورد نیاز
- عدم پرداخت صورت وضعیت شماره ۲ مهندسی توسط کارفرمای محترم
- عدم پرداخت صورت وضعیت شماره ۲ عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم
- عدم پرداخت صورت وضعیت شماره ۳ مهندسی توسط کارفرمای محترم
- عدم پرداخت صورت وضعیت شماره ۳ عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم
- عدم پرداخت صورت وضعیت شماره ۴ مهندسی توسط کارفرمای محترم
- عدم پرداخت صورت وضعیت شماره ۴ عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم
- محدودیت های ایجاد شده در تامین کالای ساخت داخل کشور و متعاقب آن سو استفاده برخی شرکت های لوله ساز داخلی و افزایش بی دلیل قیمت ها
- افزایش بی رویه کلیه قیمت های مهندسی، خرید و اجرا علیرغم عدم تغییر نرخ تسعیر ارز نیمایی

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16							شماره صفحه : ۳۲ از ۴۳	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0016		G00

۱۴ بخش کنترل پروژه

- ۱۴-۱ برنامه زمان بندی پروژه
- ۱۴-۲ لیست مدارک ارسال شده طی دوره
- ۱۴-۲ لیست مدارک دارای تاخیر در پاسخ از سوی کارفرما
- ۱۴-۳ جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16							شماره صفحه : ۳۳ از ۴۳
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0016	G00

۱۵ ضمايم

پیوست شماره یک: برنامه زمان بندی پروژه

پس از نهایی سازی زمانبندی ارسالی، ارائه خواهد شد

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16								شماره صفحه : ۳۴ از ۴۳
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0016	G00	

پیوست شماره دو : لیست مدارک ارسال شده طی دوره

POI	Document Title	Document Number	Transmittal Date	ROW
IFC	Set Point & Alarm List- Wellheads	BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-LI-0002	1401/06/21	1
IFA	Mechanical Design Criteria	BK-GNRAL-PEDCO-000-ME-DC-0001	1401/06/22	2
IFA	Mechanical Data Sheets For Flare K.O. Drum	BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0012	1401/06/22	3
IFA	Mechanical Data Sheets For Slug Catcher	BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0014	1401/06/22	4
AFC	I/O List For ESD Systems	BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0003	1401/06/22	5
IFC	Control Room Cable Route Layout - Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-IN-PY-0002	1401/06/22	6
IFA	Hazard Source List	BK-GCS-PEDCO-120-SA-LI-0001	1401/06/22	7
IFA	Utility Consumption List	BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0006	1401/06/22	8
AFC	I/O List For Control System	BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0002	1401/06/23	9
IFA	Data Sheets For Stone Trap	BK-SSGRL-PEDCO-110-PI-DT-0001	1401/06/23	10
IFI	MTO For Transmission Over Head Line - BK14	BK-BK14-PEDCO-110-EL-MT-0001	1401/06/23	11
IFC	F&G Detector List - Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-IN-LI-0008	1401/06/23	12
IFI	Monthly Progress Report	BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0015	1401/06/23	13
IFC	Architectural Drawing For Utility Shelter	BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0005	1401/06/23	14
IFC	Data Sheets For F&G Devices - Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0010	1401/06/27	15
IFC	Panels & Junction Box List - Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-IN-LI-0005	1401/06/27	16
IFI	PMR For Pressure Vessels	BK-GCS-PEDCO-120-ME-MR-0003	1401/06/27	17
IFC	Oil Contaminated Water System Layout	BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0003	1401/06/27	18
IFA	F&G Location Layout - Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-IN-PY-0005	1401/06/27	19
IFI	Cash Flow Plan	BK-GNRAL-HD-000-PM-CP-0001	1401/06/27	20
IFC	F&G Cause and Effect Diagram - Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-IN-DG-0010	1401/06/28	21

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16							شماره صفحه : ۳۵ از ۴۳	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0016		G00

POI	Document Title	Document Number	Transmittal Date	ROW
IFC	General Civil Layout - BK14	BK-BK14-PEDCO-110-CV-PY-0001	1401/06/28	22
IFI	PMR For Gas Dehydration Package	BK-GCS-PEDCO-120-ME-MR-0002	1401/06/28	23
IFA	Consumption List	BK-SSGRL-PEDCO-110-PR-LI-0001	1401/06/28	24
IFI	TBE/TBA For Control Valves - Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0005	1401/06/28	25
IFI	MTO For Transmission Over Head Line - W046S	BK-W046S-PEDCO-110-EL-MT-0001	1401/06/28	26
IFI	MTO For Transmission Over Head Line - W007S	BK-W007S-PEDCO-110-EL-MT-0006	1401/06/28	27
IFI	MTO For Transmission Over Head Line - BK12	BK-BK12-PEDCO-110-EL-MT-0001	1401/06/28	28
IFI	MTO For Transmission Over Head Line - BK15	BK-BK15-PEDCO-110-EL-MT-0001	1401/06/28	29
IFI	MTO For Transmission Over Head Line - BK05	BK-BK05-PEDCO-110-EL-MT-0001	1401/06/28	30
IFC	Architectural Drawing For Security Building of Well Pads - W046S	BK-W046S-PEDCO-110-AR-DW-0004	1401/06/28	31
IFA	Electrical Equipment Arrangement Layout In Building - Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-EL-PY-0003	1401/06/28	32
IFA	Pipeline Standard Drawing For Cover Slabs And Set-On-Weight	BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0013	1401/06/28	33
IFA	Architectural Drawing For Fire Shed	BK-SSGRL-PEDCO-110-AR-DW-0001	1401/06/28	34
IFA	Telecom Systems Legend and Symbols	BK-GNRAL-PEDCO-000-TE-DW-0001	1401/06/29	35
IFA	Telecomm Equipment Layout For Area	BK-GCS-PEDCO-120-TE-PY-0005	1401/06/29	36
IFA	PAGA Equipment Layout For Area	BK-GCS-PEDCO-120-TE-PY-0006	1401/06/29	37
IFI	MTO FOR TELECOM EQUIPMENT	BK-GCS-PEDCO-120-TE-MT-0003	1401/06/29	38
IFI	MTO For PAGA	BK-GCS-PEDCO-120-TE-MT-0004	1401/06/29	39
IFC	LV Switchgear/MCC Expansion SLD - Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-EL-SL-0001	1401/06/29	40
IFA	Instrument Location Layout Drawing - W028	BK-W028-PEDCO-110-IN-PY-0001	1401/06/29	41
IFA	Instrument Index	BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0001	1401/06/29	42
IFC	F&G System Loop Diagram - Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-IN-DG-0007	1401/06/29	43
IFA	Instrument Location Layout Drawing - W046S	BK-W046S-PEDCO-110-IN-PY-0001	1401/06/29	44

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16							شماره صفحه : ۳۶ از ۴۳	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0016		G00

POI	Document Title	Document Number	Transmittal Date	ROW
IFA	ESD Logic Diagram - Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-IN-LD-0002	1401/06/29	45
IFA	General Civil Layout -W035	BK-W035-PEDCO-110-CV-PY-0001	1401/06/29	46
IFA	Rough Grading Plan and Details	BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0007	1401/06/29	47
IFA	Electrical Load List - Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-EL-LI-0001	1401/06/29	48
IFA	Calculation Note For Earthing & Lightning System	BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0006	1401/06/29	49
IFI	Telecom Typical Installation Details & Notes	BK-GNRAL-PEDCO-000-TE-DW-0002	1401/06/29	50
IFC	Instrument/F&G Cable Trench/Route Layout Drawing - Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-IN-PY-0004	1401/06/29	51
IFC	Road, Paving And Plant Finish Grading Layout & Sections	BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0005	1401/06/29	52
IFC	Data Sheets For Expansion of LV Switchgear in Siahmakan Gas Injection	BK-PPL-PEDCO-320-EL-DT-0001	1401/06/29	53
IFA	Instrument Location Layout - Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-IN-PY-0003	1401/07/02	54
IFA	Data Sheets For Level Switch	BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0008	1401/07/02	55
IFA	Calculation Note For Flood Control	BK-SSGRL-PEDCO-110-CV-CN-0001	1401/07/02	56
IFA	Calculation Note For Inside Surface Water Drainage Channels	BK-GCS-PEDCO-120-CV-CN-0001	1401/07/02	57
IFA	Calculation Note for offsite flood control system	BK-GCS-PEDCO-120-CV-CN-0002	1401/07/02	58
IFA	Earthing & Lightning Layout For Camp Area	BK-GNRAL-PEDCO-220-EL-PY-0002	1401/07/02	59
AFC	Telecomm. Equipment Layout For Electrical Building	BK-GCS-PEDCO-120-TE-PY-0001	1401/07/02	60
IFA	Telecomm. Equipment Layout For Control Building	BK-GCS-PEDCO-120-TE-PY-0002	1401/07/02	61
IFI	PMR For ON/OFF & Shutdown Valves - Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0004	1401/07/02	62
IFA	I&C Power Consumption Summary - Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-IN-LI-0007	1401/07/04	63
IFA	Civil and Structural drawings -W046S	BK-W046S-PEDCO-110-CV-PY-0002	1401/07/04	64
IFA	HVAC Calculation Note For Switchgear Building - W046S	BK-W046S-PEDCO-110-HV-CN-0001	1401/07/04	65
IFA	HVAC System Layout For Switchgear Building - W046S	BK-W046S-PEDCO-110-HV-PY-0001	1401/07/04	66

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16							شماره صفحه: ۳۷ از ۴۳	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0016		G00

POI	Document Title	Document Number	Transmittal Date	ROW
IFA	HVAC Calculation Note For Switchgear Building - W007S	BK-W007S-PEDCO-110-HV-CN-0001	1401/07/04	67
IFA	HVAC System Layout For Switchgear Building - W007S	BK-W007S-PEDCO-110-HV-PY-0001	1401/07/04	68
IFA	HVAC Calculation Note For Extension of Existing Elect. Building	BK-GCS-PEDCO-120-HV-CN-0002	1401/07/04	69
IFA	HVAC I&C Diagram For Extension of Existing Elect. Building	BK-GCS-PEDCO-120-HV-DG-0004	1401/07/04	70
IFC	Field Joint Coating Procedure For Pipeline	BK-GNRAL-PEDCO-000-QC-PR-0035	1401/07/04	71
AFC	Rough Grading Plan For Camp Area	BK-GNRAL-PEDCO-220-CV-DW-0001	1401/07/09	72
IFA	Process Data Sheets For Gas Compressors Packages	BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0030	1401/07/09	73
IFC	Pipe Supports Foundation Drawing For Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-ST-DW-0001	1401/07/09	74
IFC	Pipe Supports Structure Drawing For Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-ST-DW-0002	1401/07/09	75
IFA	CABLE SCHEDULE FOR TELECOM EQUIPMENT	BK-GCS-PEDCO-120-TE-LI-0003	1401/07/09	76
IFA	CABLE SCHEDULE FOR PAGA	BK-GCS-PEDCO-120-TE-LI-0004	1401/07/09	77
AFD	Process Simulation Report	BK-GCS-PEDCO-120-PR-RT-0003	1401/07/09	78
AFC	Process Flow Diagram For pipelines	BK-PPL-PEDCO-320-PR-PF-0001	1401/07/11	79
IFA	Process Flow Diagram - Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-PR-PF-0001	1401/07/11	80
IFA	Pipelines Hydraulic Calculation Report	BK-PPL-PEDCO-320-PR-RT-0001	1401/07/11	81
IFA	Specification For Atmospheric Above Ground Welded Steel Tanks	BK-GNRAL-PEDCO-000-ME-SP-0002	1401/07/11	82
IFA	I/O List For F&G Systems	BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0004	1401/07/11	83
IFA	Data Sheets For Pressure & Diff. Pressure Gauge	BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0001	1401/07/11	84
IFC	Overall Earthing Layout	BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0001	1401/07/11	85
IFA	Architectural Detail Drawing For Control Building	BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0001	1401/07/11	86
IFI	PMR For ESD System	BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0002	1401/07/11	87
IFI	TBE For Flanges - W018S	BK-W018S-PEDCO-110-PI-TB-0003	1401/07/11	88
IFI	TBE For Flanges - W028	BK-W028-PEDCO-110-PI-TB-0003	1401/07/11	89

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16							شماره صفحه : ۳۸ از ۴۳
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0016	
							G00	

POI	Document Title	Document Number	Transmittal Date	ROW
AFC	F&G Detector List	BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0008	1401/07/12	90
IFA	Calculation Note For Lighting System of Well Pads Security Building	BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0003	1401/07/12	91
IFA	Calculation Note For Cable Sizing	BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0003	1401/07/12	92
IFC	Piping Plan Drawing - Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-PI-DW-0001	1401/07/12	93
IFA	Active Fire Protection and Safety Concept	BK-GCS-PEDCO-120-SA-DB-0001	1401/07/12	94
IFA	Data Sheets For Safety Sign	BK-GCS-PEDCO-120-SA-DT-0006	1401/07/12	95
IFA	F&G Location Layout For Buildings	BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0006	1401/07/12	96
AFC	Flow line Hydraulic Calculation Report	BK-W018S-PEDCO-110-PR-RT-0001	1401/07/16	97
AFC	Flow line Hydraulic Calculation Report	BK-W028-PEDCO-110-PR-RT-0001	1401/07/16	98
AFC	Flow line Hydraulic Calculation Report	BK-W046S-PEDCO-110-PR-RT-0001	1401/07/16	99
AFC	Flow line Hydraulic Calculation Report	BK-W035-PEDCO-110-PR-RT-0001	1401/07/16	100
AFC	Flow line Hydraulic Calculation Report	BK-W008N-PEDCO-110-PR-RT-0001	1401/07/16	101
AFC	Flow line Hydraulic Calculation Report	BK-W007S-PEDCO-110-PR-RT-0001	1401/07/16	102
IFA	Duty Specification for LP Flare Package (PK-2201)	BK-GCS-PEDCO-120-PR-SP-0003	1401/07/16	103
IFA	Calculation Note For PSV Sizing	BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0004	1401/07/16	104
IFA	Calculation Note For Depressurizing (Min. Design Temperature)	BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0007	1401/07/16	105
IFA	Relief Load Summery	BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0008	1401/07/16	106
IFA	Flare Network Study Report	BK-GCS-PEDCO-120-PR-RT-0001	1401/07/16	107
IFA	Flare Radiation & Dispersion Study Report	BK-GCS-PEDCO-120-PR-RT-0002	1401/07/16	108
IFA	Specification For Fire Water System	BK-GNRAL-PEDCO-000-SA-SP-0003	1401/07/16	109
IFI	TBE For Gaskets - W018S	BK-W018S-PEDCO-110-PI-TB-0005	1401/07/16	110
IFI	TBE For Gaskets - W028	BK-W028-PEDCO-110-PI-TB-0005	1401/07/16	111
IFA	Calculation Note For Earthing & Lightning System of Well Pads	BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0007	1401/07/16	112

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16								شماره صفحه : ۳۹ از ۴۳
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0016	G00	

POI	Document Title	Document Number	Transmittal Date	ROW
AFD	Pipeline Material Specification	BK-PPL-PEDCO-320-PL-SP-0001	1401/07/16	113
IFA	Process Data Sheets For Instrument Devices - W007S & Extension Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-PR-DT-0001	1401/07/17	114
IFA	Process Data Sheets For Lean Glycol Storage Tank	BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0016	1401/07/17	115
IFA	Process Flow Diagram (PFD)	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PF-0001	1401/07/17	116
IFA	Material Safety Data Sheets	BK-GNRAL-PEDCO-000-SA-DT-0001	1401/07/17	117
IFA	Fire Water Network Layout	BK-GCS-PEDCO-120-SA-PY-0001	1401/07/17	118
IFA	F&G Location Layout For Process Area	BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0005	1401/07/17	119
IFA	Data Sheets For Oil Sump Pump - Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-ME-DT-0001	1401/07/17	120
IFA	Mechanical Data Sheets For 2nd Stage Gas Air Coolers	BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0005	1401/07/17	121
IFA	Lighting & Small Power Layout For Security Building of Well Pads	BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY-0005	1401/07/17	122
AFC	Data Sheets For Stone Trap	BK-SSGRL-PEDCO-110-PI-DT-0001	1401/07/17	123
AFC	Site Visit Report (Civil Work) - BK14	BK-BK14-PEDCO-110-CV-RT-0001	1401/07/17	124
AFD	Process Basis Of Design	BK-GNRAL-PEDCO-000-PR-DB-0001	1401/07/17	125
IFA	Process Data Sheets For Instrument Devices - W018S	BK-W018S-PEDCO-110-PR-DT-0001	1401/07/18	126
IFA	Process Data Sheets For Instrument Devices - W028	BK-W028-PEDCO-110-PR-DT-0001	1401/07/18	127
IFA	Process Data Sheets For Instrument Devices - W046S	BK-W046S-PEDCO-110-PR-DT-0001	1401/07/18	128
IFA	Process Data Sheets For Instrument Devices - W035	BK-W035-PEDCO-110-PR-DT-0001	1401/07/18	129
IFA	Process Data Sheets For Instrument Devices - W008N	BK-W008N-PEDCO-110-PR-DT-0001	1401/07/18	130
IFA	Process Data Sheets For Instrument Devices	BK-PPL-PEDCO-320-PR-DT-0001	1401/07/18	131
IFA	Process Data Sheets For Glycol Sump Drum	BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0019	1401/07/18	132
IFA	Process Data Sheets For Instrument Devices	BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0032	1401/07/18	133
IFA	Data Sheets For Safety Equipment	BK-GCS-PEDCO-120-SA-DT-0002	1401/07/18	134
IFA	Data Sheets For Fire Fighting Equipment	BK-GCS-PEDCO-120-SA-DT-0003	1401/07/18	135

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16							شماره صفحه : ۴۰ از ۴۳	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0016		G00

POI	Document Title	Document Number	Transmittal Date	ROW
IFA	Data Sheets For Deluge valves	BK-GCS-PEDCO-120-SA-DT-0004	1401/07/18	136
IFA	Piping Material Specification	BK-GCS-PEDCO-120-PI-SP-0001	1401/07/18	137
IFA	Piping Corrosion Study & Material Selection Report	BK-GCS-PEDCO-120-PI-RT-0001	1401/07/18	138
IFA	Wall Thickness Calculation Report	BK-GCS-PEDCO-120-PI-RT-0006	1401/07/18	139
IFA	Mechanical Data Sheets For 1st Stage Gas Air Coolers	BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0003	1401/07/18	140
IFC	Access Platforms Structure Plan & Details For Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-ST-DW-0003	1401/07/18	141
IFC	Access Platforms Foundation Drawing For Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-ST-DW-0004	1401/07/18	142
IFA	General Civil Layout - BK14	BK-BK14-PEDCO-110-CV-PY-0001	1401/07/19	143
IFA	Plant Clean Water Drainage System Layout & Details	BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0004	1401/07/19	144
IFI	MTO For Earthing & Lightning Systems - W046S	BK-W046S-PEDCO-110-EL-MT-0002	1401/07/19	145
IFI	MTO For Earthing & Lightning Systems - Manifold & W007S	BK-W007S-PEDCO-110-EL-MT-0001	1401/07/19	146
IFI	MTO For Earthing & Lightning Systems - BK14	BK-BK14-PEDCO-110-EL-MT-0006	1401/07/19	147
IFI	MTO For Earthing & Lightning Systems - BK12	BK-BK12-PEDCO-110-EL-MT-0006	1401/07/19	148
IFI	MTO For Earthing & Lightning Systems - BK15	BK-BK15-PEDCO-110-EL-MT-0006	1401/07/19	149
IFI	MTO For Earthing & Lightning Systems - BK05	BK-BK05-PEDCO-110-EL-MT-0006	1401/07/19	150
AFD	Specification For Air Cooled Heat Exchangers	BK-GCS-PEDCO-120-ME-SP-0001	1401/07/19	151
AFD	Specification For Overhead Travelling Cranes	BK-GCS-PEDCO-120-ME-SP-0009	1401/07/19	152
AFD	Specification For Air Dryer Package	BK-GCS-PEDCO-120-ME-SP-0007	1401/07/19	153
IFC	Earthing & Lightning Layout for well pads	BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY-0010	1401/07/19	154
IFI	MTO For Fittings	BK-GCS-PEDCO-120-PI-MT-0002	1401/07/19	155
IFA	Electrical Equipment Arrangement Layout For Building	BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0008	1401/07/19	156
IFI	Typical Drawing For Electrical Cable Trench	BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0004	1401/07/19	157
IFI	MTO For Flanges	BK-GCS-PEDCO-120-PI-MT-0003	1401/07/19	158

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16							شماره صفحه : ۴۱ از ۴۳	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0016	G00	

POI	Document Title	Document Number	Transmittal Date	ROW
AFC	Data Sheets For Pig Traps	BK-PPL-PEDCO-320-ME-DT-0001	1401/07/20	159
IFA	Data Sheets For F&G Detectors & Equipment	BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0016	1401/07/20	160
IFA	Instrument Hook-up Diagram	BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0002	1401/07/20	161
AFC	Unit Plot Plan Drawing	BK-GCS-PEDCO-120-PI-PY-0001	1401/07/20	162
IFA	Calculation Note For Lighting System of Well Pads Switchgear Building	BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0002	1401/07/20	163
IFI	TBE/TBA For ON/OFF & Shutdown Valves - Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0004	1401/07/20	164
IFI	MTO For Manual Valves	BK-GCS-PEDCO-120-PI-MT-0004	1401/07/20	165

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16							شماره صفحه : ۴۲ از ۴۳	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0016		G00

پیوست شماره سه: جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)
(در پیوست)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 16								شماره صفحه : ۴۳ از ۴۳
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0016	G00	

پیوست شماره چهار: عکسهایی از عملیات اجرایی

(در پیوست)
