



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض و ابنیه تحت الارض

عمومی و مشترک



شماره پیمان:

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

MONTHLY PROGRESS REPORT # 19

نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه
G00	0019	RT	GE	000	HD	GNRAL	BK

شماره صفحه: ۱ از ۴۰

طرح نگهداشت و افزایش تولید ۲۷ مخزن

MONTHLY PROGRESS REPORT # 19

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک

G00	JAN. 2023	IFI	M.Aref	M.Fakharian	M.Mehrshad	
Rev.	Date	Purpose of Issue/Status	Prepared by:	Checked by:	Approved by:	CLIENT Approval
Class: 3		CLIENT Doc. Number (F-Number): F0Z-707085				

Status:

IDC: Inter-Discipline Check
IFC: Issued For Comment
IFA: Issued For Approval
AFD: Approved For Design
AFC: Approved For Construction
AFP: Approved For Purchase
AFQ: Approved For Quotation
IFI: Issued For Information
AB-R: As-Built for CLIENT Review
AB-A: As-Built -Approved



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض و ابنیه تحت الارض

عمومی و مشترک



شماره پیمان:

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

MONTHLY PROGRESS REPORT # 19

نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه
G00	0019	RT	GE	000	HD	GNRAL	BK

شماره صفحه: ۲ از ۴۰

REVISION RECORD SHEET

PAGE	G00	G01	G02	G03	G04
1	X				
2	X				
3	X				
4	X				
5	X				
6	X				
7	X				
8	X				
9	X				
10	X				
11	X				
12	X				
13	X				
14	X				
15	X				
16	X				
17	X				
18	X				
19	X				
20	X				
21	X				
22	X				
23	X				
24	X				
25	X				
26	X				
27	X				
28	X				
29	X				
30	X				
31	X				
32	X				
33	X				
34	X				
35	X				
36	X				
37	X				
38	X				
39	X				
40	X				
41	X				
42	X				
43	X				
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					

PAGE	G00	G01	G02	G03	G04
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					

 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض</p> <p>عمومی و مشترک</p>	 <p>شماره صفحه: ۳ از ۴۰</p>																
<p>شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴</p>	<p>MONTHLY PROGRESS REPORT # 19</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادرکننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GNRAL</td> <td>HD</td> <td>000</td> <td>GE</td> <td>RT</td> <td>0019</td> <td>G00</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0019	G00	<p>شماره صفحه: ۳ از ۴۰</p>
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0019	G00											

فهرست مطالب

۴	مشخصات قراردادی پروژه.....	۱
۵	معرفی پروژه.....	۲
۸	گزارش مدیریتی پروژه.....	۳
۹	گزارش فعالیت‌های انجام شده.....	۴
۱۲	جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی/تحت الارض /سطح الارض).....	۵
۱۳	بخش کنترل پروژه.....	۶
۱۹	وضعیت مدارک مهندسی.....	۷
۲۰	بخش مالی پروژه.....	۸
۲۱	بخش تدارکات کالا.....	۹
۲۲	نمودار سازمانی پیمانکار.....	۱۰
۲۴	مکاتبات با کارفرما.....	۱۱
۲۸	مشکلات و موانع.....	۱۲
۲۹	موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت.....	۱۳
۳۰	بخش کنترل پروژه.....	۱۴
۳۱	ضمائم.....	۱۵

* گزارش QC و ترنسیتال لیست به پیوست می باشد.

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																	
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 19	شماره صفحه : ۴ از ۴۰																
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادرکننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GNRAL</td> <td>HD</td> <td>000</td> <td>GE</td> <td>RT</td> <td>0019</td> <td>G00</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0019	G00	
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0019	G00											

۱ مشخصات قراردادی پروژه

<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک/ بخش سطح الارض و ابنیه تحت الارض</p> <p>شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب</p> <p>اهواز، کوی فداییان اسلام، ساختمان ۵ طبقه/ تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران</p> <p>علیرضا محمدی خواه (سرپرست طرح های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران)</p> <p>شرکت توسعه پتروایران</p> <p>تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران</p> <p>منصور مهرشاد</p> <p>مشارکت “هیرگان انرژی- طرح و بازرسی”</p> <p>تهران، اتوبان همت- خیابان شیراز جنوبی- کوچه یاس - پلاک ۱۳</p> <p>محمد فخاریان</p> <p>۱۴۰۰/۰۴/۰۲</p> <p>۱۴۰۲/۰۴/۰۱</p> <p>BK-00-CO-0001</p> <p>۹۷۱۰۲۰</p> <p>۳۵،۹۰۹،۸۸۰ یورو</p> <p>۲۴ ماه</p>	<p>نام پروژه:</p> <p>کارفرمای اصلی:</p> <p>مجری و نماینده کارفرمای اصلی:</p> <p>کارفرما (پیمانکار عمومی):</p> <p>مدیر پروژه و نماینده کارفرما (پیمانکار عمومی):</p> <p>پیمانکار EPC:</p> <p>مدیر پروژه و نماینده پیمانکار:</p> <p>تاریخ شروع پروژه:</p> <p>تاریخ پایان پروژه:</p> <p>شماره قرارداد:</p> <p>شماره پروژه (در سیستم کارفرمای اصلی):</p> <p>مبلغ پیمان (یورو):</p> <p>مدت پیمان:</p>
--	--

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																	
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 19	شماره صفحه: ۵ از ۴۰																
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>نسخه</td> <td>سریال</td> <td>نوع مدرک</td> <td>رشته</td> <td>تسهیلات</td> <td>صادرکننده</td> <td>بسته کاری</td> <td>پروژه</td> </tr> <tr> <td>G00</td> <td>0019</td> <td>RT</td> <td>GE</td> <td>000</td> <td>HD</td> <td>GNRAL</td> <td>BK</td> </tr> </table>	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	G00	0019	RT	GE	000	HD	GNRAL	BK	
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه											
G00	0019	RT	GE	000	HD	GNRAL	BK											

۲ معرفی پروژه

میدان نفتی بینک از میدانی نفتی ایران است که در استان بوشهر، در فاصله ۲۰ کیلومتری از شمال بندر گناوه و در ساحل خلیج فارس مستقر می‌باشد. این میدان از شمال با میدان نفتی گلخاری، میدان نفتی بی‌بی حکیمه و میدان نفتی سیاهمکان و از جنوب با میدان نفتی خارگ، در دریا هم‌جوار است. حجم ذخیره در جای نفت خام این میدان در حدود ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون بشکه برآورد می‌شود. میدان نفتی بینک در افق آسماری دارای ابعادی به طول ۴۲ کیلومتر و عرض متوسط ۶ کیلومتر است. سازندهای آسماری و جهرم این میدان به دلیل ارتباط فشاری مناسب، به عنوان یک مخزن واحد محسوب می‌شوند.

تاسیسات سرچاهی مربوط به ۶ حلقه چاه توسعه ای (که ۲ حلقه از این ۶ حلقه نیاز به برق رسانی و دیگر تسهیلات مرتبط جهت مصارف پمپ درون چاهی می‌باشد) و انجام اصلاحات در ۴ حلقه چاه تعمیراتی موجود (به همراه برق رسانی جهت مصارف پمپ درون چاهی و دیگر تسهیلات مورد نیاز) در دستور کار این طرح قرار دارد. آب مورد نیاز حفاری چاه‌ها می‌بایست از طریق تانکر (یا خط لوله موقت) از دره گپ گناوه/خلیج فارس تامین گردد. ضمناً احداث ۶ خط لوله جریانی جدید از چاه‌های توسعه ای پیش گفته به مجموعه بوستر-کلاستر بینک و توسعه چندراهه موجود بوستر-کلاستر بینک جزو شرح کار این پروژه است.

با هدف افزایش تولید نفت از میدان بینک، افزایش ظرفیت ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (و احداث ردیف تراکم و مستحدمات مورد نیاز جدید) به میزان ۱۵ م ف م ر نیز جزو شرح کار این پروژه می‌باشد. همچنین احداث ۴۴ کیلومتر خط لوله ۸ اینچ انتقال گاز از ایستگاه تقویت فشار گاز بینک تا ایستگاه تزریق گاز سیاهمکان و ۵،۲ کیلومتر خط لوله ۴ اینچ انتقال مایعات گازی از ایستگاه تقویت فشار گاز بینک به واحد بهره برداری بینک نیز در تعهد پیمانکار می‌باشد.



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض و ابنیه تحت الارض



عمومی و مشترک

شماره پیمان:


MONTHLY PROGRESS REPORT # 19

شماره صفحه ۶ از ۴۰

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه
G00	0019	RT	GE	000	HD	GNRAL	BK

کلیات توضیحات فوق الذکر شرح کار در شماتیک زیر ارائه شده است.

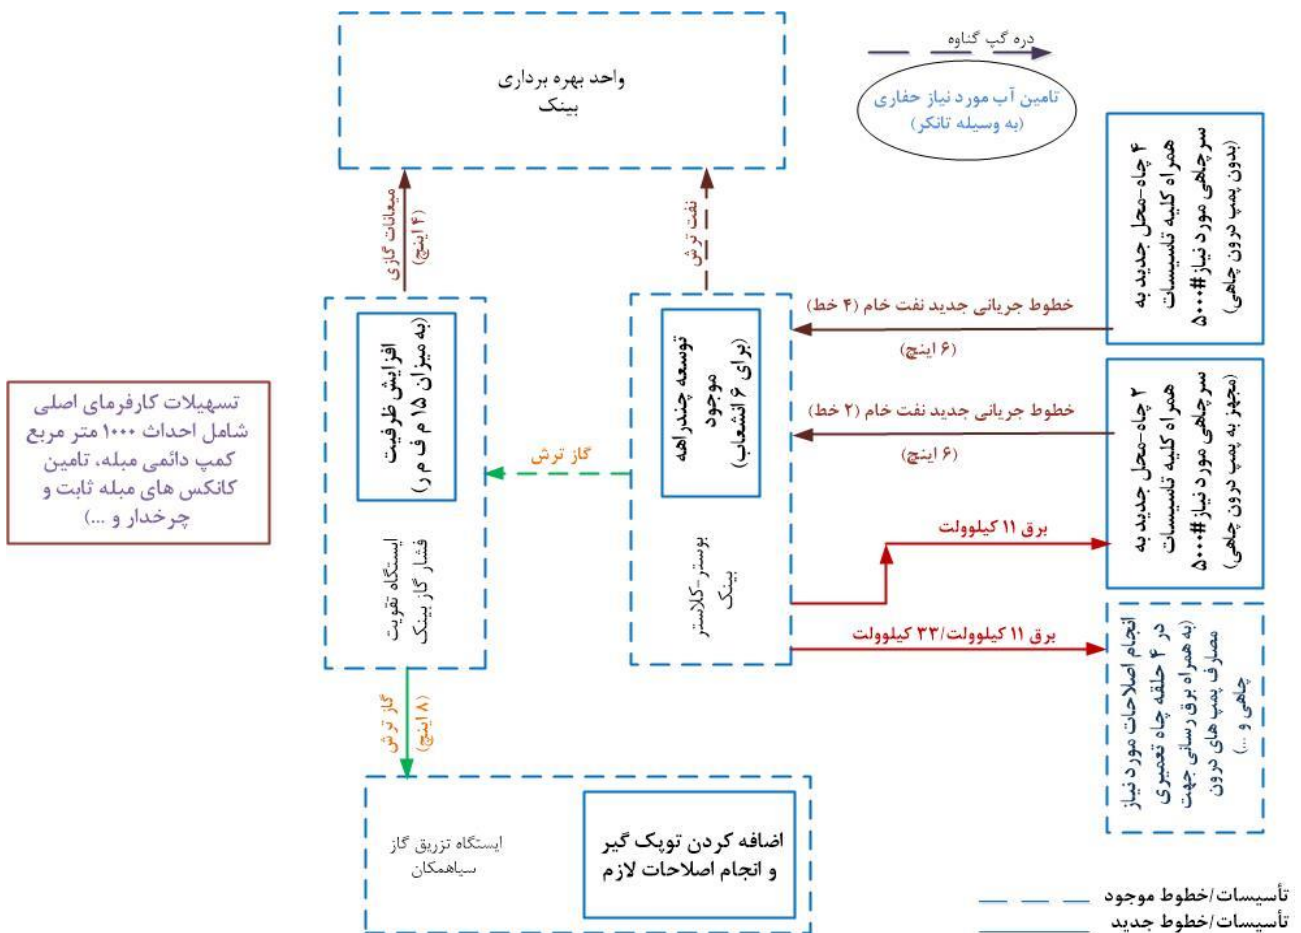

 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض</p> <p>عمومی و مشترک</p>	 																
<p>شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴</p>	<p>MONTHLY PROGRESS REPORT # 19</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادرکننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GNRAL</td> <td>HD</td> <td>000</td> <td>GE</td> <td>RT</td> <td>0019</td> <td>G00</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0019	G00	<p>شماره صفحه: ۷ از ۴۰</p>
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0019	G00											

S/L	Well Name/Location	Reservoir
1	W 008 N	Asmari
2	W 018 S	Asmari
3	W 046 S	Bangestan
4	W028	Bangestan
5	W 035	Bangestan
6	W 007 S	Bangestan
7	Well 14	Bangestan
8	Well 12	Bangestan
9	Well 15	Bangestan
10	Well 05	Bangestan



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض و ابنیه تحت الارض

عمومی و مشترک



شماره پیمان:

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

MONTHLY PROGRESS REPORT # 19

پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0019	G00


شماره صفحه : ۸ از ۴۰

۳ گزارش مدیریتی پروژه

۳-۱ گزارش مدیریتی و جدول میزان پیشرفت کل پروژه

جدول پیشرفت پروژه در بخش ۵ ارائه شده است.

۳-۲ نمودار پیشرفت کل پروژه

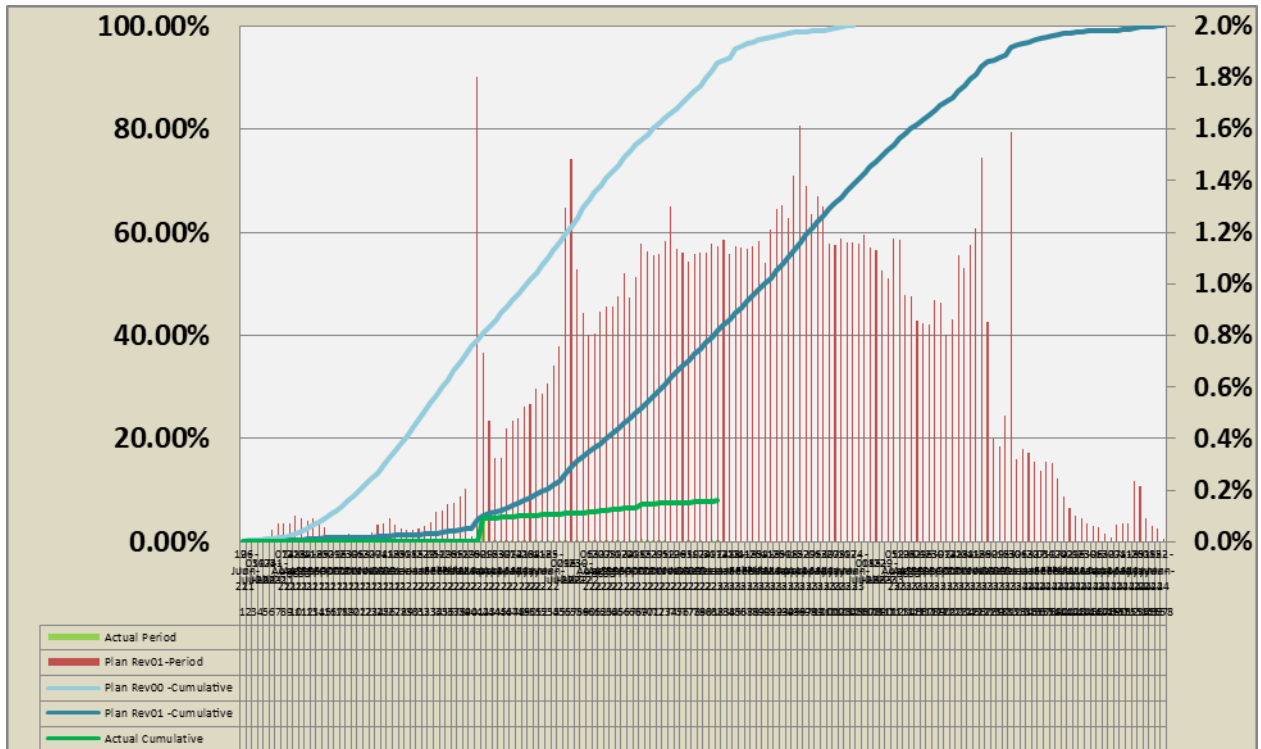

 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض</p> <p>عمومی و مشترک</p>																	
<p>شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴</p>	<p>MONTHLY PROGRESS REPORT # 19</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادرکننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GNRAL</td> <td>HD</td> <td>000</td> <td>GE</td> <td>RT</td> <td>0019</td> <td>G00</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0019	G00	<p>شماره صفحه : ۹ از ۴۰</p>
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0019	G00											

۴ گزارش فعالیت‌های انجام شده

۴-۱ مدیریت پروژه /عمومی

- شرکت در جلسات هفتگی بررسی پیشرفت پروژه
- کنترل و نظارت مستمر بر حسن انجام ضبط و ربط محیط کار General Housekeeping طبق برنامه
- ارائه خدمات رفاهی به کارفرمای محترم بر اساس قرارداد

۴-۲ بخش مهندسی (E)

۴-۲-۱ مهندسی سطح الارض /ابنیه تحت الارض پروژه

- ارسال مدارک مهندسی مطابق برنامه زمانبندی پروژه
- بررسی و اصلاح مدارک براساس نظرات کارفرما
- ارسال مدارک MTO مربوط به فلنج، فیتینگ و شیرهای بسته منیفولد مطابق برنامه زمانبندی
- ارسال نسخه اصلاح شده گزارش بازدید سایت بسته ایستگاه مطابق نظرات کارفرما
- ارسال نسخه نهایی PFD های مربوط به چاهها
- ارسال مدارک MR مربوط به خطوط هوایی چاههای تعمیری
- ارسال گزارش ۶۰٪ مدل سه بعدی لوکیشن ۰۲۸ و منیفولد
- ارسال گزارش ۳۰٪ مدل سه بعدی بسته خط لوله
- ارسال نسخه نهایی گزارش ۶۰٪ مدل سه بعدی ایستگاه
- ارسال نقشه های مربوط به خطوط هوایی چاههای تعمیری
- ارسال گزارش توپوگرافی ایستگاه مطابق نظرات کارفرما
- ارسال نسخه نهایی مدرک PFD بسته خط لوله
- ارسال نسخه نهایی مدارک MFD چاهها
- ارسال مدارک TBE مربوط به فیتینگ و فلنج ایستگاه مطابق برنامه زمانبندی
- ارسال مدارک General Civil Layout لوکیشن های ۰۲۸ و ۰۳۵
- ارسال گزارش بازدید سایت بسته منیفولد مطابق نظرات کارفرما
- ارسال مدارک Control و ESD Philosophy کلیه بسته ها مطابق نظرات کارفرما
- ارسال مدارک TBE مربوط به لوله های بسته ۱۸ و ۲۸ مطابق برنامه زمانبندی
- ارسال نسخه نهایی دیتاشیت های بخش پروسس مربوط به تجهیزات ابزار دقیق
- ارسال مدل ۶۰٪ چاه شماره ۰۱۸ براساس نظرات کارفرما
- ارسال مدل ۳۰٪ مربوط به بسته منیفولد و ایستگاه مطابق نظرات کارفرما

 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض</p> <p>عمومی و مشترک</p>																	
<p>شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴</p>	<p>MONTHLY PROGRESS REPORT # 19</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>پروژه</th> <th>بسته کاری</th> <th>صادرکننده</th> <th>تسهیلات</th> <th>رشته</th> <th>نوع مدرک</th> <th>سریال</th> <th>نسخه</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BK</td> <td>GNRAL</td> <td>HD</td> <td>000</td> <td>GE</td> <td>RT</td> <td>0019</td> <td>G00</td> </tr> </tbody> </table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0019	G00	<p>شماره صفحه: ۱۰ از ۴۰</p>
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0019	G00											

- ارسال مدرک P&ID مربوط به مخزن سوخت و آب آشامیدنی سرچاهی
- ارسال نسخه نهایی دیتاشیت های بخش پروسس مربوط به پمپها
- ارسال مدرک Civil and Structural drawings بسته ۰۳۵ مطابق برنامه زمانبندی
- ارسال مدرک General Civil Layout مربوط به لوکیشن ۰۰۸ براساس برنامه زمانبندی
- ارسال مدرک SLD سوئیچگیر بسته های سرچاهی مطابق نظرات کارفرما
- ارسال نقشه فوندانسیون مربوط به اسلیبرهای ایستگاه مطابق برنامه زمانبندی
- ارسال مدرک محاسباتی مربوط به اسلیبرهای ایستگاه مطابق برنامه زمانبندی
- ارسال مدرک PFD ایستگاه براساس نظرات کارفرما

۴-۲-۲ مهندسی تحت الارض پروژه

- (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)

۴-۳-۳ فعالیتهای مرتبط با کالا (P)

۴-۳-۱ کالای سطح الارض/ابنیه تحت الارض پروژه

- ارسال TBE Pipe ایستگاه تقویت فشار گاز
- ارسال TBE Flange ایستگاه تقویت فشار گاز
- ارسال TBE Fitting ایستگاه تقویت فشار گاز
- ارسال TBE Valve ایستگاه تقویت فشار گاز
- ارسال TBE Pump ایستگاه تقویت فشار گاز
- بررسی استعمال Chemical injection Package از سازندگان
- بررسی استعمال Instrument/Plant Air & Nitrogen Packages از سازندگان
- ارسال TBE پمپ های آتش نشانی ایستگاه
- پیگیری استعمال خرید تابلو چاه ۱۴
- پیگیری استعمال خرید ترانس چاه ۱۵
- پیگیری استعمال خرید سیستم های DCS و ESD منیفولد
- ارسال TBE Flange ایستگاه تقویت فشار گاز
- استعمال خرید Chemical injection Package از سازندگان

 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض</p> <p>عمومی و مشترک</p>																	
<p>شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴</p>	<p>MONTHLY PROGRESS REPORT # 19</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادرکننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GNRAL</td> <td>HD</td> <td>000</td> <td>GE</td> <td>RT</td> <td>0019</td> <td>G00</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0019	G00	<p>شماره صفحه : ۱۱ از ۴۰</p>
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0019	G00											

- استعلام خرید Instrument/Plant Air & Nitrogen Packages از سازندگان
- ارسال TBE Pipe ایستگاه تقویت فشار گاز
- پیگیری عقد قرارداد فلنج های سر چاهی
- پیگیری عقد قرارداد اتصالات سر چاهی
- بررسی استعلام خرید سیستم های DCS و ESD مینفولد
- ارسال TBE Pipe چاه های ۱۸ و ۲۸
- استعلام خرید Chemical injection Package از سازندگان
- بررسی استعلام خرید Instrument/Plant Air & Nitrogen Packages از سازندگان
- ارسال TBE Valve ایستگاه تقویت فشار گاز
- برگزاری جلسه کالا با شرکت محترم پترو ایران
- پیگیری عقد قرارداد فلنج های سر چاهی
- پیگیری عقد قرارداد اتصالات سر چاهی
- بررسی استعلام خرید سیستم های DCS و ESD مینفولد
- بررسی استعلام خرید Chemical injection Package از سازندگان
- بررسی استعلام خرید Instrument/Plant Air & Nitrogen Packages از سازندگان

۴-۳-۲ کالای تحت الارض پروژه

- (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)

۴-۴ فعالیتهای اجرایی (C)

- اجرای عملیات نصب تاسیسات آب و فاضلاب ساختمان اداری پترو ایران
- اجرای عملیات نصب تاسیسات آب و فاضلاب ساختمان رستوران
- اجرای عملیات نصب تاسیسات برقی ساختمان اداری پترو ایران
- اجرای عملیات نصب تاسیسات برقی ساختمان رستوران
- اجرای عملیات سرمایه کف ساختمان اداری پترو ایران
- اجرای عملیات سرمایه کف ساختمان اداری رستوران

 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض</p> <p>عمومی و مشترک</p>	 																
<p>شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴</p>	<p>MONTHLY PROGRESS REPORT # 19</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادرکننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GNRAL</td> <td>HD</td> <td>000</td> <td>GE</td> <td>RT</td> <td>0019</td> <td>G00</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0019	G00	<p>شماره صفحه: ۱۲ از ۴۰</p>
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0019	G00											

۵ جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی / سطح الارض)

BINAK OILFIELD DEVELOPMENT SURFACE WORK-PACKAGES BASED ON PACKAGES						
Code	Description	W.F. (Total)	Last Progress%	This Period	Up to now Progress%	Approved Progress% (1401/08/23)
	Total Project	100.000%	7.49%	0.49%	7.99%	5.00%
1	GENERAL	5.32%	57.11%	0.72%	57.83%	40.54%
1-1	General	5.32%	57.11%	0.72%	57.83%	40.54%
2	SUB-Surface DEVELOPMENT	18.18%	8.45%	1.47%	9.92%	7.32%
2-1	Engineering	0.36%	41.96%	1.69%	43.66%	33.45%
2-2	Procurement	11.14%	1.29%	2.23%	3.52%	1.13%
2-3	Construction	6.68%	18.56%	0.20%	18.76%	16.23%
3	SURFACE DEVELOPMENT	76.49%	3.81%	0.24%	4.06%	1.97%
3-1	Engineering	2.37%	41.24%	1.35%	42.60%	32.36%
3-2	Procurement	59.19%	3.28%	0.26%	3.54%	1.25%
3-3	Construction	13.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3-4	Commissioning, Startup & Handover	1.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
	MONTHLY PROGRESS REPORT # 19								
شماره پیمان:	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	شماره صفحه: ۱۳ از ۴۰
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0019	G00	

۶ بخش کنترل پروژه

جدول میزان پیشرفت کل پروژه (عمومی / سطح الارض)

Description	W.F. (Disc)	W.F. (Total)	Roll-Up	Last Progress%	This Period	Up to now Progress%	Approved Progress% (1401/08/23)
Total Project	100.000%	100.000%	100.00%	7.49%	0.49%	7.99%	5.00%
GENERAL	1.136%	1.136%	1.136%	57.113%	0.721%	57.83%	40.54%
Project Management	23.600%	0.268%	0.268%	55.622%	0.208%	55.83%	41.11%
Project Insurance	13.470%	0.153%	0.153%	90.555%	0.000%	90.56%	4.93%
Service to Company	35.400%	0.402%	0.402%	54.834%	1.220%	56.05%	40.88%
Training Courses	7.310%	0.083%	0.083%	0.000%	0.000%	0.00%	0.00%
GC Mobilization & Demobilization	20.220%	0.230%	0.230%	59.220%	0.000%	59.22%	55.15%
SUB-Surface DEVELOPMENT	52.342%	52.342%	52.338%	8.448%	1.471%	9.92%	7.32%
Package 01-New Well # W018S	5.210%	2.727%	2.723%	31.389%	4.106%	35.495%	30.532%
Package 02-New Well # W028 (Bangestan)	7.125%	3.729%	3.729%	34.180%	4.040%	38.220%	28.876%
Package 03-New Well # W046S (Bangestan)	33.462%	17.515%	17.515%	8.438%	1.483%	9.92%	7.23%
Package 04-New Well # W035 (Bangestan)	8.669%	4.538%	4.538%	9.783%	2.091%	11.87%	9.11%
Package 05-New Well # W008N	2.760%	1.445%	1.445%	3.525%	2.112%	5.64%	3.32%
Package 06-New Well # W007S/Manifold Extension (Bangestan)	12.934%	6.770%	6.770%	1.625%	0.980%	2.60%	1.35%
Package 07-Workover # 14	7.666%	4.013%	4.012%	3.483%	0.555%	4.04%	1.94%
Package 08-Workover # 12	6.237%	3.265%	3.264%	1.499%	0.369%	1.87%	1.07%
Package 09-Workover # 15	9.335%	4.886%	4.886%	1.044%	0.262%	1.31%	0.78%
Package 10-Workover # 05	6.602%	3.456%	3.456%	1.461%	0.347%	1.81%	0.85%
SURFACE DEVELOPMENT	46.522%	46.522%	46.522%	3.813%	0.243%	4.06%	1.97%
Package 11- EPC Pipeline 8" & 4"	15.529%	7.224%	7.224%	2.742%	0.021%	2.76%	0.75%
Package 12- EPC # Compressor Station	84.471%	39.298%	39.298%	4.082%	0.299%	4.38%	2.28%

 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض</p> <p>عمومی و مشترک</p>	 																
<p>شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴</p>	<p>MONTHLY PROGRESS REPORT # 19</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادرکننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GNRAL</td> <td>HD</td> <td>000</td> <td>GE</td> <td>RT</td> <td>0019</td> <td>G00</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0019	G00	<p>شماره صفحه : ۱۴ از ۴۰</p>
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0019	G00											

ضرایب وزنی فعالیت ها (W-F) (عمومی / سطح الارض) :

Cde	Description	W.F.(Discp.)	WF.(Total)
		100.00%	100.000%
1	GENERAL	5.32%	5.32%
1-1	Project Management	100.00%	5.32%
2	SUB-Surface DEVELOPMENT	18.18%	18.18%
2-1	Engineering	1.99%	0.36%
2-2	Procurement	61.26%	11.14%
2-3	Construction	36.75%	6.68%
3	SURFACE DEVELOPMENT	76.49%	76.49%
3-1	Engineering	3.09%	2.37%
3-2	Procurement	77.39%	59.19%
3-3	Construction	18.20%	13.92%
3-4	Commissioning, Startup & Handover	1.3%	1.01%



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض و ابنیه تحت الارض

عمومی و مشترک



شماره پیمان:


۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

MONTHLY PROGRESS REPORT # 19

نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه
G00	0019	RT	GE	000	HD	GNRAL	BK

شماره صفحه: ۱۵ از ۴۰

نمودار پیشرفت بخش عمومی

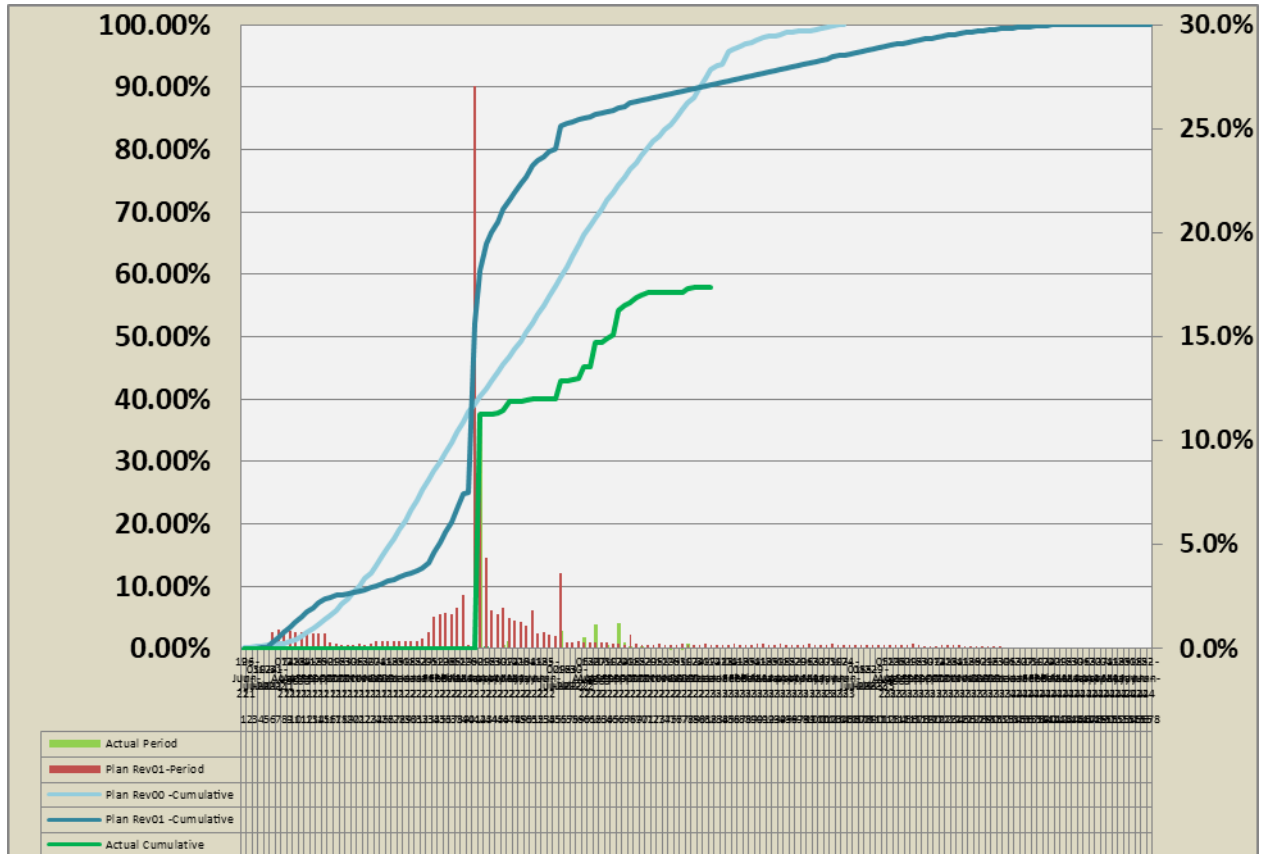



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض و ابنیه تحت الارض

عمومی و مشترک



شماره پیمان:


۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

MONTHLY PROGRESS REPORT # 19

پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0019	G00

شماره صفحه: ۱۶ از ۴۰

نمودار پیشرفت بخش ابنیه تحت الارض

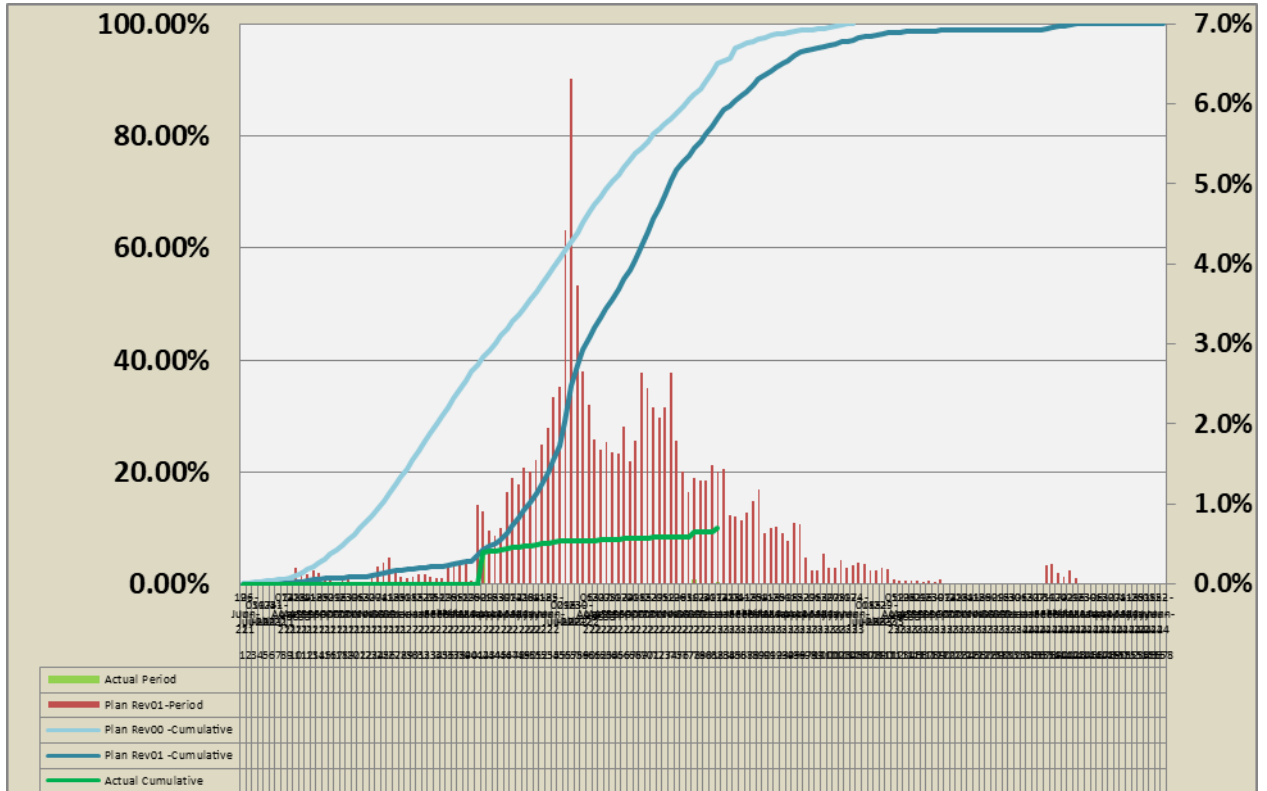



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض و ابنیه تحت الارض

عمومی و مشترک



شماره پیمان:


MONTHLY PROGRESS REPORT # 19

شماره صفحه: ۱۷ از ۴۰

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0019	G00


نمودار پیشرفت بخش سطح الارض

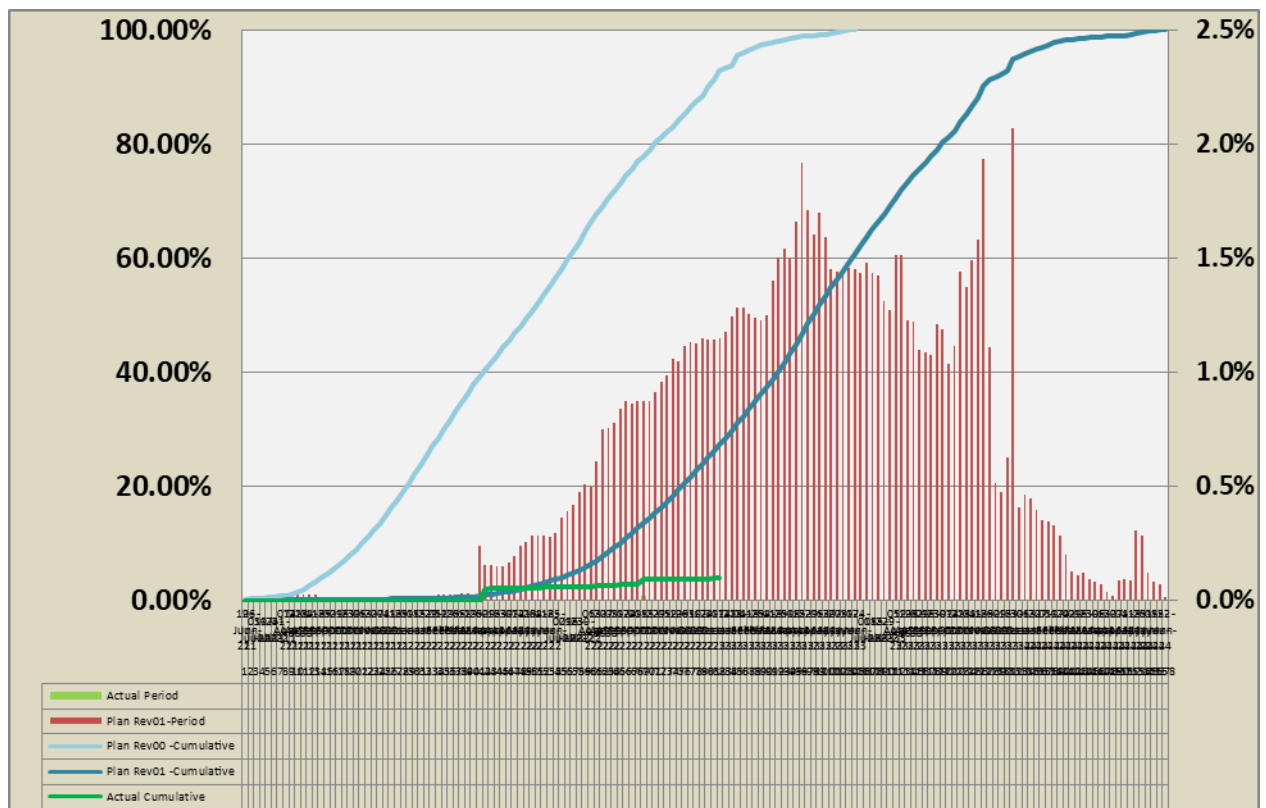

 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض</p> <p>عمومی و مشترک</p>																	
<p>شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴</p>	<p>MONTHLY PROGRESS REPORT # 19</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادرکننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GNRAL</td> <td>HD</td> <td>000</td> <td>GE</td> <td>RT</td> <td>0019</td> <td>G00</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0019	G00	<p>شماره صفحه: ۱۸ از ۴۰</p>
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0019	G00											

جدول و نمودار پیشرفت EPC:

	W.F.	Progress%
Total Project	100%	7.49%
Engineering	2.73%	41.34%
Procurement	70.33%	2.96%
Construction	20.60%	6.02%
Commissioning, Startup & Handover	1.01%	0.0%
Project Management	5.32%	57.11%

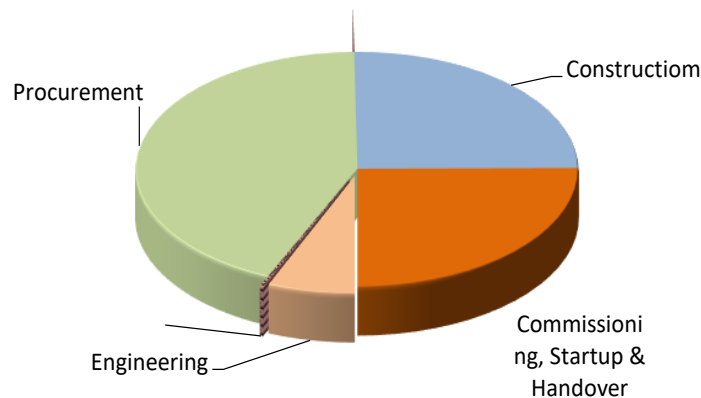



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض و ابنیه تحت الارض

عمومی و مشترک



شماره پیمان:

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

MONTHLY PROGRESS REPORT # 19

پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدارک	سریال	نسخه
BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0019	G00

شماره صفحه: ۱۹ از ۴۰

۷ وضعیت مدارک مهندسی

گزارش آخرین وضعیت مدارک مهندسی																					
		PM	PR	ME	HV	PI	PL	IN	SA	EL	TE	CV	AR	ST	GE	GT	QC	TP	SU	CO	
کل مدارک	Proj. Management	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	31
	Common	-	11	11	8	28	32	25	17	75	8	28	11	26	39	1	44	0	0	0	364
	WELLHEAD FACILITIES	0	43	8	60	235	42	126	64	206	0	80	30	126	40	10	0	0	12	10	1092
	PIPELINE	0	19	4	0	22	22	58	5	24	0	3	0	2	7	2	0	0	4	1	173
	GCS	0	90	72	18	60	0	114	32	96	29	12	12	111	8	2	0	0	1	1	658
Total Doc		30	163	95	86	345	96	323	118	401	37	123	53	265	95	15	44	0	17	12	2318
تعداد کل مدارک ارسال شده	IFI	4	0	19	0	88	21	79	14	50	3	7	0	2	40	3	0	0	0	0	330
	IFC	10	9	3	12	23	2	37	16	31	0	10	27	18	6	3	16	0	3	0	226
	IFA	6	86	30	9	20	7	70	16	70	7	19	6	3	2	6	3	0	1	0	361
	AFC/AFD	30	52	22	5	23	19	21	22	25	14	26	9	23	5	2	0	0	4	0	302
Total I/su		50	147	74	26	154	49	207	68	176	24	62	42	46	53	14	19	0	8	0	1219



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض و ابنیه تحت الارض

عمومی و مشترک



شماره پیمان:

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

MONTHLY PROGRESS REPORT # 19

نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه
G00	0019	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK



شماره صفحه : ۲۰ از ۴۰

۸ بخش مالی پروژه

شرح فعالیت	بخش اصلی / الحاقیه ۱	وزن	واحد	مبلغ پیمان یورو	ضمانت نامه ارائه شده به کار فرما - ریال	پرداخت پیش پرداخت		صورت وضعیت		پیشرفت مالی %100	پیشرفت مالی نسبت به وزن	تاریخ رسید وجه	آخرین وضعیت
						شماره	تاریخ ارسال	مبلغ	مبلغ				
پیش پرداخت	اصلی	-	-	۳۵,۹۰۹,۸۸۰	۱۷۷,۹۸۸,۷۵۶,۶۱۷	۱۷۷,۹۸۸,۷۵۶,۶۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۷۱۸,۱۹۷	۱۰۰%	۱۰۰%	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	پرداخت شده	
قسط دوم پیش پرداخت (۳٪ مبلغ پیمان)	اصلی	-	-	۳۵,۹۰۹,۸۸۰		۲۸,۰۵۷۶,۴۶۰,۸۹۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۱,۰۷۷,۳۹۶	۳,۰۰%	۱۰۰%	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	پرداخت شده	
برآورد کارکرد (WPA) بخش مهندسی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ الی ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ (G۰۰-۱۴۰۰/۰۹/۲۰)	اصلی	-	-	۹۸۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	۱۰۱,۰۰۱	۱۳,۸۸%			عدم تایید	
برآورد کارکرد (WPA) بخش مهندسی - شماره ۱ (به روز شده) (BK-HD-WPA-E-۰۰۰۱-G۰۱)	اصلی			۹۸۰,۰۰۰			۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۱۳۳,۹۳۴	۱۳,۶۷%			عدم تایید	
برآورد کارکرد (WPA) بخش های عمومی و اجرا - شماره ۱ منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (G۰۰)	اصلی			۹,۳۱۱,۹۶۰			۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۴۳۰,۰۴۹	۴,۶۲%			تایید	
برآورد کارکرد (WPA) بخش های عمومی و اجرا - شماره ۱ (به روز شده) از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ الی ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ (G۰۱)	اصلی			۹,۳۱۱,۹۶۰			۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۶۴۴,۳۲۳	۶,۹۳%			تایید	
صورت وضعیت شماره ۱ مهندسی (منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶)	اصلی			۹۸۰,۰۰۰			۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۱۶۷,۴۱۴	۱۷,۰۸%			بصورت الحساب و در چند قسط پرداخت شده	
صورت وضعیت شماره ۱ عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸)	اصلی			۹,۶۷۳,۶۱۳			۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۴۲۳,۱۹۰	۴,۵۳%			بصورت الحساب و در چند قسط پرداخت شده	
دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت ۱ مهندسی و اجرا	اصلی					۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۹					پرداختی	
برآورد کارکرد (WPA) شماره ۲ مهندسی (منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹)	اصلی			۹۸۰,۰۰۰			۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۸۷,۶۷۰	۱۹,۱۵%			تایید	
برآورد کارکرد (WPA) شماره ۲ عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹)	اصلی			۹,۶۷۳,۶۱۳			۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۸۸۷,۸۹۲	۹,۱۸%			تایید	
دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت ۱ مهندسی و اجرا	اصلی					۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۸					پرداختی	
دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت ۱ مهندسی و اجرا	اصلی					۶۰,۵۸۹,۳۴۰,۶۴۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۷					پرداختی	
صورت وضعیت شماره ۲ مهندسی (منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹)	اصلی			۹۸۰,۰۰۰			۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۱۸۷,۶۷۰	۱۹,۱۵%			پرداخت نشده	
صورت وضعیت شماره ۲ عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹)	اصلی			۹,۶۷۳,۶۱۳			۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۶۷۲,۱۲۵	۶,۹۵%			پرداخت نشده	
برآورد کارکرد بخش مهندسی - شماره ۳ (BK-HD-WPA-E-G۰۰-۰۰۰۳)	اصلی			۹۸۰,۰۰۰			۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۲۵۲,۴۵۲,۰۰۰	۲۵,۷۶%				
برآورد کارکرد بخش های عمومی و اجرا - شماره ۳ (BK-HD-WPA-C-۰۰۰۳-G۰۰)	اصلی			۹,۶۷۳,۶۱۳			۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۹۰۹,۴۷۱	۹,۴۰%				
صورت وضعیت شماره ۳ مهندسی (از ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ تا ۱۴۰۰/۰۳/۲۰)				۹۸۰,۰۰۰			۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۲۵۲,۴۵۲	۲۵,۷۶%			پرداخت نشده	
صورت وضعیت شماره ۳ عمومی و اجرا (از ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ تا ۱۴۰۰/۰۳/۲۰)				۹,۶۷۳,۶۱۳			۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۸۶۳,۸۶۴,۰۰۰	۸,۹۳%			پرداخت نشده	
برآورد کارکرد بخش مهندسی - شماره ۴ (BK-HD-WPA-E-G۰۰-۰۰۰۴)				۹۸۰,۰۰۰			۱۴۰۰/۱۰/۰۵	۳۱۷,۵۷۴	۳۲,۴۰%			تایید جهت تهیه صورت وضعیت	
برآورد کارکرد بخش های عمومی و اجرا - شماره ۴ (BK-HD-WPA-C-۰۰۰۴-G۰۰)				۹,۶۷۳,۶۱۳			۱۴۰۰/۱۰/۰۵	۱,۰۲۷,۷۵۹	۱۰,۶۲%			عدم تایید	
صورت وضعیت شماره ۴ مهندسی (از ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ تا ۱۴۰۰/۰۳/۲۰)				۹۸۰,۰۰۰			۱۴۰۰/۱۰/۰۵	۳۱۷,۵۷۴	۳۲,۴۰%			تایید	
صورت وضعیت شماره ۴ عمومی و اجرا (از ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ تا ۱۴۰۰/۰۳/۲۰)				۹,۶۷۳,۶۱۳			۱۴۰۰/۱۰/۰۵	۹۵۲,۶۸۲	۹,۹۳%			پرداخت نشده	
برآورد کارکرد بخش مهندسی - شماره ۵ (BK-HD-WPA-E-G۰۰-۰۰۰۵)				۹۸۰,۰۰۰			۱۴۰۰/۱۰/۰۷		۳۸,۹۸%			تایید	
برآورد کارکرد بخش های عمومی و اجرا - شماره ۵ (BK-HD-WPA-C-۰۰۰۵-G۰۰)				۹,۶۷۳,۶۱۳			۱۴۰۰/۱۰/۰۷		۱۰,۷۰%			تایید	
صورت وضعیت شماره ۵ مهندسی (از ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱)				۹۸۰,۰۰۰			۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۳۸۲,۰۷۸	۳۸,۹۹%			پرداخت نشده	
صورت وضعیت شماره ۵ عمومی و اجرا (از ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱)				۹,۶۷۳,۶۱۳			۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۹۹۳,۰۲۳	۱۰,۲۷%			پرداخت نشده	
برآورد کارکرد بخش مهندسی - شماره ۶ (BK-HD-WPA-E-G۰۰-۰۰۰۶)				۹۸۰,۰۰۰			۱۴۰۰/۱۰/۰۹		۴۱,۴۷%			تایید	
برآورد کارکرد بخش های عمومی و اجرا - شماره ۶ (BK-HD-WPA-C-۰۰۰۶-G۰۰)				۹,۶۷۳,۶۱۳			۱۴۰۰/۱۰/۰۹		۱۱,۶۵%			تایید	
صورت وضعیت شماره ۶ مهندسی (از ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ تا ۱۴۰۰/۰۸/۳۰)				۹۸۰,۰۰۰			۱۴۰۰/۱۰/۱۰		۴۰,۶۷%			پرداخت نشده	
صورت وضعیت شماره ۶ عمومی و اجرا (از ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ تا ۱۴۰۰/۱۰/۰۷)				۹,۶۷۳,۶۱۳			۱۴۰۰/۱۰/۱۰		۱۱,۶۲%			پرداخت نشده	

	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض</p> <p>عمومی و مشترک</p>	 																
<p>شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴</p>	<p>MONTHLY PROGRESS REPORT # 19</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادرکننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GNRAL</td> <td>PEDCO</td> <td>000</td> <td>GE</td> <td>RT</td> <td>0019</td> <td>G00</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0019	G00	<p>شماره صفحه : ۲۱ از ۴۰</p>
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0019	G00											

۹ بخش تدارکات کالا

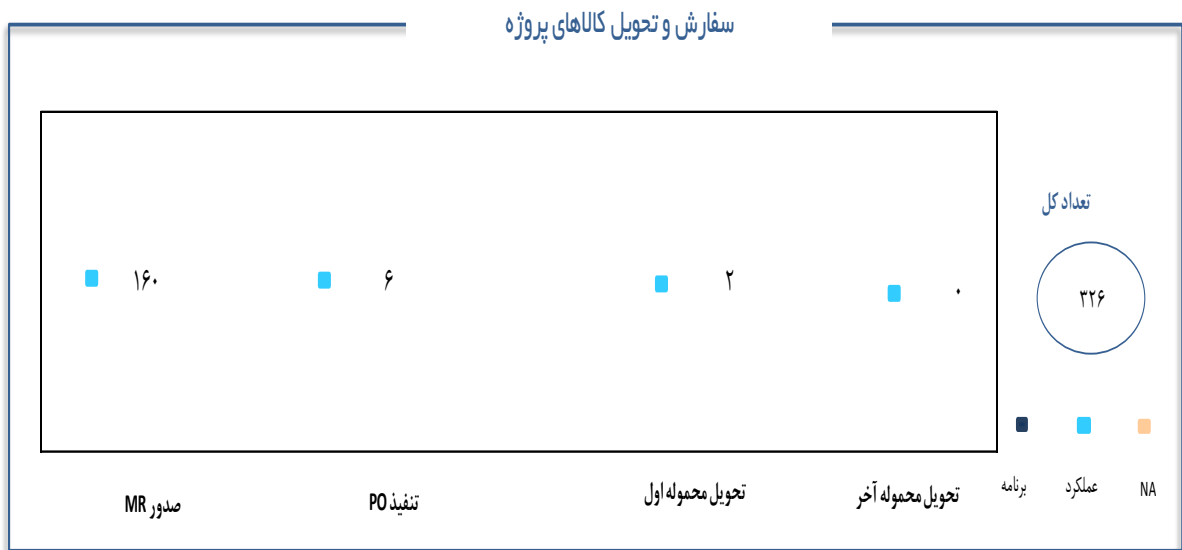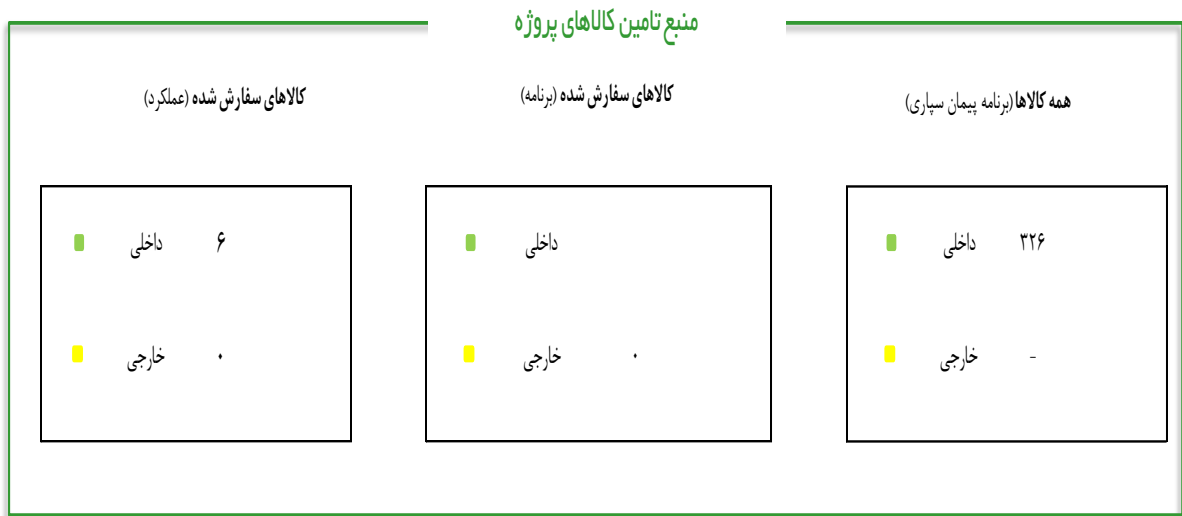

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
	MONTHLY PROGRESS REPORT # 19								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	شماره صفحه: ۲۴ از ۴۰
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0019	G00	

۱۱ مکاتبات با کارفرما

۱-۱۱ مکاتبات وارده از کارفرما:

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
۱	پاسخ سازنده منتخب اتصالات (فیتینگ) لوله کشی سرچاهی بسته های W028 و W018	1401/09/22	19086
۲	تایید طرح جدید مدیریت پسماند بسته چاه تعمیری BK14	1401/09/27	19419
۳	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتهال ها	1401/09/27	19332
۴	پاسخ به درخواست کتابچه های نهایی و مدارک تجهیزات مکانیکال	1401/09/27	19334
۵	پیگیری نامه معرفی سازنده منتخب جدید پکیج نم زدای گاز GCS	1401/09/27	19417
۶	صورتحلسات KOM و PIM مربوط به قرارداد پکیج کمپرسورهای گاز GCS	1401/09/28	19337
۷	درخواست تایید طرح جدید مدیریت پسماند بسته چاه تعمیری W007S	1401/09/30	19662
۸	معرفی سازنده منتخب کولرهای هوایی گاز بسته GCS	1401/10/03	19839
۹	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتهال ها	1401/10/03	19838
۱۰	تعیین تکلیف سازنده های منتخب معرفی شده	1401/10/05	19941
۱۱	کارکرد تایید شده شماره ۶ مهندسی	1401/10/07	20191
۱۲	کارکرد تایید شده شماره ۶ عمومی اجرا	1401/10/07	20188
۱۳	عدم حضور پزشک در کارگاه	1401/10/10	20308
۱۴	سازندگان منتخب تجهیزات ابزار دقیق TG, PG سرچاهی	1401/10/11	20363
۱۵	پاسخ سازنده منتخب توپک ران و توپک گیر بسته خطوط لوله	1401/10/11	20366
۱۶	پاسخ به سازنده معرفی شده شیر آلات سر چاهی بسته های W028 و W018S	1401/10/11	20370
۱۷	تجهیزات مورد نیاز برای انشعاب خط فشار متوسط مربوط به چاه	1401/10/11	20381
۱۸	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتهال ها	1401/10/11	20400
۱۹	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتهال ها	1401/10/11	20420
۲۰	الزامات برقی مربوط به چاه هایی که نیازمند برق رسانی می باشند	1401/10/13	20594
۲۱	تامین محل اسکان پرسنل سایت	1401/10/13	20637
۲۲	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتهال ها	1401/10/13	20640
۲۳	نظرات کارفرما در خصوص حذف گزارش GSI از مطالعات ژئوتکنیک	1401/10/13	20642

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
	MONTHLY PROGRESS REPORT # 19								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه BK	بسته کاری GNRAL	صادرکننده PEDCO	تسهیلات 000	رشته GE	نوع مدرک RT	سریال 0019	نسخه G00	شماره صفحه: ۲۵ از ۴۰

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
۲۴	سازنده منتخب تیوب-فیتینگ سر چاهی W018S و W028	1401/10/13	20644
۲۵	نظرات بخش مهندسی بر روی فایل NAVIS مدل سه بعدی ۳۰٪	1401/10/17	20785
۲۶	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسسمیتال ها	1401/10/19	21033
۲۷	نتیجه بررسی گزارش هفتگی ۸۰	1401/10/20	21141
۲۸	اقدامات ضروری جهت تسریع در پیشرفت پروژه	1401/10/20	21144
۲۹			
۳۰			
۳۱			
۳۲			
۳۳			
۳۴			
۳۵			
۳۶			
۳۷			
۳۸			
۳۹			
۴۰			

۲-۱۱ مکاتبات صادره به کارفرما:

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
۱	صورتحسابات KOM و PIM مربوط به قرارداد پکیج کمپرسورهای گاز (GCS)	1401/09/23	0629
۲	قرارداد خرید لوله های (۶ اینچ) فلولاین و (۴ اینچ) خط آتش چاه ها	1401/09/23	0630
۳	ارسال گزارش هفتگی - مربوط به هفته ۷۸ پروژه (منتهی به تاریخ ۲۳/۰۹/۱۴۰۱)	1401/09/23	0631
۴	برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی - شماره ۶ (BK-HD-WPA-C-0006_G00)	1401/09/23	0632



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض و ابنیه تحت الارض

عمومی و مشترک



شماره پیمان:

MONTHLY PROGRESS REPORT # 19

شماره صفحه: ۲۶ از ۴۰

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه
G00	0019	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
۵	درخواست ارائه چک لیست برای ادعاهای احتمالی بافت زمین	1401/09/28	0633
۶	پیگیری درخواست تعیین تکلیف نهایی "طرح جدید مدیریت پسماند بسته موقعیت چاه W007S"	1401/09/28	0634
۷	درخواست پرداخت مبلغ از حساب مشترک فیما بین	1401/09/28	0635
۸	ارسال گزارش هفتگی - مربوط به هفته ۷۹ پروژه (منتهی به تاریخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۱)	1401/09/30	0636
۹	استاندارد طراحی STONE TRAP	1401/10/03	0637
۱۰	پیگیری اخذ تاییدیه بر روی سازنده منتخب جدید پکیج نم زدای GCS	1401/10/03	0638
۱۱	ارسال یک نسخه اصل قرارداد خرید پکیج های کمپرسور گاز GCS (به علاوه متمم اصلاحی)	1401/10/05	0639
۱۲	اضافه کاری مترتبه از افزایش قیمت اعلامی سازنده پکیج های کمپرسور گاز GCS	1401/10/05	0640
۱۳	تغییر کاری؛ در نظر گرفتن تجهیزات انشعاب برق و یا گنتری برای چاه های تعمیر BK-05, 12, 15	1401/10/07	0641
۱۴	ارسال گزارش هفتگی - مربوط به هفته ۸۰ پروژه (منتهی به تاریخ ۰۷/۱۰/۱۴۰۱)	1401/10/07	0642
۱۵	صورت وضعیت شماره ۶ مهندسی (از ۰۱/۰۷/۱۴۰۱ تا ۳۰/۰۸/۱۴۰۱)	1401/10/10	0643
۱۶	صورت وضعیت شماره ۶ ساختمان و نصب و عمومی (از ۰۱/۰۷/۱۴۰۱ تا ۳۰/۰۸/۱۴۰۱)	1401/10/10	0644
۱۷	ارائه فایل NAVIS مدل سه بعدی ۳۰٪ - بسته موقعیت چاه W046S	1401/10/13	0645
۱۸	اصلاحات پایبندی اولیه در توسعه کلاستر بینک - پیگیری تاییدیه کارفرما بر روی اقلام مورد نیاز	1401/10/13	0646
۱۹	پاسخ به نظرات NISOC در خصوص مدرک (D04) PPL; Pipeline Material Spec.	1401/10/13	0647
۲۰	تغییر کاری؛ افزایش ظرفیت مخازن ذخیر گازوئیل سرچاهی - پیگیری اخذ تاییدیه کارفرما	1401/10/13	0648
۲۱	پاسخ به نظرات NISOC در خصوص مدرک (D/Sh. For Potable Water Tank of Wellpads) (D04)	1401/10/13	0649
۲۲	اضافه کاری مترتبه از افزایش قیمت اعلامی سازنده پکیج های کمپرسور گاز GCS - تاکید مجدد	1401/10/15	0650
۲۳	ارسال گزارش هفتگی - مربوط به هفته ۸۱ پروژه (منتهی به تاریخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۱)	1401/10/14	0651
۲۴	درخواست پرداخت مبلغ از حساب مشترک فیما بین (هزینه ها/تنخواه کارگاه و دفتر مرکزی پروژه)	1401/10/17	0652
۲۵	پاسخ به ابهام NISOC در خصوص مدرک GCS; Mech. D/Sh. For Slug Pump_D02	1401/10/18	0653
۲۶	سایبان کمپرسورهای گازی GCS - طرح بهینه و منطبق بر قرارداد	1401/10/18	0654
۲۷	مدارک بدون پاسخ از سوی کارفرمای محترم تا سررسید ۲۰/۱۰/۱۴۰۱	1401/10/20	0655
۲۸	پیگیری نامه های مهم بدون پاسخ از سوی کارفرمای محترم	1401/10/20	0656
۲۹			
۳۰			
۳۱			
۳۲			

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
	MONTHLY PROGRESS REPORT # 19								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه BK	بسته کاری GNRAL	صادرکننده PEDCO	تسهیلات 000	رشته GE	نوع مدرک RT	سریال 0019	نسخه G00	شماره صفحه: ۲۷ از ۴۰

۳-۱۱ لیست صورتجلسات پروژه

ردیف	عنوان صورت جلسه	تاریخ صورت جلسه	شماره صورت جلسه	ملاحظات
۱	صورتجلسات KOM	1401/09/21		مناطق نفتخیز
۲	صورتجلسات PIM	1401/09/22		مناطق نفتخیز
۳				
۴				
۵				

۴-۱۱ لیست مکاتبات بدون پاسخ

ردیف	عنوان/خلاصه نامه	تاریخ نامه	شماره نامه	ملاحظات
۱	درخواست ارائه چک لیست برای ادعاهای احتمالی بافت زمین	1401/09/28	0633	
۲	استاندارد طراحی STONE TRAP	1401/10/03	0637	
۳	اضافه کاری مترتبه از افزایش قیمت اعلامی سازنده پکیج های کمپرسور گاز GCS	1401/10/05	0640	
۴	اصلاحات پایبندی اولیه در توسعه کلاستر بینک- پیگیری تاییدیه کارفرما بر روی اقلام مورد نیاز	1401/10/13	0646	
۵	تعبیر کاری؛ افزایش ظرفیت مخازن ذخیر گازوئیل سرچاهی - پیگیری اخذ تاییدیه کارفرما	1401/10/13	0648	
۶	پاسخ به نظرات NISOC درخصوص مدرک (D/Sh. For Potable Water Tank (of Wellpads (D04	1401/10/13	0649	
۷	اضافه کاری مترتبه از افزایش قیمت اعلامی سازنده پکیج های کمپرسور گاز GCS - تاکید مجدد	1401/10/15	0650	
۸	پاسخ به ابهام NISOC درخصوص مدرک GCS; Mech. D/Sh. For Slug Pump_D02	1401/10/18	0653	
۹	سایبان کمپرسورهای گازی GCS - طرح بهینه و منطبق بر قرارداد	1401/10/18	0654	
۱۰	مدارک بدون پاسخ از سوی کارفرمای محترم تا سررسید ۲۰/۱۰/۱۴۰۱	1401/10/20	0655	
۱۱	پیگیری نامه های مهم بدون پاسخ از سوی کارفرمای محترم	1401/10/20	0656	
۱۲				
۱۳				
۱۴				
۱۵				

	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض</p> <p>عمومی و مشترک</p>																	
<p>شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴</p>	<p style="text-align: center;">MONTHLY PROGRESS REPORT # 19</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادرکننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GNRAL</td> <td>PEDCO</td> <td>000</td> <td>GE</td> <td>RT</td> <td>0019</td> <td>G00</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0019	G00	<p>شماره صفحه : ۲۸ از ۴۰</p>
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0019	G00											

۱۲-مشکلات و موانع

- مشکلات مربوط به جذب نیرو و تکمیل چارت سازمانی پروژه با توجه به شرایط موجود
- عدم هماهنگی بین کامنتهای پترو ایران و کارفرمای اصلی.
- با توجه به عدم پرداخت مالی کامل پروژه و معوق ماندن درخواستهای مالی اعلام شده (صورت وضعیت شماره ۲ و ۳ مهندسی ، صورت وضعیت شماره ۲ و ۳ بخش عمومی و اجرا به طور کامل ، و همچنین عدم پرداخت کامل صورت وضعیت شماره ۵ و ۴ مهندسی ، صورت وضعیت شماره ۴ و ۵ بخش عمومی و اجرا) موجب شده است جریان نقدینگی پروژه به شدت منفی شود .

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																	
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 19	شماره صفحه: ۲۹ از ۴۰																
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادرکننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GNRAL</td> <td>PEDCO</td> <td>000</td> <td>GE</td> <td>RT</td> <td>0019</td> <td>G00</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0019	G00	
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0019	G00											

۱۳ موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت

- دریافت با تاخیر نظرات کارفرمای محترم بر روی مدارک ارسالی
- وجود برخی تناقضات در نظرات کارفرمایان (شرکت پتروایران و شرکت مناطق نفتخیز جنوب) درخصوص مدارک ارسالی
- تاخیر در نهایی سازی وضعیت طرح مدیریت پسماند چاه ها (توسط کارفرمای محترم) و بالتبع تاخیر در نهایی سازی نقشه ها و کندی پیشرفت کار اجرایی مربوطه
- تغییر برنامه استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و در نتیجه تغییر برنامه کلی پروژه
- نامشخص بودن تاریخ دقیق استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و در نتیجه متاثر شدن برنامه آماده سازی لوکیشن چاه ها و خرید اقلام مربوطه مورد نیاز
- عدم پرداخت کامل صورت وضعیت شماره ۲ مهندسی توسط کارفرمای محترم به طور کامل
- عدم پرداخت کامل صورت وضعیت شماره ۲ عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم به طور کامل
- عدم پرداخت کامل صورت وضعیت شماره ۳ مهندسی توسط کارفرمای محترم به طور کامل
- عدم پرداخت کامل صورت وضعیت شماره ۳ عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم به طور کامل
- عدم پرداخت کامل صورت وضعیت شماره ۴ مهندسی توسط کارفرمای محترم
- عدم پرداخت کامل صورت وضعیت شماره ۴ عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم
- عدم پرداخت کامل صورت وضعیت شماره ۵ مهندسی توسط کارفرمای محترم
- عدم پرداخت کامل صورت وضعیت شماره ۵ عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم
- محدودیت های ایجاد شده در تامین کالای ساخت داخل کشور و متعاقب آن سو استفاده برخی شرکت های لوله ساز داخلی و افزایش بی دلیل قیمت ها
- افزایش بی رویه کلیه قیمت های مهندسی، خرید و اجرا علیرغم عدم تغییر نرخ تسعیر ارز نیمایی

 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض</p> <p>عمومی و مشترک</p>																	
<p>شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴</p>	<p style="text-align: center;">MONTHLY PROGRESS REPORT # 19</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>پروژه</th> <th>بسته کاری</th> <th>صادرکننده</th> <th>تسهیلات</th> <th>رشته</th> <th>نوع مدرک</th> <th>سریال</th> <th>نسخه</th> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GNRAL</td> <td>PEDCO</td> <td>000</td> <td>GE</td> <td>RT</td> <td>0019</td> <td>G00</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0019	G00	<p>شماره صفحه : ۳۰ از ۴۰</p>
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0019	G00											

۴ بخش کنترل پروژه

- ۱-۱۴ برنامه زمان بندی پروژه
- ۲-۱۴ لیست مدارک ارسال شده طی دوره
- ۲-۱۴ لیست مدارک دارای تاخیر در پاسخ از سوی کارفرما
- ۳-۱۴ جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)

 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض</p> <p>عمومی و مشترک</p>																	
<p>شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴</p>	<p style="text-align: center;">MONTHLY PROGRESS REPORT # 19</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>نسخه</th> <th>سریال</th> <th>نوع مدرک</th> <th>رشته</th> <th>تسهیلات</th> <th>صادرکننده</th> <th>بسته کاری</th> <th>پروژه</th> </tr> <tr> <td>G00</td> <td>0019</td> <td>RT</td> <td>GE</td> <td>000</td> <td>PEDCO</td> <td>GNRAL</td> <td>BK</td> </tr> </table>	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	G00	0019	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK	<p>شماره صفحه : ۳۱ از ۴۰</p>
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه											
G00	0019	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK											

۱۵ ضمائم

پیوست شماره یک: برنامه زمان بندی پروژه

پس از اعمال تغییرات و به روز رسانی برنامه ارائه خواهد شد.

 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض</p> <p>عمومی و مشترک</p>																	
<p>شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴</p>	<p>MONTHLY PROGRESS REPORT # 19</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادرکننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GNRAL</td> <td>PEDCO</td> <td>000</td> <td>GE</td> <td>RT</td> <td>0019</td> <td>G00</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0019	G00	<p>شماره صفحه : ۳۲ از ۴۰</p>
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0019	G00											

پیوست شماره دو : لیست مدارک ارسال شده طی دوره

POI	Document Title	Document Number	Transmittal Date	ROW
IFI	PMR For Control Valves - Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-IN-MR-0005	1401/09/21	1
IFC	Flare, Blow Down And Relief Philosophy	BK-PPL-PEDCO-320-PR-PH-0003	1401/09/21	2
IFA	I&C Power Consumption Summary	BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0007	1401/09/21	3
IFA	Calculation Note For Flow Element Sizing	BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0003	1401/09/23	4
IFA	Calculation Note For Control Valve Sizing	BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0006	1401/09/23	5
AFD	Calculation Note For Pipeline Wall Thickness	BK-PPL-PEDCO-320-PL-CN-0001	1401/09/23	6
AFD	Pipeline Material Specification	BK-PPL-PEDCO-320-PL-SP-0001	1401/09/23	7
IFI	MTO For Flanges - Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0003	1401/09/23	8
IFI	MTO For Manual Valves - Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0004	1401/09/23	9
IFI	MTO For Gaskets - Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0005	1401/09/23	10
IFI	Site Visit Report (Civil Work) - GCS	BK-GCS-PEDCO-120-CV-RT-0001	1401/09/26	11
IFI	Monthly Progress Report	BK-GNRAL-HD-000-GE-RT-0018	1401/09/26	12
AFC	Process Flow Diagram - W018S	BK-W018S-PEDCO-110-PR-PF-0001	1401/09/26	13
AFC	Process Flow Diagram - W028	BK-W028-PEDCO-110-PR-PF-0001	1401/09/26	14
AFC	Process Flow Diagram - W035	BK-W035-PEDCO-110-PR-PF-0001	1401/09/26	15
AFC	Process Flow Diagram - W008N	BK-W008N-PEDCO-110-PR-PF-0001	1401/09/26	16
AFC	Process Flow Diagram - W007S	BK-W007S-PEDCO-110-PR-PF-0002	1401/09/26	17
AFC	Tie in list	BK-PPL-PEDCO-320-PR-LI-0004	1401/09/26	18
AFC	Pipeline Standard Drawing For Cover Slabs And Set-On-Weight	BK-GNRAL-PEDCO-000-PL-DW-0013	1401/09/26	19
IFI	PMR For Transmission Over head Line - BK12	BK-BK12-PEDCO-110-EL-MR-0013	1401/09/26	20
IFI	PMR For Transmission Over head Line - BK15	BK-BK15-PEDCO-110-EL-MR-0013	1401/09/26	21

 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض</p> <p>عمومی و مشترک</p>																	
<p>شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴</p>	<p>MONTHLY PROGRESS REPORT # 19</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادرکننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GNRAL</td> <td>PEDCO</td> <td>000</td> <td>GE</td> <td>RT</td> <td>0019</td> <td>G00</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0019	G00	<p>شماره صفحه : ۳۳ از ۴۰</p>
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0019	G00											

POI	Document Title	Document Number	Transmittal Date	ROW
IFI	PMR For Transmission Over head Line - BK05	BK-BK05-PEDCO-110-EL-MR-0013	1401/09/26	22
IFI	Electrical Typical Schematic Diagrams For MV panel	BK-GCS-PEDCO-120-EL-DG-0001	1401/09/26	23
IFA	Data Sheets For ESD Console/F&G Matrix Panel	BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0017	1401/09/26	24
IFA	Data Sheets For Rotameter	BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0018	1401/09/26	25
IFA	Control Room Layout & Arrangement Drawing	BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0001	1401/09/26	26
IFA	Panels & Junction Box List	BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0005	1401/09/26	27
IFI	MTO For Fittings - Manifold & W007S	BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0002	1401/09/26	28
AFC	Process Flow Diagram - W0046S	BK-W046S-PEDCO-110-PR-PF-0001	1401/09/26	29
IFI	PMR For Pressure Safety Valves (PSV)	BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0006	1401/09/26	30
AFD	PDMS Model Review Report (60%) - W028	BK-W028-PEDCO-110-PI-RT-0001	1401/09/26	31
AFD	PDMS Model Review Report (60%) - Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-PI-RT-0002	1401/09/26	32
AFD	PDMS Model Review Report (30%)	BK-PPL-PEDCO-320-PI-RT-0004	1401/09/26	33
AFD	PDMS Model Review Report (60%)-GCS	BK-GCS-PEDCO-120-PI-RT-0004	1401/09/26	34
AFC	Over Head Line Plan and Profile - BK14	BK-BK14-PEDCO-110-SU-DW-0001	1401/09/27	35
AFC	Over Head Line Plan and Profile - BK12	BK-BK12-PEDCO-110-SU-DW-0001	1401/09/27	36
AFC	Over Head Line Plan and Profile - BK15	BK-BK15-PEDCO-110-SU-DW-0001	1401/09/27	37
AFC	Over Head Line Plan and Profile - BK05	BK-BK05-PEDCO-110-SU-DW-0001	1401/09/27	38
IFA	Plan & Profile Drawings For Gas Pipeline (to Siahmakan)	BK-PPL-PEDCO-320-SU-DW-0001	1401/09/27	39
IFA	Piping Corrosion Study & Material Selection Report	BK-GCS-PEDCO-120-PI-RT-0001	1401/09/27	40
AFC	Wiring Diagram For Remote Control Panel (RCP)	BK-GCS-PEDCO-120-EL-DG-0005	1401/09/28	41
AFC	Pipelines Hydraulic Calculation Report	BK-PPL-PEDCO-320-PR-RT-0001	1401/09/28	42
FI	Topographical Map	BK-GCS-PEDCO-120-SU-MP-0001	1401/09/28	43
IFI	TBE For Fire Fighting and Safety Equipment - W018S	BK-W018S-PEDCO-110-SA-TB-0001	1401/09/28	44

 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض</p> <p>عمومی و مشترک</p>	 <p>شرکت توسعه و پترو ایران</p>																
<p>شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴</p>	<p>MONTHLY PROGRESS REPORT # 19</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادرکننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GNRAL</td> <td>PEDCO</td> <td>000</td> <td>GE</td> <td>RT</td> <td>0019</td> <td>G00</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0019	G00	<p>شماره صفحه : ۳۴ از ۴۰</p>
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0019	G00											

POI	Document Title	Document Number	Transmittal Date	ROW
IFI	TBE For Fire Safety Sign - W018S	BK-W018S-PEDCO-110-SA-TB-0002	1401/09/28	45
IFI	TBE For Fire Fighting and Safety Equipment - W028	BK-W028-PEDCO-110-SA-TB-0001	1401/09/28	46
IFI	TBE For Fire Safety Sign - W028	BK-W028-PEDCO-110-SA-TB-0002	1401/09/28	47
AFC	Process Flow Diagram For pipelines	BK-PPL-PEDCO-320-PR-PF-0001	1401/09/29	48
AFC	Standard Drawing For Catch Basins	BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0006	1401/09/29	49
AFC	Installation Detail & Notes for Connection OHL to Gantries for Wells	BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-DW-0002	1401/09/29	50
AFC	Control Logic Diagram For LV Incomers and bus tie	BK-GCS-PEDCO-120-EL-LD-0001	1401/09/29	51
IFA	Isolation Philosophy	BK-SSGRL-PEDCO-110-PR-PH-0004	1401/09/30	52
IFI	PMR For Potable Water Tank of Well Pads	BK-SSGRL-PEDCO-110-ME-MR-0002	1401/09/30	53
IFA	Earthing & Lightning Layout for well pads	BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY-0010	1401/10/03	54
IFA	Existent MV Switchgear Expansion Single Line Diagram	BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0003	1401/10/03	55
IFA	Calculation Note For Earthing & Lightning System of Well Pads	BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0007	1401/10/03	56
IFA	Control/ESD/F&G System Block Diagram Configuration	BK-GCS-PEDCO-120-IN-BD-0001	1401/10/03	57
IFC	Set Point & Alarm List - Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-IN-LI-0006	1401/10/04	58
AFC	Standard Drawing For Manholes	BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0005	1401/10/04	59
AFC	Calculation Note For Flood Control	BK-SSGRL-PEDCO-110-CV-CN-0001	1401/10/04	60
IFI	Standard Drawing For Valve Box	BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0016	1401/10/04	61
AFC	I/O List For ESD Systems	BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0003	1401/10/06	62
AFC	Material Flow Diagram - W018S	BK-W018S-PEDCO-110-PI-DG-0001	1401/10/06	63
AFC	Material Flow Diagram - W028	BK-W028-PEDCO-110-PI-DG-0001	1401/10/06	64
AFC	Material Flow Diagram - W046S	BK-W046S-PEDCO-110-PI-DG-0001	1401/10/06	65
AFC	Material Flow Diagram - W035	BK-W035-PEDCO-110-PI-DG-0001	1401/10/06	66
AFC	Material Flow Diagram - W008N	BK-W008N-PEDCO-110-PI-DG-0001	1401/10/06	67

 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض</p> <p>عمومی و مشترک</p>																	
<p>شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴</p>	<p>MONTHLY PROGRESS REPORT # 19</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادرکننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GNRAL</td> <td>PEDCO</td> <td>000</td> <td>GE</td> <td>RT</td> <td>0019</td> <td>G00</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0019	G00	<p>شماره صفحه : ۳۵ از ۴۰</p>
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0019	G00											

POI	Document Title	Document Number	Transmittal Date	ROW
AFC	Material Flow Diagram - W007S	BK-W007S-PEDCO-110-PI-DG-0001	1401/10/06	68
IFA	P&ID - Gas Pipeline (to Siahmakan G.I. Station)	BK-PPL-PEDCO-320-PR-PI-0001	1401/10/06	69
IFA	Line List	BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0004	1401/10/06	70
IFA	Earthing Layout for Desalting Unit	BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0014	1401/10/06	71
IFA	Earthing Layout for Production Unit	BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0015	1401/10/06	72
IFI	PMR For Fuel Oil Storage Drum of Well Pads	BK-SSGRL-PEDCO-110-ME-MR-0001	1401/10/06	73
AFC	General Civil Layout -W035	BK-W035-PEDCO-110-CV-PY-0001	1401/10/06	74
IFI	PMR For Pipe Support - W028	BK-W028-PEDCO-110-PI-MR-0009	1401/10/06	75
AFC	Electrical Load List	BK-GNRAL-PEDCO-220-EL-LI-0001	1401/10/06	76
AFC	P&ID - Condensate Pipeline (to Binak PU)	BK-PPL-PEDCO-320-PR-PI-0002	1401/10/06	77
IFI	PMR For Control System/Console/Furniture	BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0001	1401/10/06	78
IFI	PMR For ESD System	BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0002	1401/10/06	79
IFI	MTO For Bolt & Nuts - Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-PI-MT-0012	1401/10/06	80
IFI	TBE For Fitting	BK-GCS-PEDCO-120-PI-TB-0002	1401/10/06	81
IFI	TBE For Flanges	BK-GCS-PEDCO-120-PI-TB-0003	1401/10/06	82
IFA	Site Visit Report - Manifold Extension	BK-W007S-PEDCO-110-SU-RT-0001	1401/10/06	83
IFA	General Civil Layout -W028	BK-W028-PEDCO-110-CV-PY-0001	1401/10/06	84
IFA	Rough Grading Plans -W035	BK-W035-PEDCO-110-CV-DW-0001	1401/10/06	85
AFC	I/O List For Control System	BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0002	1401/10/06	86
IFI	Typical Instrument Installation Drawing - Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-IN-DW-0001	1401/10/10	87
IFI	Instrument Earthing Typical Diagram	BK-PPL-PEDCO-320-IN-DG-0001	1401/10/10	88
IFA	LV Switchgear/MCC Expansion SLD - Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-EL-SL-0001	1401/10/10	89
IFC	HVAC Calculation Note For Security Building - BK14	BK-BK14-PEDCO-110-HV-CN-0002	1401/10/10	90

 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض</p> <p>عمومی و مشترک</p>																	
<p>شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴</p>	<p>MONTHLY PROGRESS REPORT # 19</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادرکننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GNRAL</td> <td>PEDCO</td> <td>000</td> <td>GE</td> <td>RT</td> <td>0019</td> <td>G00</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0019	G00	<p>شماره صفحه : ۳۶ از ۴۰</p>
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0019	G00											

POI	Document Title	Document Number	Transmittal Date	ROW
IFC	HVAC System Layout For Security Building - BK14	BK-BK14-PEDCO-110-HV-PY-0002	1401/10/10	91
IFC	Plumbing & Sewage Piping Layout For Security Building - BK14	BK-BK14-PEDCO-110-HV-PY-0004	1401/10/10	92
IFA	ESD Level Hierarchy	BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0003	1401/10/10	93
IFA	ESD Philosophy	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PH-0005	1401/10/11	94
IFA	ESD Philosophy	BK-SSGRL-PEDCO-110-PR-PH-0005	1401/10/11	95
IFA	Symbol & Legend For PFD and P&ID	BK-PPL-PEDCO-320-PR-PI-0003	1401/10/11	96
IFA	Control Philosophy	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PH-0002	1401/10/11	97
IFA	ESD Block Diagram	BK-GCS-PEDCO-120-PR-BD-0001	1401/10/11	98
IFA	Calculation Note For Lighting System of Well Pads Switchgear Building	BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0002	1401/10/11	99
IFA	Lighting & Small Power Layout For Switchgear Building of Well Pads	BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY-0004	1401/10/11	100
IFI	TBE For Pipes - W018S	BK-W018S-PEDCO-110-PI-TB-0001	1401/10/11	101
IFI	TBE For Pipes - W028	BK-W028-PEDCO-110-PI-TB-0001	1401/10/11	102
AFC	ESD Philosophy	BK-PPL-PEDCO-320-PR-PH-0005	1401/10/11	103
AFC	Process Data Sheets For Instrument Devices - W018S	BK-W018S-PEDCO-110-PR-DT-0001	1401/10/12	104
AFC	Process Data Sheets For Instrument Devices - W028	BK-W028-PEDCO-110-PR-DT-0001	1401/10/12	105
AFC	Process Data Sheets For Instrument Devices - W046S	BK-W046S-PEDCO-110-PR-DT-0001	1401/10/12	106
AFC	Process Data Sheets For Instrument Devices - W035	BK-W035-PEDCO-110-PR-DT-0001	1401/10/12	107
AFC	Process Data Sheets For Instrument Devices - W008N	BK-W008N-PEDCO-110-PR-DT-0001	1401/10/12	108
IFA	Control Philosophy	BK-SSGRL-PEDCO-110-PR-PH-0002	1401/10/12	109
IFA	Relief Load Summary	BK-PPL-PEDCO-320-PR-LI-0003	1401/10/12	110
IFA	Emission and Effluent Summary	BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0007	1401/10/12	111
IFA	Lighting & Small Power Layout For Security Building of Well Pads	BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY-0005	1401/10/12	112
AFD	Calculation Note For Lighting System of Well Pads Security Building	BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0003	1401/10/12	113

 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض</p> <p>عمومی و مشترک</p>	 																
<p>شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴</p>	<p>MONTHLY PROGRESS REPORT # 19</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادرکننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GNRAL</td> <td>PEDCO</td> <td>000</td> <td>GE</td> <td>RT</td> <td>0019</td> <td>G00</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0019	G00	<p>شماره صفحه: ۳۷ از ۴۰</p>
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0019	G00											

POI	Document Title	Document Number	Transmittal Date	ROW
IFA	Set Point & Alarm List	BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0006	1401/10/12	114
IFA	PDMS Model Review Report (60%) - W018S	BK-W018S-PEDCO-110-PI-RT-0001	1401/10/12	115
IFA	PDMS Model Review Report (30%) - Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-PI-RT-0001	1401/10/12	116
IFA	PDMS Model Review Report (30%)	BK-GCS-PEDCO-120-PI-RT-0003	1401/10/12	117
IFC	P&ID for Diesel Oil Drum	BK-SSGRL-PEDCO-110-PR-PI-0002	1401/10/12	118
IFC	P&ID for Potable Water Tank	BK-SSGRL-PEDCO-110-PR-PI-0003	1401/10/12	119
IFA	Calculation Note For Earthing & Lightning System	BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0006	1401/10/13	120
IFA	Process Data Sheets For Instrument Devices - W007S & Extension Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-PR-DT-0001	1401/10/13	121
IFA	Standard Drawing For Civil Underground Crossings	BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0008	1401/10/13	122
AFC	Master Document List (MDL) & Updating	BK-GNRAL-PEDCO-000-GE-DN-0001	1401/10/14	123
IFA	Plant Clean Water Drainage System Layout & Details	BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0004	1401/10/13	124
IFC	Road, Paving And Plant Finish Grading Layout & Sections	BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0005	1401/10/13	125
AFC	ESD Block Diagram - Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-PR-DG-0001	1401/10/14	126
IFI	Piping Support List - W028	BK-W028-PEDCO-110-PI-LI-0001	1401/10/14	127
AFD	Specification For Air Cooled Heat Exchangers	BK-GCS-PEDCO-120-ME-SP-0001	1401/10/17	128
IFA	Overall Earthing Layout	BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0001	1401/10/17	129
IFA	Data Sheets For WHCP/HPU - Wellheads	BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-DT-0001	1401/10/18	130
AFD	Specification For WHCP/HPU	BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-SP-0001	1401/10/18	131
IFA	Instrument Location Layout Drawing - W028	BK-W028-PEDCO-110-IN-PY-0001	1401/10/18	132
IFA	Instrument Location Layout Drawing - W046S	BK-W046S-PEDCO-110-IN-PY-0001	1401/10/18	133
AFC	Process Data Sheets For Slug Pumps	BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0020	1401/10/18	134
AFC	Process Data Sheets For Glycol Transfer Pumps	BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0021	1401/10/18	135
AFC	Process Data Sheets For Glycol Manual Pump	BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0022	1401/10/18	136

 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض</p> <p>عمومی و مشترک</p>																	
<p>شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴</p>	<p>MONTHLY PROGRESS REPORT # 19</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادرکننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GNRAL</td> <td>PEDCO</td> <td>000</td> <td>GE</td> <td>RT</td> <td>0019</td> <td>G00</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0019	G00	<p>شماره صفحه : ۳۸ از ۴۰</p>
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0019	G00											

POI	Document Title	Document Number	Transmittal Date	ROW
AFC	Process Data Sheets For Flare KO Drum Pumps	BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0025	1401/10/18	137
AFC	Process Data Sheets For Potable Water Pump	BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0026	1401/10/18	138
AFC	Process Data Sheets For Glycol Drain Pump	BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0028	1401/10/18	139
AFD	Calculation Note For Diesel Generator Sizing of Well Pads	BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0008	1401/10/18	140
IFC	Civil and Structural drawings -W035	BK-W035-PEDCO-110-CV-PY-0002	1401/10/18	141
IFC	General Civil Layout -W008N	BK-W008N-PEDCO-110-CV-PY-0001	1401/10/18	142
IFC	Pipe Supports Foundation Drawing For Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-ST-DW-0001	1401/10/18	143
IFC	Pipe Supports Structure Drawing For Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-ST-DW-0002	1401/10/18	144
AFC	Instrument Location Layout Drawing - W018S	BK-W018S-PEDCO-110-IN-PY-0001	1401/10/18	145
IFA	Single Line Diagram For LV Switchgear of Well Pads	BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-SL-0002	1401/10/18	146
IFC	Earthing & Lightning Layout - Extension of Binak B/C Manifold	BK-W007S-PEDCO-110-EL-PY-0004	1401/10/18	147
IFA	Calculation Note For Oily Contaminated Water Drainage Channels	BK-GCS-PEDCO-120-CV-CN-0003	1401/10/20	148
IFC	Calculation Note For Compressor Area Main Sleepers	BK-GCS-PEDCO-120-ST-CN-0014	1401/10/20	149
IFA	Process Flow Diagram (PFD)	BK-GCS-PEDCO-120-PR-PF-0001	1401/10/20	150
IFC	HVAC Calculation Note For Switchgear Building - BK14	BK-BK14-PEDCO-110-HV-CN-0001	1401/10/20	151
IFC	HVAC System Layout For Switchgear Building - BK14	BK-BK14-PEDCO-110-HV-PY-0001	1401/10/20	152
IFC	Plumbing & Sewage Piping Layout For Switchgear Building - BK14	BK-BK14-PEDCO-110-HV-PY-0003	1401/10/20	153

 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض</p> <p>عمومی و مشترک</p>																	
<p>شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴</p>	<p style="text-align: center;">MONTHLY PROGRESS REPORT # 19</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>پروژه</th> <th>بسته کاری</th> <th>صادرکننده</th> <th>تسهیلات</th> <th>رشته</th> <th>نوع مدرک</th> <th>سریال</th> <th>نسخه</th> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GNRAL</td> <td>PEDCO</td> <td>000</td> <td>GE</td> <td>RT</td> <td>0019</td> <td>G00</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0019	G00	<p>شماره صفحه : ۳۹ از ۴۰</p>
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0019	G00											

پیوست شماره سه: جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)

(در پیوست)

 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض</p> <p>عمومی و مشترک</p>																	
<p>شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴</p>	<p style="text-align: center;">MONTHLY PROGRESS REPORT # 19</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادرکننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GNRAL</td> <td>PEDCO</td> <td>000</td> <td>GE</td> <td>RT</td> <td>0019</td> <td>G00</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0019	G00	<p>شماره صفحه : ۴۰ از ۴۰</p>
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0019	G00											

پیوست شماره چهار: عکسهای از عملیات اجرایی
(در پیوست)
