

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22							شماره صفحه : ۱ از ۳۴
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0022	G00

طرح نگهداشت و افزایش تولید ۲۷ مخزن

MONTHLY PROGRESS REPORT # 22

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک

G00	APR. 2023	IFI	M.Aref	M.Fakharian	M.Mehrshad	
Rev.	Date	Purpose of Issue/Status	Prepared by:	Checked by:	Approved by:	CLIENT Approval
Class: 3		CLIENT Doc. Number (F-Number): F0Z-707088				

Status:

IDC: Inter-Discipline Check
 IFC: Issued For Comment
 IFA: Issued For Approval
 AFD: Approved For Design
 AFC: Approved For Construction
 AFP: Approved For Purchase
 AFQ: Approved For Quotation
 IFI: Issued For Information
 AB-R: As-Built for CLIENT Review
 AB-A: As-Built –Approved

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت ملی پالایش و توزیع نفت ایران  HIRGAN ENERGY 	
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22							شماره صفحه : ۲ از ۳۴	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0022		G00

REVISION RECORD SHEET

PAGE	G00	G01	G02	G03	G04
1	X				
2	X				
3	X				
4	X				
5	X				
6	X				
7	X				
8	X				
9	X				
10	X				
11	X				
12	X				
13	X				
14	X				
15	X				
16	X				
17	X				
18	X				
19	X				
20	X				
21	X				
22	X				
23	X				
24	X				
25	X				
26	X				
27	X				
28	X				
29	X				
30	X				
31	X				
32	X				
33	X				
34	X				
35	X				
36	X				
37	X				
38	X				
39	X				
40	X				
41	X				
42	X				
43	X				
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					

PAGE	G00	G01	G02	G03	G04
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22							شماره صفحه : ۳ از ۳۴	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0022	G00	

فهرست مطالب

۱	مشخصات قراردادی پروژه.....	۴
۲	معرفی پروژه.....	۵
۳	گزارش مدیریتی پروژه.....	۸
۴	گزارش فعالیت‌های انجام شده.....	۹
۵	جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی/تحت الارض /سطح الارض).....	۱۲
۶	بخش کنترل پروژه.....	۱۳
۷	وضعیت مدارک مهندسی.....	۱۹
۸	بخش مالی پروژه.....	۲۰
۹	بخش تدارکات کالا.....	۲۱
۱۰	نمودار سازمانی پیمانکار.....	۲۲
۱۱	مکاتبات با کارفرما.....	۲۴
۱۲	مشکلات و موانع.....	۲۹
۱۳	موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت.....	۳۰
۱۴	بخش کنترل پروژه.....	۳۱
۱۵	ضمائم.....	۳۲

* گزارش ترنس میتال لیست به پیوست می باشد.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22							شماره صفحه : ۴ از ۳۴	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0022	G00	

۱ مشخصات قراردادی پروژه

نام پروژه:

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک/ بخش سطح الارض و ابنیه تحت الارض

کارفرمای اصلی:

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
اهواز، کوی فداییان اسلام، ساختمان ۵ طبقه/ تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

مجری و نماینده کارفرمای اصلی:

علیرضا محمدی خواه (سرپرست طرح های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران)

کارفرما (پیمانکار عمومی):

شرکت توسعه پتروایران
تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

مدیر پروژه و نماینده کارفرما (پیمانکار عمومی):
منصور مهرشاد

پیمانکار EPC:

مشارکت “هیرگان انرژی- طرح و بازرسی”
تهران، اتوبان همت- خیابان شیراز جنوبی- کوچه یاس - پلاک ۱۳

مدیر پروژه و نماینده پیمانکار:

محمد فخاریان

تاریخ شروع پروژه:

۱۴۰۰/۰۴/۰۲

تاریخ پایان پروژه:

۱۴۰۲/۰۴/۰۱

شماره قرارداد:

BK-00-CO-0001

شماره پروژه (در سیستم کارفرمای اصلی):

۹۷۱۰۲۰

مبلغ پیمان (یورو):

۳۵،۹۰۹،۸۸۰ یورو

مدت پیمان:

۲۴ ماه

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22							شماره صفحه : ۵ از ۳۴
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0022	G00

۲ معرفی پروژه


میدان نفتی بینک از میدانی نفتی ایران است که در استان بوشهر، در فاصله ۲۰ کیلومتری از شمال بندر گناوه و در ساحل خلیج فارس مستقر می باشد. این میدان از شمال با میدان نفتی گلخاری، میدان نفتی بی بی حکیمه و میدان نفتی سیاهمکان و از جنوب با میدان نفتی خارگ، در دریا هم جوار است. حجم ذخیره در جای نفت خام این میدان در حدود ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون بشکه برآورد می شود. میدان نفتی بینک در افق آسماری دارای ابعادی به طول ۴۲ کیلومتر و عرض متوسط ۶ کیلومتر است. سازندهای آسماری و جهرم این میدان به دلیل ارتباط فشاری مناسب، به عنوان یک مخزن واحد محسوب می شوند.

تاسیسات سرچاهی مربوط به ۶ حلقه چاه توسعه ای (که ۲ حلقه از این ۶ حلقه نیاز به برق رسانی و دیگر تسهیلات مرتبط جهت مصارف پمپ درون چاهی می باشد) و انجام اصلاحات در ۴ حلقه چاه تعمیری موجود (به همراه برق رسانی جهت مصارف پمپ درون چاهی و دیگر تسهیلات مورد نیاز) در دستور کار این طرح قرار دارد. آب مورد نیاز حفاری چاه ها می بایست از طریق تانکر (یا خط لوله موقت) از دره گپ گناوه/خلیج فارس تامین گردد. ضمناً احداث ۶ خط لوله جریانی جدید از چاه های توسعه ای پیش گفته به مجموعه بوستر- کلاستر بینک و توسعه چندراهه موجود بوستر- کلاستر بینک جزو شرح کار این پروژه است.

با هدف افزایش تولید نفت از میدان بینک، افزایش ظرفیت ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (و احداث ردیف تراکم و مستحداثات مورد نیاز جدید) به میزان ۱۵ م ف م ر نیز جزو شرح کار این پروژه می باشد. همچنین احداث ۴۴ کیلومتر خط لوله ۸ اینچ انتقال گاز از ایستگاه تقویت فشار گاز بینک تا ایستگاه تزریق گاز سیاهمکان و ۵،۲ کیلومتر خط لوله ۴ اینچ انتقال مایعات گازی از ایستگاه تقویت فشار گاز بینک به واحد بهره برداری بینک نیز در تعهد پیمانکار می باشد.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پیمانکاری 
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22							شماره صفحه: ۶ از ۳۴
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0022	G00

کلیات توضیحات فوق الذکر شرح کار در شماتیک زیر ارائه شده است.

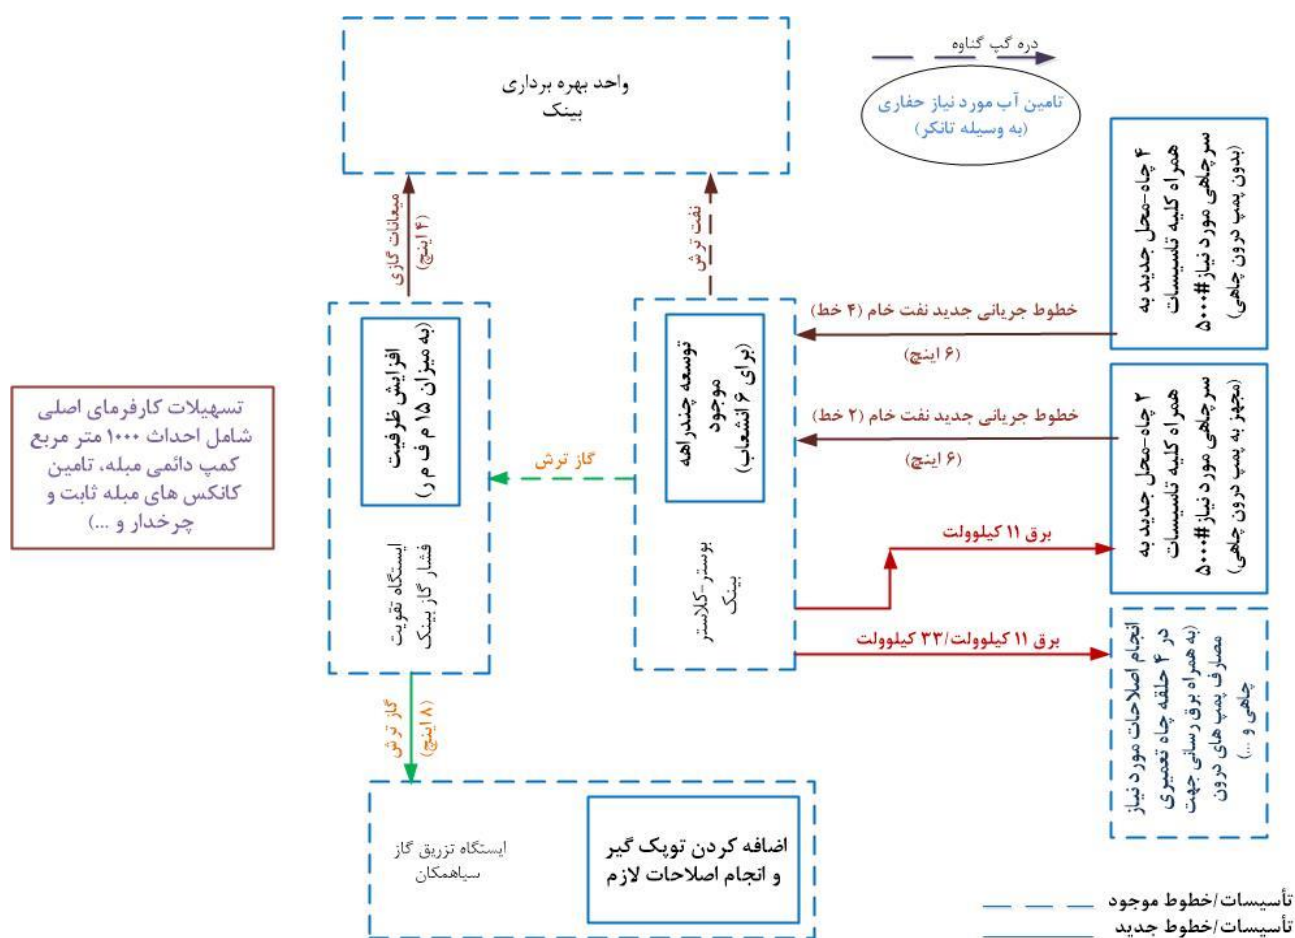

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																	
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22 <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GNRAL</td><td>HD</td><td>000</td><td>GE</td><td>RT</td><td>0022</td><td>G00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0022	G00	شماره صفحه: ۷ از ۳۴
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0022	G00											

S/L	Well Name/Location	Reservoir
1	W 008 N	Asmari
2	W 018 S	Asmari
3	W 046 S	Bangestan
4	W028	Bangestan
5	W 035	Bangestan
6	W 007 S	Bangestan
7	Well 14	Bangestan
8	Well 12	Bangestan
9	Well 15	Bangestan
10	Well 05	Bangestan


 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22							شماره صفحه : ۸ از ۳۴	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0022	G00	

۳ گزارش مدیریتی پروژه

۳-۱ گزارش مدیریتی و جدول میزان پیشرفت کل پروژه

جدول پیشرفت پروژه در بخش ۵ ارائه شده است.

۳-۲ نمودار پیشرفت کل پروژه

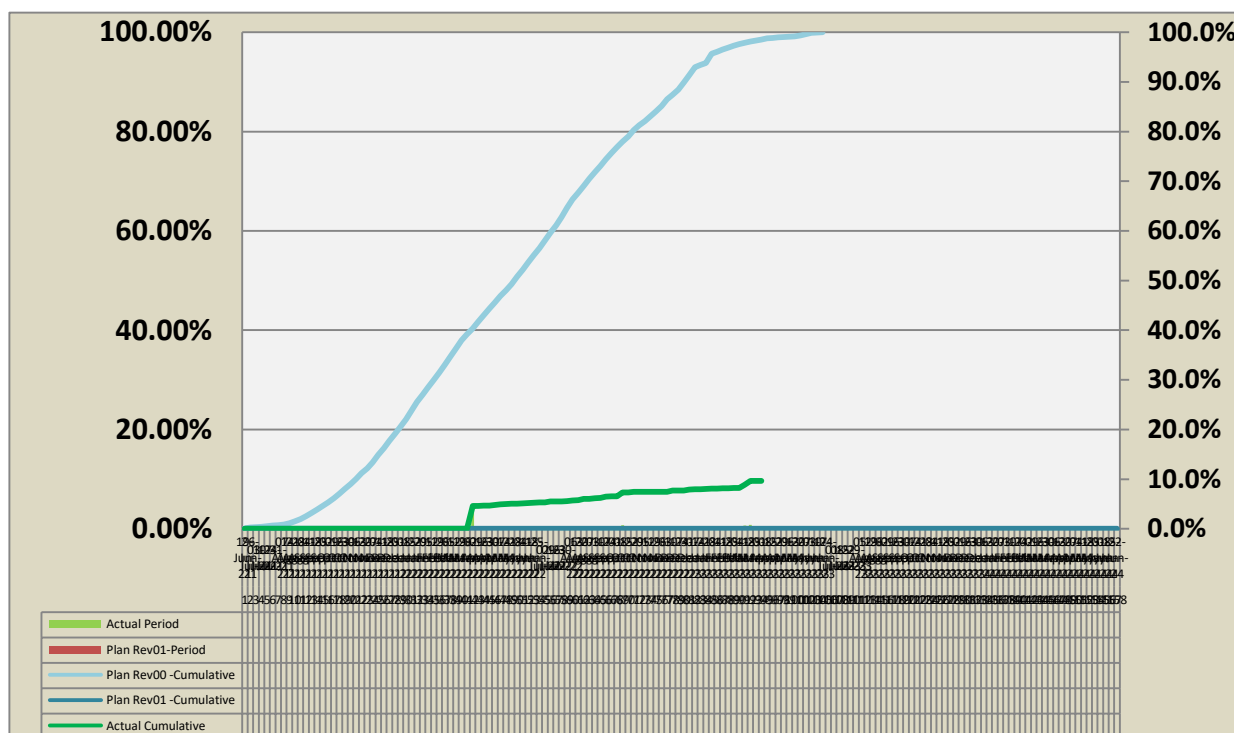

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22							شماره صفحه : ۹ از ۳۴
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0022	G00

۴ گزارش فعالیت‌های انجام شده

۴-۱ مدیریت پروژه /عمومی

- شرکت در جلسات هفتگی بررسی پیشرفت پروژه
- کنترل و نظارت مستمر بر حسن انجام ضبط و ربط محیط کار General Housekeeping طبق برنامه
- ارائه خدمات رفاهی به کارفرمای محترم بر اساس قرارداد

۴-۲ بخش مهندسی (E)

۴-۲-۱ مهندسی سطح الارض /ابنیه تحت الارض پروژه

- ارسال مدارک مهندسی مطابق برنامه زمانبندی پروژه
- بررسی و اصلاح مدارک براساس نظرات کارفرما
- ارسال نقشه های فونداسیون مربوط به اسلیپرهای کمپرسور
- ارسال PMRهای مربوط به DC Charger چاه ۰۰۷ و منیفولد مطابق برنامه زمانبندی
- ارسال مدرک دیتاشیت دیزل ژنراتور بسته ایستگاه مطابق نظرات کارفرما
- ارسال TBE های سیستم کنترل و ESD بسته منیفولد مطابق برنامه زمانبندی
- ارسال MTO های بخش پاپینگ لوکیشن ۰۳۵ مطابق برنامه زمانبندی
- ارسال مدرک PMR مربوط به دیزل ژنراتور مطابق برنامه زمانبندی
- ارسال MTO های بخش پاپینگ لوکیشن ۰۴۶ مطابق برنامه زمانبندی
- ارسال مدرک PMR مربوط به پکیج نیتروژن مطابق برنامه زمانبندی
- ارسال برخی PMR های بخش ابزار دقیق مطابق برنامه زمانبندی
- ارسال نسخه نهایی مدارک فونداسیون و سازه پایپ ساپورت بسته منیفولد
- ارسال نسخه نهایی مدرک Rough Grading بسته ایستگاه
- ارسال نقشه Plan & Profile لوکیشن ۰۴۶ مطابق برنامه زمانبندی
- ارسال مدرک PMR مربوط به F&G System بسته منیفولد مطابق برنامه زمانبندی
- ارسال مدرک TBE مربوط به پایپ ساپورت چاه ۰۲۸ مطابق برنامه زمانبندی

۴-۲-۲ مهندسی تحت الارض پروژه

- (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																	
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22 <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GNRAL</td><td>HD</td><td>000</td><td>GE</td><td>RT</td><td>0022</td><td>G00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0022	G00	شماره صفحه : ۱۰ از ۳۴
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0022	G00											

۳-۴ فعالیتهای مرتبط با کالای (P)

۱-۳-۴ کالای سطح الارض / ابنیه تحت الارض پروژه

- تامین بخشی از متریال بلوکه کمپرسورهای گاز GCS توسط سازنده
- نهایی سازی و مبادله قرارداد Pig Trap بسته خط لوله
- ارسال VOR مربوط به تغییرات (درخواستی کارفرما) بسته نمزدا در راستای نهایی سازی قرارداد مربوطه
- ارسال VOR مربوط به تغییرات مخازن تحت فشار GCS
- ارسال VOR مربوط به تغییر ضخامت لوله ۴ اینچ خط آتش در راستای اخذ تاییدیه نهایی کارفرما
- پیگیری تخصیص ارز لوله های ۴ و ۶ اینچ فلولاین
- پیگیری عقد قرارداد فلنج های سر چاهی
- پیگیری عقد قرارداد اتصالات سر چاهی
- پیگیری عقد قرارداد شیرآلات سر چاهی
- ارسال TBE سیستم های DCS و ESD منیفولد
- پیگیری تخصیص ارز لوله های ۴ و ۶ اینچ فلولاین
- پیگیری عقد قرارداد فلنج های سر چاهی
- پیگیری عقد قرارداد اتصالات سر چاهی
- پیگیری عقد قرارداد Pig Trap بسته خط لوله
- پیگیری عقد قرارداد شیرآلات سر چاهی
- ارسال TBE سیستم های DCS و ESD منیفولد

۲-۳-۴ کالای تحت الارض پروژه

- (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)

۴-۴ فعالیتهای اجرایی (C)

- اجرای دیوار های داخلی ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز (تجهیز کارگاه)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22							شماره صفحه : ۱۱ از ۳۴
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0022	G00

- رنگ آمیزی دیوار سوله انبار (تجهیز کارگاه)
- تسطیح و آماده سازی حوضچه های آب و گل چاه ۲۸ جهت نصب ژئوتکستایل و ژئوممبران
- حفاری کانال بالای دیواره Waste Pit چاه ۲۸ جهت نصب ژئوتکستایل و ژئوممبران
- آرماتوربندی ، کروم گیری و قالب بندی کف سوله انبار (تجهیز کارگاه)
- نصب و تست ژئوتکستایل و ژئوممبران Waste Pit چاه ۲۸
- حفاری کانال بالای دیواره Water Pool چاه ۲۸ جهت نصب ژئوتکستایل و ژئوممبران
- ساخت ساپورت لوله سوخت چاه ۲۸
- نصب و تست ژئوتکستایل و ژئوممبران Water Pool چاه ۲۸
- ساخت و نصب دریچه های CORAL PIT , OIL TRAP چاه ۲۸
- حفاری چاله جهت نصب ساپورت لوله سوخت چاه ۲۸
- نصب ساپورت لوله سوخت در چاه ۲۸
- نصب لوله درین سلر به Waste Pit در چاه ۲۸
- حفاری مسیر خط لوله سوخت به Burn Pit در چاه ۲۸
- ایجاد رمپ مناسب و Back fill به OBM در چاه ۲۸

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22							شماره صفحه: ۱۲ از ۳۴
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0022	G00

۵ جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی / سطح الارض)

BINAK OILFIELD DEVELOPMENT SURFACE WORK-PACKAGES BASED ON PACKAGES						
Code	Description	W.F. (Total)	Last Progress%	This Period	Up to now Progress%	Client Approval 1401/12/03
	Total Project	100.000%	8.84%	1.37%	10.21%	6.68%
1	GENERAL	5.32%	58.03%	1.34%	59.37%	43.67%
1-1	General	5.32%	58.03%	1.34%	59.37%	43.67%
2	SUB-Surface DEVELOPMENT	18.18%	10.21%	0.02%	10.22%	8.98%
2-1	Engineering	0.36%	50.45%	0.81%	51.26%	46.02%
2-2	Procurement	11.14%	3.74%	0.00%	3.74%	3.01%
2-3	Construction	6.68%	18.81%	0.00%	18.81%	16.92%
3	SURFACE DEVELOPMENT	76.49%	5.10%	1.69%	6.78%	3.55%
3-1	Engineering	2.37%	45.46%	0.15%	45.61%	39.21%
3-2	Procurement	59.19%	4.77%	2.17%	6.94%	3.02%
3-3	Construction	13.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3-4	Commissioning, Startup & Handover	1.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22							شماره صفحه: ۱۳ از ۳۴	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0022	G00	

۶ بخش کنترل پروژه

جدول میزان پیشرفت کل پروژه (عمومی / سطح الارض)

Description	W.F. (Disc)	W.F. (Total)	Roll-Up	Last Progress%	This Period	Up to now Progress%	Client Approval 1401/12/03
Total Project	100.000%	100.000%	100.00%	8.84%	1.37%	10.21%	6.68%
GENERAL	1.136%	1.136%	1.136%	58.030%	1.343%	59.37%	43.67%
Project Management	23.600%	0.268%	0.268%	56.942%	0.027%	56.97%	44.71%
Project Insurance	13.470%	0.153%	0.153%	90.662%	0.015%	90.68%	6.62%
Service to Company	35.400%	0.402%	0.402%	56.204%	2.092%	58.30%	45.55%
Training Courses	7.310%	0.083%	0.083%	0.000%	0.000%	0.00%	0.00%
GC Mobilization & Demobilization	20.220%	0.230%	0.230%	59.220%	0.582%	59.80%	55.15%
SUB-Surface DEVELOPMENT	52.342%	52.342%	52.338%	10.208%	0.016%	10.22%	8.98%
Package 01-New Well # W018S	5.210%	2.727%	2.723%	36.042%	0.002%	36.044%	34.152%
Package 02-New Well # W028 (Bangestan)	7.125%	3.729%	3.729%	38.655%	0.016%	38.671%	32.009%
Package 03-New Well # W046S (Bangestan)	33.462%	17.515%	17.515%	10.064%	0.015%	10.08%	8.91%
Package 04-New Well # W035 (Bangestan)	8.669%	4.538%	4.538%	12.146%	0.030%	12.18%	11.78%
Package 05-New Well # W008N	2.760%	1.445%	1.445%	5.856%	0.010%	5.87%	4.45%
Package 06-New Well # W007S/Manifold Extension (Bangestan)	12.934%	6.770%	6.770%	3.752%	0.022%	3.77%	3.18%
Package 07-Workover # 14	7.666%	4.013%	4.012%	4.076%	0.014%	4.09%	2.67%
Package 08-Workover # 12	6.237%	3.265%	3.264%	1.876%	0.017%	1.89%	1.81%
Package 09-Workover # 15	9.335%	4.886%	4.886%	1.311%	0.011%	1.32%	1.26%
Package 10-Workover # 05	6.602%	3.456%	3.456%	1.816%	0.016%	1.83%	1.65%
SURFACE DEVELOPMENT	46.522%	46.522%	46.522%	5.097%	1.687%	6.78%	3.55%
Package 11- EPC Pipeline 8" & 4"	15.529%	7.224%	7.224%	2.805%	0.002%	2.81%	1.21%
Package 12- EPC # Compressor Station	84.471%	39.298%	39.298%	5.673%	2.110%	7.78%	4.14%


 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22							شماره صفحه : ۱۴ از ۳۴
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0022	G00

ضرایب وزنی فعالیت ها (W-F) (عمومی / سطح الارض) :

Cde	Description	W.F.(Discp.)	WF.(Total)
		100.00%	100.000%
1	GENERAL	5.32%	5.32%
1-1	Project Management	100.00%	5.32%
2	SUB-Surface DEVELOPMENT	18.18%	18.18%
2-1	Engineering	1.99%	0.36%
2-2	Procurement	61.26%	11.14%
2-3	Construction	36.75%	6.68%
3	SURFACE DEVELOPMENT	76.49%	76.49%
3-1	Engineering	3.09%	2.37%
3-2	Procurement	77.39%	59.19%
3-3	Construction	18.20%	13.92%
3-4	Commissioning, Startup & Handover	1.3%	1.01%


 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22							شماره صفحه : ۱۵ از ۳۴
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0022	G00

نمودار پیشرفت بخش عمومی

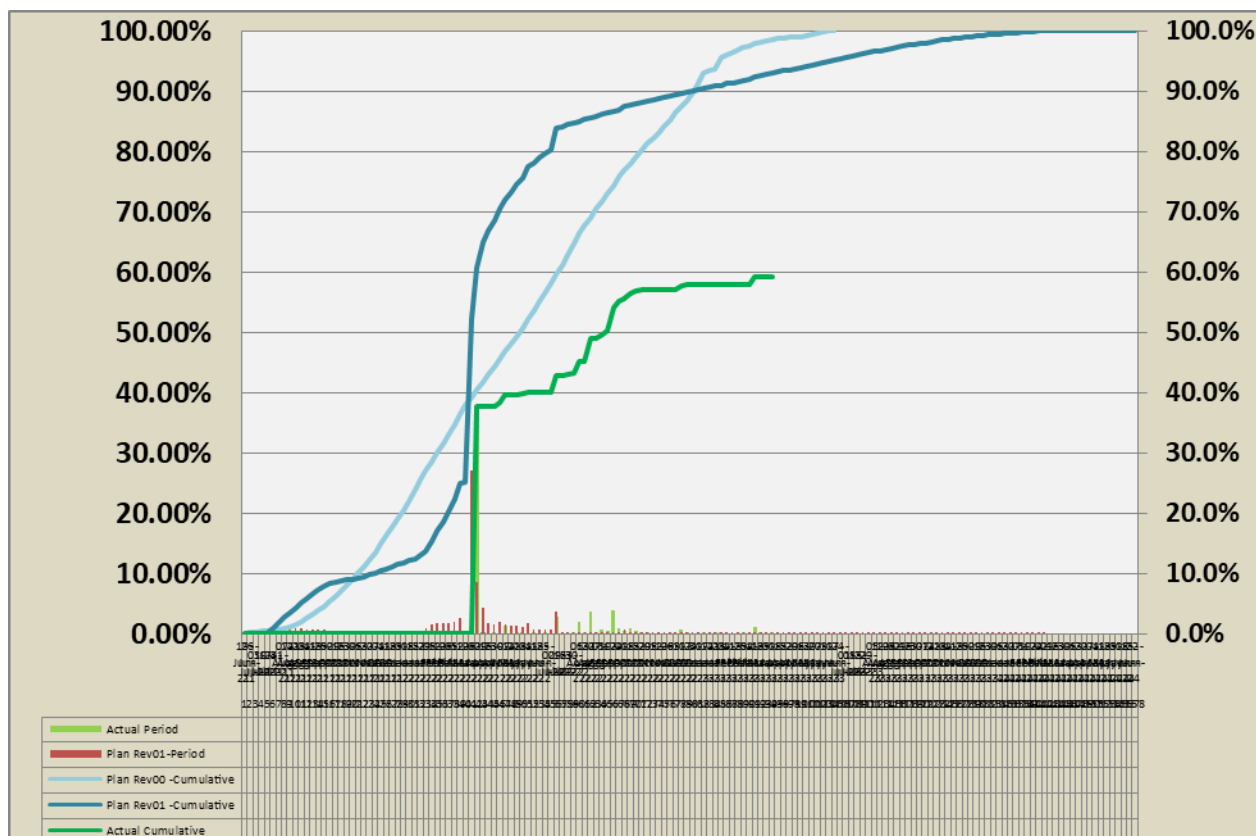


 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پیمانکاری 
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22							شماره صفحه : ۱۶ از ۳۴
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0022	G00

نمودار پیشرفت بخش ابنیه تحت الارض

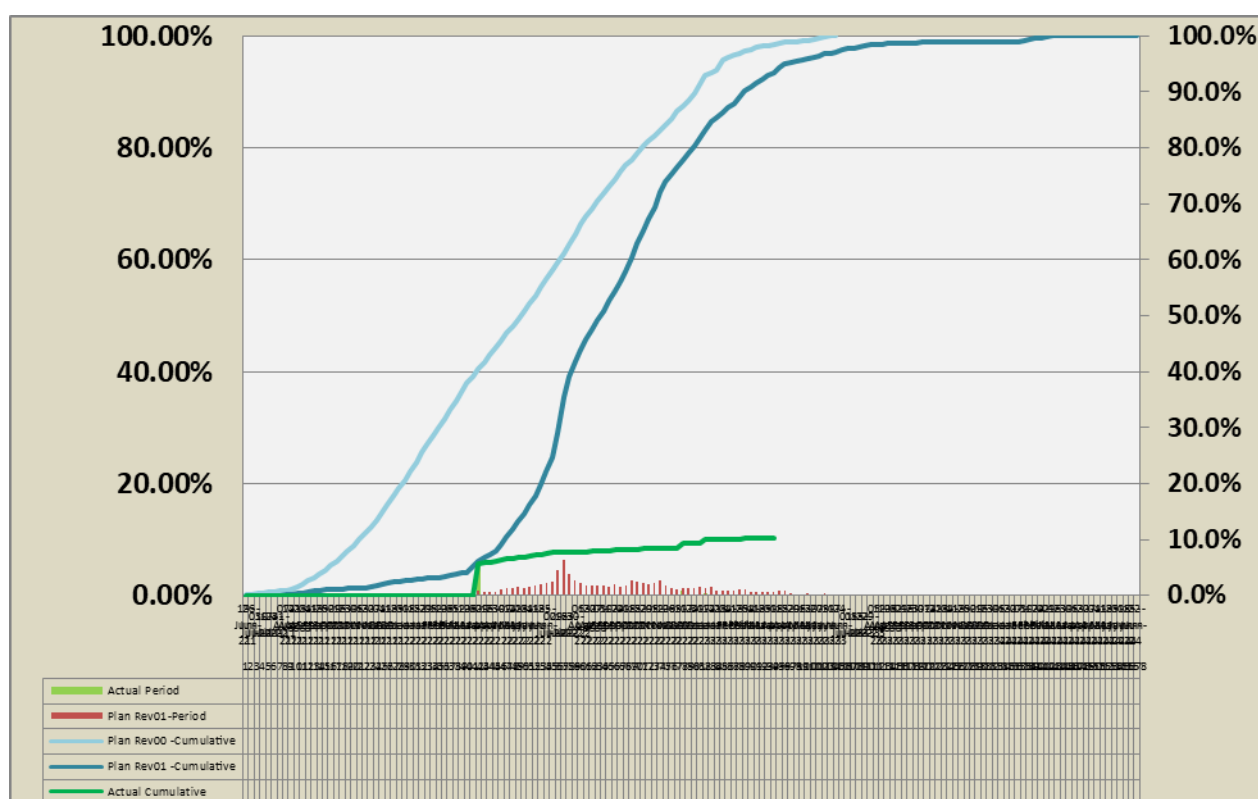

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								 شرکت توسعه و پیمانکاری 
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22								شماره صفحه: ۱۷ از ۳۴
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0022	G00	


نمودار پیشرفت بخش سطح الارض

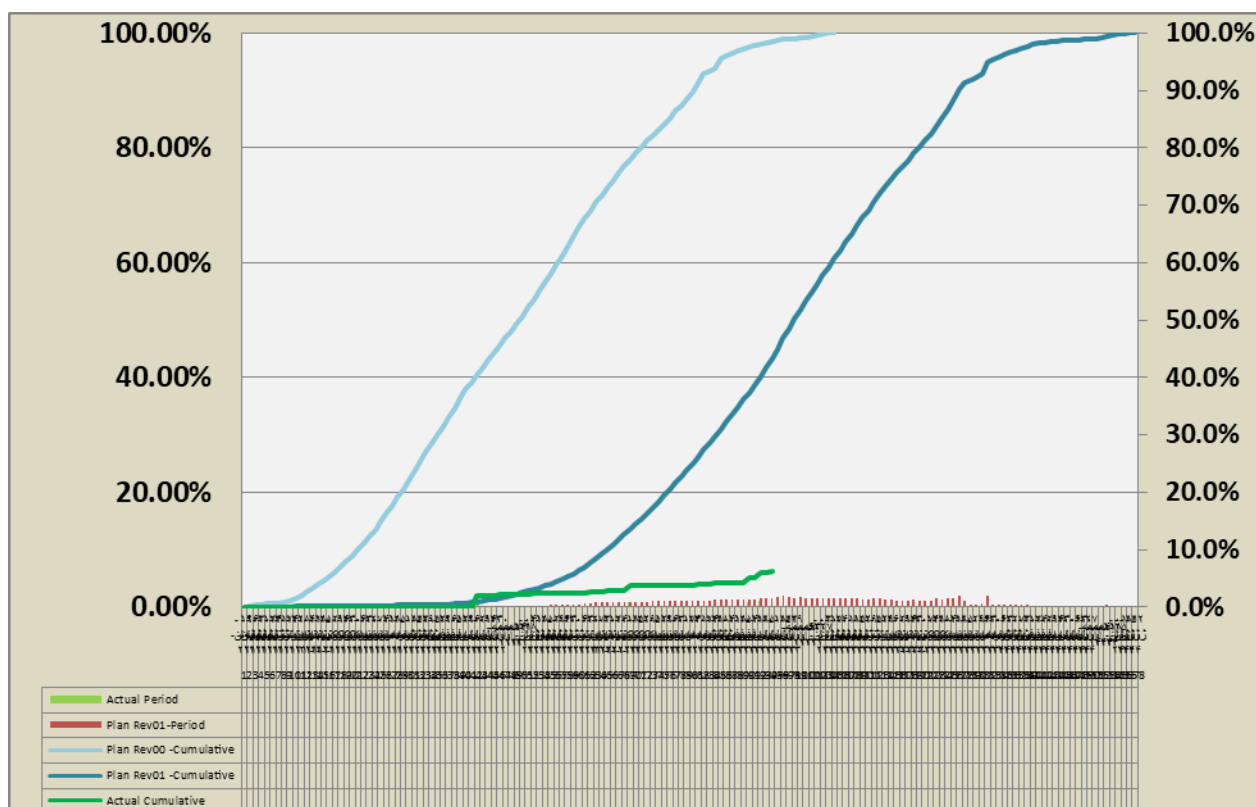

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22							شماره صفحه : ۱۸ از ۳۴
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0022	G00

جدول و نمودار پیشرفت EPC :

	W.F.	Progress%
Total Project	100%	10.21%
Engineering	2.73%	46.36%
Procurement	70.33%	6.44%
Construction	20.60%	6.10%
Commissioning, Startup & Handover	1.01%	0.0%
Project Management	5.32%	59.37%

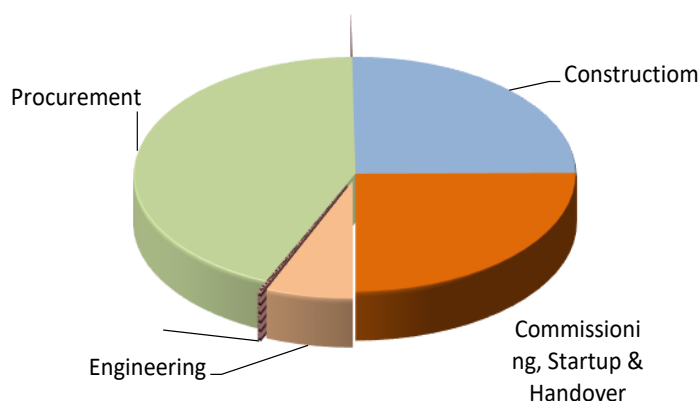

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت ملی پالایش و توزیع نفت ایران  HIRGAN ENERGY 	
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22							شماره صفحه : ۱۹ از ۳۴	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0022		G00

۷ وضعیت مدارک مهندسی

		گزارش آخرین وضعیت مدارک مهندسی																			
		PM	PR	ME	HV	PI	PL	IN	SA	EL	TE	CV	AR	ST	GE	GT	QC	TP	SU	CO	
کل مدارک	Proj. Management	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	31
	Common	-	11	11	8	28	32	25	17	75	8	28	11	26	39	1	44	0	0	0	364
	WELLHEAD FACILITIES	0	43	8	60	235	42	126	64	206	0	80	30	126	40	10	0	0	12	10	1092
	PIPELINE	0	19	4	0	22	22	58	5	24	0	3	0	2	7	2	0	0	4	1	173
	GCS	0	90	72	18	60	0	114	32	96	29	12	12	111	8	2	0	0	1	1	658
Total Doc		30	163	95	86	345	96	323	118	401	37	123	53	265	95	15	44	0	17	12	2318
تعداد کل مدارک ارسال شده	IFI	4	0	21	0	92	22	84	25	64	0	7	0	2	44	3	0	0	0	0	368
	IFC	10	4	3	15	22	2	24	10	21	1	8	13	15	6	3	15	0	5	0	177
	IFA	6	80	29	9	27	7	71	19	81	3	18	20	6	1	6	3	0	2	0	388
	AFC/AFD	30	64	22	5	26	20	35	31	26	18	31	9	28	6	2	1	0	4	0	358
Total Isu		50	148	75	29	167	51	214	85	192	22	64	42	51	57	14	19	0	11	0	1291
تعداد کل مدارک ارسال شده در دوره	IFI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	IFC	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3
	IFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	AFC/AFD	2	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض

عمومی و مشترک



شماره پیمان:

۹۱۸۴ - ۰۷۳ - ۰۵۳

MONTHLY PROGRESS REPORT # 22

نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه
G00	0022	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK

شماره صفحه : ۲۰ از ۳۴

۸ بخش مالی پروژه

آخرین وضعیت	تاریخ رسید وجه	پیشرفت مالی نسبت به وزن	پیشرفت مالی / ۱۰۰٪	صورت وضعیت تایید شده	صورت وضعیت کل (ارائه شده/پروژه)	صورت وضعیت به پیمانکار - ریال	پرداخت پیش پرداخت شده به کارفرما - ریال	مبلغ پیمان	واحد	روز	بخش اصلی / الحاقیه ۱	شرح فعالیت
پرداخت شده	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۷۱۸,۱۹۷	۱۲۰,۰۰۰/۶۰۳	۱۷۷,۹۸۸,۷۵۶,۶۱۷	۳۵,۹۰۹,۸۸۰	-	-	اصلی	پیش پرداخت
پرداخت شده	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۳۰۰٪	۱,۰۷۷,۳۹۶	۱۴۰,۰۰۰/۹/۱۵	۲۸۰,۵۷۶,۶۶۰,۸۱۸	۳۵,۹۰۹,۸۸۰	-	-	اصلی	قسط دوم پیش پرداخت (۳٪ مبلغ پیمان)
عدم تایید				۱۳,۸۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰/۹/۲۱	-	۹۸۰,۰۰۰	-	-	اصلی	برآورد کارکرد (WPA) بخش مهندسی (شده) (BK-HD-WPA-E-۰۰۰۱_G-۱) از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ الی ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
عدم تایید				۱۳,۶۷٪	۱۳,۹۳۴	۱۴۰,۰۰۰/۱۱/۲۳		۹۸۰,۰۰۰			اصلی	برآورد کارکرد (WPA) بخش مهندسی - شماره ۱ (به روز شده) (BK-HD-WPA-E-۰۰۰۱_G-۱)
تایید				۴,۶۲٪	۴۳,۰۰۰/۴۹	۱۴۰,۰۰۰/۹/۲۹		۹,۳۱۱,۸۶۰			اصلی	برآورد کارکرد (WPA) بخش های عمومی و اجرا - شماره ۱
تایید				۶,۹۲٪	۶۴۴,۳۳۳	۱۴۰,۰۰۰/۱۱/۱۹		۹,۳۱۱,۸۶۰			اصلی	برآورد کارکرد (WPA) بخش های عمومی و اجرا - شماره ۱ (به روز شده) از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ الی ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
بصورت الحساب و در چند قسط پرداخت شده				۱۷,۰۸٪	۱۶۷,۴۱۴	۱۴۰,۰۰۰/۱۲/۰۹		۹۸۰,۰۰۰			اصلی	صورت وضعیت شماره ۱ مهندسی (منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶)
بصورت الحساب و در چند قسط پرداخت شده				۴,۵۴٪	۴۲۳,۱۹۰	۱۴۰,۰۰۰/۱۲/۰۹		۹,۶۷۳,۶۱۳			اصلی	صورت وضعیت شماره ۱ عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸)
پرداختی						۱۴۰,۰۰۰/۱۲/۰۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				اصلی	دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت ۱ مهندسی و اجرا
تایید				۱۹,۱۵٪	۱۸۷,۶۷۰	۱۴۰,۰۰۰/۱۰/۱۶		۹۸۰,۰۰۰			اصلی	برآورد کارکرد (WPA) بخش مهندسی (منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹)
تایید				۹,۱۸٪	۸۸۷,۸۹۲	۱۴۰,۰۰۰/۱۰/۱۶		۹,۶۷۳,۶۱۳			اصلی	برآورد کارکرد (WPA) بخش مهندسی و اجرا (منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹)
پرداختی						۱۴۰,۰۰۰/۱۰/۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				اصلی	دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت ۱ مهندسی و اجرا
پرداختی						۱۴۰,۰۰۰/۱۰/۱۶	۶۰,۵۸۹,۴۴۰,۶۴۷				اصلی	دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت ۱ مهندسی و اجرا
پرداخت شده				۱۹,۱۵٪	۲۰,۲۵۶	۱۴۰,۰۰۰/۱۰/۲۴		۹۸۰,۰۰۰			اصلی	صورت وضعیت شماره ۲ مهندسی (منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴)
پرداخت شده				۶,۹۵٪	۲۴۸,۸۳۴	۱۴۰,۰۰۰/۱۰/۲۷		۹,۶۷۳,۶۱۳			اصلی	صورت وضعیت شماره ۲ عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴)
				۲۵,۷۶٪	۲۵۳,۴۵۲,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰/۱۰/۲۸		۹۸۰,۰۰۰			اصلی	برآورد کارکرد بخش مهندسی - شماره ۲ (BK-HD-WPA-E) (G-۰۰۰۰۰۰۳)
				۹,۴۰٪	۹۰,۹۴۷	۱۴۰,۰۰۰/۱۰/۲۹		۹,۶۷۳,۶۱۳			اصلی	برآورد کارکرد بخش های عمومی و اجرا - شماره ۳ (BK-HD) (WPA-C-۰۰۰۰۰۰۳_G-۰۰۰۰۰۰۳)
پرداخت شده				۲۵,۷۶٪	۲۵۳,۴۵۲	۱۴۰,۰۰۰/۱۰/۲۵		۹۸۰,۰۰۰			اصلی	صورت وضعیت شماره ۳ مهندسی (از ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ الی ۱۴۰۰/۱۰/۲۵)
پرداخت شده				۸,۹۳٪	۸۶۳,۸۶۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰/۱۰/۲۵		۹,۶۷۳,۶۱۳			اصلی	صورت وضعیت شماره ۳ عمومی و اجرا (از ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ الی ۱۴۰۰/۱۰/۲۵)
تایید جهت تهیه صورت وضعیت				۳۲,۴۰٪	۳۱۷,۵۷۴	۱۴۰,۰۰۰/۱۰/۲۴		۹۸۰,۰۰۰				برآورد کارکرد بخش مهندسی - شماره ۴ (BK-HD-WPA-E) (G-۰۰۰۰۰۰۳)
عدم تایید				۱۰,۶۲٪	۱۰,۲۷,۷۵۹	۱۴۰,۰۰۰/۱۰/۲۵		۹,۶۷۳,۶۱۳				برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی - شماره ۴ (BK) (HD-WPA-C-۰۰۰۰۰۰۴_G-۰۰۰۰۰۰۴)
تایید				۱۰,۶۲٪	۱۰,۲۷,۷۵۹	۱۴۰,۰۰۰/۱۰/۲۵		۹,۶۷۳,۶۱۳				برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی - شماره ۴ (BK) (HD-WPA-C-۰۰۰۰۰۰۴_G-۰۰۰۰۰۰۴)
پرداخت شده				۲۲,۴۰٪	۲۱۷,۵۷۴	۱۴۰,۰۰۰/۱۰/۲۹		۹۸۰,۰۰۰			اصلی	صورت وضعیت شماره ۴ مهندسی (از ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ الی ۱۴۰۰/۱۰/۲۹)
پرداخت شده				۹,۹۳٪	۹۵,۸۱۸	۱۴۰,۰۰۰/۱۰/۲۹		۹,۶۷۳,۶۱۳			اصلی	صورت وضعیت شماره ۴ ساختمان و نصب و عمومی (از ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ الی ۱۴۰۰/۱۰/۲۹)
تایید				۳۸,۹۸٪		۱۴۰,۰۰۰/۱۰/۲۹		۹۸۰,۰۰۰				برآورد کارکرد بخش مهندسی - شماره ۵ (BK-HD-WPA-E) (G-۰۰۰۰۰۰۵)
تایید				۱۰,۷۰٪		۱۴۰,۰۰۰/۱۰/۲۹		۹,۶۷۳,۶۱۳				برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی - شماره ۵ (BK) (HD-WPA-C-۰۰۰۰۰۰۵_G-۰۰۰۰۰۰۵)
پرداخت شده				۳۸,۹۹٪	۳۸۲,۰۷۸	۱۴۰,۰۰۰/۱۰/۲۹		۹۸۰,۰۰۰			اصلی	صورت وضعیت شماره ۵ مهندسی (از ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ الی ۱۴۰۰/۱۰/۳۰)
پرداخت شده				۱۰,۲۷٪	۲۳,۳۴۱	۱۴۰,۰۰۰/۱۰/۲۹		۹,۶۷۳,۶۱۳			اصلی	صورت وضعیت شماره ۵ ساختمان و نصب و عمومی (از ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ الی ۱۴۰۰/۱۰/۳۰)
تایید				۴۱,۲۷٪		۱۴۰,۰۰۰/۱۰/۳۰		۹۸۰,۰۰۰				برآورد کارکرد بخش مهندسی - شماره ۶ (BK-HD-WPA-E) (G-۰۰۰۰۰۰۶)
تایید				۱۱,۶۵٪		۱۴۰,۰۰۰/۱۰/۳۰		۹,۶۷۳,۶۱۳				برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی - شماره ۶ (BK-HD-WPA-C-۰۰۰۰۰۰۶_G-۰۰۰۰۰۰۶)
پرداخت شده				۲۰,۶۷٪	۱۶,۵۲۴	۱۴۰,۰۰۰/۱۰/۳۰		۹۸۰,۰۰۰			اصلی	صورت وضعیت شماره ۶ مهندسی (از ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ الی ۱۴۰۰/۱۰/۳۱)
پرداخت شده				۱۱,۶۲٪	۱۳۱,۰۴۴	۱۴۰,۰۰۰/۱۰/۳۰		۹,۶۷۳,۶۱۳			اصلی	صورت وضعیت شماره ۶ ساختمان و نصب و عمومی (از ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ الی ۱۴۰۰/۱۰/۳۱)
تایید				۴۲,۸۱٪		۱۴۰,۰۰۰/۱۰/۳۱		۹۸۰,۰۰۰				برآورد کارکرد بخش مهندسی - شماره ۷ (BK-HD-WPA-E) (G-۰۰۰۰۰۰۷)
تایید				۱۱,۸۳٪		۱۴۰,۰۰۰/۱۰/۳۱		۹,۶۷۳,۶۱۳				برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی - شماره ۷ (BK-HD-WPA-C-۰۰۰۰۰۰۷_G-۰۰۰۰۰۰۷)
پرداخت شده				۴۲,۷۸٪	۲۰,۶۹۴	۱۴۰,۰۰۰/۱۰/۳۱		۹۸۰,۰۰۰			اصلی	صورت وضعیت شماره ۷ مهندسی (از ۱۴۰۰/۱۰/۳۱ الی ۱۴۰۰/۱۰/۳۲)
پرداخت شده				۱۱,۷۶٪	۱۳,۱۶۴	۱۴۰,۰۰۰/۱۰/۳۲		۹,۶۷۳,۶۱۳			اصلی	صورت وضعیت شماره ۷ ساختمان و نصب و عمومی (از ۱۴۰۰/۱۰/۳۱ الی ۱۴۰۰/۱۰/۳۲)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22							شماره صفحه : ۲۱ از ۳۴	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0022	G00	

۹ بخش تدارکات کالا



 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22							شماره صفحه : ۲۳ از ۳۴	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0022		G00

ردیف	عنوان شغل	آمار نیروی انسانی طی ماه گذشته																																		
ردیف	عنوان شغل	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	مجموع ماهیانه			
۱	مدیر سطح الارض	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۲	سرپرست سایت	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		
۳	ناظر فنی	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۳۵	
۴	ناظر ایمنی	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲۰	
۵	ناظر کالا	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱۹	
۶	حراست	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۳۸	
۷	متفرقه	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۵۷	
۸	مدیر پروژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۹	سرپرست کارگاه	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱۹	
۱۵		۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱۵	
۱۰	معاون کارگاه	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱۰
۱۱	کنترل پروژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲	پشتیبانی	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲۲
۱۳	مسئول ماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴	حراست	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۱۷۴	
۱۵	خدمات	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۴۳	
۱۶	کارمند امور اداری و حسابداری	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲۰	
۱۷	انبار دار	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲۲	
۱۸	بنا و بتن ریز	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲	
۱۹	HSE	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۴۸	
۲۰	QC	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱۲	
۲۱	تدارکات ومسئول تجهیز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲۲	ماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲۳	راننده دستگاه سنگین	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲۴	راننده وانت وسواری	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۴۰	
۲۵	مبایشر عملیات خاکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲۶	آشپز	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲۶	
۲۷	کارگر ساده	۴	۳	۳	۳	۳	۶	۶	۶	۰	۶	۹	۹	۳	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳	۳	۴	۴	۴	۸۲
۲۸	آرماتور بند	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۰	۳	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱	
۲۹	قالب بند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳۰	جوشکار و کمک جوشکار	۱	۱	۱	۳	۳	۳	۳	۳	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	
۳۱	کمپاس و آبدارچی	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۴۳	
۳۲	راننده تراکتور	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲۳	
۳۳	مکانیک وژنراتور من	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲۴	
۳۴	آزمایشگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳۵	اکیب گمانه زنی	۰	۰	۰	۰																															

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22							شماره صفحه : ۲۴ از ۳۴
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0022	G00

۱۱ مکاتبات با کارفرما

۱-۱۱ مکاتبات وارده از کارفرما :

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
۱	جمع آوری بخارات خروجی از Still Column	1401/12/21	25144
۲	تایید اجرای دوره آموزشی خوردگی میکروبی و تسریع در پرداخت حق الزحمه	1401/12/21	25160
۳	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسسمیتال ها	1401/12/21	25163
۴	پاسخ به تغییر کاری افزایش ظرفیت مخازن ذخیره گازوئیل سر چاهی	1401/12/21	25165
۵	نتیجه بررسی گزارش هفتگی شماره ۹۰ (منتهی به تاریخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱)	1401/12/21	25196
۶	پیگیری اخذ تاییدیه تغییر کاری افزایش CA و ضخامت اقلام پایپینگ سر چاهی	1401/12/21	25197
۷	مدارک سازنده کمپرسورهای گاز(هوایار) ایستگاه تقویت فشار گاز WBS V00 Time Schedule&V01	1401/12/21	25199
۸	پیگیری اخذ بازخورد بر روی استاندارد طراحی STONE TRAP	1401/12/21	25201
۹	پیگیری اخذ بازخورد بر روی مدارک TBE For Sampling Connection D00 W018,028	1401/12/21	25222
۱۰	پاسخ به نظرات کارفرمای محترم در خصوص مدرک PPL:TBE For Line (Pipe(D01	1401/12/21	25217
۱۱	مهندسی ارزش - تبیین نحوه تخصیص پاداش پیمانکار از صرفه جویی های کارفرما	1401/12/21	25264
۱۲	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسسمیتال ها	1401/12/23	25332
۱۳	مدارک سازنده کمپرسورهای گاز	1401/12/24	25485
۱۴	مدارک سازنده کمپرسورهای گاز ID-V00&P	1401/12/24	25497
۱۵	درخواست کتابچه های نهایی و مدارک مکانیکال ایستگاه موجود تقویت فشار گاز	1401/12/28	25653
۱۶	پاسخ به درخواست تایید نهایی داده برگ ویرایش پنجم D05 پمپ گازوئیل GCS	1401/12/28	25654
۱۷	پاسخ به اقلام مورد نیاز اصلاحات پایپینگ اولیه در توسعه کلاستر بینک	1401/12/28	25657
۱۸	سایبان کمپرسورهای گازی GCS طرح مدنظر کارفرمای اصلی محترم	1401/12/28	25658
۱۹	نقطه نظرات تکمیلی مربوط مدارک سازنده کمپرسورهای ایستگاه تقویت فشار گاز بینک	1401/12/28	25659

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22							شماره صفحه : ۲۵ از ۳۴
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0022	G00

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
۲۰	پاسخ به اقلام مورد نیاز اصلاحات پایپینگ اولیه در توسعه کلاستر بینک (اصلاحیه)	1401/12/28	25694
۲۱	GCS-مدارک سازنده کمپرسورهای گاز هوایار VPIS V01	1401/12/28	25671
۲۲	پاسخ به نظرات جدید کارفرما در خصوص موقعیت جاده چاه W008S	1401/12/28	25676
۲۳	تذکر در خصوص ضرورت تکمیل کارهای باقیمانده در موقعیت چاه W028	1401/12/28	25667
۲۴	پاسخ به مدارک سازنده کمپرسورهای گاز(شرکت هوایار)WBS V018Time	1402/01/05	25
۲۵	ارائه ضمانتنامه بانکی جهت تضمین پیش پرداخت در بخش اول سفارش گذاری کالا	1402/01/06	51
۲۶	شفاف سازی در خصوص الزام بانک خازنی سر چاهی	1402/01/06	53
۲۷	پاسخ بررسی مدارک بازرسی شخص ثالث TPI ساخت کمپرسورهای گاز	1402/01/07	75
۲۸	تکمیل جدول اضافه کاری های قرارداد فی مابین	1402/01/07	76
۲۹	احداث مسیر دسترسی مناسب به Disposal چاه W018S و تکمیل کارهای باقیمانده موقعیت چاه W028 و کارگاه مرکزی	1402/01/08	96
۳۰	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسسمیتال ها	1402/01/14	179
۳۱	پاسخ پیگیری اخذ بازخورد بر روی مدارک TBE For Sampling Connection	1402/01/16	317
۳۲	شفاف سازی در خصوص الزام بانک خازنی فشار ضعیف سر چاهی	1402/01/16	316
۳۳	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسسمیتال ها	1402/01/16	312
۳۴	نتیجه بررسی ترانسسمیتال ۱۷۶۲ شامل مدرک (MDL)&(D08)	1402/01/19	413
۳۵			
۳۶			
۳۷			
۳۸			
۳۹			
۴۰			
۴۱			
۴۲			
۴۳			

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22							شماره صفحه : ۲۶ از ۳۴	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0022	G00	

۲-۱۱ مکاتبات صادره به کارفرما :

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
۱	ارسال صورتجلسه مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۱ (تعیین تکلیف آماده سازی و تحویل WHCP ها - قرارداد مربوطه با شرکت سازنده؛ کاردانان شرق))	1401/12/23	0723
۲	اقدامات قابل انجام در تکمیل موقعیت چاه W028	1401/12/24	0724
۳	قرارداد کمپرسورهای گازی GCS؛ افزایش قیمت به علت عدم تادیه کامل پیش پرداخت	1401/12/24	0725
۴	پاسخ به نظرات مطروحه بر روی آنالیز تاخیرات در راستای تعدیل نرخ و اصلاح CBS مهندسی (پیش از نهایی سازی تعدیل کل پروژه)	1401/12/24	0726
۵	GCS - مدارک سازنده کمپرسورهای گاز (هوایار)؛ "VPIS_V01"	1401/12/24	0727
۶	ارسال گزارش هفتگی - مربوط به هفته ۹۱ پروژه (منتهی به تاریخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۱)	1401/12/24	0728
۷	پیگیری اضافه کاری منتج از اختصاصی سازی UCP ردیف های پکیج کمپرسور گاز GCS	1401/12/24	0729
۸	درخواست پرداخت مبلغ از حساب آن شرکت (مطالبات پیمانکاران دست دوم و حقوق بهمن ماه پرسنل این مشارکت)	1401/12/27	0730
۹	درخواست پرداخت مبلغ از حساب آن شرکت (پیش پرداخت کالای تاسیسات سرچاهی و توپک ران/توپک گیر)	1401/12/27	0731
۱۰	تغییر کاری #۱؛ پکیج نمزدای GCS - جمع آوری بخارات گلایکول و سیستم مستقل کنترل/ESD	1402/01/06	0732
۱۱	تغییر کاری #۲؛ GCS - ادغام ساختمان های کنترل جدید و موجود	1402/01/07	0733
۱۲	پیگیری درخواست مجوز، جهت نقشه برداری از محدوده داخل ایستگاه تزریق گاز سیاهمان	1402/01/07	0734
۱۳	درخواست ابلاغ کار اضافی "احداث جاده مستقل به Disposal Pit موقعیت چاه W018S	1402/01/08	0735
۱۴	پیگیری مجدد کتابچه های نهایی و مدارک مکانیکال ایستگاه موجود تقویت فشار گاز بینک	1402/01/08	0736
۱۵	تغییر کاری #۳؛ WHF - تغییر ضخامت لوله ۴ اینچ خط آتش چاه ها	1402/01/08	0737
۱۶	اصلاحات پایبستگی در توسعه کلاستر بینک - درخواست تامین مقطعی اقلام مورد نیاز از کارفرما	1402/01/09	0738
۱۷	سایبان کمپرسورهای گازی GCS - پوشش فضای خالی بین کمپرسورها	1402/01/09	0739
۱۸	بسته W007S ابهام در مسیر (پایه) فلولاین مربوطه - پیشنهاد مسیر جدید	1402/01/15	0740
۱۹	تغییر کاری #۴؛ GCS - تغییر ابعاد و فشار طراحی برخی از مخازن تحت فشار	1402/01/15	0741
۲۰	پیگیری اخذ بازخورد بر روی مدرک "مطالعات خوردگی (GCS D03)	1402/01/15	0742
۲۱	ارسال تجهیزات IT - (مربوط به تسهیلات مورد نیاز کارفرما)	1402/01/16	0743
۲۲	درخواست اصلاح درآمد مربوط به صورت وضعیت ۵ "ساختمان، نصب و عمومی"	1402/01/16	0744

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22							شماره صفحه : ۲۷ از ۳۴	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0022	G00	

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
۲۳	بسته W028؛ مدارک جوشکار خط آتش و WPS مربوطه	1402/01/16	0745
۲۴	(ارسال گزارش هفتگی - مربوط به هفته ۹۴ پروژه (منتهی به تاریخ ۱۶/۰۱/۱۴۰۲)	1402/01/16	0746
۲۵	GCS - ساخت کمپرسورهای گاز؛ بازرسین TPI (توضیحات تکمیلی)	1402/01/16	0747
۲۶	تست های هیدرواستاتیک و کارخانه ای (FAT) دو دستگاه پکیج WHCP سرچاهی	1402/01/19	0748
۲۷	ارسال تجهیزات IT (مربوط به تسهیلات مورد نیاز کارفرما)	1402/01/19	0749
۲۸			
۲۹			
۳۰			

۳-۱۱ لیست صورتجلسات پروژه

ردیف	عنوان صورت جلسه	تاریخ صورت جلسه	شماره صورت جلسه	ملاحظات
۱	صورتجلسه بررسی و تعیین تکلیف در خصوص تکمیل آماده سازی WHCP پروژه بینک-مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۱	1401/12/22		
۲				
۳				
۴				
۵				

۴-۱۱ لیست مکاتبات بدون پاسخ

ردیف	عنوان/خلاصه نامه	تاریخ نامه	شماره نامه	ملاحظات
۱	پاسخ به نظرات مطروحه بر روی آنالیز تاخیرات در راستای تعدیل نرخ و اصلاح CBS مهندسی (پیش از نهایی سازی تعدیل کل پروژه)	1401/12/24	0726	
۲	پیگیری اضافه کاری منتج از اختصاصی سازی UCP ردیف های پکیج کمپرسور گاز GCS	1401/12/24	0729	
۳	درخواست پرداخت مبلغ از حساب آن شرکت (مطالبات پیمانکاران دست دوم و حقوق بهمن ماه پرسنل این مشارکت)	1401/12/27	0730	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22							شماره صفحه : ۲۸ از ۳۴
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0022	G00

ردیف	عنوان/خلاصه نامه	تاریخ نامه	شماره نامه	ملاحظات
۴	درخواست پرداخت مبلغ از حساب آن شرکت (پیش پرداخت کالای تاسیسات سرچاهی و توپک ران/توپک گیر)	1401/12/27	0731	
۵	تغییر کاری #۱؛ پکیج نمودار GCS - جمع آوری بخارات گلایکول و سیستم مستقل کنترل/ESD	1402/01/06	0732	
۶	تغییر کاری #۲؛ GCS - ادغام ساختمان های کنترل جدید و موجود	1402/01/07	0733	
۷	درخواست ابللاغ کار اضافی "احداث جاده مستقل به Disposal Pit موقعیت چاه W018S"	1402/01/08	0735	
۸	پیگیری مجدد کتابچه های نهایی و مدارک مکانیکال ایستگاه موجود تقویت فشار گاز بینک	1402/01/08	0736	
۹	تغییر کاری #۳؛ WHF - تغییر ضخامت لوله ۴ اینچ خط آتش چاه ها	1402/01/08	0737	
۱۰	سایبان کمپرسورهای گازی GCS - پوشش فضای خالی بین کمپرسورها	1402/01/09	0739	
۱۱	بسته W007S/ابهام در مسیر (پایه) فلولاین مربوطه - پیشنهاد مسیر جدید	1402/01/15	0740	
۱۲	تغییر کاری #۴؛ GCS - تغییر ابعاد و فشار طراحی برخی از مخازن تحت فشار	1402/01/15	0741	
۱۳	پیگیری اخذ بازخورد بر روی مدرک "مطالعات خوردگی (GCS) D03"	1402/01/15	0742	
۱۴	درخواست اصلاح درآمد مربوط به صورت وضعیت ۵ "ساختمان، نصب و عمومی"	1402/01/16	0744	
۱۵	بسته W028؛ مدارک جوشکار خط آتش و WPS مربوطه	1402/01/16	0745	
۱۶	GCS - ساخت کمپرسورهای گاز؛ بازرسین TPI (توضیحات تکمیلی)	1402/01/16	0747	
۱۷	تست های هیدرواستاتیک و کارخانه ای (FAT) دو دستگاه پکیج WHCP سرچاهی	1402/01/19	0748	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																	
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22 <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GNRAL</td><td>PEDCO</td><td>000</td><td>GE</td><td>RT</td><td>0022</td><td>G00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0022	G00	شماره صفحه : ۲۹ از ۳۴
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0022	G00											

۱۲- مشکلات و موانع

- مشکلات مربوط به جذب نیرو و تکمیل چارت سازمانی پروژه با توجه به شرایط موجود
- عدم هماهنگی بین کامنتهای پترو ایران و کارفرمای اصلی.
- با توجه به عدم پرداخت مالی کامل پروژه و معوق ماندن درخواستهای مالی اعلام شده صورت وضعیت شماره ۷, ۵۶ و ۴ مهندسی ، صورت وضعیت شماره ۷ و ۵۶ و ۴ بخش عمومی و اجرا) موجب شده است جریان نقدینگی پروژه به شدت منفی شود .

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پارس  HIRGAN ENERGY 
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22							شماره صفحه : ۳۰ از ۳۴
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0022	G00

۱۳ موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت

- دریافت با تاخیر نظرات کارفرمای محترم بر روی مدارک ارسالی
- وجود برخی تناقضات در نظرات کارفرمایان (شرکت پتروایران و شرکت مناطق نفتخیز جنوب) درخصوص مدارک ارسالی
- تاخیر در نهایی سازی وضعیت طرح مدیریت پسماند چاه ها (توسط کارفرمای محترم) و بالتبع تاخیر در نهایی سازی نقشه ها و کندی پیشرفت کار اجرایی مربوطه
- تغییر برنامه استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و در نتیجه تغییر برنامه کلی پروژه
- نامشخص بودن تاریخ دقیق استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و در نتیجه متاثر شدن برنامه آماده سازی لوکیشن چاه ها و خرید اقلام مربوطه مورد نیاز
- عدم پرداخت کامل صورت وضعیت شماره ۴ مهندسی توسط کارفرمای محترم
- عدم پرداخت کامل صورت وضعیت شماره ۴ عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم
- عدم پرداخت کامل صورت وضعیت شماره ۵ مهندسی توسط کارفرمای محترم
- عدم پرداخت کامل صورت وضعیت شماره ۵ عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم
- عدم پرداخت صورت وضعیت شماره ۶ و ۷ مهندسی توسط کارفرمای محترم
- عدم پرداخت صورت وضعیت شماره ۶ و ۷ عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم
- محدودیت های ایجاد شده در تامین کالای ساخت داخل کشور و متعاقب آن سو استفاده برخی شرکت های لوله ساز داخلی و افزایش بی دلیل قیمت ها
- افزایش بی رویه کلیه قیمت های مهندسی، خرید و اجرا علیرغم عدم تغییر نرخ تسعیر ارز نیمایی

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																	
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22 <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GNRAL</td><td>PEDCO</td><td>000</td><td>GE</td><td>RT</td><td>0022</td><td>G00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0022	G00	شماره صفحه : ۳۱ از ۳۴
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0022	G00											

۱۴ بخش کنترل پروژه

- ۱-۱۴ برنامه زمان بندی پروژه
- ۲-۱۴ لیست مدارک ارسال شده طی دوره
- ۲-۱۴ لیست مدارک دارای تاخیر در پاسخ از سوی کارفرما
- ۳-۱۴ جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">MONTHLY PROGRESS REPORT # 22</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>G00</td><td>0022</td><td>RT</td><td>GE</td><td>000</td><td>PEDCO</td><td>GNRAL</td><td>BK</td></tr></table>	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	G00	0022	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK	شماره صفحه : ۳۲ از ۳۴
MONTHLY PROGRESS REPORT # 22																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
G00	0022	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK																			

۱۵ ضمائم

پیوست شماره یک: برنامه زمان بندی پروژه

پس از اعمال تغییرات و به روز رسانی برنامه ارائه خواهد شد.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">MONTHLY PROGRESS REPORT # 22</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>G00</td><td>0022</td><td>RT</td><td>GE</td><td>000</td><td>PEDCO</td><td>GNRAL</td><td>BK</td></tr></table>	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	G00	0022	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK	شماره صفحه : ۳۳ از ۳۴
MONTHLY PROGRESS REPORT # 22																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
G00	0022	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK																			

پیوست شماره دو : لیست مدارک ارسال شده طی دوره
(در پیوست)

پیوست شماره سه: جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)
(در پیوست)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22							شماره صفحه : ۳۴ از ۳۴
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0022	G00

پیوست شماره چهار: عکسهایی از عملیات اجرایی
(در پیوست)
