

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 23 <table border="1"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادر کننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GNRAL</td> <td>HD</td> <td>000</td> <td>GE</td> <td>RT</td> <td>0023</td> <td>G00</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0023	G00	شماره صفحه : 1 از 36
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0023	G00											

طرح نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن

MONTHLY PROGRESS REPORT # 23

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک

G00	MAY. 2023	IFI	M.Aref	M.Fakharian	A.M.MOHSENI	
Rev.	Date	Purpose of Issue/Status	Prepared by:	Checked by:	Approved by:	CLIENT Approval
Class: 3		CLIENT Doc. Number (F-Number): F0Z-707089				

Status:

IDC: Inter-Discipline Check
 IFC: Issued For Comment
 IFA: Issued For Approval
 AFD: Approved For Design
 AFC: Approved For Construction
 AFP: Approved For Purchase
 AFQ: Approved For Quotation
 IFI: Issued For Information
 AB-R: As-Built for CLIENT Review
 AB-A: As-Built –Approved

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 23 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادر کننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GNRAL</td> <td>HD</td> <td>000</td> <td>GE</td> <td>RT</td> <td>0023</td> <td>G00</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0023	G00	شماره صفحه : 2 از 36
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0023	G00											

REVISION RECORD SHEET

PAGE	G00	G01	G02	G03	G04
1	X				
2	X				
3	X				
4	X				
5	X				
6	X				
7	X				
8	X				
9	X				
10	X				
11	X				
12	X				
13	X				
14	X				
15	X				
16	X				
17	X				
18	X				
19	X				
20	X				
21	X				
22	X				
23	X				
24	X				
25	X				
26	X				
27	X				
28	X				
29	X				
30	X				
31	X				
32	X				
33	X				
34	X				
35	X				
36	X				
37	X				
38	X				
39	X				
40	X				
41	X				
42	X				
43	X				
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					

PAGE	G00	G01	G02	G03	G04
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 23							شماره صفحه : 3 از 36	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0023		G00

فهرست مطالب

1	مشخصات قراردادی پروژه.....	4
2	معرفی پروژه.....	5
3	گزارش مدیریتی پروژه.....	8
4	گزارش فعالیت‌های انجام شده.....	9
5	جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی/تحت الارض /سطح الارض).....	13
6	بخش کنترل پروژه.....	14
7	وضعیت مدارک مهندسی.....	20
8	بخش مالی پروژه.....	21
9	بخش تدارکات کالا.....	22
10	نمودار سازمانی پیمانکار.....	23
11	مکاتبات با کارفرما.....	25
12	مشکلات و موانع.....	31
13	موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت.....	32
14	بخش کنترل پروژه.....	33
15	ضمائم.....	34

* گزارش ترنسیتال لیست به پیوست می باشد.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 23							شماره صفحه : 4 از 36	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0023		G00

۱ مشخصات قراردادی پروژه

نام پروژه:

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک/ بخش سطح الارض و ابنیه
تحت الارض

کارفرمای اصلی:

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
اهواز، کوی فداییان اسلام، ساختمان 5 طبقه/ تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع
تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

مجری و نماینده کارفرمای اصلی:

علیرضا محمدی خواه (سرپرست طرح های نگهداشت و افزایش تولید
ناحیه گچساران)

کارفرما (پیمانکار عمومی):

شرکت توسعه پتروایران
تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

مدیر پروژه و نماینده کارفرما (پیمانکار
عمومی):

مشارکت "هیروگان انرژی- طرح و بازرسی"
تهران، اتوبان همت- خیابان شیراز جنوبی- کوچه یاس - پلاک 13

پیمانکار EPC:

مدیر پروژه و نماینده پیمانکار:

محمد فخاریان

تاریخ شروع پروژه:

1400/04/02

تاریخ پایان پروژه:

1402/04/01

شماره قرارداد:

BK-00-CO-0001

شماره پروژه (در سیستم کارفرمای اصلی):

971020

مبلغ پیمان (یورو):

35,909,880 یورو

مدت پیمان:

24 ماه

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	<table><tr><th colspan="8">MONTHLY PROGRESS REPORT # 23</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادر کننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>G00</td><td>0023</td><td>RT</td><td>GE</td><td>000</td><td>HD</td><td>GNRAL</td><td>BK</td></tr></table>	MONTHLY PROGRESS REPORT # 23								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	G00	0023	RT	GE	000	HD	GNRAL	BK	شماره صفحه : 5 از 36
MONTHLY PROGRESS REPORT # 23																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
G00	0023	RT	GE	000	HD	GNRAL	BK																			

۲ معرفی پروژه


میدان نفتی بینک از میداین نفتی ایران است که در استان بوشهر، در فاصله ۲۰ کیلومتری از شمال بندر گناوه و در ساحل خلیج فارس مستقر می باشد. این میدان از شمال با میدان نفتی گلخاری، میدان نفتی بی بی حکیمه و میدان نفتی سیاهمکان و از جنوب با میدان نفتی خارگ، در دریا هم جوار است. حجم ذخیره در جای نفت خام این میدان در حدود ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون بشکه برآورد می شود. میدان نفتی بینک در افق آسماری دارای ابعادی به طول ۴۲ کیلومتر و عرض متوسط ۶ کیلومتر است. سازندهای آسماری و جهرم این میدان به دلیل ارتباط فشاری مناسب، به عنوان یک مخزن واحد محسوب می شوند.

تاسیسات سرچاهی مربوط به ۶ حلقه چاه توسعه ای (که ۲ حلقه از این ۶ حلقه نیاز به برق رسانی و دیگر تسهیلات مرتبط جهت مصارف پمپ درون چاهی می باشد) و انجام اصلاحات در ۴ حلقه چاه تعمیری موجود (به همراه برق رسانی جهت مصارف پمپ درون چاهی و دیگر تسهیلات مورد نیاز) در دستور کار این طرح قرار دارد. آب مورد نیاز حفاری چاه ها می بایست از طریق تانکر (یا خط لوله موقت) از دره گپ گناوه/خلیج فارس تامین گردد. ضمناً احداث ۶ خط لوله جریانی جدید از چاه های توسعه ای پیش گفته به مجموعه بوستر- کلاستر بینک و توسعه چندراهه موجود بوستر- کلاستر بینک جزو شرح کار این پروژه است.

با هدف افزایش تولید نفت از میدان بینک، افزایش ظرفیت ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (و احداث ردیف تراکم و مستحداثات مورد نیاز جدید) به میزان ۱۵ م ف م ر نیز جزو شرح کار این پروژه می باشد. همچنین احداث ۴۴ کیلومتر خط لوله ۸ اینچ انتقال گاز از ایستگاه تقویت فشار گاز بینک تا ایستگاه تزریق گاز سیاهمکان و ۵,۲ کیلومتر خط لوله ۴ اینچ انتقال مایعات گازی از ایستگاه تقویت فشار گاز بینک به واحد بهره برداری بینک نیز در تعهد پیمانکار میباشد.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پالایش نفت ایران  HIRGAN ENERGY 	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 23							شماره صفحه : 6 از 36	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0023		G00

کلیات توضیحات فوق الذکر شرح کار در شماتیک زیر ارائه شده است.

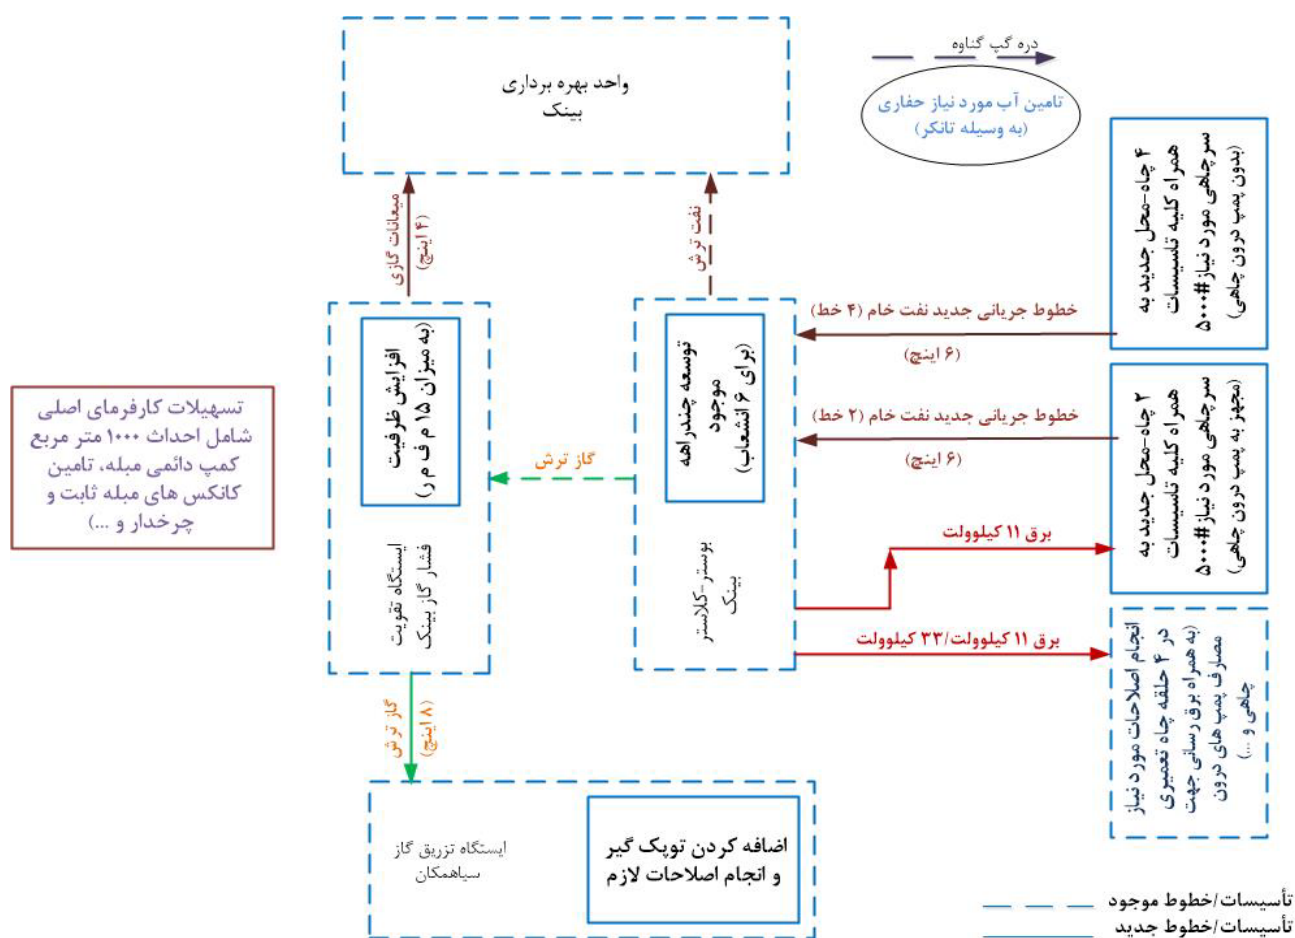


 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 23							شماره صفحه : 7 از 36	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0023		G00

S/L	Well Name/Location	Reservoir
1	W 008 N	Asmari
2	W 018 S	Asmari
3	W 046 S	Bangestan
4	W028	Bangestan
5	W 035	Bangestan
6	W 007 S	Bangestan
7	Well 14	Bangestan
8	Well 12	Bangestan
9	Well 15	Bangestan
10	Well 05	Bangestan

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 23							شماره صفحه : 8 از 36
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0023	G00

۳ گزارش مدیریتی پروژه
1-3 گزارش مدیریتی و جدول میزان پیشرفت کل پروژه
جدول پیشرفت پروژه در بخش 5 ارائه شده است.

2-3 نمودار پیشرفت کل پروژه

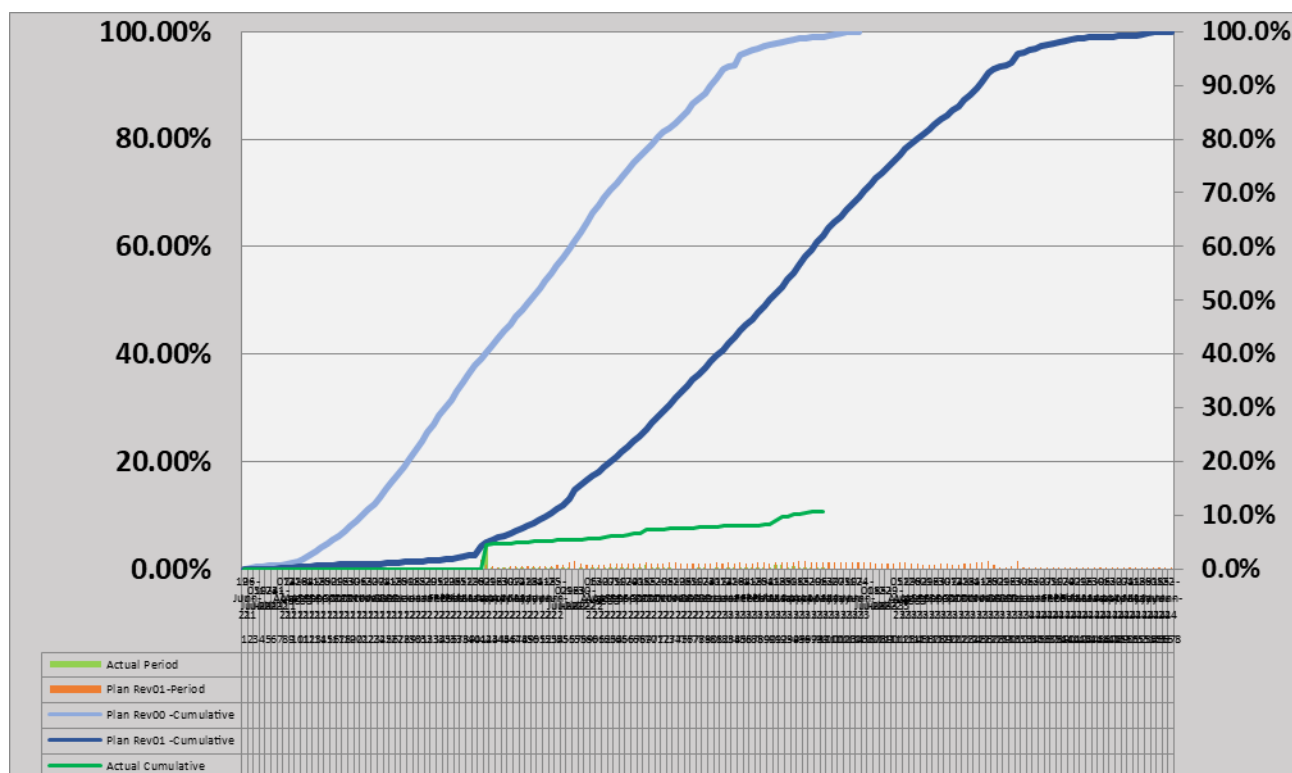

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 23							شماره صفحه : 9 از 36	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0023		G00

۴ گزارش فعالیت‌های انجام شده

1-4 مدیریت پروژه /عمومی

- شرکت در جلسات هفتگی بررسی پیشرفت پروژه
- کنترل و نظارت مستمر بر حسن انجام ضبط و ربط محیط کار General Housekeeping طبق برنامه
- ارائه خدمات رفاهی به کارفرمای محترم بر اساس قرارداد

2-4 بخش مهندسی (E)

1-2-4 مهندسی سطح الارض /ابنیه تحت الارض پروژه

- ارسال مدارک مهندسی مطابق برنامه زمانبندی پروژه
- بررسی و اصلاح مدارک براساس نظرات کارفرما
- ارسال نسخه نهایی مدرک Rough Grading
- ارسال مدرک Plan & Profile لوکیشن w046 مطابق برنامه زمانبندی
- ارسال TBE ساپورت لوله مربوط به چاه 028
- ارسال برخی از مدارک PMR مربوط به بخش برق و ابزار دقیق - بسته منیفولد
- ارسال گزارش Flare Radiation & Dispersion مطابق نظرات کارفرما
- ارسال PMRهای مربوط به سیستم Earthing & Lightning چاهها
- ارسال نسخه نهایی MTOهای مربوط به سیستم Earthing & Lightning چاهها
- ارسال نسخه نهایی مدرک PMS مربوط به چاهها
- ارسال نسخه نهایی General Civil Lay و Rough Grading لوکیشن 046
- ارسال PMRهای بخش پایپینگ لوکیشن 046 و 035 مطابق برنامه زمانبندی
- ارسال نسخه های به روز شده P&ID بسته ایستگاه مطابق نظرات کارفرما
- ارسال مدارک Plot Plan مربوط به لوکیشن های 008 و منیفولد
- ارسال نسخه نهایی مدارک معماری شلتر سرچاهی
- ارسال نسخه نهایی دیتاشیت های بخش برق بسته ایستگاه
- ارسال نسخه نهایی نقشه پایپ ساپورت های منیفولد
- ارسال نسخه نهایی ESD Block Diagram
- ارسال نسخه نهایی Process Flow Diagram چاه 46
- ارسال نسخه نهایی مدرک Specification برای Nitrogen Package
- ارسال نسخه نهایی Logic Diagram و Loop Diagram بسته منیفولد

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 23							شماره صفحه : 10 از 36	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0023		G00

4-2-2 مهندسی تحت الارض پروژه

- (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)

4-3-3 فعالیتهای مرتبط با کالا (P)

4-3-1 کالای سطح الارض / ابنیه تحت الارض پروژه

- پیگیری تخصیص ارز لوله های 4 و 6 اینچ فولاین
- پیگیری عقد قرارداد فلنج های سر چاهی
- پیگیری عقد قرارداد اتصالات سر چاهی
- پیگیری عقد قرارداد شیر آلان سر چاهی
- انجام تست FAT تجهیز WHCP
- پیگیری عقد قرارداد PG و TG سر چاهی
- هماهنگی برگزاری جلسات KOM و PIM اتصالات سر چاهی
- معرفی سازنده منتخب مخازن ایستگاه تقویت فشار گاز
- عقد قرارداد Pig Trap بسته خط لوله
- پیگیری عقد قرارداد پکیج نم زدا
- برگزاری جلسه با کارفرما درخصوص چگونگی سیستم های کنترل
- پیگیری تخصیص ارز لوله های 4 و 6 اینچ فولاین
- ارسال استعلام برای سازندگان Flare
- برگزاری جلسه با سازنده کمپرسور گازی شرکت هواپار درخصوص مدرک P&ID
- ارسال استعلام برای سازندگان سیستم کنترل ایستگاه
- پیگیری جلسه PIM لوله های 4 و 6 اینچ
- ارسال استعلام برای سازندگان سیستم کنترل ایستگاه
- پیگیری جلسه PIM لوله های 4 و 6 اینچ

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 23							شماره صفحه : 11 از 36	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0023		G00

4-3-2 کالای تحت الارض پروژه

- (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)

4-4-4 فعالیتهای اجرایی (C)

- گود برداری جهت نصب پایه های خط برق هوایی کارگاه
- نصب پایه های خط برق هوایی کارگاه
- بتن ریزی پایه های خط برق هوایی کارگاه
- نصب کراس آرم پایه های برق هوایی کارگاه
- سیم کشی خط برق هوایی کارگاه
- نصب ترانس خط برق هوایی کارگاه
- نصب ساپورت خط لوله Burn Pit روی پد بتنی و در مسیر خط در چاه 28
- بتن ریزی پایه ساپورت های خط لوله Burn Pit در چاه 28
- ریسه کردن لوله های خط Burn Pit چاه 28
- Fit up خط لوله Burn Pit چاه 28
- جوشکاری خط لوله Burn Pit چاه 28
- تست خط لوله Burn Pit چاه 28
- اجرای سقف اتاق های ساختمان Warehouse (تیرچه گذاری و یونولیت)
- بتن ریزی سقف اتاق های ساختمان Warehouse
- اجرای کروم گیری کف ساختمان Warehouse
- بتن ریزی کف ساختمان Warehouse
- عملیات مخلوط ریزی کف اتاق های ساختمان Warehouse
- بتن ریزی کف اتاق های ساختمان Warehouse
- سفید کاری دیوار اتاق های ساختمان Warehouse
- اجرای تأسیسات برق و روشنایی Warehouse
- نصب درب و پنجره و پوشش پلی کربنات درب و پنجره و نصب قفل و دستگیره درب های Warehouse
- خط کشی و رنگ آمیزی کف ساختمان Warehouse و نصب تابلو های ایمنی

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	<table><tr><th colspan="8">MONTHLY PROGRESS REPORT # 23</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>G00</td><td>0023</td><td>RT</td><td>GE</td><td>000</td><td>HD</td><td>GNRAL</td><td>BK</td></tr></table>	MONTHLY PROGRESS REPORT # 23								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	G00	0023	RT	GE	000	HD	GNRAL	BK	شماره صفحه : 12 از 36
MONTHLY PROGRESS REPORT # 23																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
G00	0023	RT	GE	000	HD	GNRAL	BK																			

- اجرای سرامیک کاری کف اتاق های ساختمان اداری پترو ایران
- اجرای سرامیک کاری کف ساختمان رستوران پترو ایران
- اجرای تأسیسات برق و روشنایی ساختمان رستوران پترو ایران
- حفاری کانال جهت اجرای کابل برق Warehouse ، ساختمان اداری و رستوران پترو ایران
- حفاری کانال فاضلاب ساختمان اداری و رستوران پترو ایران
- اجرای پلاستر سیمان دیوارهای داخلی ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پخش نفت ایران  HIRGAN ENERGY 	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 23							شماره صفحه : 13 از 36	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0023		G00

ه جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی / سطح الارض)

BINAK OILFIELD DEVELOPMENT SURFACE WORK-PACKAGES BASED ON PACKAGES						
Code	Description	W.F. (Total)	Last Progress%	This Period	Up to now Progress%	Client Approval 1402/02/03
	Total Project	100.000%	10.21%	0.53%	10.74%	6.88%
1	GENERAL	5.32%	59.37%	0.39%	59.76%	44.18%
1-1	General	5.32%	59.37%	0.39%	59.76%	44.18%
2	SUB-Surface DEVELOPMENT	18.18%	10.22%	0.06%	10.29%	9.11%
2-1	Engineering	0.36%	51.26%	1.08%	52.34%	48.76%
2-2	Procurement	11.14%	3.74%	0.05%	3.79%	3.12%
2-3	Construction	6.68%	18.81%	0.02%	18.83%	16.94%
3	SURFACE DEVELOPMENT	76.49%	6.78%	0.66%	7.44%	3.75%
3-1	Engineering	2.37%	45.61%	0.31%	45.91%	45.61%
3-2	Procurement	59.19%	6.94%	0.83%	7.78%	3.02%
3-3	Construction	13.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3-4	Commissioning, Startup & Handover	1.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پخش نفت ایران  HIRGAN ENERGY 	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 23							شماره صفحه : 14 از 36	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0023		G00

۶ بخش کنترل پروژه

جدول میزان پیشرفت کل پروژه (عمومی / سطح الارض)

Description	W.F. (Disc)	W.F. (Total)	Roll-Up	Last Progress%	This Period	Up to now Progress%	Client Approval 1402/02/03
Total Project	100.000%	100.000%	100.00%	10.21%	0.53%	10.74%	6.68%
GENERAL	1.136%	1.136%	1.136%	59.373%	0.387%	59.76%	44.18%
Project Management	23.600%	0.268%	0.268%	56.968%	0.208%	57.18%	45.07%
Project Insurance	13.470%	0.153%	0.153%	90.677%	0.000%	90.68%	6.79%
Service to Company	35.400%	0.402%	0.402%	58.296%	0.413%	58.71%	46.19%
Training Courses	7.310%	0.083%	0.083%	0.000%	5.000%	5.00%	0.00%
GC Mobilization & Demobilization	20.220%	0.230%	0.230%	59.803%	0.000%	59.80%	55.57%
SUB-Surface DEVELOPMENT	52.342%	52.342%	52.338%	10.225%	0.061%	10.29%	9.11%
Package 01-New Well # W018S	5.210%	2.727%	2.723%	36.044%	-2.545%	33.498%	34.245%
Package 02-New Well # W028 (Bangestan)	7.125%	3.729%	3.729%	38.671%	0.204%	38.874%	33.044%
Package 03-New Well # W046S (Bangestan)	33.462%	17.515%	17.515%	10.079%	0.011%	10.09%	8.95%
Package 04-New Well # W035 (Bangestan)	8.669%	4.538%	4.538%	12.176%	2.217%	14.39%	11.90%
Package 05-New Well # W008N	2.760%	1.445%	1.445%	5.866%	-1.008%	4.86%	4.61%
Package 06-New Well # W007S/Manifold Extension (Bangestan)	12.934%	6.770%	6.770%	3.774%	0.031%	3.80%	3.09%
Package 07-Workover # 14	7.666%	4.013%	4.012%	4.090%	0.033%	4.12%	2.78%
Package 08-Workover # 12	6.237%	3.265%	3.264%	1.893%	0.041%	1.93%	1.90%
Package 09-Workover # 15	9.335%	4.886%	4.886%	1.322%	0.029%	1.35%	1.32%
Package 10-Workover # 05	6.602%	3.456%	3.456%	1.832%	0.039%	1.87%	1.83%
SURFACE DEVELOPMENT	46.522%	46.522%	46.522%	6.784%	0.655%	7.44%	3.75%
Package 11- EPC Pipeline 8" & 4"	15.529%	7.224%	7.224%	2.807%	0.452%	3.26%	1.38%
Package 12- EPC # Compressor Station	84.471%	39.298%	39.298%	7.783%	0.706%	8.49%	4.34%


 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 23							شماره صفحه : 15 از 36	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0023		G00

ضرایب وزنی فعالیت ها (W-F) (عمومی / سطح الارض) :

Cde	Description	W.F.(Discp.)	WF.(Total)
		100.00%	100.000%
1	GENERAL	5.32%	5.32%
1-1	Project Management	100.00%	5.32%
2	SUB-Surface DEVELOPMENT	18.18%	18.18%
2-1	Engineering	1.99%	0.36%
2-2	Procurement	61.26%	11.14%
2-3	Construction	36.75%	6.68%
3	SURFACE DEVELOPMENT	76.49%	76.49%
3-1	Engineering	3.09%	2.37%
3-2	Procurement	77.39%	59.19%
3-3	Construction	18.20%	13.92%
3-4	Commissioning, Startup & Handover	1.3%	1.01%


 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پالایش نفت ایران  HIRGAN ENERGY 	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 23							شماره صفحه : 16 از 36	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0023		G00

نمودار پیشرفت بخش عمومی

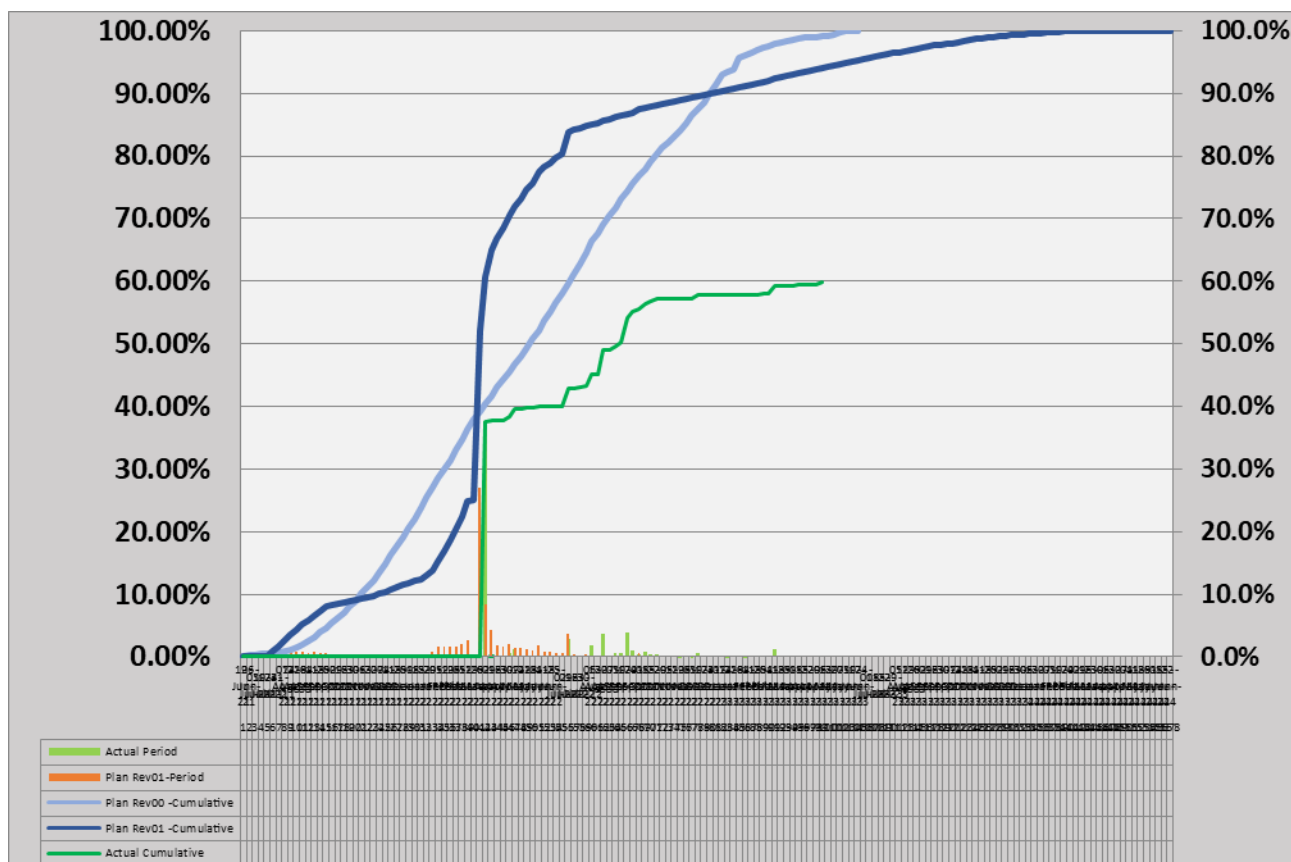

نمودار پیشرفت بخش ابنیه تحت الارض

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							  	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 23							شماره صفحه : 17 از 36	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0023		G00

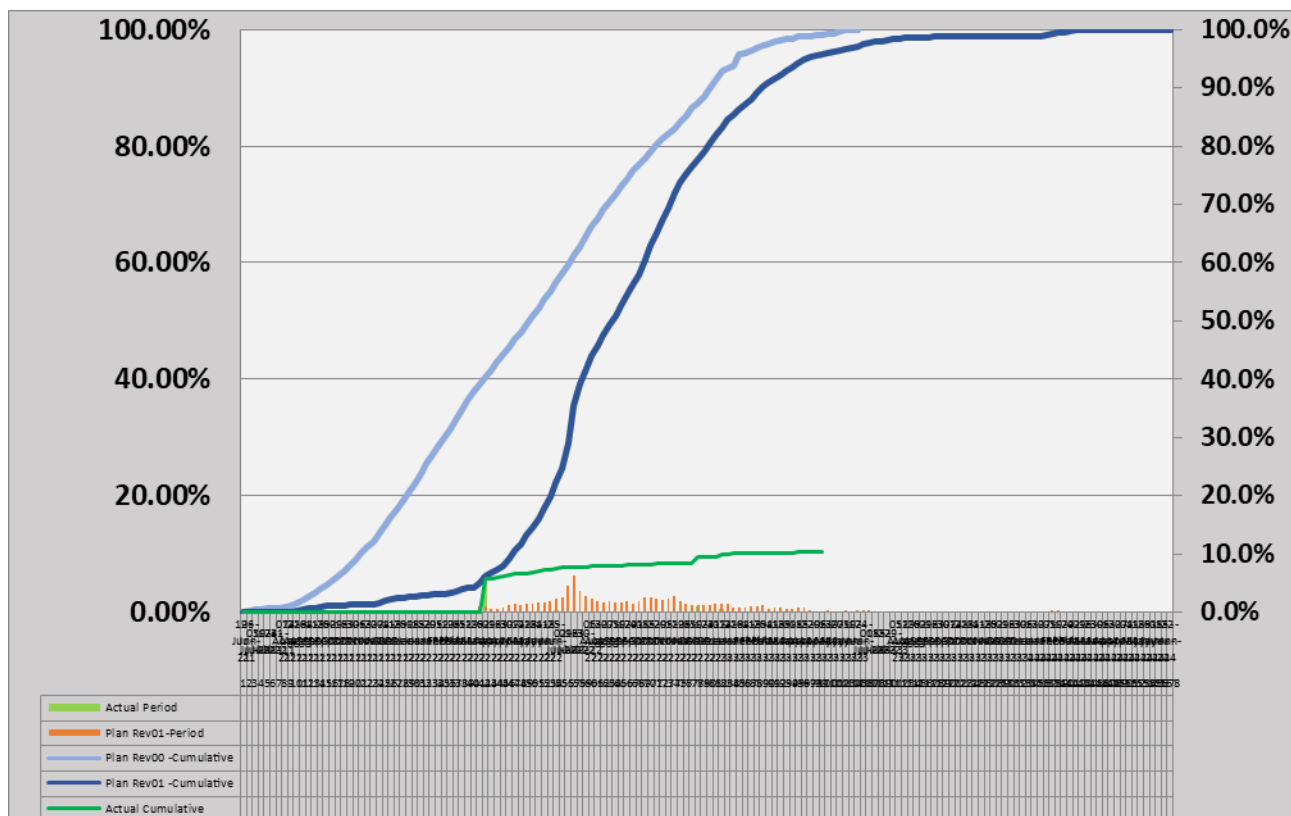

نمودار پیشرفت بخش سطح الارض



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض و ابنیه تحت الارض

عمومی و مشترک




شماره پیمان:

053 - 073 - 9184

MONTHLY PROGRESS REPORT # 23

نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه
G00	0023	RT	GE	000	HD	GNRAL	BK


شماره صفحه : 18 از 36

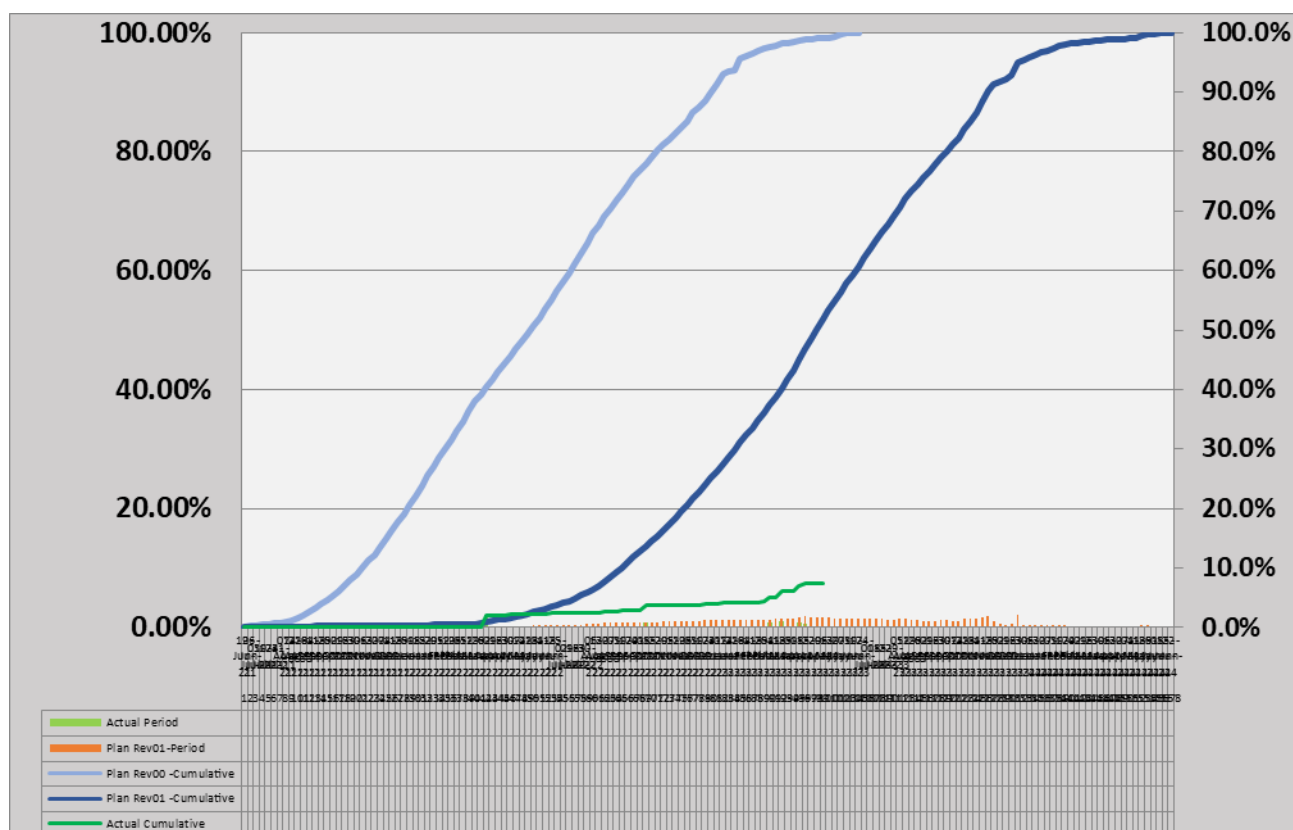

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 23							شماره صفحه : 19 از 36
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0023	
							G00	

جدول و نمودار پیشرفت EPC :

Total Project	100%	10.74%
Engineering	2.73%	46.77%
Procurement	70.33%	7.15%
Construction	20.60%	6.11%
Commissioning, Startup & Handover	1.01%	0.0%
Project Management	5.32%	59.76%

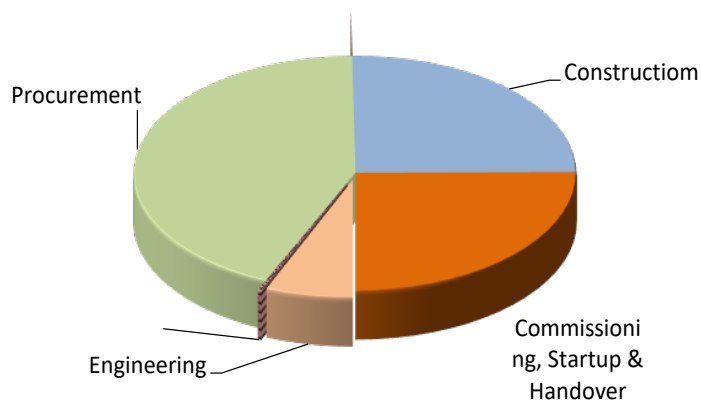

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پارس  HIRGAN ENERGY 	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 23							شماره صفحه : 20 از 36	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0023		G00

۷ وضعیت مدارک مهندسی

		گزارش آخرین وضعیت مدارک مهندسی																				
		PM	PR	ME	HV	PI	PL	IN	SA	EL	TE	CV	AR	ST	GE	GT	QC	TP	SU	CO		
کل مدارک	Proj. Management	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	31	
	Common	-	11	11	8	28	32	25	17	75	8	28	11	26	39	1	44	0	0	0	364	
	WELLHEAD FACILITIE	0	43	8	60	235	42	126	64	207	0	80	30	126	40	10	0	0	12	10	1093	
	PIPELINE	0	19	4	0	22	22	58	5	24	0	3	0	2	7	2	0	0	4	1	173	
	GCS	0	90	72	18	60	0	114	32	96	29	12	12	111	8	2	0	0	1	1	658	
جمع کل		30	163	95	86	345	96	323	118	402	37	123	53	265	95	15	44	0	17	12	2319	
تعداد کل مدارک ارسال شده	IFI	4	0	22	0	104	22	79	25	77	0	7	0	2	46	3	0	0	0	0	391	
	IFC	10	6	3	15	20	2	23	6	15	1	8	9	15	6	3	15	0	4	0	161	
	IFA	6	68	27	9	29	7	68	17	62	3	15	20	6	1	6	3	0	3	0	350	
	AFC/AFD	30	80	24	5	26	20	37	37	40	18	32	14	28	6	2	1	0	4	0	404	
جمع کل		50	154	76	29	179	51	207	85	194	22	62	43	51	59	14	19	0	11	0	1306	

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22							شماره صفحه : 22 از 36	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0023		G00

۹ بخش تدارکات کالا



 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت ملی پالایش و توزیع نفت ایران  HIRGAN ENERGY 	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22							شماره صفحه : 25 از 36	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0023		G00

۱۱ مکاتبات با کارفرما

1-11 مکاتبات وارده از کارفرما :

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
1	نظرات کارفرما در خصوص مدرک (D01) TBE For Line Pipe	1402/01/26	807
2	درخواست مجوز جهت نقشه برداری از محدوده داخل ایستگاه تزریق سیاهمان	1402/01/26	801
3	معرفی رئیس جدید QC/QA طرح بینک	1402/01/26	800
4	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانس میتال ها	1402/01/26	795
5	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانس میتال ها	1402/01/26	791
6	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانس میتال ها	1402/01/26	788
7	ارسال نظرات تکمیلی مربوط به ID&P کمپرسورهای ایستگاه تقویت فشار گاز	1402/01/26	809
8	اطلاعات سیستم حفاظت کاتدی موجود مرتبط با خط انتقال 8 اینچ از تقویت فشار گاز بینک به سیاهمان	1402/01/26	814
9	الزام به درج منشا تامین اجزای کالا و تجهیزات در قراردادهای خرید	1402/01/26	815
10	درخواست ارسال صورتجلسه مورخ 09/11/1401 با عنوان بررسی اولیه امکان سنجی ادغام ساختمان های کنترل ایستگاه جدید	1402/01/26	811
11	ارسال صورتجلسه بررسی PLOT PLAN چاه های BK05 و BK12 و BK15 و BK14	1402/01/26	816
12	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانس میتال ها	1402/01/27	884
13	پاسخ بررسی استاندارد طراحی stone trap	1402/01/27	966
14	پاسخ به مدارک سازنده کمپرسورهای گاز تقویت فشار بینک VPIS-V01	1402/01/27	885
15	خرید یک عدد جک پالت 3 تنی	1402/01/27	969
16	نامه ذینفع اصلی طرح مبنی بر تذکر قراردادی - عدم تکمیل تجهیز کارگاه و کمپ کارفرما و انبارهای بسته و روباز	1402/01/28	988
17	پاسخ به مدرک سازنده کمپرسورهای گازی ایستگاه تقویت فشار گاز	1402/01/28	989
18	اعمال اصلاحات ضمانت نامه های بانکی مربوط به اعطای پیش پرداخت خرید کالا	1402/01/29	1116
19	پاسخ به نظرات تکمیلی در خصوص یونیت کنترل پنل هر ردیف کمپرسور گاز GCS	1402/01/30	1163

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پارسا  HIRGAN ENERGY 	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22							شماره صفحه : 26 از 36	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0023		G00

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
20	بازدید نمایندگان کارفرما از شرکت کاردانان شرق جهت انجام تست های هیدرواستاتیک و کارخانه ای FAT کنترل پنل های سرچاهی (WHCP)	1402/02/04	1290
21	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها	1402/02/05	1370
22	پاسخ به موارد مطروحه در خصوص مدرک D/sh. For potable Water Tank of Well pads (DO4)	1402/02/05	1378
23	جبهه های کاری پیش رو در بخش خرید و اجرا	1402/02/05	1386
24	معرفی سرپرست طرح نگهداشت و افزایش تولید میدان بینک و نماینده EPCC ابنیه تحت الارض و سطح الارض	1402/02/06	1525
25	نتیجه بررسی گزارش هفتگی شماره 96 (29/01/1402)	1402/02/09	1629
26	تعهدات آموزشی طرح توسعه	1402/02/09	1630
27	ارسال ایمیل های پاسخ به مدارک مهندسی	1402/02/10	1693
28	پاسخ دعوت جهت بازرسی و تست FAT دو دستگاه WHCP	1402/02/10	1760
29	پاسخ به نظرات در خصوص قرارداد خرید لوله های خط آتش چاه ها	1402/02/10	1754
30	جمع آوری علف های هرز به منظور جلوگیری از آتش سوزی	1402/02/10	1750
31	نواقص مستندات و مدارک مربوط به تجهیز WHCP	1402/02/10	1753
32	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها	1402/02/11	1790
33	تامین یک دستگاه کاروان	1402/02/12	1898
34	پاسخ ذینفع اصلی در خصوص مدرک GCS ; Mech. D/Sh .For Slug Pump D02	1402/02/12	1924
35	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها	1402/02/12	1908
36	پاسخ به موارد مطروحه در خصوص مدرک D/Sh .For Potable Water Tank of Well pads	1402/02/12	1913
37	پاسخ ذینفع اصلی به مدارک سازنده کمپرسورهای گاز D/Sh. Detailed For Compressor V00-D/Sh. For Compressor Main Motor	1402/02/12	1920
38	گزارش کالای سطح الارض	1402/02/11	1948
39	پاسخ ذینفع اصلی طرح به اضافه کاری منتج از جداسازی سیستم خنک کاری / روانکاری در پکیج کمپرسور گاز GCS	1402/02/13	2003
40	پاسخ به اقدامات اولیه مورد نیاز در طرح توسعه چند راهه کلاستر بینک خط 4 اینچ گاز مشعل	1402/02/13	2013

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							  	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22							شماره صفحه : 27 از 36	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0023		G00

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
41	پاسخ به تغییر کاری افزایش C.A و ضخامت اقلام پاییبگی سر چاهی	1402/02/13	2021
42	پاسخ بررسی مسیر پیشنهادی جدید خطوط جریان مربوط به بسته W007S	1402/02/13	2022
43	ارائه برنامه جبرانی اجرای فعالیت های قابل انجام بخش های مهندسی و اجرا	1402/02/13	2024
44	پاسخ به نامه درخواست تسریع در تأدیه 50٪ تقریبی باقیمانده قسط اول پیش پرداخت کالا (4٪ مبلغ پیمان)	1402/02/16	2161
45	تامین و توزیع منابع مالی	1402/02/16	2144
46	مستندات ثبت سفارش لوله های 6 اینچ و 4 اینچ	1402/02/16	2108
47	درخواست مجوز انتشار نسخ کاغذی مدارک با وضعیت AFC	1402/02/19	2395
48	رئیس جدید مهندسی پروژه	1402/02/19	2394
49	سایبان کمپرسورهای گازی GCS - پوشش فضای خالی بین کمپرسورها	1402/02/19	2396
50	تسریع در نهایی سازی مدارک بخش سیویل چاه محلها بخصوص BK14.W046S.W035	1402/02/20	2404
51	برآورد کارکرد بخش های عمومی و اجرا - شماره 8	1402/02/20	2419
52	برآورد کارکرد بخش مهندسی شماره 8	1402/02/20	2450
53			
54			

2-11 مکاتبات صادره به کارفرما :

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
1	برآورد کارکرد بخش مهندسی - شماره 8 (BK-HD-WPA-E-0008_G00)	1402/01/21	0750
2	برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی - شماره 8 (BK-HD-WPA-C-0008_G00)	1402/01/21	0751
3	ارسال گزارش هفتگی - مربوط به هفته 95 پروژه (منتهی به تاریخ 22/01/1402)	1402/01/22	0752
4	درخواست جلسه با کارفرمای اصلی - بررسی نظرات بر روی نقشه های سیویل لوکیشن چاه بسته W046S	1402/01/26	0753
5	ارائه ضمانتنامه بانکی بابت قسط اول پیش پرداخت کالا (4٪ مبلغ پیمان)	1402/01/27	0754

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	<table><tr><th colspan="8">MONTHLY PROGRESS REPORT # 22</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادر کننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>G00</td><td>0023</td><td>RT</td><td>GE</td><td>000</td><td>PEDCO</td><td>GNRAL</td><td>BK</td></tr></table>	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	G00	0023	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK	شماره صفحه : 28 از 36
MONTHLY PROGRESS REPORT # 22																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
G00	0023	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK																			

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
6	تست های هیدرواستاتیک و کارخانه ای (FAT) دو دستگاه WHCP سرچاهی - تاریخ اصلاحی	1402/01/28	0755
7	تغییر کاری #2؛ GCS - ادغام ساختمان های کنترل جدید و موجود - اصلاح شده	1402/01/29	0756
8	کلاس نشستی شیرهای کنترلی (بخش توسعه کلاستر بینک)	1402/01/29	0757
9	ارسال گزارش هفتگی - مربوط به هفته 96 پروژه (منتهی به تاریخ 30/01/1402)	1402/01/30	0758
10	GCS - مدارک سازنده کمپرسورهای گاز (هوایار)؛ "VPIS_V02"	1402/01/30	0759
11	ارائه ضمانتنامه بانکی اصلاح شده بابت قسط اول پیش پرداخت کالا (4% مبلغ پیمان)	1402/02/04	0760
12	GCS - مدارک سازنده کمپرسورهای گاز (هوایار)؛ "SUB VENDOR LIST_V00"	1402/02/05	0761
13	عدم تعهد قراردادی به تامین جک پالت 3 تنی جهت استفاده برای کالای تحت الارض	1402/02/05	0762
14	درخواست مجوز انتشار نسخ کاغذی مدارک با وضعیت AFC	1402/02/06	0763
15	مستندات فنی مربوط به تامین برق کمپ از خط موجود NISOC	1402/02/06	0764
16	ارسال گزارش هفتگی - مربوط به هفته 97 پروژه (منتهی به تاریخ 06/02/1402)	1402/02/06	0765
17	درخواست تسریع در تأدیه قسط اول پیش پرداخت کالا (4% مبلغ پیمان) با توجه به افزایش قیمت اعلامی سازنده کمپرسور گاز GCS	1402/02/09	0766
18	ارسال تجهیزات IT (مربوط به تسهیلات مورد نیاز کارفرما)	1402/02/09	0767
19	GCS - مدارک سازنده کمپرسورهای گاز؛ "Detailed D/Sh. For D/Sh. For Compressor Main " & "Compressor_V01 ("Motor_V01"	1402/02/10	0768
20	درخواست جلسه با کارفرمای اصلی برای جمع بندی نظرات بر روی TBE سیستم کنترل ESD/ کلاستر بینک	1402/02/12	0769
21	معرفی رئیس جدید مهندسی پروژه	1402/02/12	0770
22	قرارداد خرید توپک ران و توپک گیر بسته خطوط لوله	1402/02/12	0771
23	پاسخ به نظرات NISOC درخصوص FAT دو دستگاه پکیج WHCP سرچاهی	1402/02/12	0772
24	مستندات بازرسی WHCP سرچاهی - توضیحات تکمیلی پیمانکار	1402/02/12	0773
25	ارسال گزارش هفتگی - مربوط به هفته 98 پروژه (منتهی به تاریخ 1402/02/13)	1402/02/14	0774
26	درخواست تسریع در تأدیه 50% تقریبی باقیمانده قسط اول پیش پرداخت کالا (4% مبلغ پیمان)	1402/02/14	0775

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه پتروایران  HIRGAN ENERGY 	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22							شماره صفحه : 29 از 36	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0023		G00

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
27	پاسخ به نظرات NISOC درخصوص نقشه های سیویل سرچاهی W028	1402/02/17	0776
28	ارائه فایل NAVIS مدل سه بعدی 30٪ - بسته موقعیت چاه W007S	1402/02/19	0777
29	ارائه فایل NAVIS مدل سه بعدی 60٪ - بسته موقعیت چاه W008N	1402/02/20	0778
30	پیگیری مجدد اخذ بازخورد بر روی مدرک "مطالعات خوردگی(GCS (D03)"	1402/02/20	0779
31	پیگیری اخذ بازخورد بر روی مدرک Nitrogen & TBE For Air GCS ; "Packages_D00"	1402/02/20	0780
32	تغییرکاری؛ افزایش C.A. و ضخامت اقلام پایپینگ سرچاهی - توضیحات تکمیلی	1402/02/20	0781
33			

3-11 لیست صورتجلسات پروژه

ردیف	عنوان صورت جلسه	تاریخ صورت جلسه	شماره صورت جلسه	ملاحظات
1	بررسی مدارک طراحی سیویل ایستگاه تقویت فشار گاز	1402/01/22		
2	عملیات اجرایی و تحویل حوضچه ها و خط Burn Pit در چاه 28	1402/01/31		
3	مراحل اجرایی خط برق هوایی کمپ موقت بینک	1402/02/10		
4	صورجلسه مورخ 18/02/1402 - جلسه هماهنگی با پیمانکاربخش سطح الارض	1402/02/18		
5	بررسی پیشرفت پروژه	1402/02/04		

4-11 لیست مکاتبات بدون پاسخ

ردیف	عنوان/خلاصه نامه	تاریخ نامه	شماره نامه	ملاحظات
1	درخواست جلسه با کارفرمای اصلی - بررسی نظرات بر روی نقشه های سیویل لوکیشن چاه بسته W046S	1402/01/26	0753	
2	درخواست تسریع در تأدیه قسط اول پیش پرداخت کالا (4٪ مبلغ پیمان) با توجه به افزایش قیمت اعلامی سازنده کمپرسور گاز GCS	1402/02/09	0766	
3	ارسال تجهیزات IT (مربوط به تسهیلات مورد نیاز کارفرما)	1402/02/09	0767	
4	درخواست جلسه با کارفرمای اصلی برای جمع بندی نظرات بر روی TBE	1402/02/12	0769	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22							شماره صفحه : 30 از 36	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0023		G00

ردیف	عنوان/خلاصه نامه	تاریخ نامه	شماره نامه	ملاحظات
	سیستم کنترل/ ESD کلاستر بینک			
5	درخواست تسریع در تأدیه 50٪ تقریبی باقیمانده قسط اول پیش پرداخت کالا (4٪ مبلغ پیمان)	1402/02/14	0775	
6	پیگیری مجدد اخذ بازخورد بر روی مدرک "مطالعات خوردگی (D03) GCS"	1402/02/20	0779	

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	<table><tr><th colspan="8">MONTHLY PROGRESS REPORT # 22</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادر کننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>G00</td><td>0023</td><td>RT</td><td>GE</td><td>000</td><td>PEDCO</td><td>GNRAL</td><td>BK</td></tr></table>	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	G00	0023	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK	شماره صفحه : 31 از 36
MONTHLY PROGRESS REPORT # 22																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
G00	0023	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK																			

۱۲- مشکلات و موانع

- مشکلات مربوط به جذب نیرو و تکمیل چارت سازمانی پروژه با توجه به شرایط موجود
- عدم هماهنگی بین کامنتهای پترو ایران و کارفرمای اصلی.
- با توجه به عدم پرداخت مالی کامل پروژه و معوق ماندن درخواستهای مالی اعلام شده صورت وضعیت شماره 7 و 6 و 5 و 4 مهندسی ، صورت وضعیت شماره 7 و 6 و 5 و 4 بخش عمومی و اجرا) موجب شده است جریان نقدینگی پروژه به شدت منفی شود .

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	<table><tr><th colspan="8">MONTHLY PROGRESS REPORT # 22</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادر کننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>G00</td><td>0023</td><td>RT</td><td>GE</td><td>000</td><td>PEDCO</td><td>GNRAL</td><td>BK</td></tr></table>	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	G00	0023	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK	شماره صفحه : 32 از 36
MONTHLY PROGRESS REPORT # 22																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
G00	0023	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK																			

۱۳ موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت

- دریافت با تاخیر نظرات کارفرمای محترم بر روی مدارک ارسالی
- وجود برخی تناقضات در نظرات کارفرمایان (شرکت پتروایران و شرکت مناطق نفتخیز جنوب) درخصوص مدارک ارسالی
- تاخیر در نهایی سازی وضعیت طرح مدیریت پسماند چاه ها (توسط کارفرمای محترم) و بالتبع تاخیر در نهایی سازی نقشه ها و کندی پیشرفت کار اجرایی مربوطه
- تغییر برنامه استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و در نتیجه تغییر برنامه کلی پروژه
- نامشخص بودن تاریخ دقیق استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و در نتیجه متاثر شدن برنامه آماده سازی لوکیشن چاه ها و خرید اقلام مربوطه مورد نیاز
- عدم پرداخت کامل صورت وضعیت شماره 4 مهندسی توسط کارفرمای محترم
- عدم پرداخت کامل صورت وضعیت شماره 4 عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم
- عدم پرداخت کامل صورت وضعیت شماره 5 مهندسی توسط کارفرمای محترم
- عدم پرداخت کامل صورت وضعیت شماره 5 عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم
- عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 6 و 7 مهندسی توسط کارفرمای محترم
- عدم پرداخت صورت وضعیت شماره 6 و 7 عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم
- محدودیت های ایجاد شده در تامین کالای ساخت داخل کشور و متعاقب آن سو استفاده برخی شرکت های لوله ساز داخلی و افزایش بی دلیل قیمت ها
- افزایش بی رویه کلیه قیمت های مهندسی، خرید و اجرا علیرغم عدم تغییر نرخ تسعیر ارز نیمایی

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22							شماره صفحه : 33 از 36	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0023		G00

۱۴ بخش کنترل پروژه

- 1-14 برنامه زمان بندی پروژه
- 2-14 لیست مدارک ارسال شده طی دوره
- 2-14 لیست مدارک دارای تاخیر در پاسخ از سوی کارفرما
- 3-14 جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																	
شماره پیمان:	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22	شماره صفحه : 34 از 36																
053 – 073 – 9184	<table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GNRAL</td><td>PEDCO</td><td>000</td><td>GE</td><td>RT</td><td>0023</td><td>G00</td></tr></table>		پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0023	G00
	پروژه		بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه									
BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0023	G00											

۱۵ ضمائم

پیوست شماره یک: برنامه زمان بندی پروژه

پس از اعمال تغییرات و به روز رسانی برنامه ارائه خواهد شد.

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22							شماره صفحه : 35 از 36
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0023	
							G00	

پیوست شماره دو : لیست مدارک ارسال شده طی دوره
(در پیوست)

پیوست شماره سه: جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)
(در پیوست)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 22								شماره صفحه : 36 از 36
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0023	G00	

پیوست شماره چهار: عکسهایی از عملیات اجرایی
(در پیوست)
