

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																	
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 24 <table border="1"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادر کننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GNRAL</td> <td>HD</td> <td>000</td> <td>GE</td> <td>RT</td> <td>0024</td> <td>G00</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0024	G00	شماره صفحه : ۱ از ۳۴
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0024	G00											

طرح نگهداشت و افزایش تولید ۲۷ مخزن

MONTHLY PROGRESS REPORT # 24

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک

G00	JUN. 2023	IFI	M.Aref	M.Fakharian	A.M.Mohseni	
Rev.	Date	Purpose of Issue/Status	Prepared by:	Checked by:	Approved by:	CLIENT Approval
Class: 3		CLIENT Doc. Number (F-Number): F0Z-707090				
Status: IDC: Inter-Discipline Check IFC: Issued For Comment IFA: Issued For Approval AFD: Approved For Design AFC: Approved For Construction AFP: Approved For Purchase AFQ: Approved For Quotation IFI: Issued For Information AB-R: As-Built for CLIENT Review AB-A: As-Built –Approved						

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 24								شماره صفحه : ۲ از ۳۴
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0024	G00	

REVISION RECORD SHEET

PAGE	G00	G01	G02	G03	G04
1	X				
2	X				
3	X				
4	X				
5	X				
6	X				
7	X				
8	X				
9	X				
10	X				
11	X				
12	X				
13	X				
14	X				
15	X				
16	X				
17	X				
18	X				
19	X				
20	X				
21	X				
22	X				
23	X				
24	X				
25	X				
26	X				
27	X				
28	X				
29	X				
30	X				
31	X				
32	X				
33	X				
34	X				
35	X				
36	X				
37	X				
38	X				
39	X				
40	X				
41	X				
42	X				
43	X				
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					

PAGE	G00	G01	G02	G03	G04
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																	
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 24 <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GNRAL</td><td>HD</td><td>000</td><td>GE</td><td>RT</td><td>0024</td><td>G00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0024	G00	شماره صفحه : ۳ از ۳۴
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0024	G00											

فهرست مطالب

۱	مشخصات قراردادی پروژه.....	۴
۲	معرفی پروژه.....	۵
۳	گزارش مدیریتی پروژه.....	۸
۴	گزارش فعالیت‌های انجام شده.....	۹
۵	جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی/تحت الارض /سطح الارض).....	۱۲
۶	بخش کنترل پروژه.....	۱۳
۷	وضعیت مدارک مهندسی.....	۱۹
۸	بخش مالی پروژه.....	۲۰
۹	بخش تدارکات کالا.....	۲۱
۱۰	نمودار سازمانی پیمانکار.....	۲۲
۱۱	مکاتبات با کارفرما.....	۲۴
۱۲	مشکلات و موانع.....	۲۹
۱۳	موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت.....	۳۰
۱۴	بخش کنترل پروژه.....	۳۱
۱۵	ضمائم.....	۳۲

* گزارش ترنس میتال لیست به پیوست می باشد.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																	
شماره پیمان:	MONTHLY PROGRESS REPORT # 24	شماره صفحه : ۴ از ۳۴																
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GNRAL</td><td>HD</td><td>000</td><td>GE</td><td>RT</td><td>0024</td><td>G00</td></tr></table>		پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0024	G00
	پروژه		بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه									
BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0024	G00											

۱ مشخصات قراردادی پروژه

نام پروژه:

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک/ بخش سطح الارض و ابنیه تحت الارض

کارفرمای اصلی:

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
اهواز، کوی فداییان اسلام، ساختمان ۵ طبقه/ تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

مجری و نماینده کارفرمای اصلی:

علیرضا محمدی خواه (سرپرست طرح های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران)

کارفرما (پیمانکار عمومی):

شرکت توسعه پتروایران
تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

مدیر پروژه و نماینده کارفرما (پیمانکار عمومی):
امیر محمد محسنی

پیمانکار EPC:

مشارکت “هیرگان انرژی- طرح و بازرسی”
تهران، اتوبان همت- خیابان شیراز جنوبی- کوچه یاس - پلاک ۱۳

مدیر پروژه و نماینده پیمانکار:

محمد فخاریان

تاریخ شروع پروژه:

۱۴۰۰/۰۴/۰۲

تاریخ پایان پروژه:

۱۴۰۲/۰۴/۰۱

شماره قرارداد:

BK-00-CO-0001

شماره پروژه (در سیستم کارفرمای اصلی):

۹۷۱۰۲۰

مبلغ پیمان (یورو):

۳۵،۹۰۹،۸۸۰ یورو

مدت پیمان:

۲۴ ماه

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 24							شماره صفحه : ۵ از ۳۴	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0024	G00	

۲ معرفی پروژه

میدان نفتی بینک از میدانی نفتی ایران است که در استان بوشهر، در فاصله ۲۰ کیلومتری از شمال بندر گناوه و در ساحل خلیج فارس مستقر می باشد. این میدان از شمال با میدان نفتی گلخاری، میدان نفتی بی بی حکیمه و میدان نفتی سیاهمکان و از جنوب با میدان نفتی خارگ، در دریا هم جوار است. حجم ذخیره در جای نفت خام این میدان در حدود ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون بشکه برآورد می شود. میدان نفتی بینک در افق آسماری دارای ابعادی به طول ۴۲ کیلومتر و عرض متوسط ۶ کیلومتر است. سازندهای آسماری و جهرم این میدان به دلیل ارتباط فشاری مناسب، به عنوان یک مخزن واحد محسوب می شوند.

تاسیسات سرچاهی مربوط به ۶ حلقه چاه توسعه ای (که ۲ حلقه از این ۶ حلقه نیاز به برق رسانی و دیگر تسهیلات مرتبط جهت مصارف پمپ درون چاهی می باشد) و انجام اصلاحات در ۴ حلقه چاه تعمیری موجود (به همراه برق رسانی جهت مصارف پمپ درون چاهی و دیگر تسهیلات مورد نیاز) در دستور کار این طرح قرار دارد. آب مورد نیاز حفاری چاه ها می بایست از طریق تانکر (یا خط لوله موقت) از دره گپ گناوه/خلیج فارس تامین گردد. ضمناً احداث ۶ خط لوله جریانی جدید از چاه های توسعه ای پیش گفته به مجموعه بوستر- کلاستر بینک و توسعه چندراهه موجود بوستر- کلاستر بینک جزو شرح کار این پروژه است.

با هدف افزایش تولید نفت از میدان بینک، افزایش ظرفیت ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (و احداث ردیف تراکم و مستحداثات مورد نیاز جدید) به میزان ۱۵ م ف م ر نیز جزو شرح کار این پروژه می باشد. همچنین احداث ۴۴ کیلومتر خط لوله ۸ اینچ انتقال گاز از ایستگاه تقویت فشار گاز بینک تا ایستگاه تزریق گاز سیاهمکان و ۵،۲ کیلومتر خط لوله ۴ اینچ انتقال مایعات گازی از ایستگاه تقویت فشار گاز بینک به واحد بهره برداری بینک نیز در تعهد پیمانکار می باشد.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																	
شماره پیمان:	MONTHLY PROGRESS REPORT # 24	شماره صفحه: ۷ از ۳۴																
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GNRAL</td><td>HD</td><td>000</td><td>GE</td><td>RT</td><td>0024</td><td>G00</td></tr></table>		پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0024	G00
	پروژه		بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه									
BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0024	G00											

S/L	Well Name/Location	Reservoir
1	W 008 N	Asmari
2	W 018 S	Asmari
3	W 046 S	Bangestan
4	W028	Bangestan
5	W 035	Bangestan
6	W 007 S	Bangestan
7	Well 14	Bangestan
8	Well 12	Bangestan
9	Well 15	Bangestan
10	Well 05	Bangestan


 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پارس  HIRGAN ENERGY 
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 24							شماره صفحه : ۸ از ۳۴
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0024	G00

۳ گزارش مدیریتی پروژه

۳-۱ گزارش مدیریتی و جدول میزان پیشرفت کل پروژه

جدول پیشرفت پروژه در بخش ۵ ارائه شده است.

۳-۲ نمودار پیشرفت کل پروژه

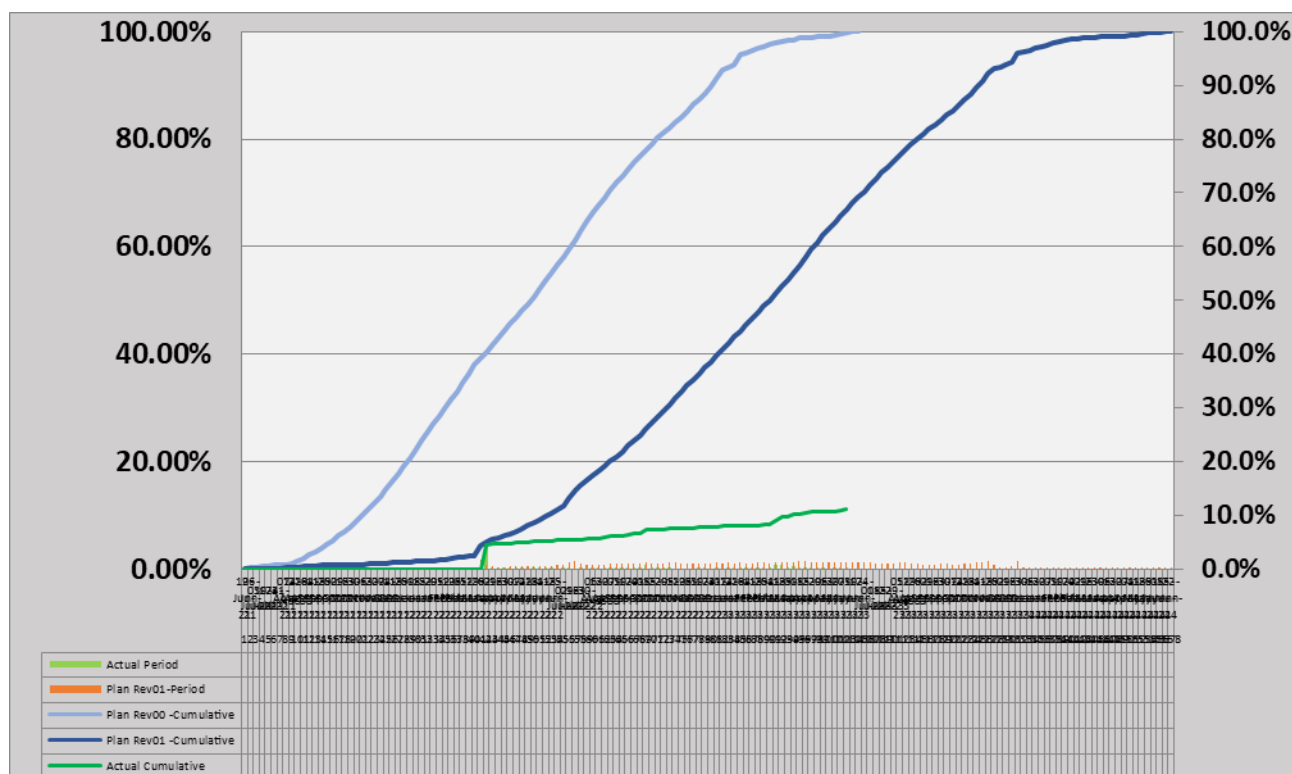

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 24							شماره صفحه : ۹ از ۳۴	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0024	G00	

۴ گزارش فعالیت های انجام شده

۴-۱ مدیریت پروژه /عمومی

- شرکت در جلسات هفتگی بررسی پیشرفت پروژه
- کنترل و نظارت مستمر بر حسن انجام ضبط و ربط محیط کار General Housekeeping طبق برنامه
- ارائه خدمات رفاهی به کارفرمای محترم بر اساس قرارداد

۴-۲ بخش مهندسی (E)

۴-۲-۱ مهندسی سطح الارض /ابنیه تحت الارض پروژه

- ارسال MTO کابل های بخش برق مطابق برنامه زمان بندی
- ارسال دیتاشیت مکانیکی برخی پمپها براساس نظرات کارفرما
- ارسال نسخه نهایی نقشه های ساپورت لوله ها - بسته منیفولد
- ارسال نقشه معماری شلتر پکیج ذخیره شیمیایی براساس نظرات کارفرما
- ارسال نسخه نهایی برخی MTO های مربوط به سینس کابل چاهها
- ارسالن نقشه های بخش سیویل چاه ۱۴ براساس نظرات کارفرما
- ارسال TBE پکیج تزریق مواد شیمیایی براساس نظرات کارفرما
- ارسال مجدد نقشه های P&ID چاهها براساس نظرات کارفرما
- ارسال نسخه نهاسس PMR های LV Switchgear & MCC برخی چاهها
- ارسال مدرک MFD ایستگاه براساس نظرات کارفرما
- ارسال نسخه نهایی برخی دیتاشیت های فرایندی ایستگاه
- ارسال نسخه نهایی مدرک IRP ایستگاه
- ارسالن نقشه های بخش سیویل لوکیشن ۳۵ براساس نظرات کارفرما
- ارسال PMR های به روز شده WHCP برخی چاهها

۴-۲-۲ مهندسی تحت الارض پروژه

- (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)

۴-۳ فعالیتهای مرتبط با کالا (P)

۴-۳-۱ کالای سطح الارض /ابنیه تحت الارض پروژه

- پیگیری اصلاح TBE سیستم کنترل و ESD منیفولد

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">MONTHLY PROGRESS REPORT # 24</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>G00</td><td>0024</td><td>RT</td><td>GE</td><td>000</td><td>HD</td><td>GNRAL</td><td>BK</td></tr></table>	MONTHLY PROGRESS REPORT # 24								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	G00	0024	RT	GE	000	HD	GNRAL	BK	شماره صفحه : ۱۰ از ۳۴
MONTHLY PROGRESS REPORT # 24																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
G00	0024	RT	GE	000	HD	GNRAL	BK																			

- پیگیری تخصیص ارز لوله های ۴ و ۶ اینچ فلولاین
- ارسال استعلام برای سازندگان Flare
- برگزاری جلسه با سازنده کمپرسور گازی شرکت هوایار درخصوص مدرک P&ID
- ارسال استعلام برای سازندگان On/Off Valve ایستگاه
- پیگیری جلسه PIM لوله های ۴ و ۶ اینچ
- معرفی سازنده Control Valve های منیفولد
- معرفی سازنده On/Off Valve های منیفولد
- ارسال استعلام سیستم کنترل و ESD ایستگاه برای سازندگان مربوطه
- تادیه پیش پرداخت قرارداد Pig Trap
- ارسال استعلام دیزل ژنراتور برای سازندگان مربوطه
- ارسال استعلام مخازن سوخت برای سازندگان مربوطه
- پیگیری استعلام Control Valve های ایستگاه برای سازندگان مربوطه
- پیگیری انجام حواله ارزی پیش پرداخت لوله های ۴ و ۶ اینچ فلولاین
- پیگیری دریافت استعلام از سازندگان Flare
- پیگیری استعلام برای سازندگان On/Off Valve ایستگاه
- پیگیری جلسه PIM Pig Trap بسته خط لوله

۴-۳-۲ کالای تحت الارض پروژه

- (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)

۴-۴ فعالیتهای اجرایی (C)

- سنگ چینی پل های جاده چاه ۱۴ ، شماره ۲ ، ۳ ، ۵
- نقشه برداری چاه ۱۵ و نقشه برداری لوکیشن چاه ۵
- نصب و اجرای لوله فاضلاب ساختمان اداری و رستوران پترو ایران
- اجرای عملیات خط برق جدید، کارگاه
- اجرای عملیات موزاییک کاری walk way ساختمان رستوران پترو ایران

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">MONTHLY PROGRESS REPORT # 24</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>G00</td><td>0024</td><td>RT</td><td>GE</td><td>000</td><td>HD</td><td>GNRAL</td><td>BK</td></tr></table>	MONTHLY PROGRESS REPORT # 24								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	G00	0024	RT	GE	000	HD	GNRAL	BK	شماره صفحه : ۱۱ از ۳۴
MONTHLY PROGRESS REPORT # 24																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
G00	0024	RT	GE	000	HD	GNRAL	BK																			

- اجرای دیوار حائل کیلومتر ۲+۳۲۰ لغایت ۲+۳۵۰ جاده چاه ۱۴
- اجرای کابل کشی خط برق ساختمان اداری، رستوران پترو ایران و Warehouse
- خاکبرداری Burn Pit چاه ۴۶
- اخداث کانال هدایت آب های سطحی جاده چاه ۱۴
- خاکبرداری محوطه لوکیشن چاه ۴۶
- بارگیری و حمل مخلوط و تخلیه آن در محدوده تجهیز کارگاه
- پخش و تسطیح مخلوط های محدوده تجهیز کارگاه
- آبیاشی، تسطیح و میکس مصالح مخلوط محدوده تجهیز کارگاه
- آبیاشی و کوبش مصالح مخلوط محدوده تجهیز کارگاه
- حفاری کانال جهت کابل برق ساختمان اداری و مسکونی مناطق نفت خیز
- اجرای پلاستر دیوار جان پناه ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز
- اجرای قالب بندی و بتن ریزی پیاده رو محوطه بین ساختمان اداری و رستوران پترو ایران
- انجام عملیات خاکبرداری و پیکورزنی لوکیشن چاه ۱۴
- بارگیری و حمل آجر نما و پودر بندکشی جهت اجرای نمای ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز
- اجرای شبکه اینترنت و تلفن ساختمان های Warehouse، اداری و رستوران پترو ایران
- انجام عملیات برشکاری و جوشکاری جهت ساخت، قیف مصالح بتن
- اجرای عملیات شیب بندی و کرم گیری پشت بام ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک	 شرکت توسعه و پخش نفت ایران  HIRGAN ENERGY 																
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 24 <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GNRAL</td><td>HD</td><td>000</td><td>GE</td><td>RT</td><td>0024</td><td>G00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0024	G00	شماره صفحه : ۱۲ از ۳۴
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0024	G00											

۵ جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی / سطح الارض)

BINAK OILFIELD DEVELOPMENT SURFACE WORK-PACKAGES BASED ON PACKAGES						
Code	Description	W.F. (Total)	Last Progress%	This Period	Up to now Progress%	Client Approval 1402/02/03
	Total Project	100.000%	10.74%	0.35%	11.09%	6.88%
1	GENERAL	5.32%	59.76%	0.70%	60.46%	44.18%
1-1	General	5.32%	59.76%	0.70%	60.46%	44.18%
2	SUB-Surface DEVELOPMENT	18.18%	10.29%	0.45%	10.73%	9.11%
2-1	Engineering	0.36%	52.34%	0.94%	53.27%	48.76%
2-2	Procurement	11.14%	3.79%	0.58%	4.37%	3.12%
2-3	Construction	6.68%	18.83%	0.20%	19.03%	16.94%
3	SURFACE DEVELOPMENT	76.49%	7.44%	0.30%	7.74%	3.75%
3-1	Engineering	2.37%	45.91%	0.45%	46.36%	45.61%
3-2	Procurement	59.19%	7.78%	0.37%	8.15%	3.02%
3-3	Construction	13.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3-4	Commissioning, Startup & Handover	1.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک	 شرکت توسعه و پخش نفت ایران  HIRGAN ENERGY 																
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 24 <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GNRAL</td><td>HD</td><td>000</td><td>GE</td><td>RT</td><td>0024</td><td>G00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0024	G00	شماره صفحه : ۱۳ از ۳۴
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0024	G00											

۶ بخش کنترل پروژه

جدول میزان پیشرفت کل پروژه (عمومی / سطح الارض)

Description	W.F. (Disc)	W.F. (Total)	Roll-Up	Last Progress%	This Period	Up to now Progress%	Client Approval 1402/02/03
Total Project	100.000%	100.000%	100.00%	10.74%	0.35%	11.09%	6.88%
GENERAL	1.136%	1.136%	1.136%	59.761%	0.696%	60.46%	44.18%
Project Management	23.600%	0.268%	0.268%	57.177%	0.208%	57.39%	45.07%
Project Insurance	13.470%	0.153%	0.153%	90.677%	0.000%	90.68%	6.79%
Service to Company	35.400%	0.402%	0.402%	58.709%	1.177%	59.89%	46.19%
Training Courses	7.310%	0.083%	0.083%	5.000%	0.000%	5.00%	0.00%
GC Mobilization & Demobilization	20.220%	0.230%	0.230%	59.803%	0.000%	59.80%	55.57%
SUB-Surface DEVELOPMENT	52.342%	52.342%	52.338%	10.286%	0.446%	10.73%	9.11%
Package 01-New Well # W018S	5.210%	2.727%	2.723%	33.498%	2.805%	36.303%	34.245%
Package 02-New Well # W028 (Bangestan)	7.125%	3.729%	3.729%	38.874%	0.504%	39.378%	33.044%
Package 03-New Well # W046S (Bangestan)	33.462%	17.515%	17.515%	10.090%	0.176%	10.27%	8.95%
Package 04-New Well # W035 (Bangestan)	8.669%	4.538%	4.538%	14.393%	0.266%	14.66%	11.90%
Package 05-New Well # W008N	2.760%	1.445%	1.445%	4.858%	1.341%	6.20%	4.61%
Package 06-New Well # W007S/Manifold Extension (Bangestan)	12.934%	6.770%	6.770%	3.805%	0.395%	4.20%	3.09%
Package 07-Workover # 14	7.666%	4.013%	4.012%	4.123%	0.933%	5.06%	2.78%
Package 08-Workover # 12	6.237%	3.265%	3.264%	1.935%	0.100%	2.03%	1.90%
Package 09-Workover # 15	9.335%	4.886%	4.886%	1.352%	0.067%	1.42%	1.32%
Package 10-Workover # 05	6.602%	3.456%	3.456%	1.871%	0.094%	1.96%	1.83%
SURFACE DEVELOPMENT	46.522%	46.522%	46.522%	7.439%	0.300%	7.74%	3.75%
Package 11- EPC Pipeline 8" & 4"	15.529%	7.224%	7.224%	3.260%	0.642%	3.90%	1.38%
Package 12- EPC # Compressor Station	84.471%	39.298%	39.298%	8.489%	0.214%	8.70%	4.34%


 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																	
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 24 <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GNRAL</td><td>HD</td><td>000</td><td>GE</td><td>RT</td><td>0024</td><td>G00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0024	G00	شماره صفحه : ۱۴ از ۳۴
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0024	G00											

ضرایب وزنی فعالیت ها (W-F) (عمومی / سطح الارض) :

Cde	Description	W.F.(Discp.)	WF.(Total)
		100.00%	100.000%
1	GENERAL	5.32%	5.32%
1-1	Project Management	100.00%	5.32%
2	SUB-Surface DEVELOPMENT	18.18%	18.18%
2-1	Engineering	1.99%	0.36%
2-2	Procurement	61.26%	11.14%
2-3	Construction	36.75%	6.68%
3	SURFACE DEVELOPMENT	76.49%	76.49%
3-1	Engineering	3.09%	2.37%
3-2	Procurement	77.39%	59.19%
3-3	Construction	18.20%	13.92%
3-4	Commissioning, Startup & Handover	1.3%	1.01%


 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 24							شماره صفحه : ۱۵ از ۳۴
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0024	G00

نمودار پیشرفت بخش عمومی

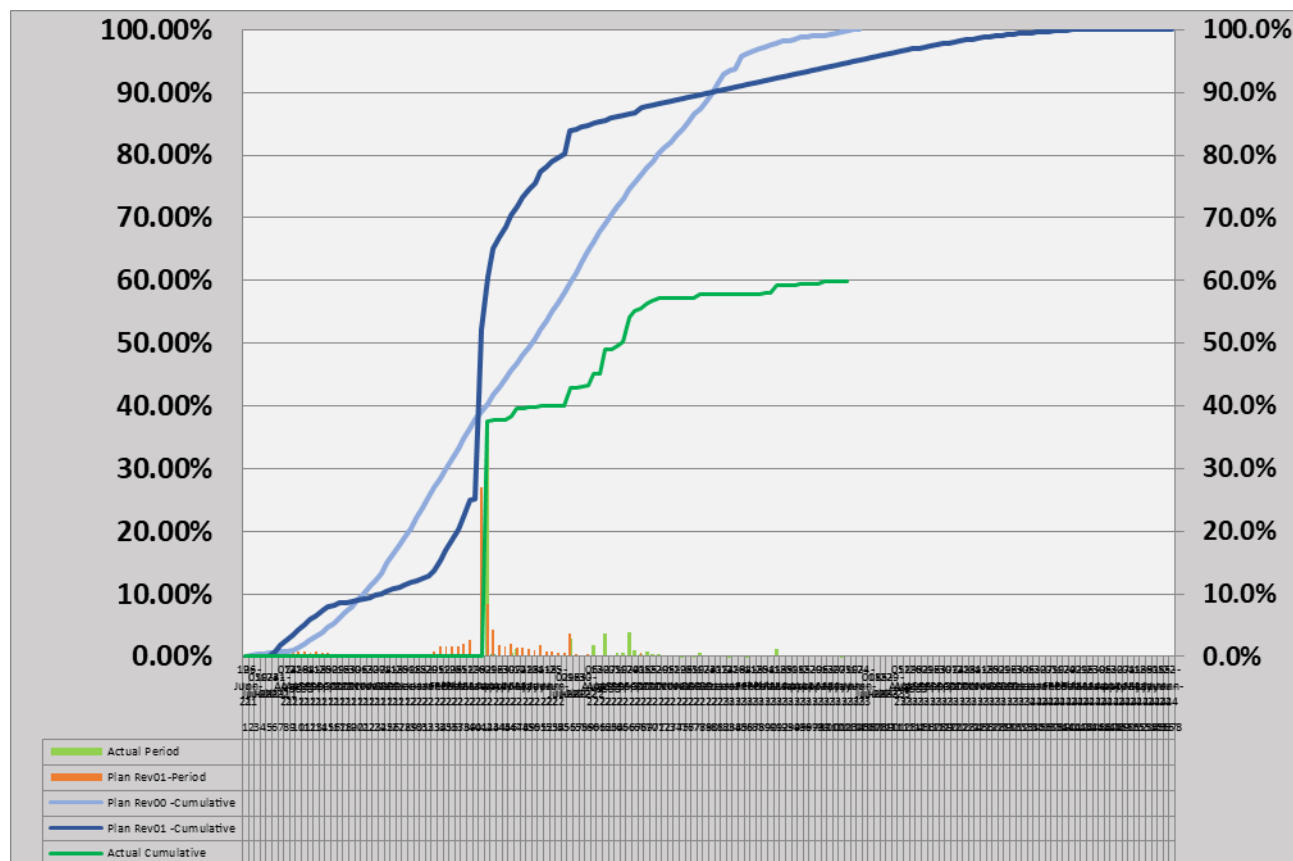


 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 24							شماره صفحه : ۱۶ از ۳۴
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0024	G00

نمودار پیشرفت بخش ابنیه تحت الارض

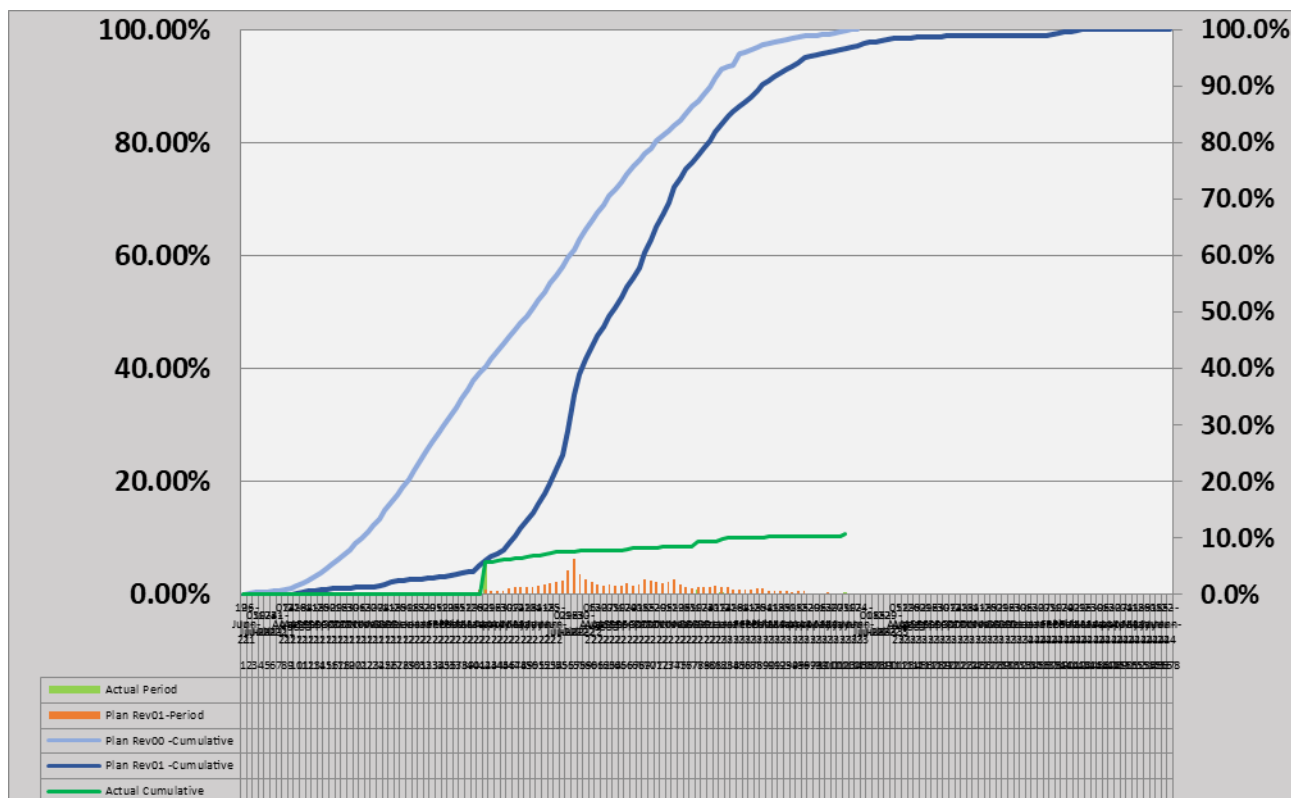

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پارس  HIRGAN ENERGY 
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 24							شماره صفحه: ۱۷ از ۳۴
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0024	G00


نمودار پیشرفت بخش سطح الارض

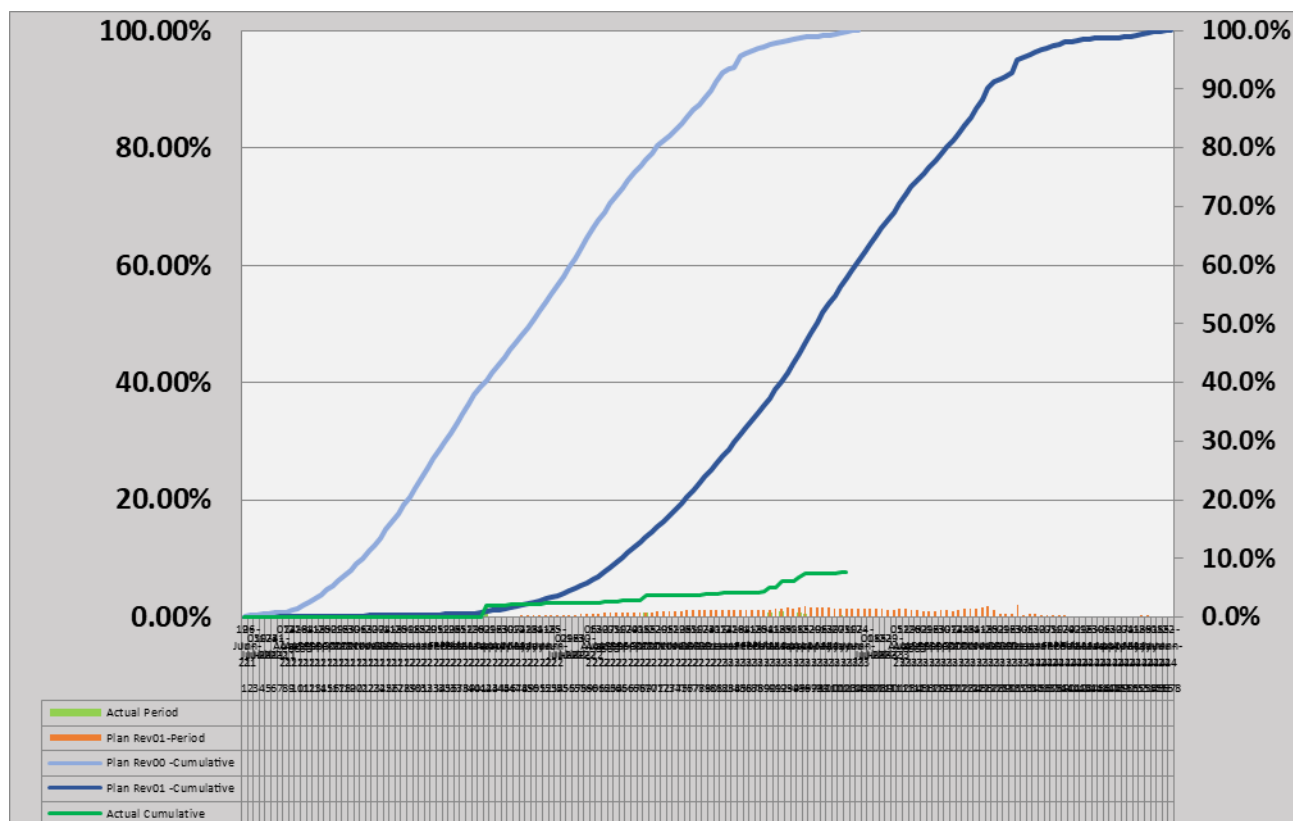

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">MONTHLY PROGRESS REPORT # 24</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>G00</td><td>0024</td><td>RT</td><td>GE</td><td>000</td><td>HD</td><td>GNRAL</td><td>BK</td></tr></table>	MONTHLY PROGRESS REPORT # 24								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	G00	0024	RT	GE	000	HD	GNRAL	BK	شماره صفحه : ۱۸ از ۳۴
MONTHLY PROGRESS REPORT # 24																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
G00	0024	RT	GE	000	HD	GNRAL	BK																			

جدول و نمودار پیشرفت EPC :

Total Project	100%	11.09%
Engineering	2.73%	47.28%
Procurement	70.33%	7.55%
Construction	20.60%	6.17%
Commissioning, Startup & Handover	1.01%	0.0%
Project Management	5.32%	60.46%

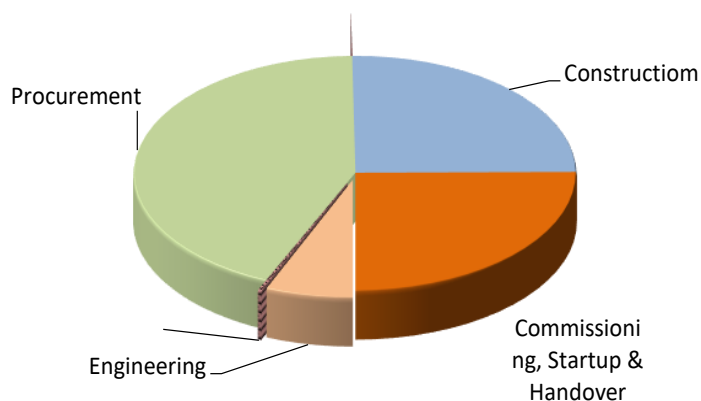

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 24							شماره صفحه : ۱۹ از ۳۴	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0024		G00

۷ وضعیت مدارک مهندسی

گزارش آخرین وضعیت مدارک مهندسی																					
		PM	PR	ME	HV	PI	PL	IN	SA	EL	TE	CV	AR	ST	GE	GT	QC	TP	SU	CO	
کل مدارک	Proj. Management	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28
	Common	-	13	11	8	28	32	23	17	73	8	28	11	27	39	1	43	0	0	0	362
	WELLHEAD FACILITIES	0	38	8	60	263	30	127	69	214	0	52	28	73	40	10	0	0	13	10	1035
	PIPELINE	0	19	4	0	22	22	58	5	18	0	3	0	2	7	2	0	0	2	1	165
	GCS	0	85	68	22	60	0	112	32	94	29	13	12	102	8	2	0	0	1	1	641
Total Doc		27	155	91	90	373	84	320	123	399	37	96	51	204	95	15	43	0	16	12	2231
تعداد کل مدارک ارسال شده	IFI	4	0	23	0	105	21	73	25	67	0	3	0	2	50	3	0	0	0	0	376
	IFC	10	3	1	15	35	2	16	5	11	1	9	8	16	6	3	14	0	4	0	159
	IFA	4	60	22	9	26	1	57	16	45	3	17	19	7	1	6	3	0	3	0	299
	AFC/AFD	30	85	28	5	30	28	50	40	54	18	33	16	29	6	2	2	0	5	0	461
Total Isu		48	148	74	29	196	52	196	86	177	22	62	43	54	63	14	19	0	12	0	1295

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شماره صفحه : ۲۰ از ۳۴
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 24							
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه
	G00	0024	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK

۸ بخش مالی پروژه

آخرین وضعیت	تاریخ رسید وجه	پیشرفت مالی نسبت به وزن	پیشرفت مالی (تجمعی)	صورت وضعیت تایید شده	صورت وضعیت ادعا شده (پروژه)	صورت وضعیت به پیمانکار - ریال	پرداخت پیش پرداخت	ضمانت نامه ارائه شده به کارفرما - ریال	مبلغ پیمان واحد	واحد وزن	بخش اصلی / الحاقیه ۱	شرح فعالیت
پرداخت شده	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۷۱۸,۱۹۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۷۷,۹۸۸,۷۵۶,۶۱۷	۱۷۷,۹۸۸,۷۵۶,۶۱۷	۳۵,۹۰۰,۹۸۸	-	-	اصلی	پیش پرداخت
پرداخت شده	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۱۰۰٪	۳۰۰٪	۱,۰۷۷,۲۹۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۲۸۰,۵۷۶,۲۶۰,۸۸۸	۲۸۰,۵۷۶,۲۶۰,۸۸۸	۳۵,۹۰۰,۹۸۸	-	-	اصلی	قسط دوم پیش پرداخت (۳٪ مبلغ پیمان)
عدم تایید			۱۲,۸۸٪	۱۰۱,۰۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	-	-	۹۸۰,۰۰۰	-	-	اصلی	برآورد کارکرد (WPA) بخش مهندسی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ الی ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
عدم تایید			۱۳,۶۷٪	۱۳۴,۳۴۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	-	-	۹۸۰,۰۰۰	-	-	اصلی	برآورد کارکرد (WPA) بخش مهندسی - شماره ۱ (به روز شده) (BK-HD-WPA-E-۰۰۰۱-G-۰۱)
تایید			۴,۶۳٪	۴۳۰,۰۴۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	-	-	۹,۳۱۱,۵۶۰	-	-	اصلی	برآورد کارکرد (WPA) بخش های عمومی و اجرا - شماره ۱ منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تایید			۶,۹۳٪	۶۴۴,۳۴۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	-	-	۹,۳۱۱,۵۶۰	-	-	اصلی	برآورد کارکرد (WPA) بخش های عمومی و اجرا - شماره ۱ (به روز شده) از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ الی ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
بصورت الحساب و در چند قسط پرداخت شده	۱۴۰۰/۱۱/۱۶		۱۶۷,۴۱۴	۱۶۷,۴۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	-	-	۹۸۰,۰۰۰	-	-	اصلی	صورت وضعیت شماره ۱ مهندسی (منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶)
بصورت الحساب و در چند قسط پرداخت شده	۱۴۰۰/۱۱/۱۸		۴,۵۲٪	۲۲۳,۱۹۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	-	-	۹,۶۷۳,۶۱۳	-	-	اصلی	صورت وضعیت شماره ۱ عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸)
پرداختی					۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اصلی	دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت ۱ مهندسی و ۱ اجرا
تایید			۱۹,۱۵٪	۱۸۷,۶۷۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	-	-	۹۸۰,۰۰۰	-	-	اصلی	برآورد کارکرد (WPA) شماره ۲ مهندسی (منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹)
تایید			۹,۱۸٪	۸۸۷,۸۹۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	-	-	۹,۶۷۳,۶۱۳	-	-	اصلی	برآورد کارکرد (WPA) شماره ۲ عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹)
پرداختی					۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اصلی	دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت ۱ مهندسی و ۱ اجرا
پرداختی					۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۶,۸۵۹,۳۳۰,۶۶۷	-	-	-	-	اصلی	دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت ۱ مهندسی و ۱ اجرا
پرداخت شده	۱۴۰۰/۱۲/۰۹		۱۹,۱۵٪	۲۰,۳۵۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۸۷,۶۷۰	-	-	۹۸۰,۰۰۰	-	اصلی	صورت وضعیت شماره ۲ مهندسی (منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹)
پرداخت شده	۱۴۰۰/۱۲/۰۷		۶,۹۵٪	۲۲۸,۹۳۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۶۷۲,۱۲۵	-	-	۹,۶۷۳,۶۱۳	-	اصلی	صورت وضعیت شماره ۲ عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷)
			۲۵,۷۶٪	۲۵۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	-	-	۹۸۰,۰۰۰	-	-	اصلی	برآورد کارکرد بخش مهندسی - شماره ۳ (BK-HD-WPA-E) (G-۰۰۰۰۰۰۳)
			۹,۴۰٪	۹۰۰,۹۴۷۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	-	-	۹,۶۷۳,۶۱۳	-	-	اصلی	برآورد کارکرد بخش های عمومی و اجرا - شماره ۳ (BK-HD-WPA-E) (G-۰۰۰۰۰۰۳)
پرداخت شده	۱۴۰۰/۱۲/۲۵		۲۵,۷۶٪	۲۵۲,۴۵۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	-	-	۹۸۰,۰۰۰	-	-	اصلی	صورت وضعیت شماره ۳ مهندسی (از ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ الی ۱۴۰۰/۱۲/۲۵)
پرداخت شده	۱۴۰۰/۱۲/۲۵		۱۹,۱۷٪	۸۶۳,۸۶۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	-	-	۹,۶۷۳,۶۱۳	-	-	اصلی	صورت وضعیت شماره ۳ عمومی و اجرا (از ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ الی ۱۴۰۰/۱۲/۲۵)
تایید جهت تهیه صورت وضعیت	۱۴۰۰/۰۳/۰۲		۳۱,۷۵٪	۳۱۷,۵۷۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	-	-	۹۸۰,۰۰۰	-	-		برآورد کارکرد بخش مهندسی - شماره ۴ (BK-HD-WPA-E) (G-۰۰۰۰۰۰۴)
عدم تایید			۱۰,۶۳٪	۱,۰۲۷,۷۵۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	-	-	۹,۶۷۳,۶۱۳	-	-		برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی - شماره ۴ (BK) (HD-WPA-C-۰۰۰۰۰۰۴-G-۰۰)
تایید			۱۰,۶۳٪	۱,۰۲۷,۷۵۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	-	-	۹,۶۷۳,۶۱۳	-	-		برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی - شماره ۴ (BK) (HD-WPA-C-۰۰۰۰۰۰۴-G-۰۱)
پرداخت شده	۱۴۰۰/۰۳/۲۹		۳۱,۷۵٪	۳۱۷,۵۷۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	-	-	۹۸۰,۰۰۰	-	-		صورت وضعیت شماره ۴ مهندسی (از ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ الی ۱۴۰۰/۰۳/۲۹)
پرداخت شده	۱۴۰۰/۰۳/۲۹		۹,۹۲٪	۹۵۸,۱۸۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	-	-	۹,۶۷۳,۶۱۳	-	-		صورت وضعیت شماره ۴ ساختمان و نصب و عمومی (از ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ الی ۱۴۰۰/۰۳/۲۹)
تایید			۳۸,۹۸٪		۱۴۰۰/۰۷/۰۹	-	-	۹۸۰,۰۰۰	-	-		برآورد کارکرد بخش مهندسی - شماره ۵ (BK-HD-WPA-E) (G-۰۰۰۰۰۰۵)
تایید			۱۰,۷۰٪		۱۴۰۰/۰۷/۰۹	-	-	۹,۶۷۳,۶۱۳	-	-		برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی - شماره ۵ (BK) (HD-WPA-C-۰۰۰۰۰۰۵-G-۰۰)
پرداخت شده	۱۴۰۰/۰۸/۰۴		۳۸,۹۹٪	۳۸۲,۰۷۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	-	-	۹۸۰,۰۰۰	-	-		صورت وضعیت شماره ۵ مهندسی (از ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ الی ۱۴۰۰/۰۸/۰۴)
پرداخت شده	۱۴۰۰/۰۸/۰۷		۲۳,۳۴٪	۹۹۳,۰۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	-	-	۹,۶۷۳,۶۱۳	-	-		صورت وضعیت شماره ۵ ساختمان و نصب و عمومی (از ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ الی ۱۴۰۰/۰۸/۰۷)
تایید			۴۱,۲۷٪		۱۴۰۰/۰۹/۲۰	-	-	۹۸۰,۰۰۰	-	-		برآورد کارکرد بخش مهندسی - شماره ۶ (BK-HD-WPA-E) (G-۰۰۰۰۰۰۶)
تایید			۱۱,۶۵٪		۱۴۰۰/۰۹/۲۳	-	-	۹,۶۷۳,۶۱۳	-	-		برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی - شماره ۶ (BK-HD-WPA-C-۰۰۰۰۰۰۶-G-۰۰)
پرداخت شده	۱۴۰۰/۱۰/۰۰		۱۶,۵۲٪	۲۲,۳۷۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۰	-	-	۹۸۰,۰۰۰	-	-		صورت وضعیت شماره ۶ مهندسی (از ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ الی ۱۴۰۰/۱۰/۰۰)
پرداخت شده	۱۴۰۰/۱۰/۰۰		۱۱,۶۳٪	۱۳۱,۰۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۰	-	-	۹,۶۷۳,۶۱۳	-	-		صورت وضعیت شماره ۶ ساختمان و نصب و عمومی (از ۱۴۰۰/۱۰/۰۰ الی ۱۴۰۰/۱۰/۰۰)
تایید			۴۲,۸۱٪		۱۴۰۰/۱۱/۰۱	-	-	۹۸۰,۰۰۰	-	-		برآورد کارکرد بخش مهندسی - شماره ۷ (BK-HD-WPA-E) (G-۰۰۰۰۰۰۷)
تایید			۱۱,۸۳٪		۱۴۰۰/۱۱/۰۱	-	-	۹,۶۷۳,۶۱۳	-	-		برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی - شماره ۷ (BK-HD-WPA-C-۰۰۰۰۰۰۷-G-۰۰)
پرداخت شده	۱۴۰۰/۱۲/۰۶		۲۰,۶۴٪	۲۰,۶۴۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	-	-	۹۸۰,۰۰۰	-	-		صورت وضعیت شماره ۷ مهندسی (از ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۱۲/۰۶)
پرداخت شده	۱۴۰۰/۱۲/۰۷		۱۳,۱۶٪	۲۰,۶۴۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	-	-	۹,۶۷۳,۶۱۳	-	-		صورت وضعیت شماره ۷ ساختمان و نصب و عمومی (از ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ الی ۱۴۰۰/۱۲/۰۷)
تایید			۴۵,۵۷٪		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	-	-	۹۸۰,۰۰۰	-	-		برآورد کارکرد بخش مهندسی - شماره ۸ (BK-HD-WPA-E) (G-۰۰۰۰۰۰۸)
تایید			۱۲,۲۹٪		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	-	-	۹,۶۷۳,۶۱۳	-	-		برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی - شماره ۸ (BK-HD-WPA-C-۰۰۰۰۰۰۸-G-۰۰)
پرداخت شده	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۲۷,۳۱٪	۲۷,۳۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	-	-	۹۸۰,۰۰۰	-	-		صورت وضعیت شماره ۸ مهندسی (از ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ الی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱)
پرداخت شده	۱۴۰۰/۰۳/۳۰		۶,۸۵٪	۵۲,۰۳۵	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	-	-	۹,۶۷۳,۶۱۳	-	-		صورت وضعیت شماره ۸ ساختمان و نصب و عمومی (از ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ الی ۱۴۰۰/۰۳/۳۰)
تایید			۴۲,۲۰٪		۱۴۰۰/۰۳/۰۹	-	-	۹۸۰,۰۰۰	-	-		برآورد کارکرد بخش مهندسی - شماره ۹ (BK-HD-WPA-E) (G-۰۰۰۰۰۰۹)
تایید			۱۲,۲۳٪		۱۴۰۰/۰۳/۰۹	-	-	۹,۶۷۳,۶۱۳	-	-		برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی - شماره ۹ (BK-HD-WPA-C-۰۰۰۰۰۰۹-G-۰۰)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پالایش نفت ایران  HIRGAN ENERGY 
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 24							شماره صفحه : ۲۱ از ۳۴
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0024	G00

۹ بخش تدارکات کالا



 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پخش نفت ایران  HIRGAN ENERGY 	
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 24							شماره صفحه : ۲۴ از ۳۴	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0024		G00

۱۱ مکاتبات با کارفرما

۱-۱۱ مکاتبات وارده از کارفرما :

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
۱	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانس میتال ها	1402/02/23	2613
۲	ارسال مسیر برق رسانی به کارگاه و کمپ کارفرما	1402/02/23	2615
۳	پاسخ نامه درخواست جلسه جمع بندی نظرات TBE سیستم کنترل/ESD	1402/02/23	2618
۴	تامین بچینگ پلنت و استقرار آزمایشگاه مکانیک خاک در کارگاه	1402/02/24	2686
۵	پاسخ به گزارش پیشرفت GCS و WHCP پروژه	1402/02/24	2688
۶	تسریع در تکمیل تجهیز کارگاه	1402/02/24	2699
۷	تکمیل انبار و تامین ماشین آلات پروژه	1402/02/24	2745
۸	دعوت به جلسه بررسی تغییر ابعاد و فشار طراحی برخی از مخازن تحت فشار-GCS	1402/02/25	2811
۹	دعوت به جلسه بررسی PLAT PLAN چاههای W007S و W008N	1402/02/25	2786
۱۰	پاسخ ذینفع اصلی در خصوص گزارشات بازرسی پل های WHCP	1402/02/25	2795
۱۱	تامین دو دستگاه WHCP باقی مانده	1402/02/25	2827
۱۲	تجهیز کاروان	1402/02/25	2834
۱۳	گزارش کارفرما مبنی بر انجام عمل نالایم توسط آقای رسول طاهری (برقکار)	1402/02/25	HSE-B-134
۱۴	پیگیری ارسال ویرایش جدید لیست مدارک پروژه MDL	1402/02/27	2918
۱۵	جبهه های کاری پیش رو در بخش خرید و اجرا	1402/02/30	3076
۱۶	ضرورت تسریع در فعال نمودن تمامی جبهه های کاری چاه	1402/02/30	3089
۱۷	ارسال صورتجلسه بررسی نقطه نظرات نقشه های سیویل لوکیشن چاه بسته W046S	1402/02/30	3090
۱۸	پیگیری دوم ارسال مدارک جایگزین	1402/02/30	3092
۱۹	پاسخ به مدرک سازنده کمپرسورهای گاز هوایار SUB - VENDOR - LIST-V00	1402/02/31	3134
۲۰	پاسخ به بسته تغییر کار شماره ۴ تغییر ابعاد و فشار طراحی برخی از مخازن تحت فشار-GCS	1402/02/31	3137
۲۱	پاسخ به بسته تغییر کار شماره ۲ ادغام ساختمان های کنترل جدید موجود-GCS	1402/02/31	3140
۲۲	پاسخ به مدارک سازنده کمپرسورهای گاز تقویت فشار بینک	1402/02/31	3143
۲۳	تذکر قراردادی بدلیل تاخیرات آن پیمانکار در بخشهای E,P,C	1402/02/31	3160
۲۴	پاسخ به درخواست مجدد جهت تأدیه ۵۰٪ تقریبی باقیمانده قسط اول پیش پرداخت کالا	1402/03/02	3348

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 24							شماره صفحه : ۲۵ از ۳۴	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0024	G00	

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
۲۵	تامین دیزل ژنراتورهای سرچاهی	1402/03/02	3353
۲۶	آموزش جهت پنل های سر چاهی WHCP	1402/03/02	3355
۲۷	صورتحجلسه رفع مغایرت های بخش مهندسی سطح الارض طرح بینک	1402/03/02	3350
۲۸	تاییدیه برآورد کارکرد بخش مهندسی	1402/03/02	3354
۲۹	لزوم تسریع در پیشبرد مهندسی و اجرای ابنیه تحت الارض	1402/03/03	3432
۳۰	لزوم ارائه خدمات رفاهی	1402/03/03	3507
۳۱	تجهیز و تکمیل انبار بینک	1402/03/06	3546
۳۲	پاسخ به بسته تغییر کار شماره یک -پکیج نمزدای GCS-جمع آوری بخارات گلایکول و سیستم های ESD/BMS	1402/03/07	3707
۳۳	تولید تمامی مدارک مهندسی و تامین کالاهای چاه های تعمیری	1402/03/07	3718
۳۴	صورتحجلسه بررسی موارد مهندسی و کالا	1402/03/07	3736
۳۵	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترنسمیتال های شماره TR-HY-0001	1402/03/07	3756
۳۶	پاسخ به بسته تغییر کار شماره ۳ تغییر ضخامت لوله ۴ اینچ خط آتش چاه ها	1402/03/07	3757
۳۷	ارسال نقشه جانمایی کارگاه مرکزی و انبار	1402/03/07	3762
۳۸	انتشار صورتحجلسه مورخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۲	1402/03/08	3759
۳۹	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترنسمیتال ها	1402/03/08	3760
۴۰	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترنسمیتال ها	1402/03/08	3761
۴۱	آزمایش عملکردی در زمان FAT پنل سر چاهی WHCP	1402/03/09	3915
۴۲	پاسخ به نامه پیگیری مجدد کتاچه های نهایی و مدارک مکانیکال ایستگاه موجود تقویت فشار گاز بینک	1402/03/09	3918
۴۳	صورتحجلسه FAT دو دستگاه WHCP	1402/03/09	3923
۴۴	ارسال ویرایش نهایی مدارک تایید شده توسط دینفع اصلی	1402/03/10	4034
۴۵	تذکر عدم رعایت نکات ایمنی به سرپرست کارگاه	1402/03/10	4036
۴۶	عدم رضایت از پیشرفت عملیات اجرایی چاه ها	1402/03/10	4061
۴۷	پیگیری گزارش پیشرفت ساخت کمپرسورهای گازی	1402/03/10	4062
۴۸	پاسخ به پیگیری مجدد اضافه کاری منتج از اختصاص سازی UCP ردیف های پکیج کمپرسور گاز GCS	1402/03/10	4081
۴۹	پیگیری تعهدات آموزشی طرح توسعه میدان بینک	1402/03/10	4090
۵۰	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها	1402/03/13	4155
۵۱	خرید و نصب پایه های روشنایی در چاه محل های چاههای تعمیراتی	1402/03/13	4244

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک	 شرکت توسعه و پخش نفت ایران  HIRGAN ENERGY 																
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 24 <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GNRAL</td><td>PEDCO</td><td>000</td><td>GE</td><td>RT</td><td>0024</td><td>G00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0024	G00	شماره صفحه : ۲۶ از ۳۴
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0024	G00											

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
۵۲	تسریع در تکمیل و تجهیز کارگاه مرکزی	1402/03/13	4281
۵۳	پاسخ به نامه با موضوع " پاسخ به تذکر قراردادی آن کارفرمای محترم"	1402/03/16	4315
۵۴	پاسخ قرارداد خرید توپک ران و توپک گیر پروژه بینک	1402/03/16	4325
۵۵	صورجلسه بازدید میدانی از چاه های تعمیری BK-5,BK-12,BK-15	1402/03/16	4328
۵۶	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسسمیتال ها	1402/03/16	4382
۵۷	فهرست نفقات جهت اخذ مجوز تردد در محدوده طرح بینک	1402/03/20	4553
۵۸	تایید رئیس جدید مهندسی	1402/03/20	4628
۵۹	تکمیل انبار کارگاه اخذ شناسه انبار	1402/03/21	4722
۶۰	شرکت در جلسه نهایی سازی مدارک ویرایش ۰۲ به بالا	1402/03/21	4725
۶۱	پاسخ به نامه نهایی سازی نقشه های سیویل چاه شماره ۱۴	1402/03/22	4833

۲-۱۱ مکاتبات صادره به کارفرما :

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
۱	پاسخ به نظرات NISOC درخصوص گزارش مهندسی ارزش GCS (ویرایش D04)	1402/02/30	0787
۲	صورت وضعیت شماره ۸ ساختمان و نصب و عمومی (از ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹)	1402/02/30	0788
۳	برآورد اصلاح شده کارکرد بخش مهندسی - شماره ۸ (BK-HD-WPA-E-0008_G01)	1402/02/30	0789
۴	توسعه کلاستر بینک؛ معرفی سازنده منتخب شیر کنترل/قطع اضطراری	1402/02/30	0790
۵	درخواست مجدد جهت تأدیه ۵۰٪ تقریبی باقیمانده قسط اول پیش پرداخت کالا (۴٪ مبلغ پیمان)	1402/02/31	0791
۶	پاسخ تکمیلی به نظرات جدید NISOC درخصوص موقعیت و جاده چاه W008N (درج شده بر طرح مدیریت پسماند)	1402/03/01	0792
۷	لوله های (۶ اینچ) فلولاین و (۴ اینچ) خط آتش چاه ها- تخصیص ارز	1402/03/01	0793
۸	جانمایی ساختمان انبار جدید درخواستی کارفرما و توسعه ساختمان کنترل موجود	1402/03/01	0794
۹	آموزش جهت WHCP های سرچاهی	1402/03/03	0795
۱۰	صورت وضعیت شماره ۸ مهندسی (از ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹)	1402/03/03	0796
۱۱	معرفی سازنده منتخب لوله های (۸ اینچ) خط انتقال گاز به ایستگاه تزریق گاز سیاهمان	1402/03/03	0797
۱۲	پاسخ به نظرات NISOC بر روی مدرک VPIS_V02 کمپرسورهای گاز (هوایار)	1402/03/06	0798
۱۳	پیگیری اخذ بازخورد بر روی مدرک "Nitrogen &GCS; TBE For Air Packages_D00"	1402/03/07	0799

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 24							شماره صفحه : ۲۷ از ۳۴
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0024	G00

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
۱۴	پاسخ به تذکر قراردادی آن کارفرمای محترم (درخصوص تاخیرات در پروژه؛ مطروحه از جانب آن کارفرمای محترم)	1402/03/08	0800
۱۵	معرفی رئیس جدید مهندسی پروژه	1402/03/08	0801
۱۶	برآورد کارکرد بخش مهندسی - شماره ۹ (BK-HD-WPA-E-0009_G00)	1402/03/09	0802
۱۷	برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی - شماره ۹ (BK-HD-WPA-C-0009_G00)	1402/03/09	0803
۱۸	تاریخ KOM و PIM توپک ران/توپک گیر	1402/03/10	0804
۱۹	ظرفیت دیزل ژنراتور سرچاهی	1402/03/10	0805
۲۰	طرح جدید مدیریت پسماند چاه های توسعه ای - تبعات اولیه تغییر کاری مترتبه (تجمع شده)	1402/03/10	0806
۲۱	برنامه عملیاتی جهت آماده سازی چاه- محل های BK-14 و W046S (پیش از استقرار دکل حفاری)	1402/03/16	0807
۲۲	درخواست واریز مانده مبلغ ۶ صورت وضعیت مهندسی و عمومی/اجرا	1402/03/17	0808
۲۳	پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره ۷ مهندسی (منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۱)	1402/03/17	0809
۲۴	پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره ۷ ساختمان و نصب و عمومی (منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۱)	1402/03/17	0810
۲۵	درخواست تمدید زمان قرارداد و تنظیم و مبادله الحاقیه مربوطه	1402/03/17	0811
۲۶	پیگیری مجدد تأدیه الباقي مبلغ قسط اول پیش پرداخت کالا (۴٪ مبلغ پیمان)	1402/03/22	0812

۳-۱۱ لیست صورتجلسات پروژه

ردیف	عنوان صورت جلسه	تاریخ صورت جلسه	شماره صورت جلسه	ملاحظات
۱	صورتجلسه رفع مغایرت های بخش مهندسی سطح الارض طرح بینک	1402/01/24		
۲	صورتجلسه واگذاری برق به پیمانکاران	1402/02/30		
۳	صورتجلسه بررسی نقطه نظرات نقشه های سیویل لوکیشن چاه بسته W046S	1402/01/31		
۴	صورتجلسه بررسی موارد مهندسی و کالا	1402/03/06		
۵	بررسی تغییر ابعاد و فشار طراحی برخی از مخازن تحت فشار-GCS	1402/02/25		
۶	صورتجلسه رفع ابهامات شرح خدمات اجرایی و شرح کار چاه های تعمیر BK5, BK12, BK15	1402/03/02		
۷	بررسی موارد مهندسی و کالا با شرکت هیرگان انرژی	1402/03/21		

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 24							شماره صفحه : ۲۸ از ۳۴
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0024	G00

۴-۱۱ لیست مکاتبات بدون پاسخ

ردیف	عنوان/خلاصه نامه	تاریخ نامه	شماره نامه	ملاحظات
۱	جانمایی ساختمان انبار جدید درخواستی کارفرما و توسعه ساختمان کنترل موجود	1402/03/01	0794	
۲	آموزش جهت WHCP های سرچاهی	1402/03/03	0795	
۳	برآورد کارکرد بخش مهندسی - شماره ۹ (BK-HD-WPA-E-0009_G00)	1402/03/09	0802	
۴	برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی - شماره ۹ (BK-HD-WPA-C-0009_G00)	1402/03/09	0803	
۵	درخواست واریز مانده مبلغ ۶ صورت وضعیت مهندسی و عمومی/اجرا	1402/03/17	0808	
۶	پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره ۷ مهندسی (منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۱)	1402/03/17	0809	
۷	پیگیری دریافت مبلغ صورت وضعیت شماره ۷ ساختمان و نصب و عمومی (منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۱)	1402/03/17	0810	
۸	درخواست تمدید زمان قرارداد و تنظیم و مبادله الحاقیه مربوطه	1402/03/17	0811	
۹	پیگیری مجدد تأدیه الباقی مبلغ قسط اول پیش پرداخت کالا (۴٪ مبلغ پیمان)	1402/03/22	0812	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 24							شماره صفحه : ۲۹ از ۳۴	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0024		G00

۱۲- مشکلات و موانع

- مشکلات مربوط به جذب نیرو و تکمیل چارت سازمانی پروژه با توجه به شرایط موجود
- عدم هماهنگی بین کامنتهای پترو ایران و کارفرمای اصلی.
- با توجه به عدم پرداخت مالی کامل پروژه و معوق ماندن درخواستهای مالی اعلام شده صورت وضعیت شماره ۷, ۶ و مهندسی ، صورت وضعیت شماره ۷, ۶ بخش عمومی و اجرا) موجب شده است جریان نقدینگی پروژه به شدت منفی شود .

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پارس  HIRGAN ENERGY 
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 24							شماره صفحه : ۳۰ از ۳۴
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0024	G00

۱۳ موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت

- دریافت با تاخیر نظرات کارفرمای محترم بر روی مدارک ارسالی
- وجود برخی تناقضات در نظرات کارفرمایان (شرکت پتروایران و شرکت مناطق نفتخیز جنوب) درخصوص مدارک ارسالی
- تاخیر در نهایی سازی وضعیت طرح مدیریت پسماند چاه ها (توسط کارفرمای محترم) و بالتبع تاخیر در نهایی سازی نقشه ها و کندی پیشرفت کار اجرایی مربوطه
- تغییر برنامه استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و در نتیجه تغییر برنامه کلی پروژه
- نامشخص بودن تاریخ دقیق استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و در نتیجه متاثر شدن برنامه آماده سازی لوکیشن چاه ها و خرید اقلام مربوطه مورد نیاز
- عدم پرداخت صورت وضعیت شماره ۶ و ۷ مهندسی توسط کارفرمای محترم
- عدم پرداخت صورت وضعیت شماره ۶ و ۷ عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم
- محدودیت های ایجاد شده در تامین کالای ساخت داخل کشور و متعاقب آن سو استفاده برخی شرکت های لوله ساز داخلی و افزایش بی دلیل قیمت ها
- افزایش بی رویه کلیه قیمت های مهندسی، خرید و اجرا علیرغم عدم تغییر نرخ تسعیر ارز نیمایی

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">MONTHLY PROGRESS REPORT # 24</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>G00</td><td>0024</td><td>RT</td><td>GE</td><td>000</td><td>PEDCO</td><td>GNRAL</td><td>BK</td></tr></table>	MONTHLY PROGRESS REPORT # 24								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	G00	0024	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK	شماره صفحه : ۳۱ از ۳۴
MONTHLY PROGRESS REPORT # 24																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
G00	0024	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK																			

۱۴ بخش کنترل پروژه

- ۱-۱۴ برنامه زمان بندی پروژه
- ۲-۱۴ لیست مدارک ارسال شده طی دوره
- ۲-۱۴ لیست مدارک دارای تاخیر در پاسخ از سوی کارفرما
- ۳-۱۴ جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">MONTHLY PROGRESS REPORT # 24</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>G00</td><td>0024</td><td>RT</td><td>GE</td><td>000</td><td>PEDCO</td><td>GNRAL</td><td>BK</td></tr></table>	MONTHLY PROGRESS REPORT # 24								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	G00	0024	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK	شماره صفحه : ۳۲ از ۳۴
MONTHLY PROGRESS REPORT # 24																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
G00	0024	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK																			

۱۵ ضمائم

پیوست شماره یک: برنامه زمان بندی پروژه

پس از اعمال تغییرات و به روز رسانی برنامه ارائه خواهد شد.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">MONTHLY PROGRESS REPORT # 24</th></tr><tr><td>نسخه</td><td>سریال</td><td>نوع مدرک</td><td>رشته</td><td>تسهیلات</td><td>صادرکننده</td><td>بسته کاری</td><td>پروژه</td></tr><tr><td>G00</td><td>0024</td><td>RT</td><td>GE</td><td>000</td><td>PEDCO</td><td>GNRAL</td><td>BK</td></tr></table>	MONTHLY PROGRESS REPORT # 24								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	G00	0024	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK	شماره صفحه : ۳۳ از ۳۴
MONTHLY PROGRESS REPORT # 24																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
G00	0024	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK																			

پیوست شماره دو : لیست مدارک ارسال شده طی دوره
(در پیوست)

پیوست شماره سه: جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)
(در پیوست)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">MONTHLY PROGRESS REPORT # 24</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادر کننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>G00</td><td>0024</td><td>RT</td><td>GE</td><td>000</td><td>PEDCO</td><td>GNRAL</td><td>BK</td></tr></table>	MONTHLY PROGRESS REPORT # 24								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	G00	0024	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK	شماره صفحه : ۳۴ از ۳۴
MONTHLY PROGRESS REPORT # 24																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
G00	0024	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK																			

پیوست شماره چهار: عکسهایی از عملیات اجرایی
(در پیوست)
