

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک	 																
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 27 <table border="1"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادر کننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GNRAL</td> <td>HD</td> <td>000</td> <td>GE</td> <td>RT</td> <td>0027</td> <td>G00</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0027	G00	شماره صفحه : 1 از 34
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0027	G00											

طرح نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن

MONTHLY PROGRESS REPORT # 27

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک

G00	SEP. 2023	IFI	M.Aref	M.Fakharian	A.Mohseni	
Rev.	Date	Purpose of Issue/Status	Prepared by:	Checked by:	Approved by:	CLIENT Approval
Class: 3		CLIENT Doc. Number: F0Z-707097				

Status:

IDC: Inter-Discipline Check
 IFC: Issued For Comment
 IFA: Issued For Approval
 AFD: Approved For Design
 AFC: Approved For Construction
 AFP: Approved For Purchase
 AFQ: Approved For Quotation
 IFI: Issued For Information
 AB-R: As-Built for CLIENT Review
 AB-A: As-Built –Approved

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 27 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادر کننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GNRAL</td> <td>HD</td> <td>000</td> <td>GE</td> <td>RT</td> <td>0027</td> <td>G00</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0027	G00	شماره صفحه : 2 از 34
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0027	G00											

REVISION RECORD SHEET

PAGE	G00	G01	G02	G03	G04
1	X				
2	X				
3	X				
4	X				
5	X				
6	X				
7	X				
8	X				
9	X				
10	X				
11	X				
12	X				
13	X				
14	X				
15	X				
16	X				
17	X				
18	X				
19	X				
20	X				
21	X				
22	X				
23	X				
24	X				
25	X				
26	X				
27	X				
28	X				
29	X				
30	X				
31	X				
32	X				
33	X				
34	X				
35	X				
36	X				
37	X				
38	X				
39	X				
40	X				
41	X				
42	X				
43	X				
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					

PAGE	G00	G01	G02	G03	G04
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پارسا  HIRGAN ENERGY 	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 27							شماره صفحه : 3 از 34	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0027		G00

فهرست مطالب

1	مشخصات قراردادی پروژه.....	4
2	معرفی پروژه.....	5
3	گزارش مدیریتی پروژه.....	8
4	گزارش فعالیت‌های انجام شده.....	9
5	جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی/تحت الارض /سطح الارض).....	12
6	بخش کنترل پروژه.....	13
7	وضعیت مدارک مهندسی.....	19
8	بخش مالی پروژه.....	20
9	بخش تدارکات کالا.....	21
10	نمودار سازمانی پیمانکار.....	22
11	مکاتبات با کارفرما.....	24
12	مشکلات و موانع.....	29
13	موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت.....	30
14	بخش کنترل پروژه.....	31
15	ضمائم.....	32

* گزارش ترنسیتال لیست به پیوست می باشد.

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 27							شماره صفحه : 4 از 34	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0027		G00

۱ مشخصات قراردادی پروژه

نام پروژه:

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک/ بخش سطح الارض و ابنیه تحت الارض

کارفرمای اصلی:

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
اهواز، کوی فداییان اسلام، ساختمان 5 طبقه/ تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

مجری و نماینده کارفرمای اصلی:

علیرضا محمدی خواه (سرپرست طرح های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران)

کارفرما (پیمانکار عمومی):

شرکت توسعه پتروایران
تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

مدیر پروژه و نماینده کارفرما (پیمانکار عمومی):
امیر محمد محسنی

پیمانکار EPC:

مشارکت “هیروگان انرژی- طرح و بازرسی”
تهران، اتوبان همت- خیابان شیراز جنوبی- کوچه یاس - پلاک 13

مدیر پروژه و نماینده پیمانکار:

محمد فخاریان

تاریخ شروع پروژه:

1400/04/02

تاریخ پایان پروژه:

1402/04/01

شماره قرارداد:

BK-00-CO-0001

شماره پروژه (در سیستم کارفرمای اصلی):

971020

مبلغ پیمان (یورو):

35,909,880 یورو

مدت پیمان:

24 ماه

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پارس  HIRGAN ENERGY 
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 27							شماره صفحه : 5 از 34
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0027	
								G00

۲ معرفی پروژه


میدان نفتی بینک از میداین نفتی ایران است که در استان بوشهر، در فاصله ۲۰ کیلومتری از شمال بندر گناوه و در ساحل خلیج فارس مستقر می باشد. این میدان از شمال با میدان نفتی گلخاری، میدان نفتی بی بی حکیمه و میدان نفتی سیاهمکان و از جنوب با میدان نفتی خارگ، در دریا هم جوار است. حجم ذخیره در جای نفت خام این میدان در حدود ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون بشکه برآورد می شود. میدان نفتی بینک در افق آسماری دارای ابعادی به طول ۴۲ کیلومتر و عرض متوسط ۶ کیلومتر است. سازندهای آسماری و جهرم این میدان به دلیل ارتباط فشاری مناسب، به عنوان یک مخزن واحد محسوب می شوند.

تاسیسات سرچاهی مربوط به ۶ حلقه چاه توسعه ای (که ۲ حلقه از این ۶ حلقه نیاز به برق رسانی و دیگر تسهیلات مرتبط جهت مصارف پمپ درون چاهی می باشد) و انجام اصلاحات در ۴ حلقه چاه تعمیری موجود (به همراه برق رسانی جهت مصارف پمپ درون چاهی و دیگر تسهیلات مورد نیاز) در دستور کار این طرح قرار دارد. آب مورد نیاز حفاری چاه ها می بایست از طریق تانکر (یا خط لوله موقت) از دره گپ گناوه/خلیج فارس تامین گردد. ضمناً احداث ۶ خط لوله جریانی جدید از چاه های توسعه ای پیش گفته به مجموعه بوستر- کلاستر بینک و توسعه چندراهه موجود بوستر- کلاستر بینک جزو شرح کار این پروژه است.

با هدف افزایش تولید نفت از میدان بینک، افزایش ظرفیت ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (و احداث ردیف تراکم و مستحداثات مورد نیاز جدید) به میزان ۱۵ م ف م ر نیز جزو شرح کار این پروژه می باشد. همچنین احداث ۴۴ کیلومتر خط لوله ۸ اینچ انتقال گاز از ایستگاه تقویت فشار گاز بینک تا ایستگاه تزریق گاز سیاهمکان و ۵,۲ کیلومتر خط لوله ۴ اینچ انتقال مایعات گازی از ایستگاه تقویت فشار گاز بینک به واحد بهره برداری بینک نیز در تعهد پیمانکار می باشد.

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							  	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 27							شماره صفحه : 6 از 34	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0027		G00

کلیات توضیحات فوق الذکر شرح کار در شماتیک زیر ارائه شده است.

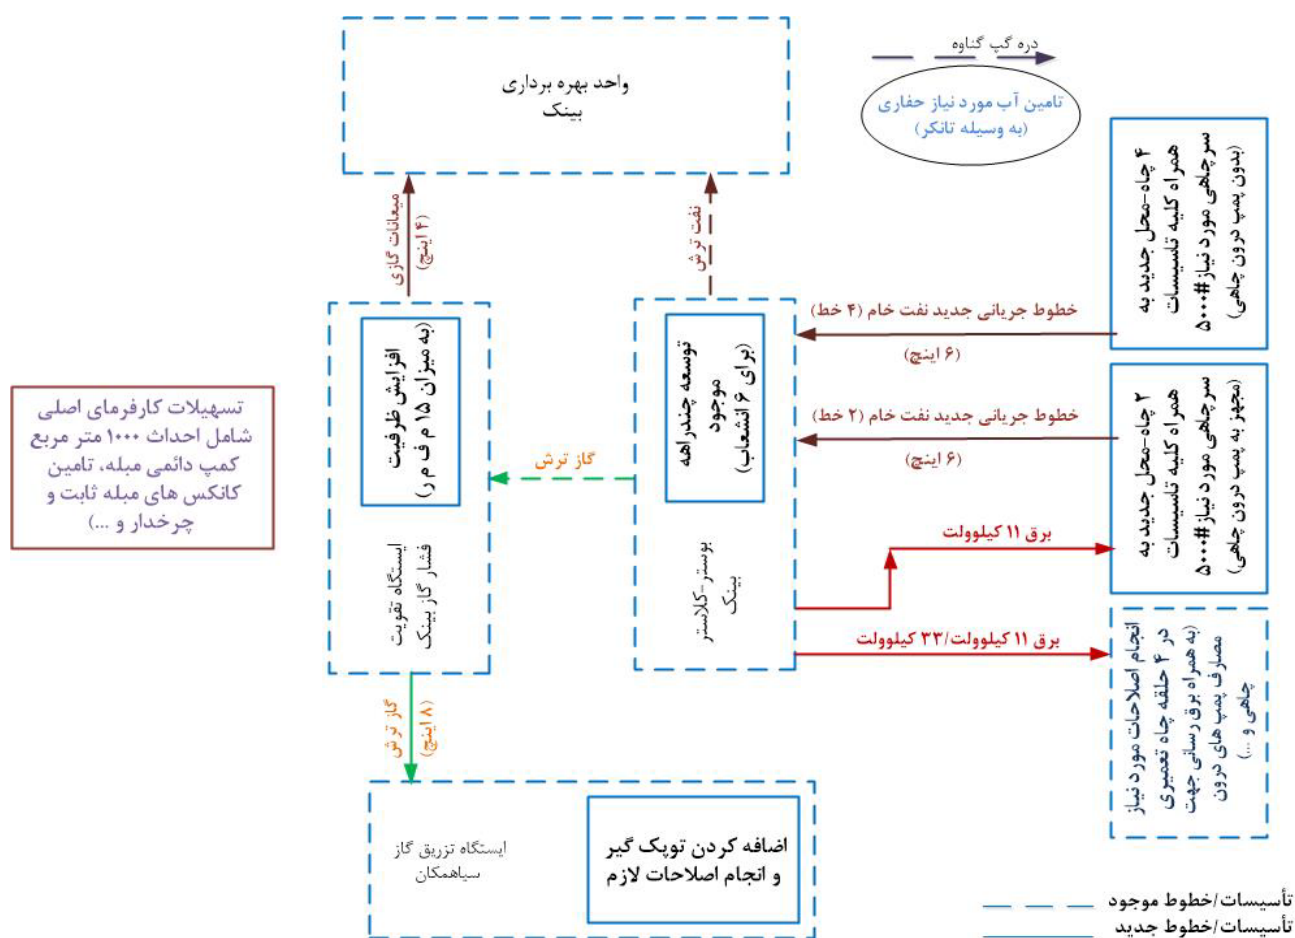

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 27							شماره صفحه : 7 از 34	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0027		G00

S/L	Well Name/Location	Reservoir
1	W 008 N	Asmari
2	W 018 S	Asmari
3	W 046 S	Bangestan
4	W028	Bangestan
5	W 035	Bangestan
6	W 007 S	Bangestan
7	Well 14	Bangestan
8	Well 12	Bangestan
9	Well 15	Bangestan
10	Well 05	Bangestan


	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 27							شماره صفحه : 8 از 34
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0027	G00

۳ گزارش مدیریتی پروژه

1-3 گزارش مدیریتی و جدول میزان پیشرفت کل پروژه

جدول پیشرفت پروژه در بخش 5 ارائه شده است.

2-3 نمودار پیشرفت کل پروژه

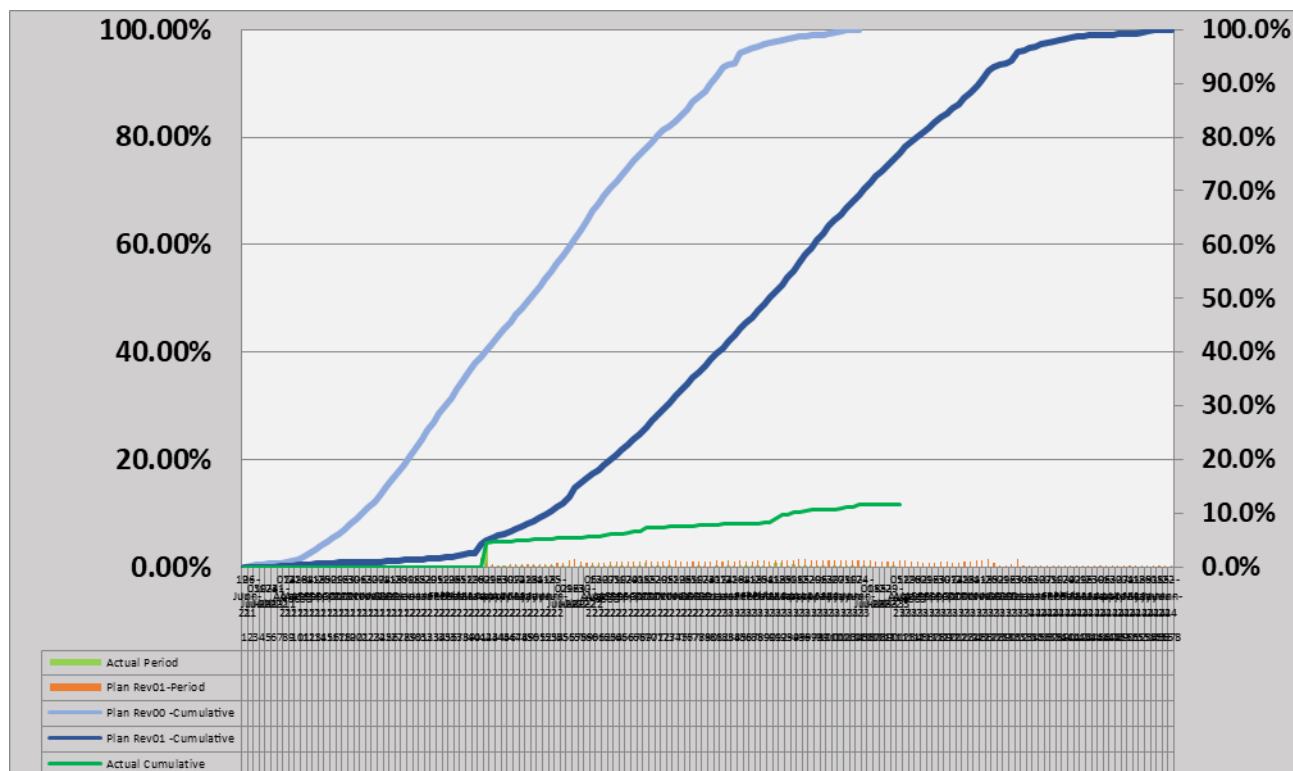

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 27							شماره صفحه : 9 از 34	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0027		G00

۴ گزارش فعالیت‌های انجام شده

1-4 مدیریت پروژه /عمومی

- شرکت در جلسات هفتگی بررسی پیشرفت پروژه
- کنترل و نظارت مستمر بر حسن انجام ضبط و ربط محیط کار General Housekeeping طبق برنامه
- ارائه خدمات رفاهی به کارفرمای محترم بر اساس قرارداد

2-4 بخش مهندسی (E)

1-2-4 مهندسی سطح الارض /ابنیه تحت الارض پروژه

- ارسال مدارک مهندسی مطابق برنامه زمانبندی پروژه
- بررسی و اصلاح مدارک براساس نظرات کارفرما
- ارسال مدارک بخش سیویل چاههای تعمیری

2-2-4 مهندسی تحت الارض پروژه

- (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)

3-4 فعالیتهای مرتبط با کالا(P)

1-3-4 کالای سطح الارض /ابنیه تحت الارض پروژه

- برگزاری جلسه PIM لوله های 4 و 6 اینچ
- برگزاری جلسه بررسی مدرک سیستم های DCS و ESD منیفولد
- ارسال TBE اصلاحی سیستم های DCS و ESD منیفولد
- برگزاری جلسه PIM لوله های 8 اینچ بسته خط لوله
- برگزاری جلسات با سازندگان پکیج هوا و نیتروژن
- ارسال مدارک سازنده Pig Trap
- برگزاری جلسه بررسی P&ID سازنده کمپرسور گازی
- برگزاری بررسی روند کالا در دفتر پترو ایران
- ارسال مدارک سازنده کمپرسور گازی

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پارس  HIRGAN ENERGY 	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 27							شماره صفحه : 10 از 34	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0027		G00

4-3-2 کالای تحت الارض پروژه

- (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)

4-4-4 فعالیتهای اجرایی (C)

- اجرای بتن مگر Concrete pad لوکیشن چاه شماره 14
- آرماتوربندی Concrete pad لوکیشن چاه شماره 14
- اجرای بتن مگر کانال های Concrete pad چاه 14
- انجام قالب بندی فونداسیون Septic tank لوکیشن چاه شماره 14
- بتن ریزی فونداسیون Septic tank لوکیشن چاه شماره 14
- بارگیری و حمل نخاله های حاصل از پیکور لوکیشن چاه شماره 14 و تخلیه آن
- اجرای دیوار پیرامون Fuel tank جهت آماده کردن بستر سازه مذکور
- انجام عملیات خاکبرداری با پیکور دستی جهت احداث کانال های داخلی Concrete pad لوکیشن چاه شماره 14
- بارگیری و حمل میلگرد و تخلیه آن در محدوده لوکیشن چاه شماره 14
- اجرای نبشی کشی نمای ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز
- رنگ آمیزی متریال قفسه بندی انبار سوله
- حفاری کابل برق دوربین مدار بسته انبار روباز
- انجام عملیات خاکبرداری با پیکور دستی جهت احداث کانال های داخلی Concrete pad لوکیشن چاه شماره 14
- اجرای آرماتوربندی Coral pit لوکیشن چاه شماره 14
- اجرای قالب بندی فونداسیون Coral pit چاه 14
- عملیات خاک برداری و رگلاژ Waste pit چاه 14
- اجرای بتن مگر Waste pit چاه 14
- اجرای بتن مگر Fuel tank چاه 14
- اجرای بتن مگر OBM و Oil trap چاه 14

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	<table><tr><th colspan="8">MONTHLY PROGRESS REPORT # 27</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادر کننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>G00</td><td>0027</td><td>RT</td><td>GE</td><td>000</td><td>HD</td><td>GNRAL</td><td>BK</td></tr></table>	MONTHLY PROGRESS REPORT # 27								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	G00	0027	RT	GE	000	HD	GNRAL	BK	شماره صفحه : 11 از 34
MONTHLY PROGRESS REPORT # 27																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
G00	0027	RT	GE	000	HD	GNRAL	BK																			

- اجرای نمای ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز
- اجرای عملیات شیارزنی تاسیسات برقی ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز
- مونتاژ و نصب قفسه های Warehouse
- اجرای آرماتوربندی Concrete pad چاه 14
- عملیات قالب بندی Concrete pad چاه 14
- عملیات بتن ریزی Concrete pad چاه 14
- اجرای بتن ریزی فونداسیون Coral pit چاه 14
- عملیات پیکور زنی و خاک برداری WASTE PIT چاه 14
- تکمیل عملیات بتن ریزی مگر پد گازوئیل چاه 14
- عملیات آرماتور بندی پد گازوئیل چاه 14
- عملیات آرماتور بندی سازه OBM چاه 14
- عملیات خاکبرداری و پیکور زنی کانال دفع آب های سطحی چاه 14 (ضلع شرقی)
- عملیات آرماتور بندی سازه Oil trap چاه شماره 14
- عملیات آرماتور بندی دیچ های سازه پد پازوئیل چاه شماره 14
- عملیات آرماتوربندی فونداسیون سازه Waste pit چاه 14
- عملیات قالب بندی پارت های 9 و 10 و 12 و 13 و 14 ضلع شمالی و شرقی سازه Concrete pad چاه 14
- عملیات بتن ریزی پارت های 5 و 6 ضلع جنوبی سازه Concrete pad چاه شماره 14
- عملیات بتن ریزی پارت های 7 و 8 ضلع جنوبی سازه Concrete pad چاه 14
- عملیات دیوارچینی سازه Septic tank
- عملیات بتن ریزی فونداسیون سازه های Oil trap & OBM چاه 14
- عملیات بتن ریزی پارت های 9 و 10 و 12 و 13 و 14 ضلع شمالی و شرقی سازه Concrete pad چاه 14

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 27							شماره صفحه : 12 از 34	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0027		G00

ه جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی / سطح الارض)

BINAK OILFIELD DEVELOPMENT SURFACE WORK-PACKAGES BASED ON PACKAGES						
Code	Description	W.F. (Total)	Last Progress%	This Period	Up to now Progress%	Client Approval 1402/02/03
	Total Project	100.000%	11.74%	1.26%	13.00%	6.88%
1	GENERAL	5.32%	66.94%	0.00%	66.94%	44.18%
1-1	General	5.32%	66.94%	0.00%	66.94%	44.18%
2	SUB-Surface DEVELOPMENT	18.18%	11.73%	0.06%	11.80%	9.11%
2-1	Engineering	0.36%	55.16%	0.20%	55.36%	48.76%
2-2	Procurement	11.14%	5.55%	0.04%	5.59%	3.12%
2-3	Construction	6.68%	19.69%	0.09%	19.78%	16.94%
3	SURFACE DEVELOPMENT	76.49%	7.90%	1.63%	9.53%	3.75%
3-1	Engineering	2.37%	47.20%	0.89%	48.09%	45.61%
3-2	Procurement	59.19%	8.32%	2.07%	10.39%	3.02%
3-3	Construction	13.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3-4	Commissioning, Startup & Handover	1.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت ملی پالایش و توزیع نفت ایران  HIRGAN ENERGY 	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 27							شماره صفحه : 13 از 34	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0027		G00

۶ بخش کنترل پروژه

جدول میزان پیشرفت کل پروژه (عمومی / سطح الارض)

Description	W.F. (Disc)	W.F. (Total)	Roll-Up	Last Progress%	This Period	Up to now Progress%	Client Approval 1402/02/03
Total Project	100.000%	100.000%	100.00%	11.74%	1.26%	13.00%	6.88%
GENERAL	1.136%	1.136%	1.136%	66.937%	0.000%	66.94%	44.18%
Project Management	23.600%	0.268%	0.268%	58.218%	0.000%	58.22%	45.07%
Project Insurance	13.470%	0.153%	0.153%	90.677%	0.000%	90.68%	6.79%
Service to Company	35.400%	0.402%	0.402%	70.735%	0.000%	70.74%	46.19%
Training Courses	7.310%	0.083%	0.083%	5.000%	0.000%	5.00%	0.00%
GC Mobilization & Demobilization	20.220%	0.230%	0.230%	60.494%	0.000%	60.49%	55.57%
SUB-Surface DEVELOPMENT	52.342%	52.342%	52.338%	11.734%	0.064%	11.80%	9.11%
Package 01-New Well # W018S	5.210%	2.727%	2.723%	37.374%	0.425%	37.799%	34.245%
Package 02-New Well # W028 (Bangestan)	7.125%	3.729%	3.729%	40.490%	0.000%	40.490%	33.044%
Package 03-New Well # W046S (Bangestan)	33.462%	17.515%	17.515%	11.435%	0.001%	11.44%	8.95%
Package 04-New Well # W035 (Bangestan)	8.669%	4.538%	4.538%	15.909%	0.000%	15.91%	11.90%
Package 05-New Well # W008N	2.760%	1.445%	1.445%	7.090%	0.203%	7.29%	4.61%
Package 06-New Well # W007S/Manifold Extension (Bangestan)	12.934%	6.770%	6.770%	4.901%	0.013%	4.91%	3.09%
Package 07-Workover # 14	7.666%	4.013%	4.012%	8.220%	0.428%	8.65%	2.78%
Package 08-Workover # 12	6.237%	3.265%	3.264%	2.109%	0.003%	2.11%	1.90%
Package 09-Workover # 15	9.335%	4.886%	4.886%	1.468%	0.000%	1.47%	1.32%
Package 10-Workover # 05	6.602%	3.456%	3.456%	2.035%	0.003%	2.04%	1.83%
SURFACE DEVELOPMENT	46.522%	46.522%	46.522%	7.899%	1.629%	9.53%	3.75%
Package 11- EPC Pipeline 8" & 4"	15.529%	7.224%	7.224%	3.915%	3.068%	6.98%	1.38%
Package 12- EPC # Compressor Station	84.471%	39.298%	39.298%	8.899%	1.268%	10.17%	4.34%


 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پارس  HIRGAN ENERGY 	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 27							شماره صفحه : 14 از 34	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0027		G00

ضرایب وزنی فعالیت ها (W-F) (عمومی / سطح الارض) :

Cde	Description	W.F.(Discp.)	WF.(Total)
		100.00%	100.000%
1	GENERAL	5.32%	5.32%
1-1	Project Management	100.00%	5.32%
2	SUB-Surface DEVELOPMENT	18.18%	18.18%
2-1	Engineering	1.99%	0.36%
2-2	Procurement	61.26%	11.14%
2-3	Construction	36.75%	6.68%
3	SURFACE DEVELOPMENT	76.49%	76.49%
3-1	Engineering	3.09%	2.37%
3-2	Procurement	77.39%	59.19%
3-3	Construction	18.20%	13.92%
3-4	Commissioning, Startup & Handover	1.3%	1.01%


	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							  	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 27							شماره صفحه : 15 از 34	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0027		G00

نمودار پیشرفت بخش عمومی

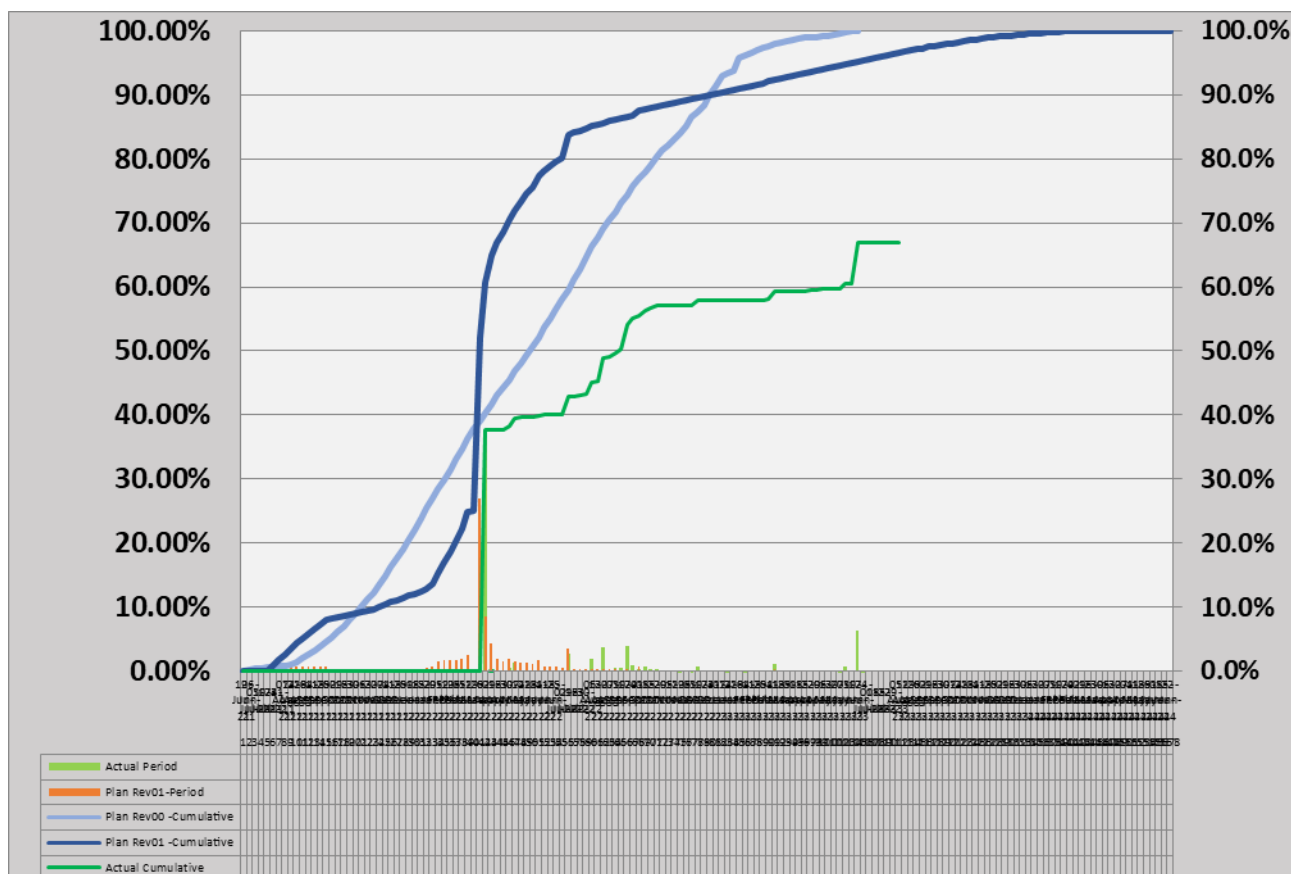


	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 27							شماره صفحه : 16 از 34
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0027	G00

نمودار پیشرفت بخش ابنیه تحت الارض

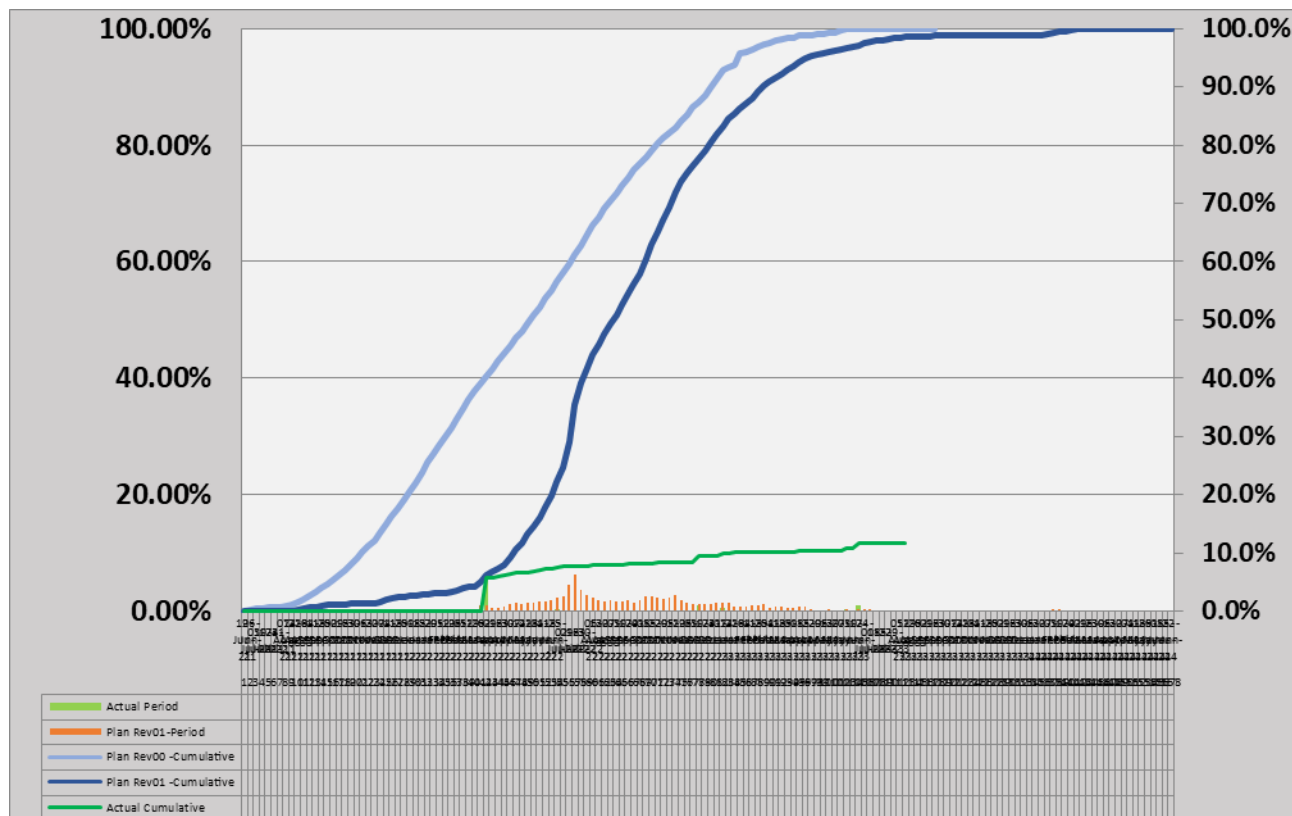

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 27							شماره صفحه : 17 از 34	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0027		G00


نمودار پیشرفت بخش سطح الارض

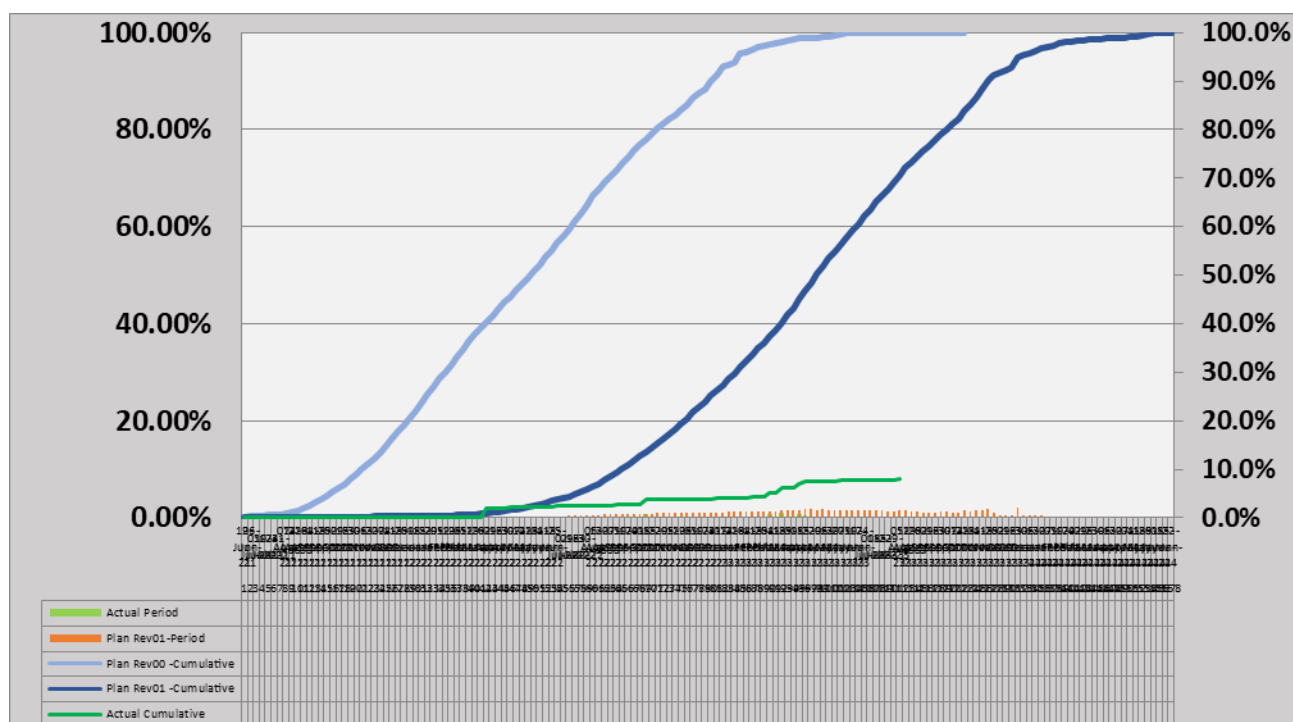

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 27							شماره صفحه : 18 از 34	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	HD	000	GE	RT	0027		G00

جدول و نمودار پیشرفت EPC :

Total Project	100%	13.00%
Engineering	2.73%	49.06%
Procurement	70.33%	9.63%
Construction	20.60%	6.41%
Commissioning, Startup & Handover	1.01%	0.0%
Project Management	5.32%	66.94%

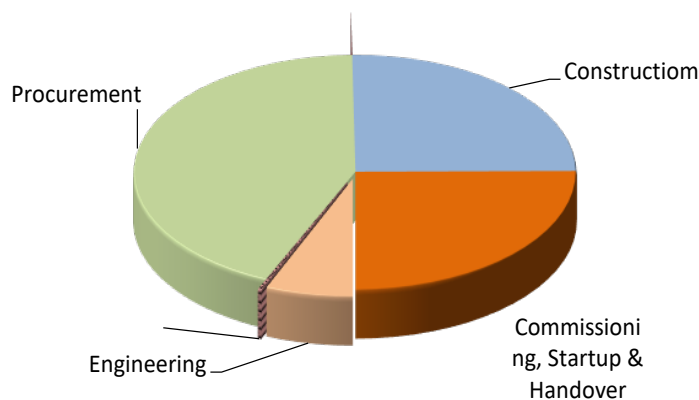


۸ بخش مالی پروژه

آخرین وضعیت	تاریخ رسید وجه	پیشرفت مالی نسبت به وزن	پیشرفت مالی (تجمعی)	صورت وضعیت تایید شده	صورت وضعیت ادعا شده (پروژه)	صورت وضعیت به پیمانکار - ریال	برداشت پیش برداشت شده به کار فرما - ریال	مبلغ پیمان واحد وزن	مبلغ پیمان واحد وزن	شرح فعالیت
برداشت شده	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۷۱۸,۱۹۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱۷۷,۹۸۸,۷۵۶,۶۱۷	۱۷۷,۹۸۸,۷۵۶,۶۱۷	۳۵,۹۰۹,۸۸۰	۳۵,۹۰۹,۸۸۰	پیش برداشت -
برداشت شده	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۰۰٪	۳۰۰٪	۱,۰۷۷,۲۹۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۲۸۰,۵۷۶,۲۶۰,۸۸۸	۲۸۰,۵۷۶,۲۶۰,۸۸۸	۳۵,۹۰۹,۸۸۰	۳۵,۹۰۹,۸۸۰	قسط دوم پیش برداشت (۳٪ مبلغ پیمان)
عدم تایید			۱۲,۸۸۰٪	۱۰۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	-	-	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	برآورد کارکرد (WPA) بخش مهندسی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ الی ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
عدم تایید			۱۳,۶۷٪	۱۳۳,۳۳۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۳			۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	برآورد کارکرد (WPA) بخش مهندسی - شماره ۱ (به روز شده) (BK-HD-WPA-E-۰۰۰۱-G-۱)
تایید			۴,۶۳٪	۴۳۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۹			۹,۳۱۱,۵۶۰	۹,۳۱۱,۵۶۰	برآورد کارکرد (WPA) بخش های عمومی و اجرا - شماره ۱ منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
تایید			۶,۹۳٪	۶۴۴,۳۳۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۹			۹,۳۱۱,۵۶۰	۹,۳۱۱,۵۶۰	برآورد کارکرد (WPA) بخش های عمومی و اجرا - شماره ۱ (به روز شده) از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ الی ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
صورت الحساب و در چند قسط برداشت شده	۱۴۰۱/۱۱/۱۶		۱۶۷,۴۱۴	۱۶۷,۴۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۹			۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	صورت وضعیت شماره ۱ مهندسی (منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶)
صورت الحساب و در چند قسط برداشت شده	۱۴۰۱/۱۱/۱۸		۴,۵۲٪	۲۲۳,۱۹۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۹			۹,۶۷۳,۶۱۳	۹,۶۷۳,۶۱۳	صورت وضعیت شماره ۱ عمومی (منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸)
برداشتی					۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت ۱ مهندسی و ۱ اجرا
تایید			۱۹,۱۵٪	۱۸۷,۶۷۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۶			۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	برآورد کارکرد (WPA) شماره ۲ مهندسی (منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۹)
تایید			۹,۱۸٪	۸۸۷,۸۹۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۶			۹,۶۷۳,۶۱۳	۹,۶۷۳,۶۱۳	برآورد کارکرد (WPA) شماره ۲ عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۹)
برداشتی					۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت ۱ مهندسی و ۱ اجرا
برداشتی					۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۴,۵۸۹,۳۳۰,۴۴۲				دریافت علی الحساب بابت صورت وضعیت ۱ مهندسی و ۱ اجرا
برداشت شده	۱۴۰۱/۱۱/۱۶		۲۰,۳۵۶	۱۸۷,۶۷۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۹			۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	صورت وضعیت شماره ۲ مهندسی (منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶)
برداشت شده	۱۴۰۱/۱۱/۲۷		۶,۹۵٪	۲۴۸,۹۳۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۶۷۲,۱۲۵		۹,۶۷۳,۶۱۳	۹,۶۷۳,۶۱۳	صورت وضعیت شماره ۲ عمومی (منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷)
			۳,۵۷٪	۲۵۲,۴۵۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۸			۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	برآورد کارکرد بخش مهندسی - شماره ۳ (BK-HD-WPA-E-۰۰۰۳)
			۹,۴۰٪	۹۰۹,۴۷۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۹			۹,۶۷۳,۶۱۳	۹,۶۷۳,۶۱۳	برآورد کارکرد بخش های عمومی و اجرا - شماره ۳ (BK-HD-۳) منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۹
برداشت شده	۱۴۰۱/۱۱/۲۷		۲۵,۷۶٪	۴۶,۵۸۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۲۵۲,۴۵۲		۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	صورت وضعیت شماره ۳ مهندسی (منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷)
برداشت شده	۱۴۰۱/۱۱/۲۷		۸,۹۳٪	۱۹۱,۷۳۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۸۳۳,۸۶۰,۰۰۰		۹,۶۷۳,۶۱۳	۹,۶۷۳,۶۱۳	صورت وضعیت شماره ۳ عمومی و اجرا (منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷)
تایید جهت تهیه صورت وضعیت	۱۴۰۱/۰۵/۰۴		۳۴,۴۰٪	۳۱۷,۵۷۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۴			۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	برآورد کارکرد بخش مهندسی - شماره ۴ (BK-HD-WPA-E-۰۰۰۴)
عدم تایید			۱۰,۶۳٪	۱,۰۲۷,۷۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۵			۹,۶۷۳,۶۱۳	۹,۶۷۳,۶۱۳	برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی - شماره ۴ (BK-۴) منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
تایید			۱۰,۶۳٪	۱,۰۲۷,۷۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۲			۹,۶۷۳,۶۱۳	۹,۶۷۳,۶۱۳	برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی - شماره ۴ (BK-۴) منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
برداشت شده	۱۴۰۱/۰۵/۲۹		۳۴,۴۰٪	۳۱۷,۵۷۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۹			۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	صورت وضعیت شماره ۴ مهندسی (منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹)
برداشت شده	۱۴۰۱/۰۵/۲۹		۹,۹۲٪	۹۵۸,۸۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۹۵۲,۴۸۲		۹,۶۷۳,۶۱۳	۹,۶۷۳,۶۱۳	صورت وضعیت شماره ۴ ساختمان و نصب و عمومی (منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹)
تایید			۳۸,۹۸٪		۱۴۰۱/۰۷/۰۹			۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	برآورد کارکرد بخش مهندسی - شماره ۵ (BK-HD-WPA-E-۰۰۰۵)
تایید			۱۰,۷۰٪		۱۴۰۱/۰۷/۰۹			۹,۶۷۳,۶۱۳	۹,۶۷۳,۶۱۳	برآورد کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی - شماره ۵ (BK-۵) منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹
برداشت شده	۱۴۰۱/۰۸/۰۴		۳۸,۹۹٪	۴۴۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۳۸۲,۰۷۸		۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	صورت وضعیت شماره ۵ مهندسی (منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴)
برداشت شده	۱۴۰۱/۰۸/۱۷		۱۰,۲۷٪	۲۳,۳۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۹۹۳,۰۰۰		۹,۶۷۳,۶۱۳	۹,۶۷۳,۶۱۳	صورت وضعیت شماره ۵ ساختمان و نصب و عمومی (منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷)
تایید			۴۱,۲۷٪		۱۴۰۱/۰۹/۲۰			۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	برآورد کارکرد بخش مهندسی - شماره ۶ (BK-HD-WPA-E-۰۰۰۶)
تایید			۱۱,۶۵٪		۱۴۰۱/۰۹/۲۳			۹,۶۷۳,۶۱۳	۹,۶۷۳,۶۱۳	برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی - شماره ۶ (BK-۶) منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
برداشت شده	۱۴۰۱/۱۰/۱۰		۴۰,۶۷٪	۱۶۵,۲۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۲۲,۳۷۳		۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	صورت وضعیت شماره ۶ مهندسی (منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰)
برداشت شده	۱۴۰۱/۱۰/۱۰		۱۱,۶۳٪	۱۳۱,۰۴۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۳۳,۷۶۰		۹,۶۷۳,۶۱۳	۹,۶۷۳,۶۱۳	صورت وضعیت شماره ۶ ساختمان و نصب و عمومی (منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰)
تایید			۴۲,۸۱٪		۱۴۰۱/۱۱/۰۹			۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	برآورد کارکرد بخش مهندسی - شماره ۷ (BK-HD-WPA-E-۰۰۰۷)
تایید			۱۱,۸۳٪		۱۴۰۱/۱۱/۱۱			۹,۶۷۳,۶۱۳	۹,۶۷۳,۶۱۳	برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی - شماره ۷ (BK-۷) منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
برداشت شده	۱۴۰۱/۱۱/۲۶		۴۰,۶۴٪	۲۰,۳۴۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۶			۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	صورت وضعیت شماره ۷ مهندسی (منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶)
برداشت شده	۱۴۰۱/۱۱/۲۷		۱۱,۷۶٪	۱۳,۱۶۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۲۰,۳۴۴		۹,۶۷۳,۶۱۳	۹,۶۷۳,۶۱۳	صورت وضعیت شماره ۷ ساختمان و نصب و عمومی (منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷)
تایید			۴۵,۵۷٪		۱۴۰۲/۰۱/۳۱			۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	برآورد کارکرد بخش مهندسی - شماره ۸ (BK-HD-WPA-E-۰۰۰۸)
تایید			۱۲,۲۹٪		۱۴۰۲/۰۱/۳۱			۹,۶۷۳,۶۱۳	۹,۶۷۳,۶۱۳	برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی - شماره ۸ (BK-۸) منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
برداشت شده	۱۴۰۲/۰۳/۲۳		۴۵,۵۷٪	۲۷,۳۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۲۷,۳۱۳		۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	صورت وضعیت شماره ۸ مهندسی (منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳)
برداشت شده	۱۴۰۲/۰۳/۲۰		۶۸,۵۹٪	۵۲,۰۳۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۰			۹,۶۷۳,۶۱۳	۹,۶۷۳,۶۱۳	صورت وضعیت شماره ۸ ساختمان و نصب و عمومی (منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰)
تایید			۴۶,۲۰٪		۱۴۰۲/۰۳/۰۹			۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	برآورد کارکرد بخش مهندسی - شماره ۹ (BK-HD-WPA-E-۰۰۰۹)
تایید			۱۲,۲۳٪		۱۴۰۲/۰۳/۰۹			۹,۶۷۳,۶۱۳	۹,۶۷۳,۶۱۳	برآورد کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی - شماره ۹ (BK-۹) منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه نیروهایران  HIRGAN ENERGY 	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 27							شماره صفحه : 21 از 34	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0027		G00

۹ بخش تدارکات کالا

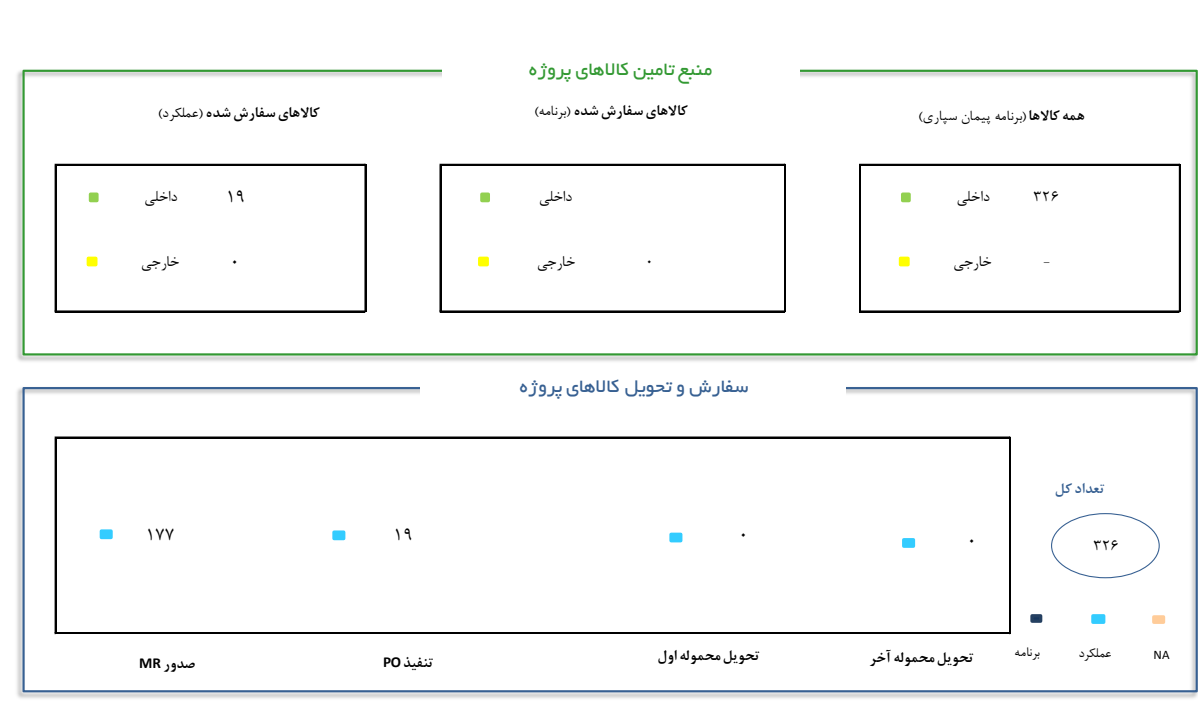

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک	 شرکت توسعه و پارسا  HIRGAN ENERGY 																
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 27 <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GNRAL</td><td>PEDCO</td><td>000</td><td>GE</td><td>RT</td><td>0027</td><td>G00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0027	G00	شماره صفحه : 24 از 34
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0027	G00											

۱۱ مکاتبات با کارفرما

1-11 مکاتبات وارده از کارفرما :

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
1	اصلاحیات مربوط به لایحه تاخیرات	1402/05/21	8843
2	عدم رضایت از پیشرفت فعالیتهای اجرایی و تکمیل تجهیز کارگاه	1402/05/22	8902
3	لزوم اجرای تعهدات قراردادی و توافقات مدیریتی	1402/05/22	8906
4	لزوم تجهیز کارگاه	1402/05/23	8964
5	پاسخ به درخواست ابلاغ کاهش کاری	1402/05/23	9013
6	پاسخ به درخواست ابلاغ کاهش کاری	1402/05/25	9162
7	تعهدات آبرسانی	1402/05/25	9145
8	مدارک QCP و MPS؛ سازنده خطوط لوله 4، 6 و 8 اینچ (شرکت HEBEI HUIKE چین)	1402/05/25	9217
9	اعمال شماره شناسایی فعالیت ها (Activity ID) در فایل برنامه ریزی	1402/05/28	9256
10	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترنسمیتال ها	1402/05/28	9283
11	اعلام برنامه زمانی تست و بازرسی نهایی کمپرسورها در کشور کره	1402/05/28	9286
12	آماده سازی اردوگاه حفاری چاه 14	1402/05/29	9542
13	پاسخ به نامه با موضوع توضیحات این پیمانکار در خصوص نارضایتی آن کارفرمای محترم در بخش اجرا	1402/05/29	9350
14	پاسخ به نامه با موضوع طرح جدید مدیریت پسماند چاه های توسعه ای تبعات اولیه تغییر کاری مترتبه	1402/05/29	9351
15	پاسخ به نامه با موضوع تامین آب مورد نیاز حفاری چاه ها	1402/05/29	9355
16	عدم نیاز به بانک خازنی فشار ضعیف سر چاهی	1402/05/29	9402
17	برنامه زمانبندی کمپرسورهای گاز شرکت هواپار - پیگیری اول	1402/05/29	9413
18	ارسال صورتجلسه بررسی لیست مدارک مهندسی	1402/05/30	9493
19	بررسی لایحه تاخیرات	1402/05/30	9496
20	تذکر مجدد قراردادی بدلیل تاخیرات پیمانکار در بخش E,P,C	1402/05/31	9526
21	عدم رضایت از پیشرفت در بخش اجرا	1402/05/31	9559
22	آماده سازی موقعیت پیشنهادی اردوگاه حفاری چاه 14	1402/05/31	9576
23	جمع آوری بخارات خروجی از Still Column	1402/05/31	9578
24	مدارک شرکت هواپار سازنده کمپرسورهای گازی	1402/06/01	9653
25	قرارداد خرید لوله های 8 اینچ خط انتقال گاز به ایستگاه تزریق گاز سیاهمکان	1402/06/01	9611

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پارسا  HIRGAN ENERGY 	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 27							شماره صفحه : 25 از 34	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0027		G00

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
26	تذکر به دلیل عدم رعایت اصول بهداشتی در آشپزخانه -9734	1402/06/04	9734
27	اقدام مورد نیاز جهت راه اندازی چاه BK14	1402/06/04	9735
28	لزوم تسریع در تجهیز و بهره برداری از رستوران و آشپزخانه کارگاه	1402/06/05	9825
29	پاسخ به گزارش بازرسی مورخ 06/05/1402 از متریال برخی قطعات بلوکه کمپرسور	1402/06/05	9827
30	ارسال گزارشات هفتگی و ماهانه -10062	1402/06/07	10062
31	توقف و تاخیر بسیار در ارسال ویرایش جدید مدارک مهندسی	1402/06/07	10066
32	تسریع در ارسال نسخه نهایی لیست مدارک مهندسی طرح	1402/06/07	10088
33	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترنس میتال ها	1402/06/08	10172
34	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترنس میتال ها	1402/06/08	10173
35	صورتحلسه مورخ 08/06/1402	1402/06/08	10175
36	پاسخ به نامه امضای الحاقیه شماره 1 (تمدید زمانی قرارداد)	1402/06/08	10180
37	لزوم تسریع در تامین کالای اصلی	1402/06/11	10243
38	پاسخ به نامه گزارشات بازرسی نهایی و فاینال بوک دو دستگاه WHCP ساخته شده	1402/06/13	10353
39	صورتحلسات KOM و PIM خطوط لوله 4، 6 و 8 اینچ	1402/06/13	10346
40	قرارداد خرید کولرهای هوایی بسته GCS	1402/06/13	10375
41	گزارش هفتگی منتهی به تاریخ 08/06/1402	1402/06/13	10386
42	اصلاحات لازم قرارداد خرید بسته نمزدا گاز GCS	1402/06/14	10426
43	پاسخ به نامه درخواست واریز مبلغ کسر شده از صورت وضعیت های 7 و 8 مهندسی و عمومی اجرا	1402/06/14	10427
44	صورتحلسه پایش پیشرفت پروژه مورخ 14/06/1402	1402/06/18	10523
45	پاسخ به درخواست واریز مانده مبالغ پیش اقساط پرداخت اول و دوم (2% و 3% مبلغ پیمان)	1402/06/18	10526
46	گزارش بازرسی از ساخت تجهیز کمپرسور	1402/06/19	10565
47	پیگیری ارائه برنامه اجرایی Executive Plan	1402/06/19	10599
48	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترنس میتال ها	1402/06/20	10721
49			
50			
51			

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک	 شرکت ملی گاز ایران  HIRGAN ENERGY 																
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 27 <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GNRAL</td><td>PEDCO</td><td>000</td><td>GE</td><td>RT</td><td>0027</td><td>G00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0027	G00	شماره صفحه : 26 از 34
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0027	G00											

2-11 مکاتبات صادره به کارفرما :

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
1	برآورد اصلاحی کارکرد بخش های ساختمان و نصب و عمومی - شماره 10-BK-HD-(WPA-C-0010_G01)	1402/05/21	0879
2	درخواست کاهش کاری	1402/05/21	0880
3	ارسال مجدد برآورد اصلاحی کارکرد بخش مهندسی - شماره 9-BK-HD-WPA-E-(0009_G01)	1402/05/22	0881
4	پیگیری مجدد واریز مانده مبلغ 6 صورت وضعیت مهندسی و عمومی/اجرا	1402/05/25	0882
5	درخواست واریز مبلغ کسر شده از مطالبات صورت وضعیت های 7 و 8 مهندسی و عمومی/اجرا	1402/05/25	0883
6	پیگیری مجدد تأدیه الباقی مبلغ قسط اول پیش پرداخت کالا (4٪ مبلغ پیمان)	1402/05/25	0884
7	تامین آب مورد نیاز حفاری چاه ه	1402/05/25	0885
8	تجهیز کارگاه این پیمانکار	1402/05/25	0886
9	توضیحات این پیمانکار درخصوص ناراضیاتی آن کارفرمای محترم در بخش اجرا	1402/05/25	0887
10	الحاقیه شماره 1 (تمدیدیه زمانی قرارداد) - ارسال سه نسخه مهرور و امضا شده	1402/05/28	0888
11	درخواست واریز مانده مبالغ پیش اقساط پرداخت اول و دوم (2٪ و 3٪ مبلغ پیمان)	1402/05/28	0889
12	پاسخ به نقطه نظرات کارفرمای اصلی محترم پروژه بر روی قرارداد خرید بسته نم زدای گاز GCS	1402/05/28	0890
13	پاسخ به نقطه نظرات کارفرمای اصلی محترم پروژه بر روی قرارداد خرید کولرهای هوایی گاز GCS	1402/05/28	0891
14	گزارش بازرسی مورخ 06/05/1402 از متریال برخی قطعات بلوکه کمپرسور	1402/05/29	0892
15	WHCP گزارشات بازرسی نهایی و فاینال بوک دو دستگاه پانل ساخته شده توسط وندور	1402/05/29	0893
16	گزینه های جانمایی ساختمان انبار جدید GCS	1402/05/29	0894
17	درخواست چهارم برای عدم توقف ارسال مدارک مهندسی پروژه و وندورها به کارفرمای اصلی	1402/05/29	0895
18	توضیحات تکمیلی درخصوص ایاب و ذهاب کارفرمایان محترم	1402/06/01	0896
19	پاسخ به تذکر قراردادی آن کارفرمای محترم (درخصوص تاخیرات در پروژه؛ مطروحه از جانب آن کارفرمای محترم)	1402/06/01	0897
20	مسیر پیشنهادی فلولاین ها - تغییرات مسیر (واریانت)	1402/06/04	0898
21	اعلام تاریخ MRT کمپرسورهای گاز (هوایار) پس از نهایی سازی مدارک اصلی وندور	1402/06/04	0899
22	اقدامات مربوطه این پیمانکار در راستای راه اندازی چاه BK14	1402/06/04	0900

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	<table><tr><th colspan="8">MONTHLY PROGRESS REPORT # 27</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>G00</td><td>0027</td><td>RT</td><td>GE</td><td>000</td><td>PEDCO</td><td>GNRAL</td><td>BK</td></tr></table>	MONTHLY PROGRESS REPORT # 27								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	G00	0027	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK	شماره صفحه : 27 از 34
MONTHLY PROGRESS REPORT # 27																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
G00	0027	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK																			

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
23	ظرفیت مناسب و مکفی برای دیزل ژنراتور سرچاهی	1402/06/05	0901
24	پاسخ تکمیلی به نظرات NISOC درخصوص مدرک GCS; TBE For Gas Compressors (D03)	1402/06/06	0902
25	پیگیری مجدد اضافه کاری "جداسازی سیستم خنک کاری/روانکاری کمپرسورهای گاز GCS"	1402/06/06	0903
26	پیگیری مجدد جبران خسارت مالی وارده بابت ناهماهنگی در مجموعه کارفرمای اصلی و ابلاغ تغییرات درخواستی کمپرسور گاز GCS	1402/06/07	0904
27	پیگیری مجدد اضافه کاری منتج از اختصاصی سازی UCP ردیف های پکیج کمپرسور گاز GCS	1402/06/07	0905
28	مهندسی ارزش - پیگیری تبیین نحوه تخصیص پاداش پیمانکار از صرفه جویی های کارفرم	1402/06/07	0906
29	صورتحسابات KOM و PIM خطوط لوله 4، 6 و 8 اینچ (مورخ 1402/05/30)	1402/06/07	0907
30	تغییر کاری #4 (01)؛ GCS - تغییر ابعاد و فشار طراحی برخی از مخازن تحت فشار)	1402/06/07	0908
31	ارسال گزارش هفتگی (منتهی به تاریخ 1402/06/08)	1402/06/08	0909
32	GCS توسعه ساختمان برق - سیستم تهویه مطبوع مورد نیاز (توضیحات تکمیلی)	1402/06/11	0910
33	سایبان دیزل ژنراتور سرچاهی؛ پاسخ به نقطه نظرات مطروحه NISOC بر روی نقشه معماری	1402/06/13	0911
34	ارسال گزارش هفتگی (منتهی به تاریخ 08/06/1402)	1402/06/14	0912
35	درخواست معرفی به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و اخذ سهمیه مهر ماه 1402 گازوئیل (با نرخ یارانه ای)	1402/06/18	0913
36	ممهور نمودن صورتحساب مربوط به صورت وضعیت های 6، 7 و 8 مهندسی و عمومی/اجرا	1402/06/18	0914
37	عدم نیاز به سیستم جمع آوری بخارات گلایکول در پکیج نمزدای GCS - بررسی خوردگی	1402/06/19	0915
38	برگزاری دوره آموزشی PDMS مقدماتی	1402/06/19	0916
39			
40			
41			

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 27							شماره صفحه : 28 از 34	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0027		G00

3-11 لیست صورتجلسات پروژه

ردیف	عنوان صورت جلسه	تاریخ صورت جلسه	شماره صورت جلسه	ملاحظات
1	صورتجلسه بررسی مدرک MDL	1402/05/24		
2	صورتجلسات KOM و PIM خطوط لوله 4، 6 و 8 اینچ (مورخ 30/05/1402)	1402/05/30		
3	بررسی مدرک ID-V02&P شرکت هواپار	1402/06/04		
4	صورتجلسه پیشرفت طرح دربخش سطح الارض و سناریوی راه اندازی	1402/06/05		

4-11 لیست مکاتبات بدون پاسخ

ردیف	عنوان/خلاصه نامه	تاریخ نامه	شماره نامه	ملاحظات
1	ممه‌ور نمودن صورتحساب مربوط به صورت وضعیت های 6، 7 و 8 مهندسی و عمومی/اجرا	1402/06/18	0914	
2				
3				
4				
5				
6				

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	<table><tr><th colspan="8">MONTHLY PROGRESS REPORT # 27</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادر کننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>G00</td><td>0027</td><td>RT</td><td>GE</td><td>000</td><td>PEDCO</td><td>GNRAL</td><td>BK</td></tr></table>	MONTHLY PROGRESS REPORT # 27								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	G00	0027	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK	شماره صفحه : 29 از 34
MONTHLY PROGRESS REPORT # 27																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
G00	0027	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK																			

۱۲- مشکلات و موانع

- مشکلات مربوط به جذب نیرو و تکمیل چارت سازمانی پروژه با توجه به شرایط موجود
- عدم هماهنگی بین کامنتهای پترو ایران و کارفرمای اصلی.
- با توجه به عدم پرداخت مالی کامل پروژه و معوق ماندن درخواستهای مالی اعلام شده صورت وضعیت های مهندسی ، صورت وضعیت شماره های بخش عمومی و اجرا) موجب شده است جریان نقدینگی پروژه به شدت منفی شود .

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	<table><tr><th colspan="8">MONTHLY PROGRESS REPORT # 27</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادر کننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>G00</td><td>0027</td><td>RT</td><td>GE</td><td>000</td><td>PEDCO</td><td>GNRAL</td><td>BK</td></tr></table>	MONTHLY PROGRESS REPORT # 27								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	G00	0027	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK	شماره صفحه : 30 از 34
MONTHLY PROGRESS REPORT # 27																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
G00	0027	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK																			

۱۳ موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت

- دریافت با تاخیر نظرات کارفرمای محترم بر روی مدارک ارسالی
- وجود برخی تناقضات در نظرات کارفرمایان (شرکت پتروایران و شرکت مناطق نفتخیز جنوب) درخصوص مدارک ارسالی
- تاخیر در نهایی سازی وضعیت طرح مدیریت پسماند چاه ها (توسط کارفرمای محترم) و بالتبع تاخیر در نهایی سازی نقشه ها و کندی پیشرفت کار اجرایی مربوطه
- تغییر برنامه استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و در نتیجه تغییر برنامه کلی پروژه
- نامشخص بودن تاریخ دقیق استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و در نتیجه متاثر شدن برنامه آماده سازی لوکیشن چاه ها و خرید اقلام مربوطه مورد نیاز
- عدم پرداخت صورت وضعیت های مهندسی توسط کارفرمای محترم
- عدم پرداخت صورت وضعیت های عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم
- محدودیت های ایجاد شده در تامین کالای ساخت داخل کشور و متعاقب آن سو استفاده برخی شرکت های لوله ساز داخلی و افزایش بی دلیل قیمت ها
- افزایش بی رویه کلیه قیمت های مهندسی، خرید و اجرا علیرغم عدم تغییر نرخ تسعیر ارز نیمایی

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 27							شماره صفحه : 31 از 34	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0027		G00

۱۴ بخش کنترل پروژه

- 1-14 برنامه زمان بندی پروژه
- 2-14 لیست مدارک ارسال شده طی دوره
- 2-14 لیست مدارک دارای تاخیر در پاسخ از سوی کارفرما
- 3-14 جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 27							شماره صفحه : 32 از 34
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0027	
							G00	

۱۵ ضمائم

پیوست شماره یک: برنامه زمان بندی پروژه

پس از اعمال تغییرات و به روز رسانی برنامه ارائه خواهد شد.

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MONTHLY PROGRESS REPORT # 27							شماره صفحه : 33 از 34	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0027		G00

پیوست شماره دو : لیست مدارک ارسال شده طی دوره
(در پیوست)

پیوست شماره سه: جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)
(در پیوست)

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	<table><tr><th colspan="8">MONTHLY PROGRESS REPORT # 27</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادر کننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>G00</td><td>0027</td><td>RT</td><td>GE</td><td>000</td><td>PEDCO</td><td>GNRAL</td><td>BK</td></tr></table>	MONTHLY PROGRESS REPORT # 27								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	G00	0027	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK	شماره صفحه : 34 از 34
MONTHLY PROGRESS REPORT # 27																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
G00	0027	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK																			

پیوست شماره چهار: عکسهایی از عملیات اجرایی
(در پیوست)
