

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																	
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 28 <table border="1"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادر کننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GNRAL</td> <td>PEDCO</td> <td>000</td> <td>GE</td> <td>RT</td> <td>0028</td> <td>G00</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0028	G00	شماره صفحه : ۱ از ۳۵
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0028	G00											

طرح نگهداشت و افزایش تولید ۲۷ مخزن

MONTHLY PROGRESS REPORT # 28

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک

G00	OCT. 2023	IFI	M.Aref	M.Fakharian	S.Faramarzpour	
Rev.	Date	Purpose of Issue/Status	Prepared by:	Checked by:	Approved by:	CLIENT Approval
Class: 3		CLIENT Doc. Number (F-Number):				
Status: IDC: Inter-Discipline Check IFC: Issued For Comment IFA: Issued For Approval AFD: Approved For Design AFC: Approved For Construction AFP: Approved For Purchase AFQ: Approved For Quotation IFI: Issued For Information AB-R: As-Built for CLIENT Review AB-A: As-Built –Approved						

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 28								شماره صفحه : ۲ از ۳۵
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0028	G00	

REVISION RECORD SHEET

PAGE	G00	G01	G02	G03	G04
1	X				
2	X				
3	X				
4	X				
5	X				
6	X				
7	X				
8	X				
9	X				
10	X				
11	X				
12	X				
13	X				
14	X				
15	X				
16	X				
17	X				
18	X				
19	X				
20	X				
21	X				
22	X				
23	X				
24	X				
25	X				
26	X				
27	X				
28	X				
29	X				
30	X				
31	X				
32	X				
33	X				
34	X				
35	X				
36	X				
37	X				
38	X				
39	X				
40	X				
41	X				
42	X				
43	X				
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					

PAGE	G00	G01	G02	G03	G04
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 28							شماره صفحه : ۳ از ۳۵	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0028	G00	

فهرست مطالب

۱	مشخصات قراردادی پروژه	۴
۲	معرفی پروژه	۵
۳	گزارش مدیریتی پروژه	۸
۴	گزارش فعالیت های انجام شده	۹
۵	جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی/تحت الارض /سطح الارض)	۱۲
۶	بخش کنترل پروژه	۱۳
۷	وضعیت مدارک مهندسی	۱۹
۸	بخش مالی پروژه	۱۹
۹	بخش تدارکات کالا	۲۱
۱۰	نمودار سازمانی پیمانکار	۲۲
۱۱	مکاتبات با کارفرما	۲۴
۱۲	مشکلات و موانع	۲۹
۱۳	موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت	۳۰
۱۴	بخش کنترل پروژه	۳۱
۱۵	ضمائم	۳۲

* گزارش ترنسمیتال لیست به پیوست می باشد.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 28							شماره صفحه : ۴ از ۳۵
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0028	G00

۱ مشخصات قراردادی پروژه

نام پروژه: نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک/ بخش سطح الارض و

ابنیه تحت الارض

کارفرمای اصلی: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

اهواز، کوی فداییان اسلام، ساختمان ۵ طبقه/ تهران، خیابان شهید دستگردی،

تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

مجری و نماینده کارفرمای اصلی: علیرضا محمدی خواه (سرپرست طرح های نگهداشت و افزایش

تولید ناحیه گچساران)

کارفرما (پیمانکار عمومی): شرکت توسعه پتروایران

تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران

مدیر پروژه و نماینده کارفرما (پیمانکار) امیر محمد محسنی

عمومی):

پیمانکار EPC: مشارکت “هیرگان انرژی- طرح و بازرسی”

تهران، اتوبان همت - خیابان شیراز جنوبی - کوچه یاس - پلاک ۱۳

مدیر پروژه و نماینده پیمانکار: محمد فخاریان

تاریخ شروع پروژه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

تاریخ پایان پروژه: ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

شماره قرارداد: BK-00-CO-0001

شماره پروژه (در سیستم کارفرمای اصلی): ۹۷۱۰۲۰

مبلغ پیمان (یورو): ۳۵،۹۰۹،۸۸۰ یورو

مدت پیمان: ۲۴ ماه

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 28							شماره صفحه : ۵ از ۳۵
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0028	G00

۲ معرفی پروژه

میدان نفتی بینک از میادین نفتی ایران است که در استان بوشهر، در فاصله ۲۰ کیلومتری از شمال بندر گناوه و در ساحل خلیج فارس مستقر می باشد. این میدان از شمال با میدان نفتی گلخاری، میدان نفتی بی بی حکیمه و میدان نفتی سیاهمکان و از جنوب با میدان نفتی خارگ، در دریا هم جوار است. حجم ذخیره در جای نفت خام این میدان در حدود ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون بشکه برآورد می شود. میدان نفتی بینک در افق آسماری دارای ابعادی به طول ۴۲ کیلومتر و عرض متوسط ۶ کیلومتر است. سازندهای آسماری و جهرم این میدان به دلیل ارتباط فشاری مناسب، به عنوان یک مخزن واحد محسوب می شوند.

تاسیسات سرچاهی مربوط به ۶ حلقه چاه توسعه ای (که ۲ حلقه از این ۶ حلقه نیاز به برق رسانی و دیگر تسهیلات مرتبط جهت مصارف پمپ درون چاهی می باشد) و انجام اصلاحات در ۴ حلقه چاه تعمیری موجود (به همراه برق رسانی جهت مصارف پمپ درون چاهی و دیگر تسهیلات مورد نیاز) در دستور کار این طرح قرار دارد. آب مورد نیاز حفاری چاه ها می بایست از طریق تانکر (یا خط لوله موقت) از دره گپ گناوه/خلیج فارس تامین گردد. ضمناً احداث ۶ خط لوله جریانی جدید از چاه های توسعه ای پیش گفته به مجموعه بوستر-کلاستر بینک و توسعه چندراهه موجود بوستر-کلاستر بینک جزو شرح کار این پروژه است.

با هدف افزایش تولید نفت از میدان بینک، افزایش ظرفیت ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (و احداث ردیف تراکم و مستحداثات مورد نیاز جدید) به میزان ۱۵ م ف م ر نیز جزو شرح کار این پروژه می باشد.

همچنین احداث ۴۴ کیلومتر خط لوله ۸ اینچ انتقال گاز از ایستگاه تقویت فشار گاز بینک تا ایستگاه تزریق گاز سیاهمکان و ۵،۲ کیلومتر خط لوله ۴ اینچ انتقال مایعات گازی از ایستگاه تقویت فشار گاز بینک به واحد بهره برداری بینک نیز در تعهد پیمانکار می باشد.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 28							شماره صفحه: ۷ از ۳۵
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0028	G00

S/L	Well Name/Location	Reservoir
1	W 008 N	Asmari
2	W 018 S	Asmari
3	W 046 S	Bangestan
4	W028	Bangestan
5	W 035	Bangestan
6	W 007 S	Bangestan
7	Well 14	Bangestan
8	Well 12	Bangestan
9	Well 15	Bangestan
10	Well 05	Bangestan


 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 28							شماره صفحه : ۸ از ۳۵
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0028	G00

۳ گزارش مدیریتی پروژه

۳-۱ گزارش مدیریتی و جدول میزان پیشرفت کل پروژه

جدول پیشرفت پروژه در بخش ۵ ارائه شده است.

۳-۲ نمودار پیشرفت کل پروژه

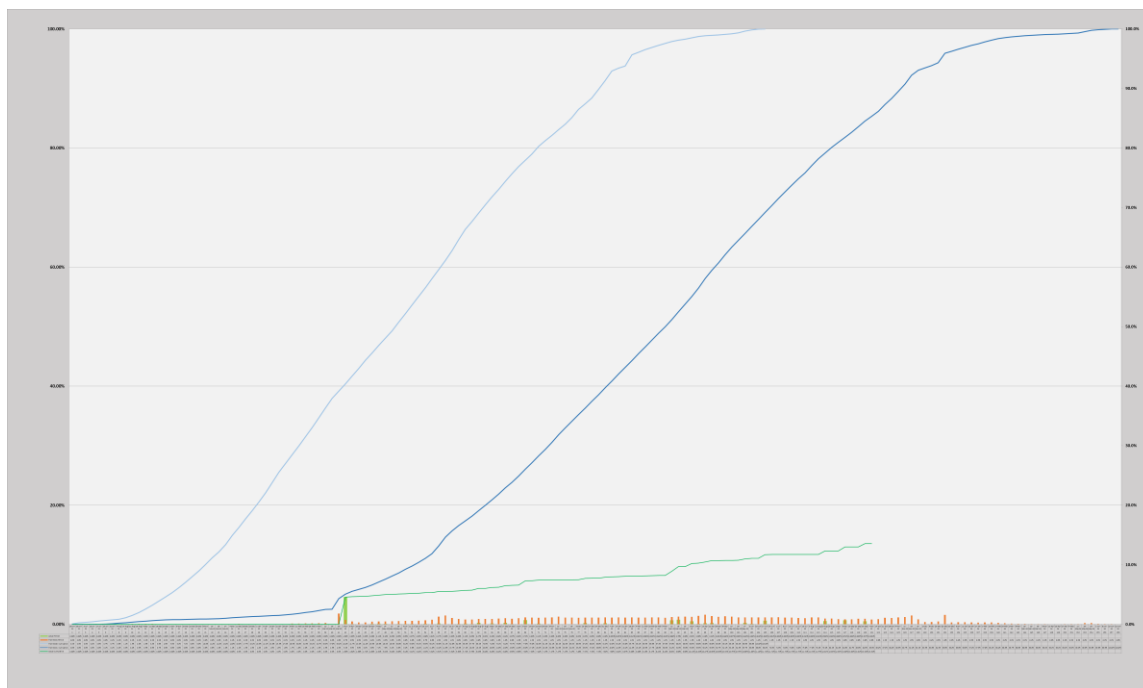

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 28							شماره صفحه : ۹ از ۳۵	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0028	G00	

۴ گزارش فعالیت های انجام شده

۴-۱ مدیریت پروژه /عمومی

- شرکت در جلسات هفتگی بررسی پیشرفت پروژه
- کنترل و نظارت مستمر بر حسن انجام ضبط و ربط محیط کار General Housekeeping طبق برنامه
- ارائه خدمات رفاهی به کارفرمای محترم بر اساس قرارداد

۴-۲ بخش مهندسی (E)

۴-۲-۱ مهندسی سطح الارض /ابنیه تحت الارض پروژه

- ارسال مدارک مهندسی مطابق برنامه زمانبندی پروژه
- بررسی و اصلاح مدارک براساس نظرات کارفرما

۴-۲-۲ مهندسی تحت الارض پروژه

- (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)

۴-۳ فعالیتهای مرتبط با کالای (P)

۴-۳-۱ کالای سطح الارض /ابنیه تحت الارض پروژه

- هماهنگی برگزاری جلسه بررسی P&ID ویرایش دوم سازنده کمپرسور گازی
- هماهنگی برگزاری جلسه PIM و KOM کولر هوایی ایستگاه
- بررسی TBE اصلاحی سیستم های DCS و ESD ایستگاه
- ارسال مدارک سازنده کمپرسور گازی
- برگزاری جلسات با سازندگان پکیج هوا و نیتروژن
- ارسال مدارک سازنده Pig Trap
- برگزاری جلسه بررسی پیشنهادات فنی پکیج فلر
- برگزاری جلسه بررسی قرارداد پمپ های آتششانی با سازنده منتخب
- ارسال TBE اصلاحی پکیج هوا و نیتروژن ایستگاه

۴-۳-۲ کالای تحت الارض پروژه

- (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 28							شماره صفحه : ۱۰ از ۳۵
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0028	G00

۴-۴ فعالیت‌های اجرایی (C)

- عملیات قالب بندی سازه Concrete pad چاه شماره ۱۴
- بتن ریزی پارت های ۲۰، ۲۱، ۲۲ و ۲۳ سازه Concrete pad چاه شماره ۱۴
- عملیات بتن ریزی پارت های ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ ضلع های شمالی سازه Concrete pad چاه شماره ۱۴
- قالب بندی دیواره های OBM و Oil trap چاه شماره ۱۴
- عملیات آرماتور بندی دیوار سازه های OBM & Oil trap چاه شماره ۱۴
- عملیات قالب بندی دیچ های پد گازوئیل چاه شماره ۱۴
- عملیات بتن ریزی فونداسیون دیچ های پد گازوئیل چاه شماره ۱۴
- عملیات پلاستر دیوار سازه Septic tank چاه شماره ۱۴
- اجرای بتن مگر Cutting Disposal چاه شماره ۱۴
- عملیات پیکور زنی سازه Waste pit چاه شماره ۱۴
- آرماتور بندی فونداسیون سازه Waste pit چاه شماره ۱۴
- آرماتور بندی شناژ ضلع شمالی و غربی سازه Concrete pad چاه شماره ۱۴
- اصلاح شیب سازه Burn pit چاه شماره ۱۴
- بارگیری و حمل نخاله های حاصل از خاکبرداری و تخلیه آن چاه شماره ۱۴
- بارگیری و حمل مصالح ماسه و تخلیه آن در محدوده بچینگ چاه شماره ۱۴
- اجرای لوله کشی برق ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز (تجهیز کارگاه)
- اجرای بند کشی نمای ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز (تجهیز کارگاه)
- آرماتور بندی شناژ محیطی Concrete Pad چاه ۱۴
- قالب بندی شناژ محیطی Concrete Pad چاه ۱۴
- پیکور زنی کانال آب های سطحی لوکیشن چاه ۱۴
- عملیات بتن ریزی پد گازوئیل چاه ۱۴
- عملیات بتن ریزی Concrete Pad چاه ۱۴
- بلوک چینی دیواره Coral Pit چاه ۱۴
- اجرای فوم بتن جهت شیب بندی سقف ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 28							شماره صفحه : ۱۱ از ۳۵
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0028	G00

- عملیات پیکورزنی دستی کانال های واقع در سازه Concrete Pad چاه ۱۴
- عملیات آرماتوربندی شناژ Concrete Pad چاه ۱۴
- عملیات پلاستر دیوارهای Coral pit چاه ۱۴
- عملیات آرماتوربندی Disposal چاه ۱۴
- عملیات قالب بندی Disposal چاه ۱۴
- عملیات سنگ چینی رمپ بین سازه های Concrete Pad و Coral pit چاه ۱۴
- بارگیری و حمل نخاله های حاصل از خاکبرداری و تخلیه آن
- بتن ریزی دیچ های داخلی سازه Concrete Pad چاه ۱۴
- اعملیات بتن ریزی سازه OBM چاه ۱۴
- اعملیات بتن ریزی سازه Oil trap چاه ۱۴
- اعملیات بتن ریزی سازه Waste pit چاه ۱۴
- اجرای بتن مگر سازه Disposal چاه ۱۴
- عملیات بتن ریزی سازه Disposal چاه ۱۴
- عملیات آرماتوربندی و قالب بندی و نصب تیرچه های سقف سازه Septic چاه ۱۴
- عملیات بتن ریزی سقف سازه Septic چاه ۱۴
- قالب بندی پارت دوم سازه های Oil trap & OBM چاه ۱۴
- عملیات آرماتوربندی رمپ بین Coral pit و Concrete Pad چاه ۱۴
- عملیات پلاستر دیوارهای Coral pit چاه ۱۴
- بارگیری و حمل مصالح درناژ و تخلیه آن در لوکیشن چاه ۱۴
- اجرای مصالح درناژ در پشت دیوار Coral pit جهت آماده ساز بستر جاده دسترسی چاه ۱۴
- جمع آوری نخاله های حاصل از خاکبرداری اطراف پد گازوئیل و اطراف شناژهای پد اصلی چاه ۱۴
- عملیات مخلوط ریزی اطراف شناژهای Concrete Pad چاه ۱۴
- عملیات لوله کشی برق ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز جنوب (تجهیز کارگاه)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 28							شماره صفحه : ۱۲ از ۳۵
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0028	G00

۵ جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی / سطح الارض)

BINAK OILFIELD DEVELOPMENT SURFACE WORK-PACKAGES BASED ON PACKAGES						
Code	Description	W.F. (Total)	Last Progress%	This Period	Up to now Progress%	Client Approval 1402/02/03
	Total Project	100.000%	13.00%	0.54%	13.54%	6.88%
1	GENERAL	5.32%	66.94%	0.20%	67.14%	44.18%
1-1	General	5.32%	66.94%	0.20%	67.14%	44.18%
2	SUB-Surface DEVELOPMENT	18.18%	11.80%	0.05%	11.84%	9.11%
2-1	Engineering	0.36%	55.36%	0.45%	55.80%	48.76%
2-2	Procurement	11.14%	5.59%	0.00%	5.59%	3.12%
2-3	Construction	6.68%	19.78%	0.10%	19.88%	16.94%
3	SURFACE DEVELOPMENT	76.49%	9.53%	0.68%	10.21%	3.75%
3-1	Engineering	2.37%	48.09%	0.24%	48.34%	45.61%
3-2	Procurement	59.19%	10.39%	0.87%	11.26%	3.02%
3-3	Construction	13.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3-4	Commissioning, Startup & Handover	1.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 28							شماره صفحه: ۱۳ از ۳۵
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0028	G00

۶ بخش کنترل پروژه

جدول میزان پیشرفت کل پروژه (عمومی / سطح الارض)

Description	W.F. (Disc)	W.F. (Total)	Roll-Up	Last Progress%	This Period	Up to now Progress%	Client Approval 1402/02/03
Total Project	100.000%	100.000%	100.00%	13.00%	0.54%	13.54%	6.88%
GENERAL	1.136%	1.136%	1.136%	66.937%	0.202%	67.14%	44.18%
Project Management	23.600%	0.268%	0.268%	58.218%	1.091%	59.31%	45.07%
Project Insurance	13.470%	0.153%	0.153%	90.677%	0.624%	91.30%	6.79%
Service to Company	35.400%	0.402%	0.402%	70.735%	0.097%	70.83%	46.19%
Training Courses	7.310%	0.083%	0.083%	5.000%	0.000%	5.00%	0.00%
GC Mobilization & Demobilization	20.220%	0.230%	0.230%	60.494%	0.000%	60.49%	55.57%
SUB-Surface DEVELOPMENT	52.342%	52.342%	52.338%	11.798%	0.047%	11.84%	9.11%
Package 01-New Well # W018S	5.210%	2.727%	2.723%	37.799%	0.000%	37.799%	34.245%
Package 02-New Well # W028 (Bangestan)	7.125%	3.729%	3.729%	40.490%	0.000%	40.490%	33.044%
Package 03-New Well # W046S (Bangestan)	33.462%	17.515%	17.515%	11.436%	0.002%	11.44%	8.95%
Package 04-New Well # W035 (Bangestan)	8.669%	4.538%	4.538%	15.909%	0.000%	15.91%	11.90%
Package 05-New Well # W008N	2.760%	1.445%	1.445%	7.292%	0.000%	7.29%	4.61%
Package 06-New Well # W007S/Manifold Extension (Bangestan)	12.934%	6.770%	6.770%	4.914%	0.012%	4.93%	3.09%
Package 07-Workover # 14	7.666%	4.013%	4.012%	8.648%	0.500%	9.15%	2.78%
Package 08-Workover # 12	6.237%	3.265%	3.264%	2.112%	0.025%	2.14%	1.90%
Package 09-Workover # 15	9.335%	4.886%	4.886%	1.468%	0.019%	1.49%	1.32%
Package 10-Workover # 05	6.602%	3.456%	3.456%	2.038%	0.039%	2.08%	1.83%
SURFACE DEVELOPMENT	46.522%	46.522%	46.522%	9.528%	0.681%	10.21%	3.75%
Package 11- EPC Pipeline 8" & 4"	15.529%	7.224%	7.224%	6.983%	0.007%	6.99%	1.38%
Package 12- EPC # Compressor Station	84.471%	39.298%	39.298%	10.168%	0.851%	11.02%	4.34%


 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 28							شماره صفحه : ۱۴ از ۳۵
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0028	G00

ضرایب وزنی فعالیت ها (W-F) (عمومی / سطح الارض) :

Cde	Description	W.F.(Discp.)	WF.(Total)
		100.00%	100.000%
1	GENERAL	5.32%	5.32%
1-1	Project Management	100.00%	5.32%
2	SUB-Surface DEVELOPMENT	18.18%	18.18%
2-1	Engineering	1.99%	0.36%
2-2	Procurement	61.26%	11.14%
2-3	Construction	36.75%	6.68%
3	SURFACE DEVELOPMENT	76.49%	76.49%
3-1	Engineering	3.09%	2.37%
3-2	Procurement	77.39%	59.19%
3-3	Construction	18.20%	13.92%
3-4	Commissioning, Startup & Handover	1.3%	1.01%


 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 28							شماره صفحه : ۱۵ از ۳۵
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0028	G00

نمودار پیشرفت بخش عمومی

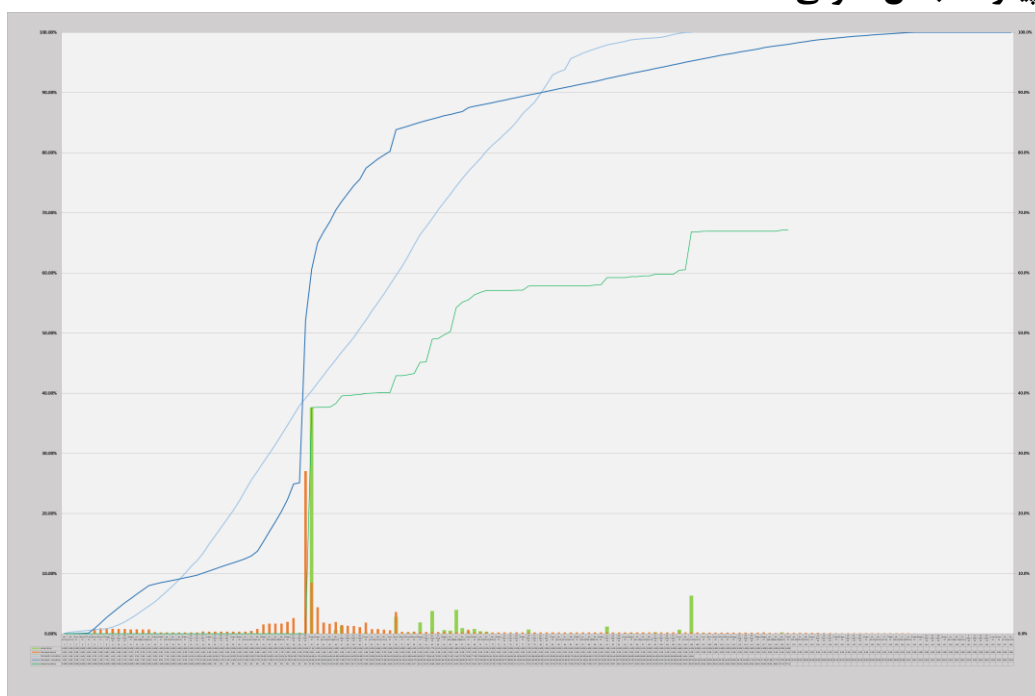

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 28							شماره صفحه : ۱۶ از ۳۵
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0028	G00

نمودار پیشرفت بخش ابنیه تحت الارض

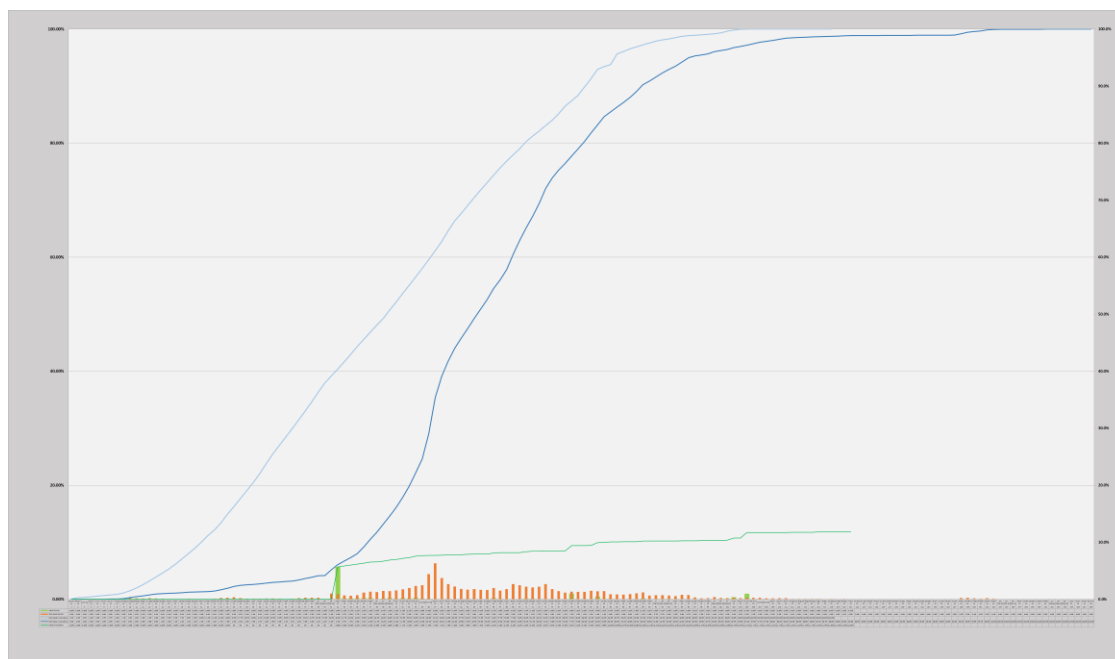



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض و ابنیه تحت الارض

عمومی و مشترک



شماره پیمان:


۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

MONTHLY PROGRESS REPORT # 28

پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0028	G00

شماره صفحه: ۱۷ از ۳۵


نمودار پیشرفت بخش سطح الارض

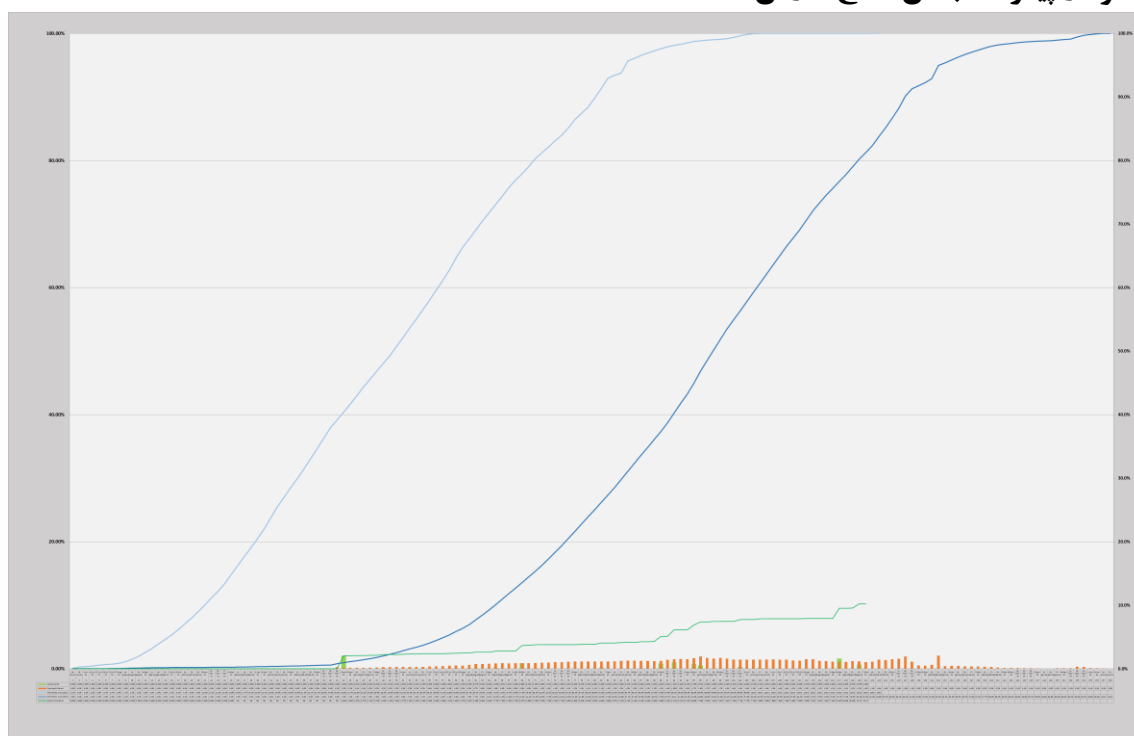

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پیمانکاری  HIRGAN ENERGY 
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 28							شماره صفحه : ۱۸ از ۳۵
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0028	G00

جدول و نمودار پیشرفت EPC:

Surface DEVELOPMENT		
	W.F.	Progress%
Total Project	100%	13.54%
Engineering	2.73%	49.31%
Procurement	70.33%	10.36%
Construction	20.60%	6.45%
Commissioning, Startup & Handover	1.01%	0.0%
Project Management	5.32%	67.14%

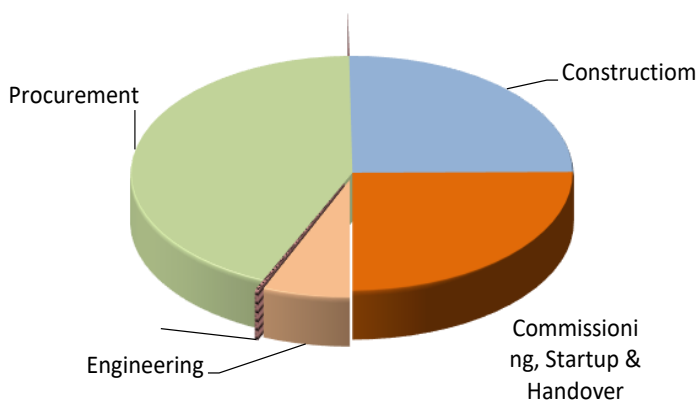



 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 28								شماره صفحه : ۲۱ از ۳۵
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0028	G00	

۸ بخش تدارکات کالا



 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 28							شماره صفحه : ۲۴ از ۳۵	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0028	G00	

۱۰ مکاتبات با کارفرما

۱-۱۱ مکاتبات وارده از کارفرما :

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
۱	کلاس بندی مدارک مهندسی	1402/06/22	10932
۲	کلاس بندی مدارک مهندسی	1402/06/22	10934
۳	تحويل دو نسخه اصل الحاقیه شماره یک پیمان مهندسی ، تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب و راه اندازی ابنیه تحت الارض و تاسیسات سطح الارض طرح نگهداشت و افزایش میدان بینک پیمان شماره BK-00-CO-0001	1402/06/23	10924
۴	لزوم تسریع در عملیات اجرایی چاه ۱۴ - ۱۱۰۰۹	1402/06/26	11009
۵	انبار جدید طرح بینک - ۱۱۰۱۹	1402/06/27	11019
۶	پکیج اولویت دوم پیش پرداخت بخش کالا	1402/06/28	11231
۷	معرفی سرپرست طرح نگهداشت و افزایش تولید میدان بینک	1402/06/28	11261
۸	صورتحجلسه بررسی فایل NAVIS مدل سه بعدی ۹۰٪-GCS	1402/06/29	11334
۹	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترنسمیتال ها	1402/06/29	11335
۱۰	نامه حراست از انبار طرح	1402/07/09	11753
۱۱	معرفی شرکت مهندسی هیرگان انرژی (بعنوان مشاور مهندسی سطح الارض پروژه توسعه میدان نفتی بینک)	1402/07/10	11950
۱۲	پاسخ به نظرات پیمانکار در خصوص مدرک TBE for gas compressor	1402/07/12	12053
۱۳	مدرک مطالعات خوردگی ایستگاه تقویت فشار گاز - ۷۶۸۳	1402/07/12	7683
۱۴	پاسخ پیگیری مجدد جبران خسارات مالی وارده بابت افزایش قیمت کمپرسورهای گازی	1402/07/12	12062
۱۵	فراخوان جلسه جانمایی ساختمان انبار جدید واحد تقویت فشار بینک	1402/07/12	12153
۱۶	مدرک مطالعات خوردگی ایستگاه تقویت فشار گاز	1402/07/12	12057
۱۷	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترنسمیتال ها	1402/07/17	12342
۱۸	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترنسمیتال ها	1402/07/17	12346
۱۹	پاسخ به مدارک سازنده کمپرسورهای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک	1402/07/17	12386
۲۰	تامین ۶ دستگاه کنترل پنل سر چاهی WHCP	1402/07/17	12401
۲۱	نظرات ذینفع اصلی در خصوص نقشه های سیویل سر چاهی W028	1402/07/17	12483
۲۲	بروز رسانی برنامه زمانبندی و فعالیت های انجام شده کمپرسورگازی هواپار	1402/07/17	12489
۲۳	پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترنسمیتال ها	1402/07/18	12490
۲۴	صورتحجلسه بررسی وضعیت کالای سطح الارض پروژه	1402/07/17	12492
۲۵	برنامه زمانبندی و گزارش ساخت (WBS) لوله های ۴ و ۸ اینچ	1402/07/18	12602

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 28							شماره صفحه : ۲۵ از ۳۵
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0028	G00

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
۲۶	پاسخ ذینفع اصلی طرح به ترنس میتال شماره ۲۳۰۸	1402/07/22	12675
۲۷	انتشار صورتجلسه بررسی ID_D02&P سازنده کمپرسورهای گاز	1402/07/22	12689
۲۸	معرفی شرکت مهندسی هیرگان انرژی بعنوان مشاور مهندسی سطح الارض بینک	1402/07/22	12710
۲۹	تغییر کد نسخه مدارک AS Built	1402/07/23	12775
۳۰	گزارش بررسی مدل سه بعدی ایستگاه تقویت فشار گاز بینک	1402/07/23	12782
۳۱	دعوت به جلسه بررسی مدل سه بعدی ۹۰٪ و پلات پلن بسته GCS و چاه ها	1402/07/23	12779
۳۲			
۳۳			

۲-۱۱ مکاتبات صادره به کارفرما :

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
۱	برگزاری دوره آموزشی PDMS مقدماتی	1402/06/19	0916
۲	معرفی نماینده جهت دریافت نسخه مهور الحاقیه شماره ۱ قرارداد (تمدیدیه زمانی)	1402/06/21	0917
۳	صورتجلسه بررسی ID_V02&P کمپرسورهای گاز GCS (از مدارک وندور)	1402/06/21	0918
۴	ارسال گزارش هفتگی (منتهی به تاریخ ۲۱/۰۶/۱۴۰۲)	1402/06/22	0919
۵	ارائه فایل NAVIS مدل سه بعدی ۹۰٪ - بسته ایستگاه جدید تقویت فشار گاز بینک	1402/06/22	0920
۶	درخواست تذکر به پیمانکار پروژه دیگر جهت رعایت موارد ایمنی (در راستای جلوگیری از آسیب به پروژه بینک)	1402/06/22	0921
۷	درخواست جلسه جهت نهایی سازی ID_V02&P سازنده کمپرسورهای گاز	1402/06/28	0922
۸	تاریخ KOM و PIM کولرهای هوایی ایستگاه گاز	1402/06/28	0923
۹	ارسال گزارش هفتگی (منتهی به تاریخ ۲۸/۰۶/۱۴۰۲)	1402/06/29	0924
۱۰	وضعیت مدارک مهندسی COMMENTED و بدون پاسخ (تا ۲۸/۰۶/۱۴۰۲)	1402/06/29	0925
۱۱	ارسال برنامه زمانبندی RE-PLAN (۲۱ ماهه)	1402/06/29	0926
۱۲	پاسخ به نظرات کارفرمای اصلی بر روی قرارداد خرید لوله ۸ اینچ	1402/06/29	0927
۱۳	خطوط لوله ۴، ۶ و ۸ اینچ؛ مدارک درخواستی صورتجلسات PIM و KOM	1402/06/30	0928
۱۴	WHCP - گزارشات بازرسی نهایی و فاینال بوک دو دستگاه پانل؛ پیگیری اخذ نظرات NISOC	1402/06/30	0929
۱۵	گزارش اصلاح شده بازرسی مورخ ۰۶/۰۵/۱۴۰۲ از متریا ل برخی قطعات بلوکه کمپرسور	1402/06/30	0930
۱۶	گزارش بازرسی مورخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۲ از متریا ل Crank Case بلوکه کمپرسور	1402/06/30	0931
۱۷	درخواست معرفی شرکت مهندسی هیرگان انرژی به سازمان برنامه و بودجه کشور	1402/07/04	0932

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 28							شماره صفحه : ۲۶ از ۳۵
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0028	G00

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
۱۸	قرارداد (اصلاح شده) خرید بسته نم زدای گاز GCS	1402/07/05	0933
۱۹	مدارک ITP_V00 و QCP_V00 سازنده کولرهای هوایی GCS جهت نهایی سازی در PIM	1402/07/05	0934
۲۰	ارسال گزارش هفتگی (منتهی به تاریخ ۰۴/۰۷/۱۴۰۲)	1402/07/05	0935
۲۱	پیگیری برگزاری جلسه بررسی مدل سه بعدی ۹۰٪ و پلات پلن (D04) بسته GCS	1402/07/08	0936
۲۲	پیگیری واریز مانده مبالغ پیش اقساط پرداخت اول و دوم (۲٪ و ۳٪ مبلغ پیمان)	1402/07/08	0937
۲۳	تغییر کاری #۵: GCS - نوع و شرایط کارکرد/طراحی برخی پمپ ها	1402/07/10	0938
۲۴	درخواست مجوز انتشار نسخ کاغذی مدارک با وضعیت AFC	1402/07/12	0939
۲۵	Sub-vendor پوشش FBE خط لوله ۸ اینچ	1402/07/15	0940
۲۶	درخواست اصلاح نامه معرفی شرکت مهندسی هیرگان انرژی به سازمان برنامه و بودجه کشور	1402/07/17	0941
۲۷	جانمایی پیشنهادی ابنیه CCTV واحدهای بهره برداری، نمک زدایی و تقویت فشار گاز بینک	1402/07/18	0942
۲۸	درخواست مجوز انتشار نسخ کاغذی/الکترونیکی مدارک با مهر AFC	1402/07/18	0943
۲۹	مسیر پیشنهادی خطوط هوای برق چاه ها - تغییرات مسیر (واریانت)	1402/07/18	0944
۳۰	درخواست جلسه و بازدید میدانی(نهایی سازی مسیر فولاین ها، خطوط هوایی برق چاه ها و بازدید از چاه- محل موقعیت W007S)	1402/07/18	0945
۳۱	GCS - VPIS_V03 کمپرسورهای گاز (هوایار)؛ پاسخ به ابهامات مطروحه	1402/07/22	0946
۳۲	برآورد به روز شده کارکرد بخش مهندسی- شماره ۹	1402/07/22	0947
۳۳	محاسبات پمپ و مخزن پکیج تزریق ماده ضد خوردگی	1402/07/23	0948
۳۴	پیگیری اخذ بازخورد بر روی کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی- شماره ۱۰ (BK-HD-WPA-C-0010_G00)	1402/07/23	0949
۳۵	درخواست مجوز شروع به کار اجرایی در ایستگاه جدید تقویت فشار گاز بینک	1402/07/23	0950
۳۶	برگزاری دوره آموزشی PDMS مقدماتی	1402/06/19	0916
۳۷	معرفی نماینده جهت دریافت نسخه ممهور الحاقیه شماره ۱ قرارداد (تمدیدیه زمانی)	1402/06/21	0917
۳۸	صورتحجلسه بررسی ID_V02&P کمپرسورهای گاز GCS (از مدارک وندور)	1402/06/21	0918
۳۹	ارسال گزارش هفتگی (منتهی به تاریخ ۲۱/۰۶/۱۴۰۲)	1402/06/22	0919
۴۰	ارائه فایل NAVIS مدل سه بعدی ۹۰٪ - بسته ایستگاه جدید تقویت فشار گاز بینک	1402/06/22	0920
۴۱	درخواست تذکر به پیمانکار پروژه دیگر جهت رعایت موارد ایمنی (در راستای جلوگیری از آسیب به پروژه بینک)	1402/06/22	0921
۴۲	درخواست جلسه جهت نهایی سازی ID_V02&P سازنده کمپرسورهای گاز	1402/06/28	0922
۴۳	تاریخ KOM و PIM کولرهای هوایی ایستگاه گاز	1402/06/28	0923
۴۴	ارسال گزارش هفتگی (منتهی به تاریخ ۲۸/۰۶/۱۴۰۲)	1402/06/29	0924

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 28							شماره صفحه : ۲۷ از ۳۵
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0028	G00

ردیف	موضوع	تاریخ	شماره نامه مربوطه
۴۵	وضعیت مدارک مهندسی COMMENTED و بدون پاسخ (تا ۲۸/۰۶/۱۴۰۲)	1402/06/29	0925
۴۶	ارسال برنامه زمانبندی RE-PLAN (۲۱ ماهه)	1402/06/29	0926
۴۷	پاسخ به نظرات کارفرمای اصلی بر روی قرارداد خرید لوله ۸ اینچ	1402/06/29	0927
۴۸	خطوط لوله ۴، ۶ و ۸ اینچ؛ مدارک درخواستی صورتجلسات PIM و KOM	1402/06/30	0928
۴۹	WHCP - گزارشات بازرسی نهایی و فاینال بوک دو دستگاه پانل؛ پیگیری اخذ نظرات NISOC	1402/06/30	0929
۵۰	گزارش اصلاح شده بازرسی مورخ ۰۶/۰۵/۱۴۰۲ از متریا ل برخی قطعات بلوکه کمپرسور	1402/06/30	0930
۵۱	گزارش بازرسی مورخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۲ از متریا ل Crank Case بلوکه کمپرسور	1402/06/30	0931
۵۲	درخواست معرفی شرکت مهندسی هیرگان انرژی به سازمان برنامه و بودجه کشور	1402/07/04	0932
۵۳	قرارداد (اصلاح شده) خرید بسته نم زدای گاز GCS	1402/07/05	0933
۵۴	مدارک ITP_V00 و QCP_V00 سازنده کولرهای هوایی GCS جهت نهایی سازی در PIM	1402/07/05	0934
۵۵	ارسال گزارش هفتگی (منتهی به تاریخ ۰۴/۰۷/۱۴۰۲)	1402/07/05	0935
۵۶	پیگیری برگزاری جلسه بررسی مدل سه بعدی ۹۰٪ و پلات پلن (D04) بسته GCS	1402/07/08	0936
۵۷	پیگیری واریز مانده مبالغ پیش اقساط پرداخت اول و دوم (۲٪ و ۳٪ مبلغ پیمان)	1402/07/08	0937
۵۸	تغییر کاری #۵؛ GCS - نوع و شرایط کارکرد/طراحی برخی پمپ ها	1402/07/10	0938
۵۹	درخواست مجوز انتشار نسخ کاغذی مدارک با وضعیت AFC	1402/07/12	0939
۶۰	Sub-vendor پوشش FBE خط لوله ۸ اینچ	1402/07/15	0940
۶۱	درخواست اصلاح نامه معرفی شرکت مهندسی هیرگان انرژی به سازمان برنامه و بودجه کشور	1402/07/17	0941
۶۲	جانمایی پیشنهادی ابنیه CCTV واحدهای بهره برداری، نمک زدایی و تقویت فشار گاز بینک	1402/07/18	0942
۶۳	درخواست مجوز انتشار نسخ کاغذی/الکترونیکی مدارک با مهر AFC	1402/07/18	0943
۶۴	مسیر پیشنهادی خطوط هوای برق چاه ها - تغییرات مسیر (واریانت)	1402/07/18	0944
۶۵	درخواست جلسه و بازدید میدانی (نهایی سازی مسیر فولاین ها، خطوط هوایی برق چاه ها و بازدید از چاه - محل موقعیت W007S)	1402/07/18	0945
۶۶	GCS - VPIS_V03 کمپرسورهای گاز (هواپار)؛ پاسخ به ابهامات مطروحه	1402/07/22	0946
۶۷	برآورد به روز شده کارکرد بخش مهندسی - شماره ۹	1402/07/22	0947
۶۸	محاسبات پمپ و مخزن پکیج تزریق ماده ضدخوردگی	1402/07/23	0948
۶۹	پیگیری اخذ بازخورد بر روی کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی - شماره ۱۰ (BK-HD-) (WPA-C-0010_G00)	1402/07/23	0949
۷۰	درخواست مجوز شروع به کار اجرایی در ایستگاه جدید تقویت فشار گاز بینک	1402/07/23	0950

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 28							شماره صفحه : ۲۸ از ۳۵
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0028	G00

۳-۱۱ لیست صورتجلسات پروژه

ردیف	عنوان صورت جلسه	تاریخ صورت جلسه	شماره صورت جلسه	ملاحظات
۱	صورتجلسه بررسی فایل NAVIS مدل سه بعدی ۹۰٪-GCS	۱۴۰۲/۰۶/۲۸		
۲	صورتجلسه بررسی وضعیت کالای سطح الارض پروژه	۱۴۰۲/۰۷/۱۰		
۳	جانمایی ساختمان انبار جدید ایستگاه تقویت گاز بینک	۱۴۰۲/۰۷/۱۶		
۴	صورتجلسه بررسی نیازهای کمپ	۱۴۰۲/۰۷/۱۷		

۴-۱۱ لیست مکاتبات بدون پاسخ

ردیف	عنوان/خلاصه نامه	تاریخ نامه	شماره نامه	ملاحظات
۱	پیگیری واریز مانده مبالغ پیش اقساط پرداخت اول و دوم (۲٪ و ۳٪ مبلغ پیمان)	1402/07/08	0937	
۲				
۳				

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 28							شماره صفحه : ۲۹ از ۳۵
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0028	G00

۱۱ - مشکلات و موانع

- عدم هماهنگی بین کامنتهای پترو ایران و کارفرمای اصلی.
- با توجه به عدم پرداخت مالی کامل پروژه و معوق ماندن درخواستهای مالی اعلام شده صورت وضعیت های مهندسی ، صورت وضعیت شماره های بخش عمومی و اجرا) موجب شده است جریان نقدینگی پروژه به شدت منفی شود .

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و پارس  HIRGAN ENERGY 
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 28							شماره صفحه : ۳۰ از ۳۵
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0028	G00

۱۲ موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت

- دریافت با تاخیر نظرات کارفرمای محترم بر روی مدارک ارسالی
- وجود برخی تناقضات در نظرات کارفرمایان (شرکت پتروایران و شرکت مناطق نفتخیز جنوب) درخصوص مدارک ارسالی
- تاخیر در نهایی سازی وضعیت طرح مدیریت پسماند چاه ها (توسط کارفرمای محترم) و بالتبع تاخیر در نهایی سازی نقشه ها و کندی پیشرفت کار اجرایی مربوطه
- تغییر برنامه استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و در نتیجه تغییر برنامه کلی پروژه
- نامشخص بودن تاریخ دقیق استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و در نتیجه متاثر شدن برنامه آماده سازی لوکیشن چاه ها و خرید اقلام مربوطه مورد نیاز
- عدم پرداخت صورت وضعیت های مهندسی توسط کارفرمای محترم
- عدم پرداخت صورت وضعیت های عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم
- محدودیت های ایجاد شده در تامین کالای ساخت داخل کشور و متعاقب آن سو استفاده برخی شرکت های لوله ساز داخلی و افزایش بی دلیل قیمت ها
- افزایش بی رویه کلیه قیمت های مهندسی، خرید و اجرا علیرغم عدم تغییر نرخ تسعیر ارز نیمایی

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 28							شماره صفحه : ۳۱ از ۳۵
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0028	G00

۱۳ بخش کنترل پروژه

- ۱-۱۴ برنامه زمان بندی پروژه
- ۲-۱۴ لیست مدارک ارسال شده طی دوره
- ۲-۱۴ لیست مدارک دارای تاخیر در پاسخ از سوی کارفرما
- ۳-۱۴ جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																	
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 28 <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GNRAL</td><td>PEDCO</td><td>000</td><td>GE</td><td>RT</td><td>0028</td><td>G00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0028	G00	شماره صفحه : ۳۲ از ۳۵
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0028	G00											

۱۴ ضمائم

پیوست شماره یک: برنامه زمان بندی پروژه

پس از اعمال تغییرات و به روز رسانی برنامه ارائه خواهد شد.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">MONTHLY PROGRESS REPORT # 28</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>G00</td><td>0028</td><td>RT</td><td>GE</td><td>000</td><td>PEDCO</td><td>GNRAL</td><td>BK</td></tr></table>	MONTHLY PROGRESS REPORT # 28								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	G00	0028	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK	شماره صفحه : ۳۳ از ۳۵
MONTHLY PROGRESS REPORT # 28																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
G00	0028	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK																			

پیوست شماره دو : لیست مدارک ارسال شده طی دوره
(در پیوست)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">MONTHLY PROGRESS REPORT # 28</th></tr><tr><td>نسخه</td><td>سریال</td><td>نوع مدرک</td><td>رشته</td><td>تسهیلات</td><td>صادر کننده</td><td>بسته کاری</td><td>پروژه</td></tr><tr><td>G00</td><td>0028</td><td>RT</td><td>GE</td><td>000</td><td>PEDCO</td><td>GNRAL</td><td>BK</td></tr></table>	MONTHLY PROGRESS REPORT # 28								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	G00	0028	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK	شماره صفحه : ۳۴ از ۳۵
MONTHLY PROGRESS REPORT # 28																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
G00	0028	RT	GE	000	PEDCO	GNRAL	BK																			

پیوست شماره سه: جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)
(در پیوست)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	MONTHLY PROGRESS REPORT # 28							شماره صفحه : ۳۵ از ۳۵
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GNRAL	PEDCO	000	GE	RT	0028	G00

پیوست شماره چهار: عکسهایی از عملیات اجرایی
(در پیوست)
