طرح نگهداشت و افزایش تولید ۲۷ مخزن

DETAILED SCHEDULE & UPDATING

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک

Rev.	Date	Purpose of Issue/Status	Prepared by:	Checked by:	Approved by:	CLIENT Approval
G05	JUL. 2022	AFD	P.Ghadamian	M.Fakharian	M.Mehrshad	
G04	JUN. 2022	AFD	P.Ghadamian	M.Fakharian	M.Mehrshad	
G03	MAY. 2022	AFD	P.Ghadamian	M.Fakharian	M.Mehrshad	
G02	APR. 2022	IFA	P.Ghadamian	M.Fakharian	M.Mehrshad	
G01	MAR. 2022	IFA	P.Ghadamian	M.Fakharian	M.Mehrshad	
G00	FEB. 2022	IFC	P.Ghadamian	M.Fakharian	M.Mehrshad	

Class:2 | **CLIENT Doc. Number: F0Z-707039**

Status:

IDC: Inter-Discipline Check
IFC: Issued For Comment
IFA: Issued For Approval
AFD: Approved For Design
AFC: Approved For Construction
AFP: Approved For Purchase
AFQ: Approved For Quotation
IFI: Issued For Information
AB-R: As-Built for CLIENT Review
AB-A: As-Built –Approved

REVISION RECORG SHEET

PAGE	G00	G01	G02	G03	G04	G05
1	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X		X	X
4	X	X	X		X	X
5	X	X	X		X	X
6	X	X	X		X	X
7	X	X	X		X	X
8	X	X	X		X	X
9	X	X	X		X	X
10	X	X	X		X	X
11	X	X	X		X	X
12	X	X	X		X	X
13	X	X	X		X	X
14	X	X	X		X	X
15	X	X	X		X	X
16	X	X	X		X	X
17	X	X	X		X	X
18	X	X	X		X	X
19	X	X	X		X	X
20	X	X	X		X	X
21	X	X	X		X	X
22	X	X	X		X	X
23	X	X	X		X	X
24	X	X	X		X	X
25	X	X	X		X	X
26	X	X	X		X	X
27	X	X	X		X	X
28	X	X	X		X	X
29	X	X	X		X	X
30	X	X	X		X	X
31	X	X	X		X	X
32	X	X	X		X	X
33	X	X	X		X	X
34	X	X	X		X	X
35	X	X	X		X	X
36	X	X	X		X	X
37	X	X	X		X	X
38	X	X	X		X	X
39	X	X	X		X	X
40	X	X	X		X	X
41	X	X	X		X	X
42	X	X	X		X	X
43	X	X	X		X	X
44	X	X	X		X	X
45	X	X	X		X	X
46	X	X	X		X	X
47	X	X	X		X	X
48	X	X	X		X	X
49	X	X	X		X	X
50	X	X	X		X	X
51	X	X	X		X	X
52	X	X	X		X	X
53	X	X	X		X	X
54	X	X	X		X	X
55	X	X	X		X	X
56	X	X	X		X	X
57	X	X	X		X	X
58	X	X	X		X	X
59	X	X	X		X	X
60	X	X	X		X	X
61	X	X	X		X	X
62	X	X	X		X	X
63	X	X	X		X	X
64	X	X	X		X	X
65	X	X	X		X	X

PAGE	G00	G01	G02	G03	G04	G05
66	X	X	X		X	X
67	X	X	X		X	X
68	X	X	X		X	X
69	X	X	X		X	X
70	X	X	X		X	X
71	X	X	X		X	X
72	X	X	X		X	X
73	X	X	X		X	X
74	X	X	X		X	X
75	X	X	X		X	X
76	X	X	X		X	X
77	X	X	X		X	X
78	X	X	X		X	X
79	X	X	X		X	X
80	X	X	X		X	X
81	X	X	X		X	X
82	X	X	X		X	X
83	X	X	X		X	X
84	X	X	X		X	X
85	X	X	X		X	X
86	X	X	X		X	X
87	X	X	X		X	X
88	X	X	X		X	X
89	X	X	X		X	X
90	X	X	X		X	X
91	X	X	X		X	X
92	X	X	X		X	X
93	X	X	X		X	X
94	X	X	X		X	X
95	X	X	X		X	X
96	X	X	X		X	X
97	X	X	X		X	X
98	X	X	X		X	X
99	X	X	X		X	X
100	X	X	X		X	X
101	X	X	X		X	X
102	X	X	X		X	X
103	X	X	X		X	X
104	X	X	X		X	X
105	X	X	X		X	X
106	X	X	X		X	X
107	X	X	X		X	X
108	X	X	X		X	X
109	X	X	X		X	X
110	X	X	X		X	X
111	X	X	X		X	X
112	X	X	X		X	X
113	X	X	X		X	X
114	X	X	X		X	X
115	X	X	X		X	X
116	X	X	X		X	X
117	X	X	X		X	X
118	X	X	X		X	X
119	X	X	X		X	X
120	X	X	X		X	X
121	X	X	X		X	X
...	X	X	X		X	X
279	X	X	X		X	X
280	X	X	X		X	X
....	X	X	X			X
371	X	X	X			X
372		X	X			X
...		X	X			X
377		X	X			X
378		X				

فهرست مطالب

۱- مقدمه ٤

۱- مقدمه

میدان نفتی بینک در استان بوشهر در فاصله ۲۰ کیلومتری شمال غربی شهرستان گناوه، واقع شده است. شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به عنوان کارفرمای اصلی، پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک (بسته بینک) را در قالب پیمان EPG-EPC به شرکت توسعه پترو ایران محول نموده است. شرکت توسعه پترو ایران نیز (به عنوان پیمانکار عمومی پروژه/ General Contractor) بخش سطح الارض و ابنیه تحت الارض این بسته را به صورت EPC به مشارکت "هیرگان انرژی- طرح و بازرسی" واگذار کرده است.

تعاریف

کارفرمای اصلی:	شرکت ملی نفت خیز جنوب
پروژه:	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک / سطح الارض و ابنیه تحت الارض
پیمانکار EPG/EPC (GC):	شرکت پترو ایران
پیمانکار EPC:	مشارکت "هیرگان انرژی- طرح و بازرسی"

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Delivery On Site	۷	$۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۸
Submitting Vendor Data Book	۵	$۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۳
Delivering Spare Parts	۵	$۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
Corrosion Coupon/Probe	۱۰۵	$۹۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
Tendering & Selection	۱۵	$۴	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۴
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۹
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۱۰	$۴۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۵
Final Inspection	۱۲	$۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۷
Delivery On Site	۷	$۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۴
Submitting Vendor Data Book	۵	$۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۹
Delivering Spare Parts	۵	$۵	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
Pressure Transmitter	۹۷	$۱۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۲
Tendering & Selection	۱۵	$۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۳
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۰۰	$۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۴
Final Inspection	۱۲	$۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
Delivery On Site	۷	$۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۳
Submitting Vendor Data Book	۵	$۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۸
Delivering Spare Parts	۵	$۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۲
Flow Transmitter/ Diff. Pressure Transmitter	۱۰۶	$۱۲۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۳
Tendering & Selection	۱۵	$۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۳
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۱۰	$۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۵
Final Inspection	۱۲	$۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۶
Delivery On Site	۷	$۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
Submitting Vendor Data Book	۵	$۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۸
Delivering Spare Parts	۵	$۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۳
Instrument/F&G Cable	۸۷	$۱۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
Tendering & Selection	۱۵	$۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
Manufacturing / Fabrication / Supply	۹۰	$۷۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
Final Inspection	۷	$۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
Delivery On Site	۷	$۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۰
Submitting Vendor Data Book	۵	$۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
Instrument/F&G Junction box and Gland	۹۴	$۱۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۶
Tendering & Selection	۱۵	$۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۶

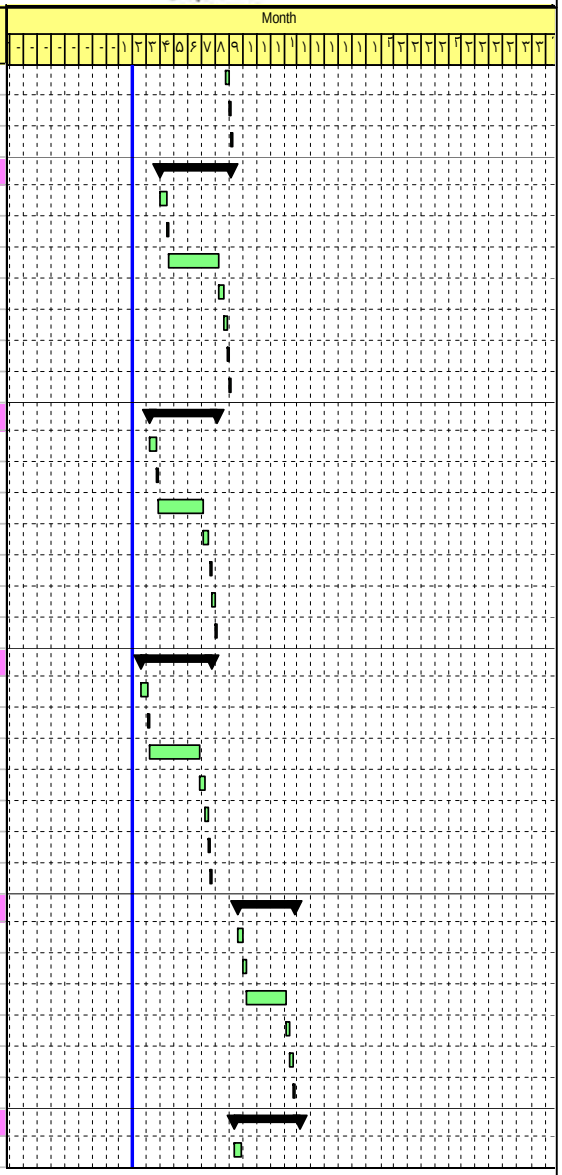

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۰۰	$۶۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۱
Final Inspection	۱۲	$۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
Delivery On Site	۷	$۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۱
Submitting Vendor Data Book	۵	$۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۶
Instrument Installation Accessories	۹۶	$۹۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۶
Tendering & Selection	۱۵	$۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۲
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۷
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۰۰	$۴۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۷
Final Inspection	۷	$۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۴
Delivery On Site	۷	$۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۱
Submitting Vendor Data Book	۵	$۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۶
Differential Pressure/Pressure Gauge	۹۸	$۱۲۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
Tendering & Selection	۱۵	$۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۳
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۰۰	$۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۵
Final Inspection	۱۲	$۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۷
Delivery On Site	۷	$۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
Submitting Vendor Data Book	۵	$۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۸
Delivering Spare Parts	۵	$۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
Temperature Gauge	۹۸	$۱۲۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
Tendering & Selection	۱۵	$۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۳
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۰۰	$۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۵
Final Inspection	۱۲	$۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۷
Delivery On Site	۷	$۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
Submitting Vendor Data Book	۵	$۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۸
Delivering Spare Parts	۵	$۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
Instrument Tube and Fitting	۸۳	$۱۵۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
Tendering & Selection	۱۰	$۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
Manufacturing / Fabrication / Supply	۹۰	$۷۵	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷
Final Inspection	۱۲	$۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
Delivery On Site	۷	$۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
Submitting Vendor Data Book	۵	$۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
Instrument Cable Tray	۹۲	$۹۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۱

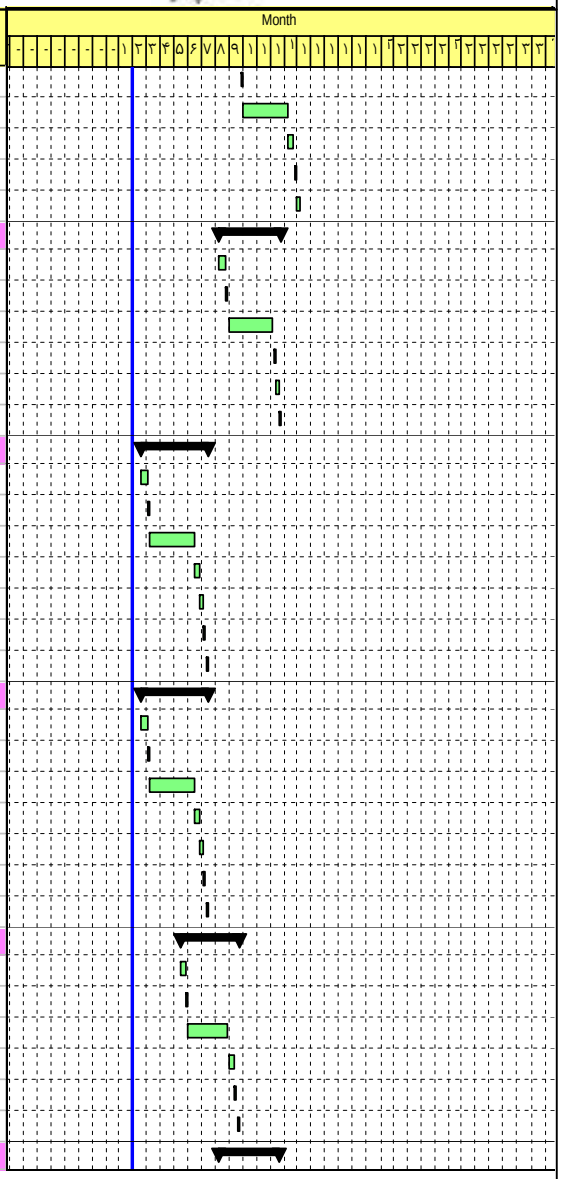

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Tendering & Selection	۱۵	$۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۲
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۷
Manufacturing / Fabrication / Supply	۹۰	$۴۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۷
Final Inspection	۱۲	$۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۹
Delivery On Site	۷	$۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۶
Submitting Vendor Data Book	۵	$۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۱
Safety & Fire Fighting	۸۲	$۴۳۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
Fire Fighting and Safety Equipment - Extension of Binak B/C Manifold	۵۳	$۳۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۹
Tendering & Selection	۳۰	$۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۰
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۵
Manufacturing / Fabrication / Supply	۲۰	$۱۶۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۵
Final Inspection	۱۲	$۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۷
Delivery On Site	۷	$۸۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۴
Submitting Vendor Data Book	۵	$۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۹
Fire Safety Sign - Extension of Binak B/C Manifold	۵۶	$۱۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
Tendering & Selection	۳۰	$۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۲
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۷
Manufacturing / Fabrication / Supply	۲۰	$۵۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷
Final Inspection	۱۲	$۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۹
Delivery On Site	۷	$۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۶
Submitting Vendor Data Book	۵	$۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
Electrical	۱۹۰	$۷،۴۳۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
UPS System - Extension of Binak B/C Manifold	۹۸	$۲،۹۸۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۳
Tendering & Selection	۱۵	$۱۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۴
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۱۷۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۹
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۰۰	$۱،۴۹۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
Final Inspection	۷	$۲۹۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
Delivery On Site	۷	$۵۹۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۳
Submitting Vendor Data Book	۵	$۱۴۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۸
Delivering Spare Parts	۵	$۱۴۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۳
LV Switchgear & MCC - Extension of Binak B/C Manifold	۱۰۱	$۱،۱۹۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۴
Tendering & Selection	۱۵	$۴۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۹
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۷۲	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۳
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۰۰	$۵۹۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۰
Final Inspection	۷	$۱۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷
Delivery On Site	۷	$۲۳۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۴

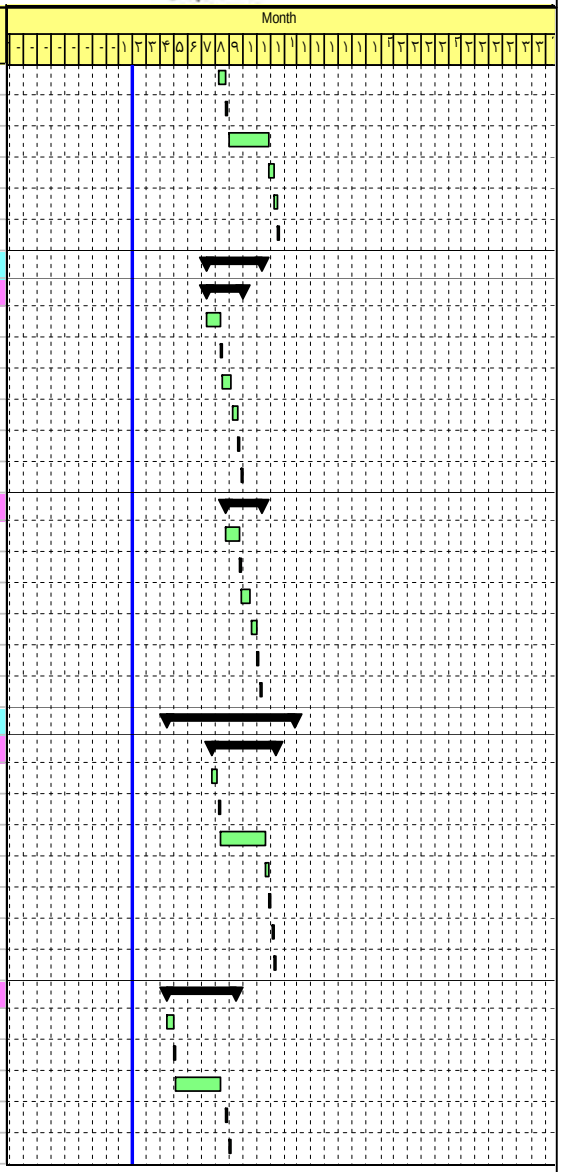

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Submitting Vendor Data Book	۵	$۶۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
Delivering Spare Parts	۵	$۶۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴
DC Charger - Extension of Binak B/C Manifold	۱۰۱	$۱،۹۸۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۴
Tendering & Selection	۱۵	$۷۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۹
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۱۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۳
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۱۰	$۹۹۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۰
Final Inspection	۷	$۱۹۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷
Delivery On Site	۷	$۳۹۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
Submitting Vendor Data Book	۵	$۹۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
Delivering Spare Parts	۵	$۹۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴
Earthing & Lightning System	۱۰۱	$۱۹۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
Tendering & Selection	۱۵	$۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۴
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۹
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۱۰	$۹۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۹
Final Inspection	۷	$۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۶
Delivery On Site	۷	$۴۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۳
Submitting Vendor Data Book	۵	$۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
Delivering Spare Parts	۵	$۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
Power & Control Cables - Extension of Binak B/C Manifold	۶۵	$۳۹۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
Tendering & Selection	۱۵	$۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۶
Manufacturing / Fabrication / Supply	۶۰	$۱۹۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
Final Inspection	۷	$۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
Delivery On Site	۷	$۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۰
Submitting Vendor Data Book	۵	$۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
Tray/Ladder and Accessories - Extension of Binak B/C Manifold	۱۰۲	$۲۷۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
Tendering & Selection	۱۵	$۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
Manufacturing / Fabrication / Supply	۶۰	$۱۳۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
Final Inspection	۷	$۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۹
Delivery On Site	۷	$۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
Submitting Vendor Data Book	۵	$۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
Electrical Bulk Items	۱۰۲	$۴۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
Tendering & Selection	۱۵	$۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۲۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۱۰	$۲۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۲

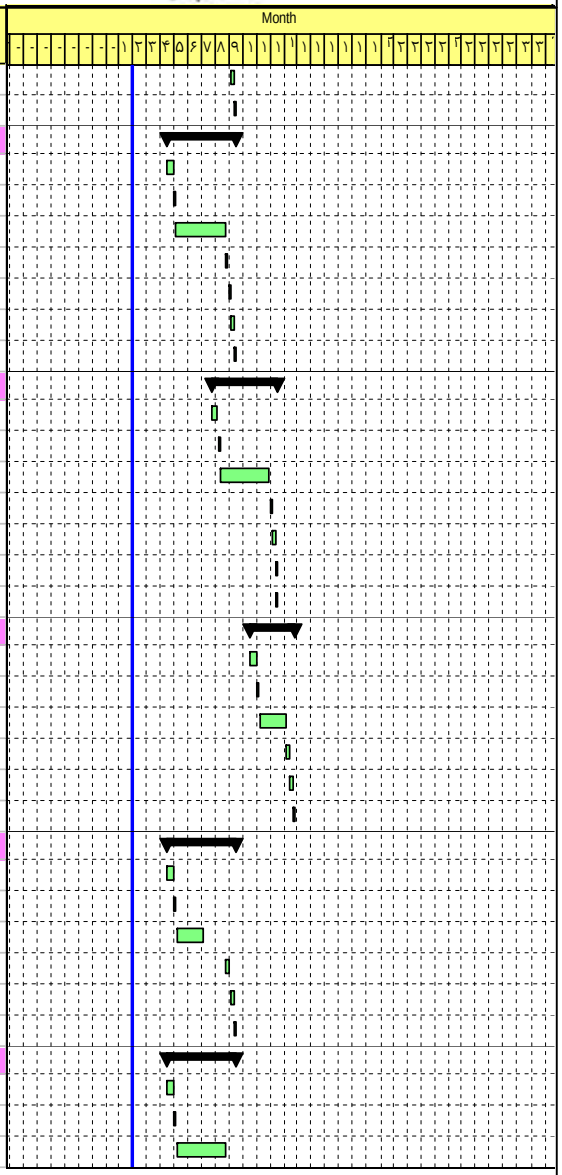

© Primavera Systems, Inc.

HIRGAN ENERGY

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
بسته های کاری سطح الارض

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Final Inspection	۱۲	$۴۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
Delivery On Site	۷	$۱۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
Submitting Vendor Data Book	۵	$۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
Construction	۳۳۸	$۱۴۱،۱۳۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۱
Wellpad and Access Road	۱۰۳	$۱۰۱،۳۳۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
Access Road	۴۶	$۲۰،۲۶۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۹
Wellpad Access Road	۴۶	$۱۶،۲۱۴	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۹
Access Road Preparation W008N	۳۰	$۴،۸۶۴	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۲
Filling and Compaction	۲۰	$۲،۴۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
Sub-Base Layer	۱۰	$۴،۰۵۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۹
Construction of Culvert and Bridge	۴۶	$۴،۸۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۹
bridge	۴۶	$۱،۹۴۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۹
Excavation	۱۵	$۱۹۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۷
lean concrete	۲	$۱۵۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۹
wall	۱۰	$۳۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۹
reinforcement	۱۰	$۳۸۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
form working	۱۰	$۱۹۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
concrete pouring	۵	$۵۸۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۴
protect stone	۱۰	$۳۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۴
Backfill	۵	$۳۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۹
culverts	۱۹	$۲،۹۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۹
pipeway culvert	۷	$۱،۱۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
pipeway	۱۰	$۸۷۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۹
pipeline culvert	۱۰	$۸۷۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۹
Burn Pit Access Road	۲۶	$۴،۰۵۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
ROW Preparation	۲۰	$۲،۲۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۲
Filling and Compaction	۱۰	$۸۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
Sub-Base Layer	۶	$۱،۰۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
Wellpad	۱۰۳	$۸۱،۰۷۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
Water Supply	۱۶	$۵،۶۷۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۷
Water Supply	۲۵	$۵،۶۷۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۷
Burn Pit	۳۳	$۴،۰۵۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۰
Soil Removal, Triming ,Filling and Compaction of Burn Pit Area	۳۰	$۳،۲۴۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۲
Construction & Installation of Support	۱۰	$۲۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۲
Welding, Installation and Testing	۱۰	$۶۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۰
Site Preparation	۲۱	$۲۸،۳۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
Site Preparation W008N	۳۰	$۲۸،۳۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹

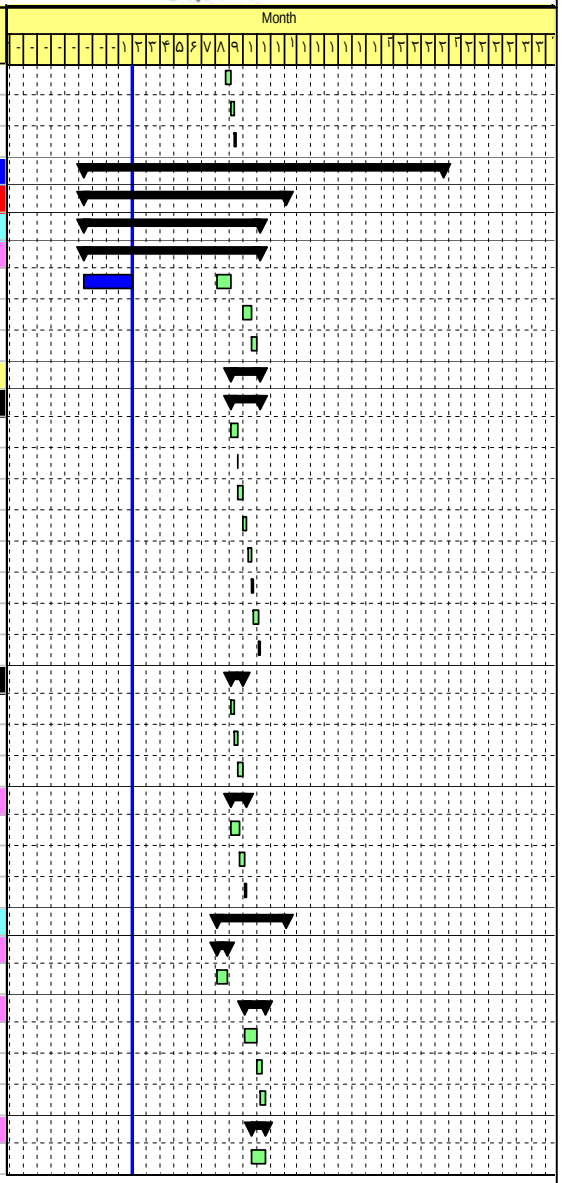

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

HIRGAN ENERGY

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
بسته های کاری سطح الارض

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Civil Work	۲۱	$۲۴،۳۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۲
(Excavation and Soil Removal (Cellar	۱۵	$۱۵،۸۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۴
Installation of Conductor Pipe	۱۰	$۱،۲۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۹
(Form Work (Above Cellar	۹	$۱،۲۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۳
Armed Concrete	۹	$۶،۰۸۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۲
Surface Preparation	۱۳	$۸۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۸
Gravel Paving	۱۹	$۸۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۸
Mud Channel	۳۰	$۴،۸۶۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
Excavation	۱۰	$۴۸۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۴
Soil Removal, Filling and Compaction of Mud Pit Area	۱۵	$۷۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۴
Construction of Mud Pit's Walls	۱۵	$۱،۷۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۹
Installation sealling Layer	۱۰	$۱،۴۵۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۹
Backfill	۷	$۴۸۶	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
Mud Pit	۱۴	$۸،۱۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۹
Soil Removal, Filling and Compaction of Mud Pit Area	۱۵	$۲،۸۳۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
Construction of Mud Pit's Walls	۱۲	$۱،۶۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
Installation sealling Layer	۱۰	$۳،۶۴۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۹
SepticTank	۱۶	$۳،۲۴۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۲
Excavation & Soil Transfer	۴	$۹۷۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۸
Levelling	۳	$۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۱
Tank Supply	۱۹	$۱،۸۴۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
Tank Execution	۳	$۳۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۶
Backfilling & Compaction	۶	$۹۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۲
Gasoil Pad	۱۲	$۱،۶۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۵
Excavation	۵	$۳۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۴
lean concrete	۲	$۴۸۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
Form work	۴	$۱۶۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
Armed Concrete	۵	$۶۴۹	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۵
Wellhead Facility and Flowline	۱۷۵	$۳۵،۲۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۴
Civil	۶۳	$۱۲،۳۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
Right of Way	۱۳	$۹،۲۶۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۹
(Steel Works(Wellhead Facilities	۳۰	$۲،۰۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۰
Construction & Installation of Shelter for Wellhead Control Panel	۱۵	$۶۱۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۴
Well Pad Fencing	۴۵	$۳۷۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
Flowline	۷۴	$۱۴،۸۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴
Fabrication of Pipe Support	۳۰	$۲،۲۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۰

Month

Actual Work | Remaining Work | Critical Remaining Work | Summary | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Installation of Pipe Supports	۳۰	$۲،۲۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۱
Flowline Installation "۶	۵۳	$۹،۶۳۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۹
COLD CUT	۲۶	$۴۸۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۶
Material Handeling	۳۵	$۱،۱۵۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
Fit-Up & Welding	۴۰	$۶،۳۵۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۵
Bending	۱۰	$۱،۰۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۴
NDT	۵	$۶۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۹
Hydrostatic Test	۴	$۷۴۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴
Pigging and Hydrostatic Test "۶	۵	$۷۴۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴
Piping	۲۱	$۴،۲۳۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۶
Sweep Bend Installation	۱۰	$۲۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۳
(…Construction of Spools (Fit up, Welding, NDT	۱۵	$۱،۴۸۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۷
Valves, Fitting and Spools Installation and Hydrotest	۷	$۲،۳۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۴
Painting	۵	$۲۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۶
Instrument Works	۱۵	$۳،۱۷۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۲
Wellhead Control Panel Installation	۱۰	$۱،۷۴۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۲
Devices Installation and Piping Connecton	۱۰	$۱،۴۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۲
Pre-commissioning	۵	$۷۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۴
Pre-commissioning	۷	$۶۳۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۴
(Ready for Comm.Certificate(RFCC	۵	$۷۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۳
Helipad	۲۹	$۲،۳۹۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۴
Excavation & Soil Transfer	۱۰	$۲۴۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۹
Levelling	۵	$۲۸۸	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۴
Lean Concrete	۳	$۳۶۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۷
Reinforced Work	۶	$۳۶۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۴
Form Work	۱۰	$۳۶۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
Main Concrete Pouring	۵	$۴۸۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۹
Backfilling & Compaction	۳	$۲۶۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
Paint Marking	۳	$۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۴
(Job Site HSE Supervision (Surface	۲۳۱	$۲۸۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۸
(Job Site HSE Supervision (Surface	۳۵۰	$۲۸۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۸
Commissioning, Startup & Handover	۶۱	$۱،۸۳۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۱
Commissioning	۲۲	$۵۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۶
Materials & Utilities Ready for Commissioning	۳	$۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۶
Receiving Facilities Ready for Commissioning	۳	$۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۹
Permits Obtained for Commissioning	۱۰	$۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۹

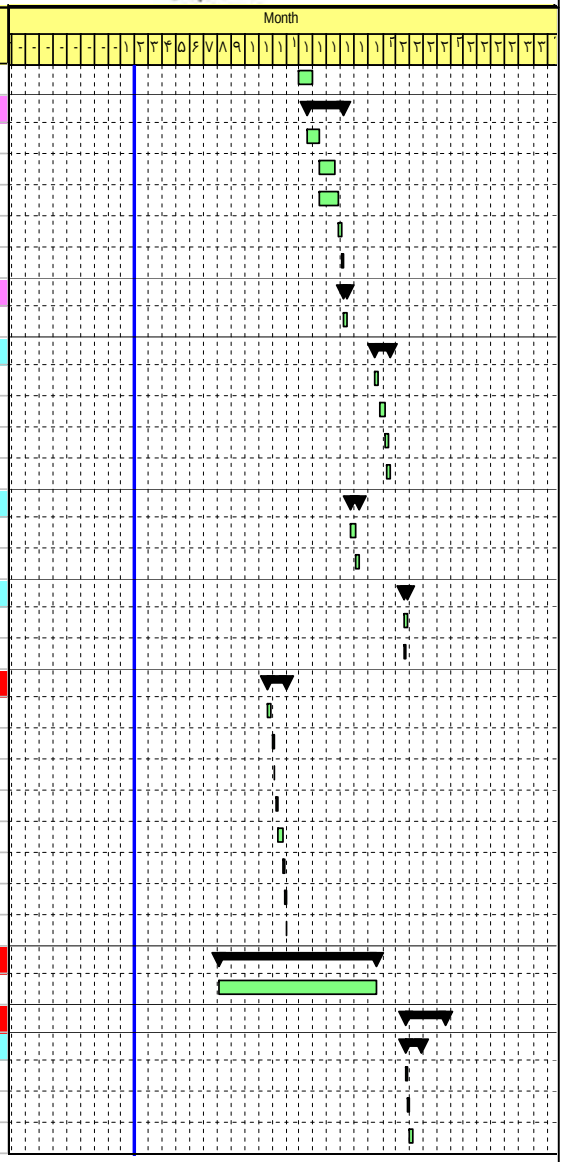

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary

Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Integrated Commissioning	۳	$۴۴۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۱
(Ready for Startup Certificate (RFSU	۱۵	$۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۶
Startup & Performance Test	۱۳	$۷۳۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۴
Startup & Performance Test Run	۳	$۵۸۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۹
(Start of Production (SOP	۱۵	$۱۴۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۴
Handover	۲۶	$۵۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۱
Compiling & Submitting Final Documentation	۲۰	$۱۶۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
Training of Operator's Personnel	۲	$۲۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۶
(Provisional Acceptance Certificate (PAC	۱۵	$۱۶۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۱
(Package 06-New Well # W007S/Manifold Extension (Bangestan	۵۳۱	$۸۴۸،۲۴۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۸
ENGINEERING	۴۸۰	$۲۷،۷۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۵
Basic Design Endorsement	۱۷	$۱،۳۸۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
Endorsement Report For Basic Design & Scope of Work	۳۰	$۱،۳۸۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
Value Engineering	۴۸	$۸۳۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۱
Value Engineering Study Report	۴۴	$۶۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
HAZID Report For WHF & Flowlines	۴۴	$۱۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۱
HAZOP Report For Binak B/C Manifold Extension	۴۴	$۵۹۸	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۱
SIL Report For Binak B/C Manifold Extension	۴۴	$۷۴	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۱
Detail Design	۳۰۶	$۱۵،۲۴۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
Process	۹۳	$۱،۵۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۶
Basis/Criteria	۲۵	$۱۵۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
Process Design Criteria	۳۵	$۵۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱
Process Basis Of Design	۴۰	$۹۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
Description	۲۵	$۱۵۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Process Description - Extension of Binak B/C Manifold	۴۴	$۱۵۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Calculation	۲۸	$۱۵۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Calculation book for (CV,PSV,Pump & Line sizing) - Extension of	۴۴	$۱۵۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Drawing/Diagram	۴۸	$۳۸۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۷
Symbol & Legend For PFD and P&ID	۴۰	$۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
ESD Block Diagram - Extension of Binak B/C Manifold	۴۰	$۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۷
Process Flow Diagram - Extension of Binak B/C Manifold	۴۰	$۶۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
P&ID - Extension of Binak B/C Manifold	۳۰	$۴۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
Cause & Effect Diagram - Extension of Binak B/C Manifold	۴۰	$۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۷
Process Flow Diagram - W007S	۴۰	$۶۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
P&ID for Potable Water Tank - W007S	۳۰	$۳۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
P&ID for Diesel Oil Drum- W007S	۳۰	$۶۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۹
P&ID for Potable Water Tank - W007S	۳۰	$۳۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۹

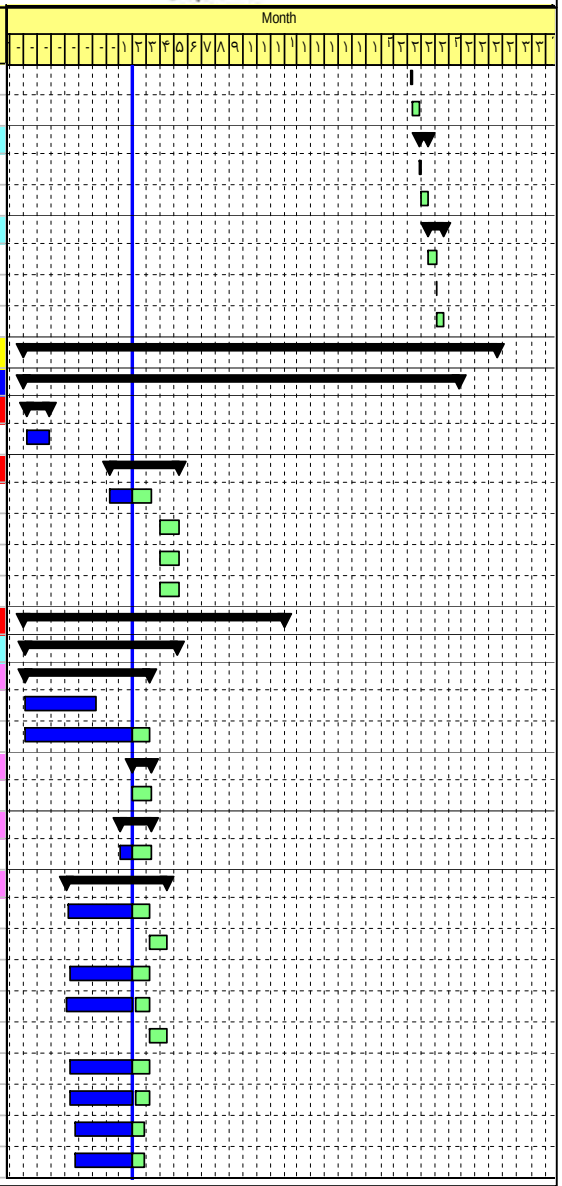

Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Philosophy	۴۷	$۱۵۲	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
Drainage Philosophy	۴۴	$۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
Control Philosophy	۴۴	$۴۲	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
Flare,Blow Down And Relief Philosophy	۴۴	$۴۲	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
Isolation Philosophy	۴۴	$۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
ESD Philosophy	۴۴	$۳۵	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
Data Sheet	۳۹	$۱۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۶
Process Data Sheets For Instrument Devices - W007S & Extensi	۳۶	$۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۳
Process Data Sheets For Fuel Oil Storage Drum of Well Pads	۳۵	$۵۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۶
Process Data Sheets For Potable Water Tank of Well Pads	۳۵	$۵۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۶
List	۷۲	$۱۵۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
Line List - W007S & Manifold Extension	۴۰	$۵۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
Tie-In List - Extension of Binak B/C Manifold	۴۰	$۵۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
Line List - W007S	۴۰	$۴۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
Consumption List	۴۰	$۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Report	۲۹	$۲۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Flowline Hydraulic Calculation Report	۴۴	$۲۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Mechanical	۶۵	$۱۵۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
Basis/Criteria	۳۳	$۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
Mechanical Design Criteria	۵۴	$۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
Specification	۶۴	$۴۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
Specification For Positive Displacement Rotary Pumps	۴۴	$۳۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Specification For Pressure Vessels	۵۴	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
Specification For Atmospheric Above Ground Welded Steel Tanks	۷۹	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
Data Sheets	۴۰	$۷۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۲
Rotary Equipment	۴۰	$۷۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۲
Data Sheets For Fuel Oil Storage Drum of Well Pads	۳۵	$۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Data Sheets For Potable Water Tank of Well Pads	۵۰	$۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۲
Data Sheets For Oil Sump Pump - Extension of Binak B/C Man	۵۰	$۶۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۲
Drawing/Diagram	۲۲	$۲۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۶
Standard Detail Drawing For Pressure Vessels and Heat Exchang	۱۴	$۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۶
Standard Detail Drawing For Storage Tanks	۱۴	$۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۶
HVAC/Plumbing	۲۶۲	$۳۰۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
Basis/Criteria	۴۰	$۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۳
HVAC & Plumbing Design Criteria	۶۴	$۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۳
Specification	۴۲	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
Specification For HVAC Equipment	۶۴	$۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۸

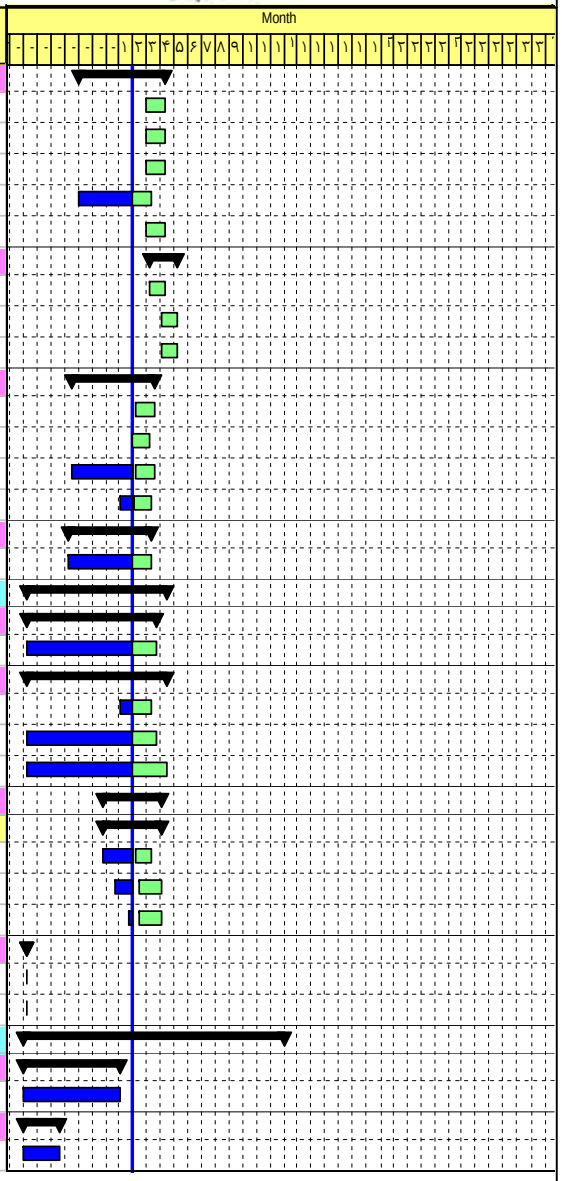

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Specification For Duct Work & Pipe Work	۶۴	$۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
Drawing/Diagram-1	۳۱	$۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۶
Standard Drawing For HVAC & Plumbing	۱۴	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
Symbol & Legend For HVAC & Plumbing	۴۸	$۳	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۶
Calculation	۱۰۵	$۵۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۷
HVAC Calculation Note For Switchgear Building - W007S	۶۲	$۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۲
HVAC Calculation Note For Security Building - W007S	۶۲	$۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۷
Drawing/Diagram	۱۴۹	$۱۷۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۹
HVAC System Layout For Switchgear Building - W007S	۶۲	$۴۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۲
HVAC System Layout For Security Building - W007S	۶۲	$۴۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۹
Plumbing & Sewage Piping Layout For Switchgear Building - W0(	۶۴	$۴۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۴
Plumbing & Sewage Piping Layout For Security Building - W007S	۶۴	$۴۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹
Data Sheets	۴۲	$۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
Data Sheets For Main HVAC Equipment - W007S	۶۴	$۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
MTO	۴	$۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۶
MTO For Building HVAC & Plumbing Systems - W007S	۷	$۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۶
Piping	۲۸۹	$۳,۰۴۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۶
Basis/Criteria	۲۴	$۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
Piping Design Criteria	۳۹	$۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
Specification	۲۸۷	$۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۲
Piping Material Specification	۶۴	$۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۲
Specification For Color Coding and Marking	۳۹	$۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Transportation, Handling, Storage of pipes	۳۹	$۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For the Design of Piping in Mechanical Packages	۳۹	$۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Metallic Pipes	۳۹	$۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Fittings, Flanges, Gaskets and Bolts	۳۹	$۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۶
Specification For Painting	۳۹	$۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۴
(Specification For Lining (Internal Protection of Equipment by Pair	۳۹	$۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Material Requirements in Sour service	۳۹	$۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Manual Valves	۳۹	$۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Plant Piping Systems Pressure Testing	۳۹	$۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Welding of Plant Piping System	۳۹	$۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Flexibility Analysis	۳۹	$۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Coating Of Underground Piping	۳۹	$۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۴
Specification For Pipe Support	۳۹	$۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Piping Construction, Fabrication & Erection	۳۹	$۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷

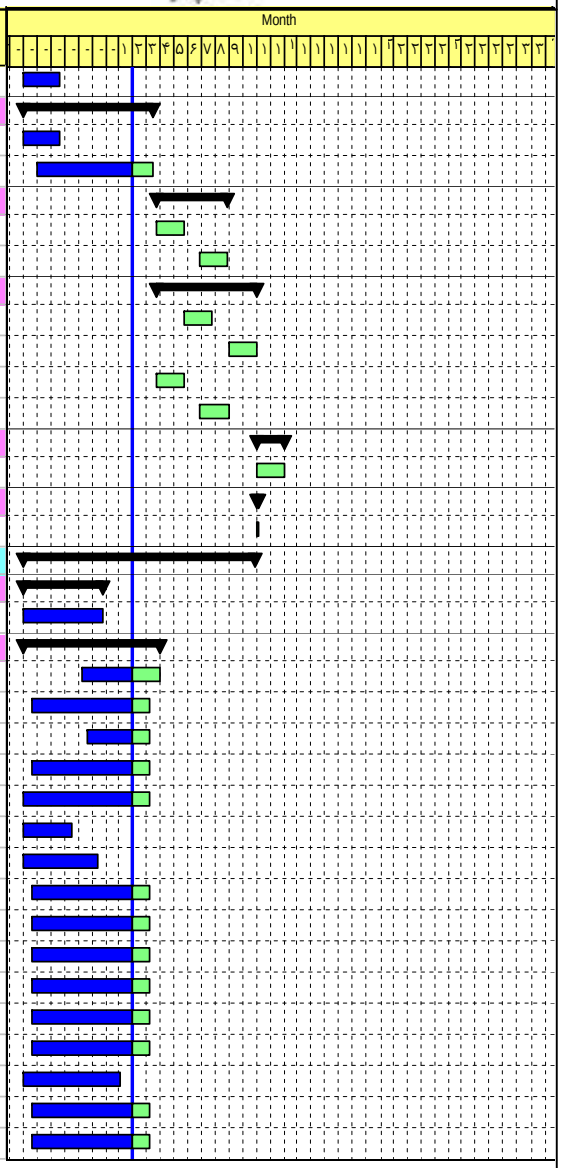

© Primavera Systems, Inc.

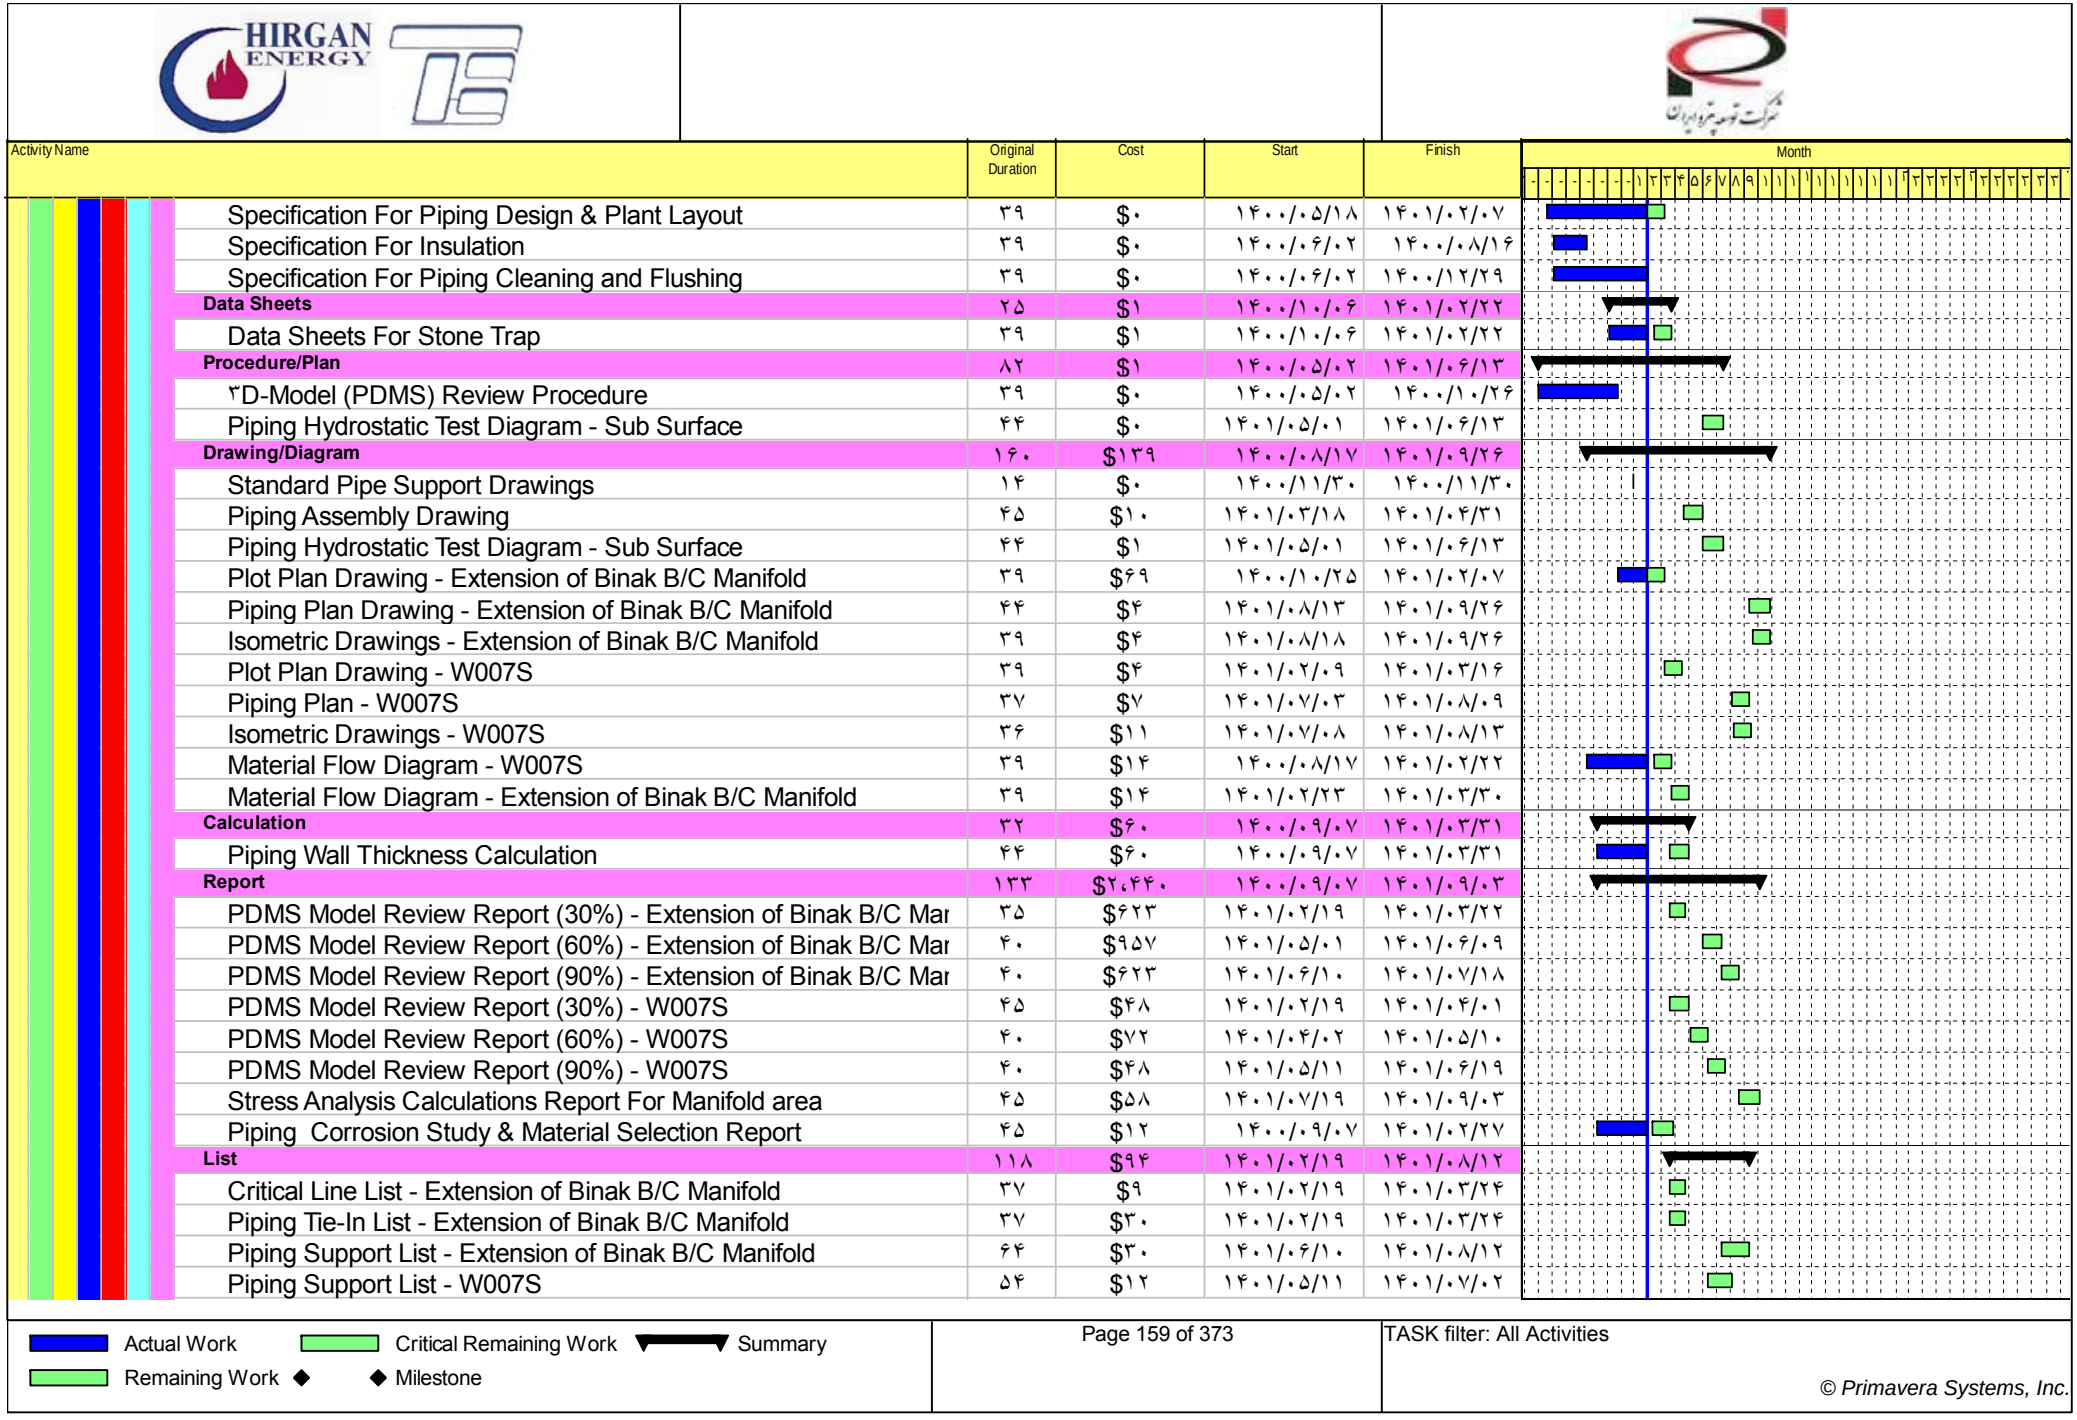

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Specification For Piping Design & Plant Layout	۳۹	$۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Insulation	۳۹	$۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۶
Specification For Piping Cleaning and Flushing	۳۹	$۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
Data Sheets	۲۵	$۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
Data Sheets For Stone Trap	۳۹	$۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
Procedure/Plan	۸۲	$۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۳D-Model (PDMS) Review Procedure	۳۹	$۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
Piping Hydrostatic Test Diagram - Sub Surface	۴۴	$۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
Drawing/Diagram	۱۶۰	$۱۳۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۶
Standard Pipe Support Drawings	۱۴	$۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
Piping Assembly Drawing	۴۵	$۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
Piping Hydrostatic Test Diagram - Sub Surface	۴۴	$۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
Plot Plan Drawing - Extension of Binak B/C Manifold	۳۹	$۶۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Piping Plan Drawing - Extension of Binak B/C Manifold	۴۴	$۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۶
Isometric Drawings - Extension of Binak B/C Manifold	۳۹	$۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۶
Plot Plan Drawing - W007S	۳۹	$۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
Piping Plan - W007S	۳۷	$۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
Isometric Drawings - W007S	۳۶	$۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۳
Material Flow Diagram - W007S	۳۹	$۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
Material Flow Diagram - Extension of Binak B/C Manifold	۳۹	$۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۳۰
Calculation	۳۲	$۶۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
Piping Wall Thickness Calculation	۴۴	$۶۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
Report	۱۳۳	$۲,۴۴۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۳
PDMS Model Review Report (30%) - Extension of Binak B/C Mar	۳۵	$۶۲۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۲
PDMS Model Review Report (60%) - Extension of Binak B/C Mar	۴۰	$۹۵۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۹
PDMS Model Review Report (90%) - Extension of Binak B/C Mar	۴۰	$۶۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۸
PDMS Model Review Report (30%) - W007S	۴۵	$۴۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
PDMS Model Review Report (60%) - W007S	۴۰	$۷۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۰
PDMS Model Review Report (90%) - W007S	۴۰	$۴۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۹
Stress Analysis Calculations Report For Manifold area	۴۵	$۵۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۳
Piping Corrosion Study & Material Selection Report	۴۵	$۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
List	۱۱۸	$۹۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۲
Critical Line List - Extension of Binak B/C Manifold	۳۷	$۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۴
Piping Tie-In List - Extension of Binak B/C Manifold	۳۷	$۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۴
Piping Support List - Extension of Binak B/C Manifold	۶۴	$۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۲
Piping Support List - W007S	۵۴	$۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۲

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Critical Line List - W007S	۳۹	$۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۶
MTO	۲۳	$۳۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۵
MTO For Pipes - Manifold & W007S	۷	$۵۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۶
MTO For Fittings - Manifold & W007S	۷	$۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۵
MTO For Flanges - Manifold & W007S	۷	$۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۵
MTO For Manual Valves - Manifold & W007S	۷	$۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۵
MTO For Gaskets - Manifold & W007S	۷	$۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۵
MTO For Bolt & Nuts - Manifold & W007S	۷	$۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۵
Pipeline & Flow line	۱۱۵	$۴۵۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۳
Basis/Criteria	۲۴	$۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۳
Pipeline Design Criteria	۳۹	$۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۳
Specification	۳۰	$۴۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Specification For Line Pipes	۳۹	$۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۶
Specification For Pipeline Cold Bending	۳۹	$۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Barred Tee	۳۹	$۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Fittings, Flanges, Gaskets and Bolts	۳۹	$۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۶
Specification For Pipeline Valves	۳۹	$۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Pipeline Coating	۳۹	$۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۶
Specification For Pipeline Flushing, Cleaning And Hydrostatic Tes	۳۹	$۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۶
Specification For Welding of Transportation Pipeline	۳۹	$۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Pipeline Stress Analysis	۳۹	$۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Pipeline Insulation Joint	۳۹	$۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۶
Specification For Pipeline Construction	۳۹	$۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Anchor Flanges	۳۹	$۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Pigs	۳۹	$۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Pipeline Material Specification	۴۴	$۳۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Specification For Pipeline Cleaning and Flushing	۳۹	$۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Drawing/Diagram	۵۹	$۲۴۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۳
Pipeline Standard Drawing For Vent Valve Pre-cast Concrete Bo›	۴۴	$۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Pipeline Standard Drawing For Slab Bridge And Set-On-Weight	۴۴	$۶	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Pipeline Standard Drawing For River Crossing	۴۴	$۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Pipeline Standard Support Drawings	۱۴	$۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵
Pipeline Standard Drawing For Line Marker Post and Cathodic Pr	۴۵	$۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۳
Standard Drawing For Above Ground Pipeline Construction R.O.'	۴۴	$۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Standard Drawing For Under Ground Pipeline Construction R.O.'	۴۴	$۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳
Pipeline Standard Drawing For Anchor Support	۴۴	$۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۲

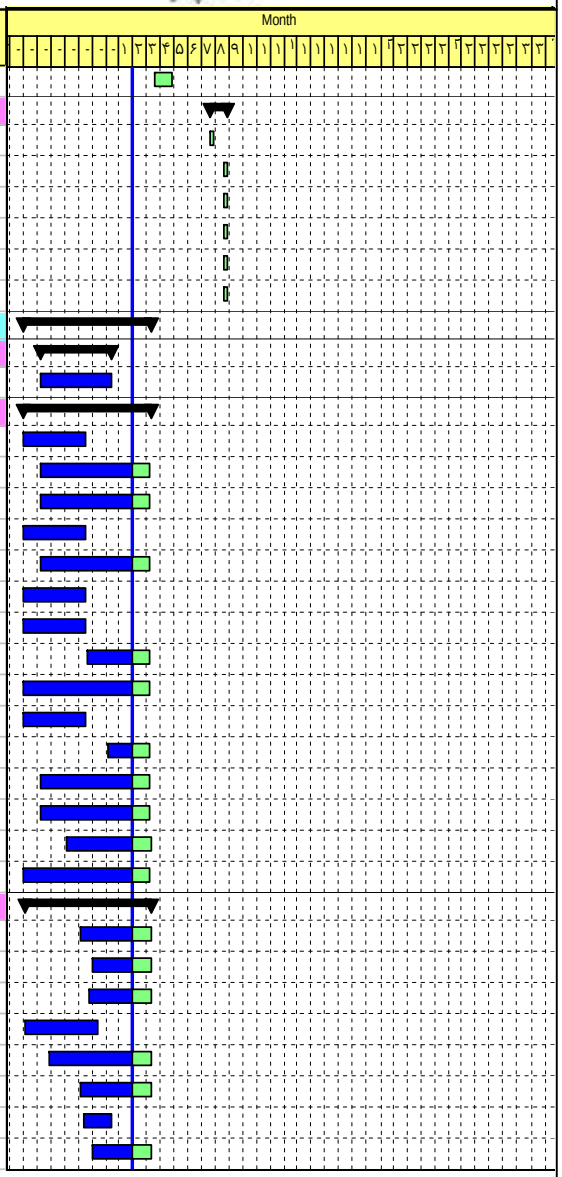

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Standard Drawing For A/G Pipeline Road Crossing	۴۴	$۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Standard Drawing For Existing Pipeline Crossing	۴۴	$۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Pipeline Standard Drawing For Irish Crossing	۴۴	$۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Pipeline Standard Drawing For Water - Way Crossing	۴۴	$۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Pipeline Standard Drawing For Pig Signaller Concrete Pit	۴۴	$۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Pipeline Standard Drawing For H-Pipe Support	۴۴	$۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
Flowline Transversal Drawings - W007S	۴۴	$۱۴۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Pipeline Hydrostatic Test Diagram - Sub Surface	۴۴	$۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Procedure/Plan	۲۵	$۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Pipeline Hydrostatic Test Diagram - Sub Surface	۴۴	$۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Calculation	۲۹	$۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Pipeline Wall Thickness Calculation	۴۴	$۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
List	۲۵	$۴۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Road Crossing Location List	۴۴	$۴۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Report	۲۸	$۷۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Pipeline Corrosion Study & Material Selection Report	۴۴	$۷۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
MTO	۴	$۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
MTO For Line Pipes (Flowlines) - W007S	۷	$۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
Control & Instrumentation	۲۴۸	$۱،۵۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
Basis/Criteria	۲۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
Fire & Gas Detection Design Criteria	۳۸	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۱
Instrument & Control System Design Criteria	۳۸	$۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
Specification	۲۹	$۳۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For WHCP/HPU	۳۸	$۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
Specification For Instrumentation	۳۹	$۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۳
Specification For Control System	۳۹	$۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For ESD System	۳۹	$۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
(Specification For Instrument and Control of Package Unit Systen	۳۹	$۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Control Valves	۳۹	$۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
(Specification For On-off /Shut Down Valves(ESDV/MOV	۳۹	$۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
(Specification For Pressure Safety Valves(PSV	۳۹	$۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۷
Specification For Fire & Gas Sensor and Devices	۳۹	$۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Instrument/F&G Cables	۳۹	$۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Control Panels and System Cabinets	۳۹	$۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Fire & Gas System	۳۹	$۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۵
Specification For LBV	۳۷	$۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۵

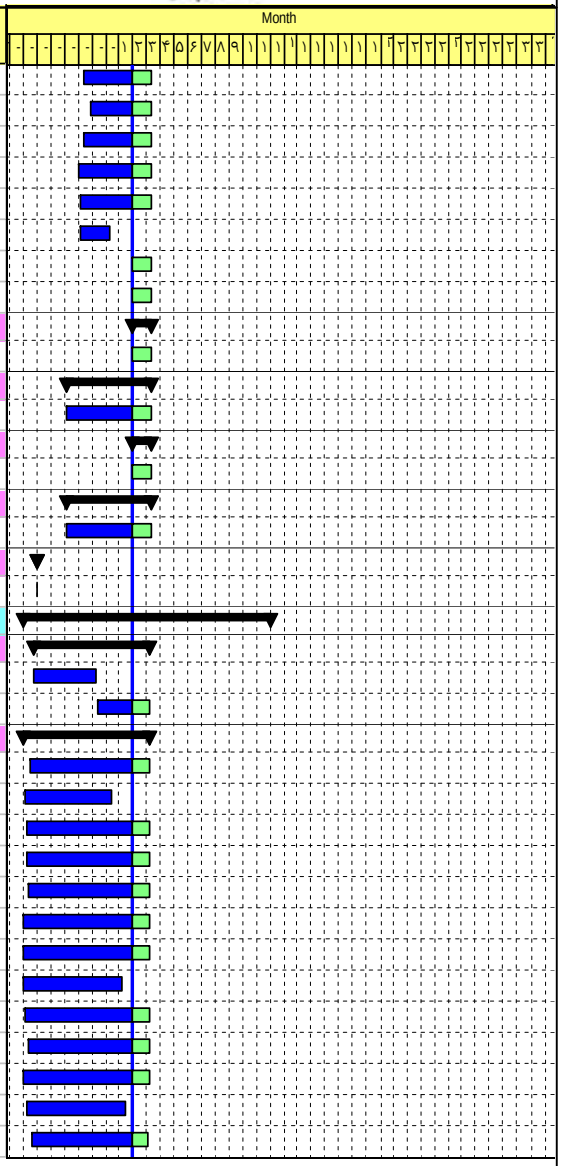

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Data Sheets	۱۱۴	$۳۷۷	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
Data Sheets For WHCP/HPU - Wellheads	۳۵	$۸	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
Data Sheets For Pressure Gauge - Wellheads	۳۵	$۴	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
Data Sheets For Temperature Gauge - Wellheads	۳۵	$۴	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
Data Sheets For Temperature Gauge - Extension of Binak B/C M	۳۵	$۲۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
Data Sheets For Pressure & Diff. Pressure Gauge - Extension of	۳۵	$۲۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
Data Sheets For Pressure Transmitter - Extension of Binak B/C M	۳۵	$۲۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
Data Sheets For Pressure & Safety Relief Valves - Extension of E	۳۵	$۴۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Data Sheets For ON/OFF & Shutdown Valves - Extension of Bina	۳۵	$۴۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
Data Sheets For Control/Regulator valves - Extension of Binak B/	۳۵	$۴۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
Data Sheets For Flow Transmitter/Diff. Pressure Transmitter - Ext	۳۵	$۲۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
Data Sheets For Orifice Plate/Restriction Orifice - Extension of Bi	۳۵	$۴۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Data Sheets For Corrosion Coupon/ Probe - Extension of Binak E	۳۵	$۴۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
Data Sheets For F&G Devices - Extension of Binak B/C Manifold	۳۵	$۴۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
Data Sheets For Pressure Switch and Differential Pressure Switc	۳۵	$۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۳
Data sheet for Level Transmitter - W007S & Manifold	۳۵	$۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۳
Drawing/Diagram	۱۸۳	$۶۷۷	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
Instrument Hook-up Diagram - Wellheads	۴۲	$۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
WHCP Hydraulic \Peneumatic Diagrams - Wellheads	۴۲	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۹
Typical Instrument Installation Drawing - Extension of Binak B/C M	۳۵	$۳۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۸
Block Diagram Configuration For Control/ESD/F&G System - Ex	۳۷	$۲۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۱
Instrument Earthing Typical Diagram - Extension of Binak B/C Ma	۵۵	$۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۱
Instrument Hook-up Diagram - Extension of Binak B/C Manifold	۴۰	$۳۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۷
ESD Level Hierarchy - Extension of Binak B/C Manifold	۳۸	$۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۵
ESD System Loop Diagram - Extension of Binak B/C Manifold	۴۲	$۳۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۹
Control System Loop Diagram - Extension of Binak B/C Manifold	۴۲	$۳۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۹
F&G System Loop Diagram - Extension of Binak B/C Manifold	۴۲	$۳۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۹
Instrument Air Piping and Air Header Diagram - Extension of Bina	۴۰	$۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۸
Instrument & F&G Junction Box Termination Diagram - Extension	۴۲	$۳۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۶
F&G Cause and Effect Diagram - Extension of Binak B/C Manifol	۳۹	$۲۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
Control System Logic Diagram - Extension of Binak B/C Manifold	۴۲	$۳۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۹
ESD Logic Diagram - Extension of Binak B/C Manifold	۴۲	$۳۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۹
Control Room Layout & Arrangement Drawing - Extension of Bina	۳۸	$۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
Control Room Cable Route Layout - Extension of Binak B/C Mani	۴۲	$۳۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
Instrument Location Layout - Extension of Binak B/C Manifold	۴۲	$۳۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰
Instrument/F&G Cable Trench/Route Layout Drawing - Extension	۴۲	$۳۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷

Month

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary

Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
F&G Location Layout - Extension of Binak B/C Manifold	۴۰	$۳۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۷
Instrument Location Layout Drawing - W007S	۳۷	$۲۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
Wiring Diagram; Interposing Relay Panel (IRP) - Extension of Bin	۴۴	$۴۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
List	۲۲۸	$۳۰۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
I/O List For Control System - Extension of Binak B/C Manifold	۴۰	$۱۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
I/O List For ESD Systems - Extension of Binak B/C Manifold	۴۰	$۸۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
I/O List For F&G Systems - Extension of Binak B/C Manifold	۴۰	$۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۶
Panels & Junction Box List - Extension of Binak B/C Manifold	۳۷	$۴۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۲
Set Point & Alarm List - Extension of Binak B/C Manifold	۳۸	$۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۵
I&C Power Consumption Summary - Extension of Binak B/C Mar	۳۸	$۳۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
F&G Detector List - Extension of Binak B/C Manifold	۳۹	$۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
Instrument /F&G Cable List - Extension of Binak B/C Manifold	۴۲	$۵۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷
Instrument Index For New Wells & Manifold Extension	۷	$۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۳
MTO	۸۵	$۱۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۴
MTO for Bulk Item and Installation Accessories - W007S & Manifc	۷	$۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
MTO For Instrument/F&G Cable - W007S & Manifold	۷	$۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۴
MTO For Instrument/F&G Junction box and Gland - W007S & Ma	۷	$۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۹
MTO For Instrument Tube and Fitting - W007S & Manifold	۷	$۲۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۴
MTO For Instrument Cable Tray/Ladder - W007S & Manifold	۷	$۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
Safety	۹۱	$۳۸۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
Basis/Criteria	۲۸	$۳۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۵
Active Fire Protection and Safety Concept	۴۴	$۳۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۵
Specification	۳۰	$۷۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Specification For Fire Fighting Equipment	۴۴	$۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۸
Specification For Hazardous Area Classification	۴۴	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۹
Specification For Fire Water System	۴۴	$۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Specification For Environmental Job	۴۴	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Specification For Total Flooding System	۴۴	$۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۷
Specification For Safety Equipment	۴۴	$۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۵
Specification For passive Fire protection	۴۴	$۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۴
Specification For Safety Signs	۴۴	$۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۹
Drawing/Diagram	۸۲	$۱۵۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۱
Typical Installation Detail for Safety & Fire Fighting Equipment	۱۴	$۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۸
Symbol & Legend For Safety & Firefighting Systems	۴۴	$۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۷
Hazardous Area Classification Layout - Extension of Binak B/C M	۴۴	$۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Safety & Fire Fighting Equipment Location Layout - Extension of E	۴۴	$۲۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۰

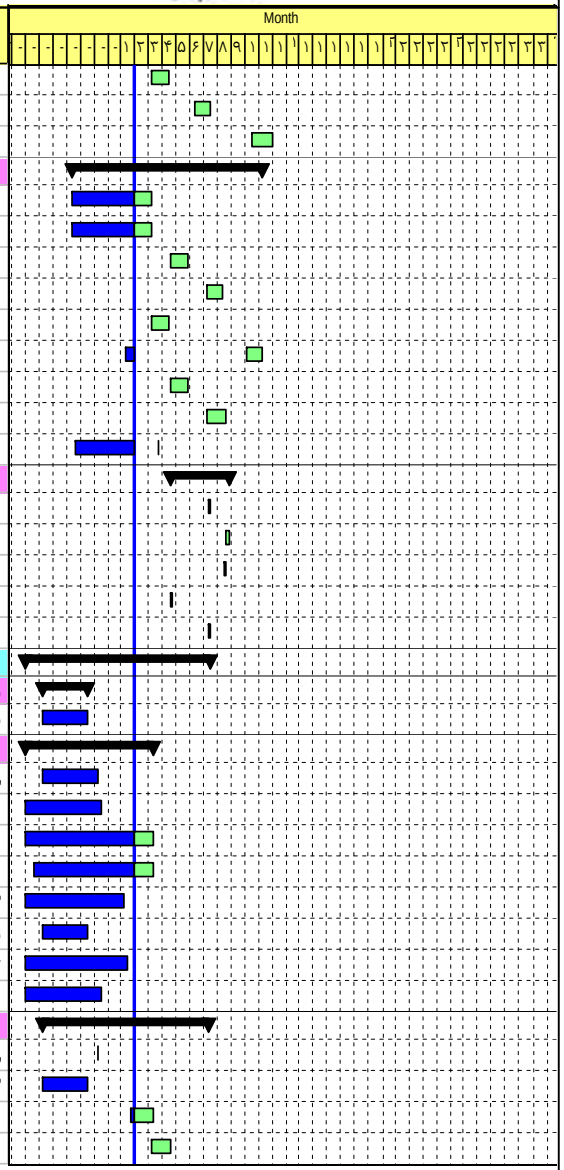

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Escape Route & Safety Sign Layout - Extension of Binak B/C Mai	۴۴	$۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۲
Hazardous Area Classification Layout - W007S	۴۴	$۲۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۵
Safety & Fire Fighting Equipment Location Layout - W007S	۴۴	$۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۹
Escape Route & Safety Sign Layout - W007S	۴۴	$۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۱
Data Sheets	۳۲	$۳۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Material Safety Data Sheets	۴۴	$۲۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Data Sheets For Fire Fighting Equipment	۴۴	$۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۹
Data Sheets For Safety Equipment	۴۴	$۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۹
Data Sheets For Safety Sign	۴۴	$۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۹
List	۴۴	$۳۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Hazard Source List - Extension of Binak B/C Manifold	۴۴	$۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Hazard Source List - W007S	۴۴	$۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
MTO	۳۳	$۳۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
MTO For Fire Fighting & Safety Equipment - Manifold & W007S	۷	$۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۵
MTO For Safety Sign - W007S	۵	$۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
Electrical	۱۷۱	$۱،۵۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۶
Basis/Criteria	۳۳	$۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲
Electrical System Design Criteria	۵۴	$۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲
Specification	۳۵	$۵۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۷
Specification For LV Switchgear & Motor Control Centers	۴۹	$۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Specification For MV Switchgear	۴۹	$۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Specification For UPS System	۴۹	$۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Specification For Transformers	۴۹	$۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۷
Specification For DC Charger	۴۹	$۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۶
Specification For Earthing & Lightning System	۴۹	$۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
Specification For Lighting & Small Power System	۴۹	$۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
Specification For Bulk Materials	۴۹	$۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۶
Specification For Diesel Generator	۴۹	$۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
Specification For LV Induction Motors	۴۹	$۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Specification For Electrical Requirements of Packaged Units	۴۹	$۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
Specification For Capacitor Bank	۴۹	$۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Specification For Distribution & Lighting Panels	۴۹	$۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
Specification For Power & Control Cables	۴۹	$۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Specification For Cathodic Protection System	۴۹	$۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۶
Specification For MV Induction Motors	۴۹	$۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Specification For NGR	۴۹	$۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴

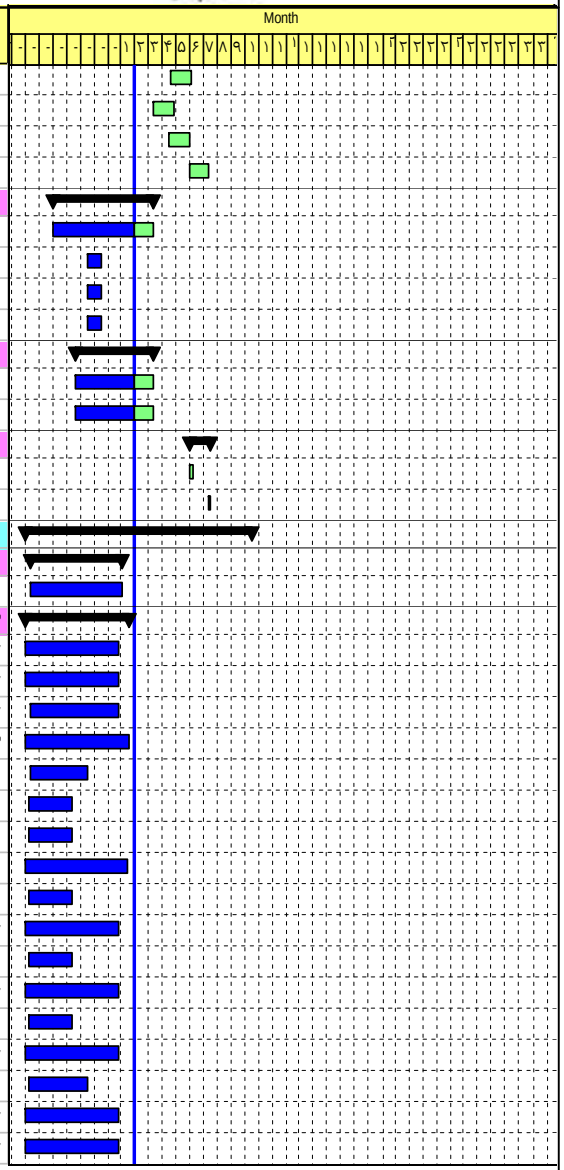

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary

Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Specification For Overhead Transmission Lines	۴۹	$۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Calculation	۱۶۳	$۸۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
Calculation Note For Lighting System of Well Pads Switchgear Bu	۶۴	$۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
Calculation Note For Lighting System of Well Pads Security Buildi	۶۴	$۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
Calculation Note For Lighting System of Well Pads Area	۷۴	$۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۸
Calculation Note For Cable Sizing of Well Pads	۷۴	$۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
Calculation Note For UPS System of Well Pads	۷۴	$۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
Calculation Note For Earthing & Lightning System of Well Pads	۷۴	$۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
Calculation Note For Diesel Generator Sizing of Well Pads	۶۴	$۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۶
Calculation Note For DC Charger of Well Pads	۷۴	$۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
Calculation Note For LV Capacitor Bank of Well Pads	۴۴	$۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
Calculation Note For 11 KV Over Head Line Sag and Tension	۴۴	$۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
Calculation Note For 33 KV Over Head Line Sag and Tension	۴۴	$۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
Drawing/Diagram	۱۷۱	$۸۷۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۶
Electrical Legend and Symbols	۴۵	$۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۷
Typical Installation Details & Notes For Earthing and Lightning Prc	۳۰	$۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۷
Typical Installation Details & Notes For Lighting System	۳۰	$۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۳
Typical Installation Details & Notes For Power System	۳۰	$۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۷
Installation Details & Notes For Cathodic Protection Systems	۶۰	$۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Typical Installation Details For Over Head Line Equipment	۳۰	$۴	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۶
Installation Detail & Notes for Connection OHL to Gantries for We	۴۵	$۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۳
Electrical Typical Schematic Diagrams For LV Panels of Well Pad:	۳۰	$۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۸
Control Logic Diagram For LV Incomers of Well Pads	۶۰	$۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
Earthing Layout For Electrical Tower (Gantry) of Well Pads	۴۰	$۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
Cable Route Layout For Electrical Tower (Gantry) of Well Pads	۵۰	$۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
Overall Single Line Diagram of Well Pads	۵۰	$۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
Single Line Diagram For LV Switchgear of Well Pads	۵۰	$۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
Single Line Diagram For LV Power Distribution Panel of Well Pad	۵۰	$۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
Single Line Diagram For DC Charger of Well Pads	۵۰	$۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۲
Single Line Diagram For Capacitor Banks of Well Pads	۵۰	$۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۲
Interconnection Wiring Diagram of Well Pads	۴۰	$۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۲
Area Lighting & Small Power Layout of Well Pads of Well Pads	۵۰	$۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
Lighting & Small Power Layout For Switchgear Building of Well P:	۴۰	$۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
Lighting & Small Power Layout For Security Building of Well Pads	۴۰	$۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۵
Area Electrical Cable Route & Section Layout of Well Pads	۵۰	$۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
Electrical Cable Route & Section Layout For Switchgear Building	۶۰	$۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۳

Month

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary

Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Electrical Equipment Arrangement Layout For Switchgear Buildinç	۵۰	$۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۰
Earthing & Lightning Layout for well pads	۵۰	$۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۷
Earthing Layout - Extension of Binak B/C Manifold	۵۰	$۷۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۴
LV Switchgear/MCC Expansion SLD - Extension of Binak B/C Ma	۴۰	$۴۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۲
UPS Single Line Diagram - Extension of Binak B/C Manifold	۴۰	$۸۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۳
DC Charger Single Line Diagram - Extension of Binak B/C Manifc	۴۰	$۸۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۳
Interconnection Wiring Diagram - Extension of Binak B/C Manifolc	۴۰	$۱۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۶
Area Electrical Cable Route & Section Layout - Extension of Binal	۴۰	$۸۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
Electrical Equipment Arrangement Layout In Switchgear Building	۴۰	$۸۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۲
Earthing & Lightning Layout - Extension of Binak B/C Manifold	۴۰	$۴۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
۱۱KV Over Head Line Study Report	۳۵	$۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۳۳KV Over Head Line Study Report	۳۵	$۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۱
List	۷۰	$۱۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۶
Electrical Load List of Well Pads	۴۵	$۱۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۳
Electrical Power & Control Cable List of Well Pads	۷۹	$۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۶
Cable Drum Schedule and Cutting List of Well Pads	۷۴	$۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
Electrical Load List - Extension of Binak B/C Manifold	۴۵	$۳۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۳
Electrical Power & Control Cable List - Extension of Binak B/C Ma	۷۴	$۶۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
Data Sheets	۱۴۱	$۶۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۷
Data Sheets For UPS of Well Pads	۴۵	$۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۷
Data Sheets For DC Charger of Well Pads	۴۵	$۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
Data Sheets For Diesel Generator of Well Pads	۴۵	$۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
Data Sheets For LV Capacitor Bank of Well Pads	۴۵	$۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۳
Data Sheets For LV Switchgear of Well Pads	۴۵	$۶	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
Data Sheets For Power & Control Cables of Well Pads	۴۵	$۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۳
Data Sheets For Power Transformers of Well Pads	۴۵	$۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۳
Data Sheets For Distribution & Lighting Panels of Well Pads	۴۵	$۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
Data Sheets For 11 KV Over Head Line Equipment	۴۵	$۱۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
Data Sheets For 33 KV Over Head Line Equipment	۴۵	$۱۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
Report	۷۰	$۱۳۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۸
Electrical Network (Load Flow, Motor Starting & Short Circuit) Stu	۵۴	$۳۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
Relay Coordination & Setting Study Report of Well Pads	۵۴	$۳۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۸
۱۱KV Over Head Line Study Report	۴۴	$۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۳۳KV Over Head Line Study Report	۴۴	$۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۳۰
MTO	۱۲۱	$۱۷۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۳
MTO For Earthing & Lightning Systems - Manifold & W007S	۷	$۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۱

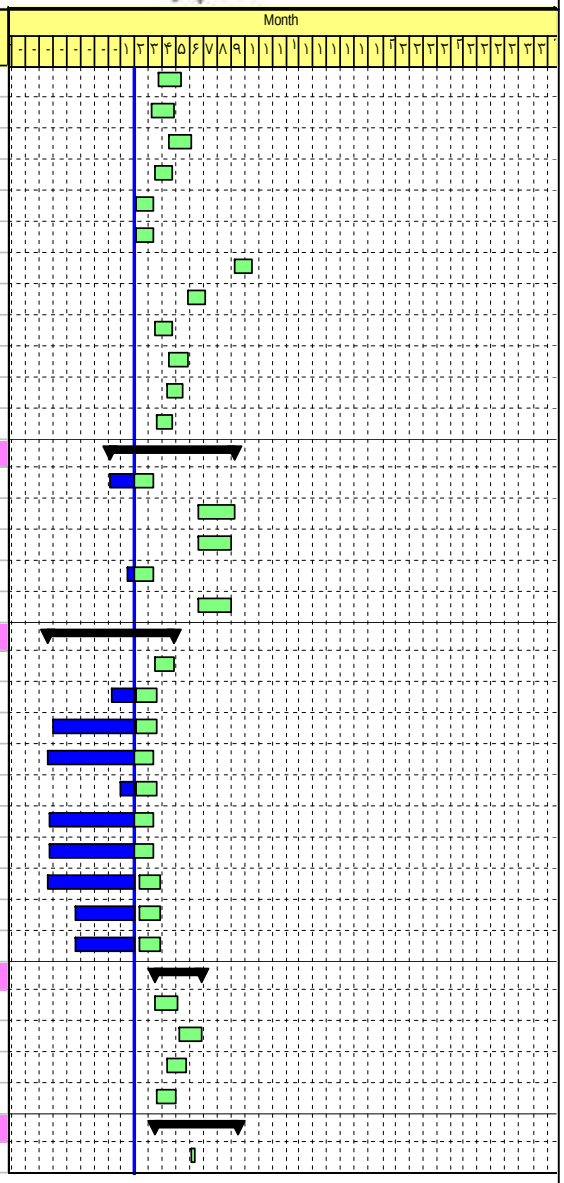

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary

Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
MTO For Lighting & Small Powers - Manifold & W007S	۷	$۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۸
MTO For Power & Control Cables - Manifold & W007S	۷	$۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۳
MTO For Tray/Ladder and Accessories - Manifold & W007S	۷	$۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
MTO For Electrical Bulk Items - Manifold & W007S	۷	$۲۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۰
MTO For Transmission Over Head Line - W007S	۷	$۴۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۰
Architecture	۱۸۱	$۳۸۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
Basis/Criteria	۴۷	$۷۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
Architectural Design Criteria	۷۴	$۷۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
Specification	۲۵	$۹۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Buildings General Specification	۴۴	$۹۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Drawing/Diagram	۱۸۱	$۹۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۷
Architectural Drawing For Diesel Generator Shelter of Well Pads	۲۵	$۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۶
Architectural Drawing For WHCP/HPU Shelter of Well Pads - W0(	۴۴	$۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Architectural Drawing For Switchgear Building of Well Pads - W0(	۴۴	$۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
Architectural Drawing For Security Building of Well Pads - W007S	۴۴	$۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۷
Standard Drawing for Architectural Details	۴۴	$۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
MTO	۵	$۱۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
MTO For Architectural Works - W007S	۷	$۱۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
Civil	۲۸۸	$۱،۳۷۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۴
Basis/Criteria	۵۸	$۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Civil Design Criteria	۶۴	$۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Design Criteria for Sewerage & Drainage	۴۴	$۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Design Criteria for Road and Paving	۴۴	$۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Specification	۵۸	$۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
Specification For Civil Works	۷۹	$۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
Specification For Road & Paving	۶۴	$۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Specification For Fence & Gate	۶۴	$۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۵
Specification For Earth Work	۶۴	$۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Specification For Sewerage & Drainage	۶۴	$۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۱
Specification For Geological & Geotechnical Survey	۴۴	$۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Drawing/Diagram	۱۰۵	$۱،۰۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۱
Standard Drawing For Civil Works	۶۴	$۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Standard Drawing For Slope Protection Details	۶۴	$۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
Standard Drawing For Roads	۶۴	$۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Standard Drawing For Electrical Cable Trench	۶۴	$۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
Standard Drawing For Manholes	۶۴	$۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱

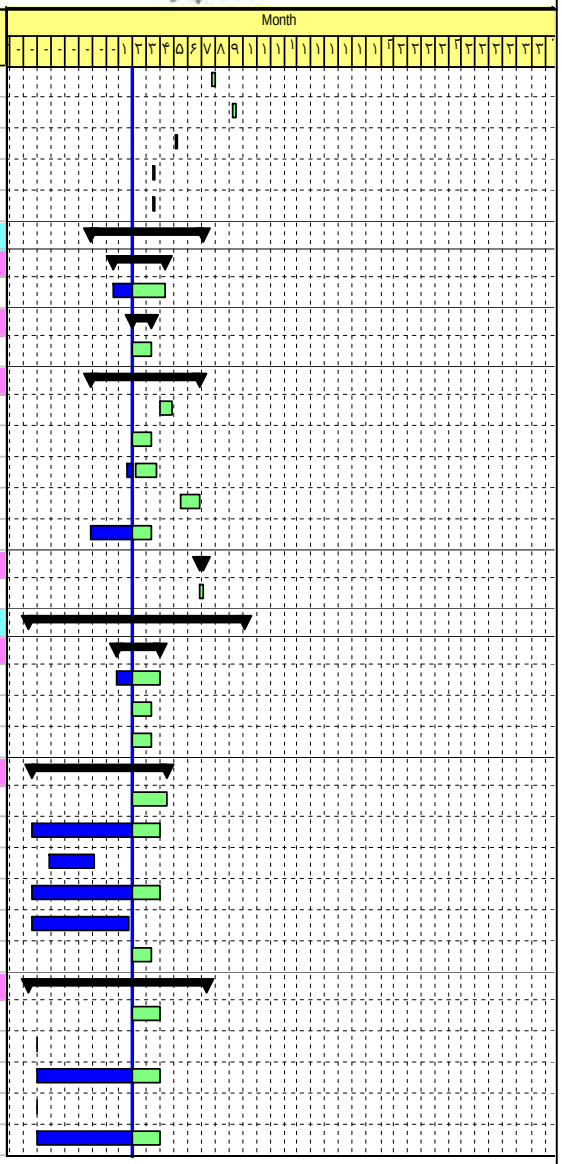

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Standard Drawing For Catch Basins	۶۴	$۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Standard Drawing For Sewerage & Drainage Details	۶۴	$۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Standard Drawing For Civil Underground Crossings	۳۸	$۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
Standard Drawing For Fence & Gate Details	۶۴	$۱۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۹
Standard Drawing For Concrete Continues Weight	۳۸	$۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷
Standard Drawing For Major Floodway Crossing	۳۸	$۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
Standard Drawing For Culvert & Details	۳۸	$۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۴
Standard Drawing For Valve Box	۳۸	$۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۲
Standard Drawing For Fire Hydrant Pit	۳۸	$۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
Standard Drawing For Cable Pull Pit	۶۴	$۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Standard Drawing For Pavings	۳۸	$۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
Standard Drawing For Earth Pit	۳۸	$۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
Standard Detail For Pipe Bedding	۶۴	$۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
Standard Details of Miscellaneous Items	۶۴	$۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
BINAK Oil Field Project Overall Well Location/Facilities Layout	۵۴	$۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
General Civil Layout - W007S	۶۴	$۲۶۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹
Civil and Structural drawings - W007S	۶۴	$۲۶۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۱
Rough Grading Plans -W007S	۵۴	$۲۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۴
Calculation	۱۸۳	$۱۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۴
Calculation Note For Heli Pad, Well Pad & Diesel Storage Pad - \	۳۸	$۶۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۸
Calculation Note For Flood Control	۳۹	$۶۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۴
Report	۳۱	$۸۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
Site Visit Report (Civil Work) - W007S & Manifold Extension	۵۴	$۸۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
MTO	۵	$۱۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۶
MTO For Civil Works - W007S	۷	$۱۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۶
Structure	۱۳۴	$۱،۵۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۵
Basis/Criteria	۳۸	$۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Structural Design Criteria	۶۴	$۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Design Criteria For Steel Structure	۴۴	$۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Design Criteria For Load & Forces	۴۴	$۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Specification	۶۰	$۱۲۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Specification For Concrete Work	۶۴	$۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Specification For Storage Tank Foundation	۳۸	$۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۸
Specification for Fabrication of Steel Structures	۶۴	$۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۹
Specification For Grouting	۶۴	$۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۸
Specification for Erection of Steel Structures	۶۴	$۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۹

Month

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Specification for Fireproofing	۶۴	$۱۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۵
Specification for Design of Blast Resistant Buildings	۶۴	$۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Specification For Steel Structural Works	۳۷	$۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۵
Drawing/Diagram	۱۲۳	$۹۸۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۹
Standard Drawing For Fire Proofing	۶۴	$۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۸
Standard Drawing For Anchor Bolts	۶۴	$۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۳
Standard Drawing For Steel Stairs	۶۴	$۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Standard Drawing For Operating Platform	۳۸	$۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۱
Standard Drawing For Handrail	۳۸	$۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۰
Standard Drawing For Insert Plates in Concrete	۳۸	$۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۴
Standard Details For Ladder & Safety Cage	۶۴	$۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۷
Standard Drawing For Lighting pole foundation Plan & Details	۳۸	$۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
General Notes - Steel Structures	۳۸	$۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۱
General Notes - Reinforced Concrete Structures	۳۸	$۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۷
Standard Drawing For Structural Built-up Sections	۴۴	$۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Standard Drawing For Steel Flooring, Grating and Chequered Pla	۴۴	$۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۳
Concrete Reinforcement Shape Code	۴۴	$۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Standard Drawing For Septic Tank	۴۴	$۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Pipe Supports Foundation Drawing For Extension of Binak B/C M	۶۶	$۷۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۱
Pipe Supports Structure Drawing For Extension of Binak B/C Mar	۶۴	$۷۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹
Access Platforms Structure Plan & Details For Extension of Binak	۶۶	$۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۱
Access Platforms Foundation Drawing For Extension of Binak B/C	۴۴	$۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۰
Fuel Oil Storage Drum Detail Drawing For Well Pads - W007S	۴۴	$۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۱
Foundation Drawing For Security Building For Well Pads - W007S	۴۴	$۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۹
Structural Drawing For Security Building For Well Pads - W007S	۴۴	$۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۹
Foundation Drawing For Switchgear Building For Well Pads - W0	۴۴	$۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۴
Structural Drawing For Switchgear Building For Well Pads - W00	۴۴	$۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۴
Foundation Drawing For Potable Water Tank For Well Pads - W0	۴۴	$۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۱
Foundation Drawing For Diesel Generator Shelter For Well Pads	۴۴	$۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۸
Structural Drawing For Diesel Generator Shelter For Well Pads -	۴۴	$۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۸
Platform Structure Drawing - W007S	۴۴	$۴۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۴
Foundation Drawing For Oil Pump	۴۴	$۵۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۹
Sump Pit Structural Drawing for Oil Pump	۴۴	$۵۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۴
Foundation Drawing For Transmission Line Tower - W007S	۴۴	$۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۷
MTO	۵	$۳۹۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۵
MTO For Structural Works - W007S & Manifold Extension	۷	$۳۹۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۵

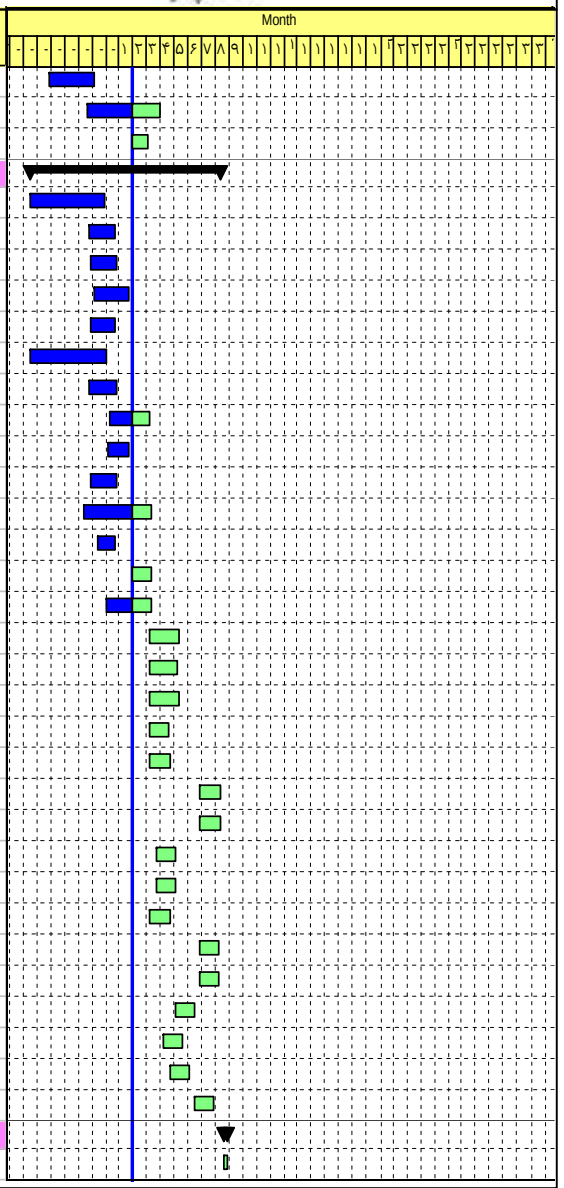

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
General	۹۱	$۳،۰۴۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
Risk Assessment	۲۹	$۱۵۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۶
Procedure/Plan	۲۹	$۱۵۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۶
HAZOP Study Procedure	۴۴	$۵۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۱
HAZID Study Procedure	۴۴	$۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۵
SIL Study Procedure	۴۴	$۸۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۶
Survey (Topography) & Geotechnic	۹۱	$۲،۵۹۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
Geotechnic	۶۴	$۲،۲۸۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Procedure/Plan	۲۸	$۱۸۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۳
Geotechnical Investigation Plan for Well Pads	۴۴	$۱۸۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۳
Report	۲۵	$۲،۱۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Geotechnical Investigation Report - W007S	۴۴	$۲،۱۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Survey	۹۱	$۳۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
Drawing/Diagram	۹۱	$۳۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
Flowline Plan & Profile Drawings - W007S	۴۶	$۱۵۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۴
Over Head Line Plan and Profile - W007S	۳۹	$۱۵۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
QC/QA	۷۳	$۳۰۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲
QC Management	۷۳	$۲۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۲
Project Audit Procedure	۴۴	$۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Specification For Final Data Book (FDB) Requirements	۴۴	$۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Non Conformance Control Procedure	۳۶	$۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۷
Corrective Action Procedure	۳۶	$۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۲
Material Reciving, Storage, Handling Procedure	۳۹	$۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Packing, Marking, Transportation Procedure	۳۹	$۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Criticality Assessment Procedure	۳۹	$۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Project Quality Plan	۴۴	$۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Technical Query Procedure	۴۴	$۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
QC General Document	۴۱	$۳۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
(Quality Control Plan (QCP	۳۹	$۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification for Welding Procedure	۴۴	$۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
(Heat Treatment Procedure (Pre Heating , PWHT	۴۴	$۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Welder Performance Qualification Test (WQT) Procedure	۴۴	$۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
NDT Procedure	۴۴	$۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Surface Preparation and Coating/Painting Procedure	۴۴	$۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Control of Inspection Measuring and Test Equipment Procedure	۴۴	$۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
QC Discipline Document	۵۴	$۲۴۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Piping	۲۵	$۶۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲

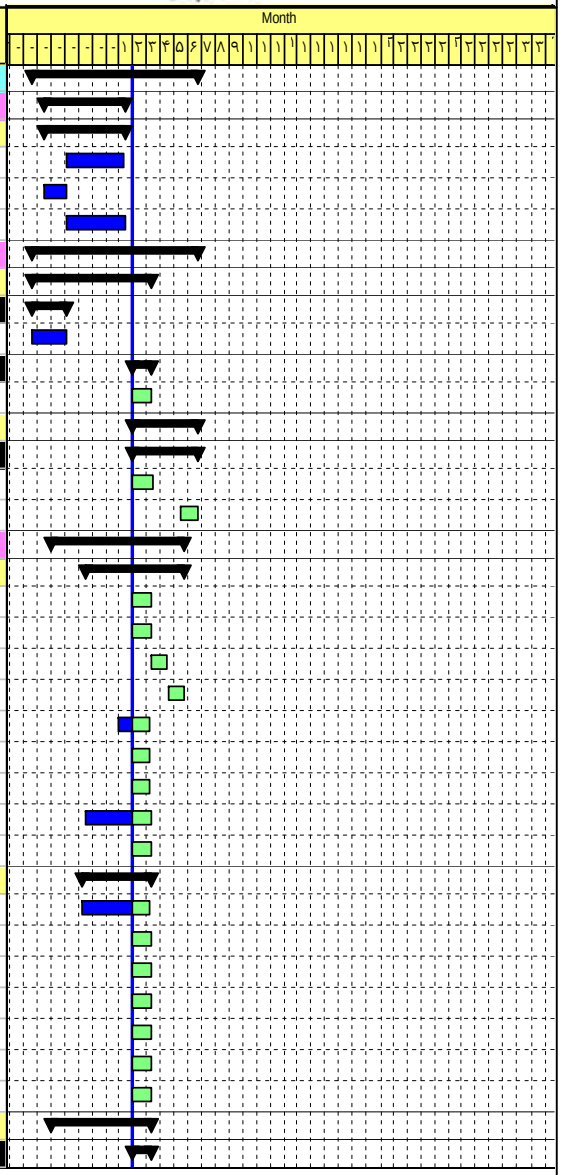

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
ITP For Piping Works	۴۴	$۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
(PIPING PWPS (Preliminary Welding Procedure Specificatio	۴۴	$۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
(PIPING WPS (Welding Procedure Specification	۴۴	$۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
(PIPING PQR (Procedure Qualification Record	۴۴	$۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
PIPING PWPS (Preliminary Welding Procedure Specificatior	۴۴	$۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
PIPING WPS (Preliminary Welding Procedure Specification)	۴۴	$۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
PIPING PQR (Procedure Qualification Record) for Repair W	۴۴	$۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Field Joint Coating Procedure For Pipeline	۴۴	$۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Pressure Test Procedure	۴۴	$۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
.Telecomm	۲۵	$۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
ITP For Telecommunication Installation	۴۴	$۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Safety	۲۵	$۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
ITP For Safety Installation	۴۴	$۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Architectural	۲۵	$۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
ITP For Architectural Works	۴۴	$۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Mechanical	۲۵	$۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
ITP For Mechanical Installation	۴۴	$۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Structure	۲۵	$۴۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
ITP For Steel Structural Works	۴۴	$۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
(Steel Structure WPS (Welding Procedure Specification	۴۴	$۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
(Steel Structure PQR (Procedure Qualification Record	۴۴	$۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Steel Structure WPS (Welding Procedure Specification) For I	۴۴	$۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Steel Structure PQR (Procedure Qualification Record) For R	۴۴	$۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Weld Map For Steel Structures	۴۴	$۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
NDT Plan For steel Structures	۴۴	$۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Instrumentation	۲۵	$۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
ITP For I&C Installation	۴۴	$۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Pipeline	۵۴	$۴۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
ITP For Pipeline	۴۴	$۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
(PIPELINE PWPS (Preliminary Welding Procedure Specifica	۴۴	$۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
(PIPELINE WPS (Welding Procedure Specification	۴۴	$۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
(PIPELINE PQR (Procedure Qualification Record	۴۴	$۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
PIPELINE PWPS (Preliminary Welding Procedure Specificat	۴۴	$۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
PIPELINE WPS (Preliminary Welding Procedure Specificatio	۴۴	$۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
PIPELINE PQR (Procedure Qualification Record) for Repair	۴۴	$۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Civil	۲۸	$۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۱

Month

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary

Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
ITP For Civil Works	۴۴	$۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۱
Electrical	۲۵	$۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
ITP For Electrical Installation	۴۴	$۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Procurement Engineering	۲۶۹	$۲،۷۷۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۲
Mechanical	۱۰۶	$۳۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۲
Potable Tank	۶۹	$۱۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۲
PMR For Potable Tanks - W007S	۱۵	$۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
TBE For Potable Tanks - W007S	۳۰	$۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۲
VDR For Potable Tanks - W007S	۷	$۸۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۲
Pump	۲۱	$۹۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۳
PMR For Pumps - Extension of Binak B/C Manifold	۱۰	$۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
TBE For Pumps - Extension of Binak B/C Manifold	۲۰	$۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۸
VDR For Pumps - Extension of Binak B/C Manifold	۷	$۶۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۳
Drum	۶۹	$۱۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۲
PMR For Drums - W007S	۱۰	$۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۶
TBE For Drums - W007S	۳۰	$۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۲
VDR For Drums - W007S	۷	$۸۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۲
HVAC	۴۷	$۱۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۲
Main HVAC Equipment	۴۷	$۱۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۲
PMR For Main HVAC Equipment - W007S	۱۰	$۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
TBE For Main HVAC Equipment - W007S	۳۰	$۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۱
VDR For Main HVAC Equipment - W007S	۷	$۸۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۲
Piping	۱۵۳	$۲۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۵
Pipes	۴۱	$۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۵
PMR For Pipes - W007S	۵	$۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
TBE For Pipes - W007S	۱۰	$۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۲
VDR For Pipes - W007S	۷	$۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۵
Stone Trap	۳۹	$۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۹
PMR For Stone Trap - W007S	۷	$۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۹
TBE For Stone Trap - W007S	۱۰	$۴	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۸
VDR For Stone Trap - W007S	۷	$۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۹
Bolt & Nuts	۴۲	$۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۴
PMR For Bolt/Nuts - W007S	۷	$۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۲
TBE For Bolt/Nuts - W007S	۱۰	$۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۲
VDR For Bolt/Nuts - W007S	۷	$۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۴
Flanges	۴۲	$۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۵
PMR For Flanges - W007S	۷	$۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۲

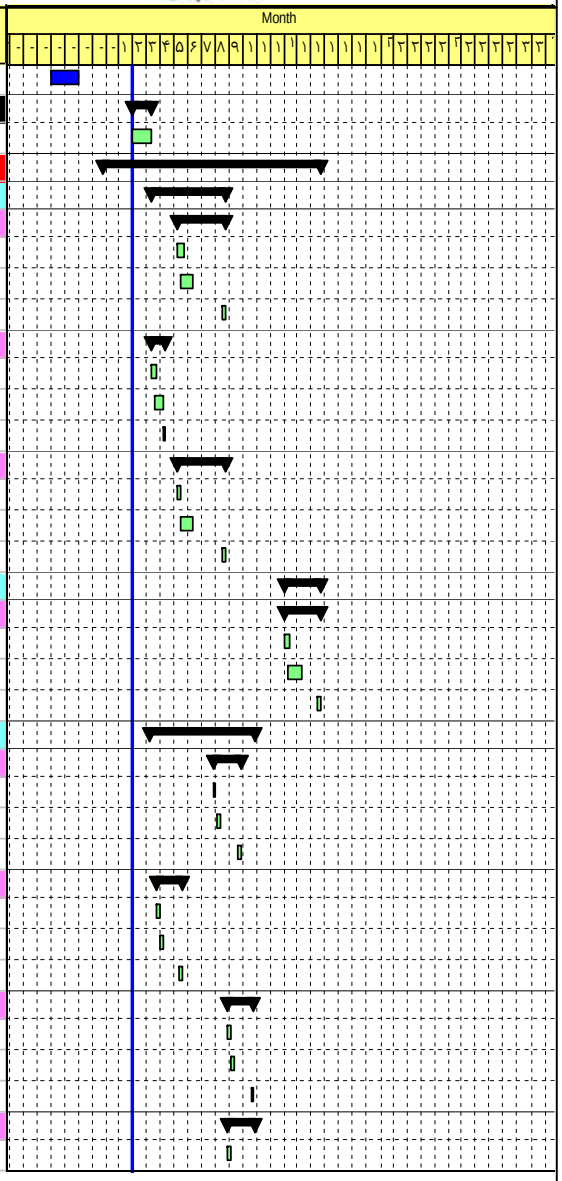

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
TBE For Flanges - W007S	۱۰	$۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۲
VDR For Flanges - W007S	۷	$۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۵
Sampling Connection	۳۸	$۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
PMR For Sampling Connection Set - W007S	۷	$۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۵
TBE For Sampling Connection - W007S	۱۰	$۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۵
VDR For Sampling Connection - W007S	۷	$۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
Manual Valves	۳۵	$۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۴
PMR For Manual Valves - W007S	۷	$۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۲
TBE For Manual Valves - W007S	۱۰	$۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۲
VDR For Manual Valves - W007S	۷	$۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۴
Gaskets	۴۲	$۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۵
PMR For Gaskets - W007S	۷	$۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۲
TBE For Gaskets - W007S	۱۰	$۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۲
VDR For Gaskets - W007S	۷	$۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۵
Fittings	۴۲	$۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۵
PMR For Fittings - W007S	۷	$۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۲
TBE For Fitting - W007S	۱۰	$۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۲
VDR For Fitting - W007S	۷	$۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۵
Pipe Support	۳۶	$۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۶
PMR For Pipe Support - W007S	۵	$۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۷
TBE For Pipe Support - W007S	۵	$۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۴
VDR For Pipe Support - W007S	۷	$۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۶
Pipeline	۶۹	$۳۳	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۰
Line Pipe	۴۴	$۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۰
PMR For Line Pipes - W007S	۱۰	$۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۹
TBE For Line Pipes - W007S	۳۰	$۲	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
VDR For Line Pipes - W007S	۷	$۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۰
Flow Line Support	۳۰	$۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۰
PMR For Flowline Support - W007S	۵	$۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۴
TBE For Flowline Support - W007S	۵	$۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۱
VDR For Flowline Support - W007S	۷	$۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۰
Control & Instrumentation	۱۷۲	$۱,۰۶۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
Instrument Tube and Fitting	۶۲	$۴۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۵
PMR For Instrument Tube and Fitting - Manifold & W007S	۱۰	$۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳
TBE/TBA For Instrument Tube and Fitting - Manifold & W007S	۱۵	$۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
VDR/TBA For Instrument Tube and Fitting - Manifold & W007S	۷	$۳۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۵
Instrument Cable Tray	۶۲	$۴۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۹

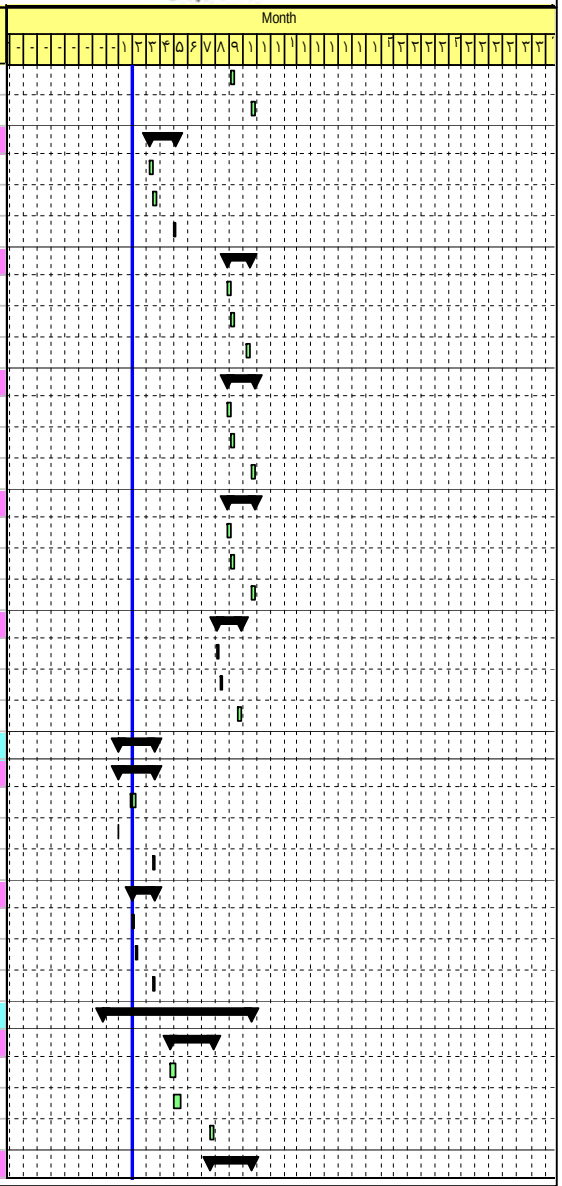

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
PMR For Instrument Cable Tray/Ladder - Manifold & W007S	۱۰	$۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۶
TBE/TBA For Instrument Cable Tray/Ladder - Manifold & W007S	۱۵	$۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۷
VDR/TBA For Instrument Cable Tray/Ladder - Manifold & W007S	۷	$۳۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
Differential Pressure/Pressure Gauge	۱۴۸	$۴۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۵
PMR For Differential Pressure/Pressure Gauge - Manifold & W0(	۱۰	$۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
TBE/TBA For Differential Pressure/Pressure Gauge - Manifold &	۱۵	$۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۹
VDR/TBA For Differential Pressure/Pressure Gauge - Manifold &	۷	$۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۵
Instrument/F&G Junction box and Gland	۲۱	$۴۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۸
PMR For Instrument/F&G Junction box and Gland - Extension of	۱۰	$۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹
TBE/TBA For Instrument/F&G Junction box and Gland - Extensio	۱۵	$۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
VDR/TBA For Instrument/F&G Junction box and Gland - Extensic	۷	$۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۸
Instrument Installation Accessories	۱۶	$۴۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۴
PMR For Bulk Item and Installation Accessories - Extension of Bir	۱۰	$۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۶
TBE/TBA For Bulk Item and Installation Accessories - Extension c	۱۵	$۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۷
VDR/TBA For Bulk Item and Installation Accessories - Extension (	۷	$۳۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۴
Temperature Gauge	۱۲۱	$۴۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۹
PMR For Temperature Gauge - Manifold & W007S	۱۰	$۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
TBE/TBA For Temperature Gauge - Manifold & W007S	۱۵	$۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۹
VDR/TBA For Temperature Gauge - Manifold & W007S	۷	$۳۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۹
Pressure Transmitter	۹۰	$۴۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
PMR For Pressure Transmitter/Pressure Switch - Extension of Bi	۱۰	$۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
TBE/TBA For Pressure Transmitter/Pressure Switch - Extension (	۱۵	$۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۴
VDR/TBA For Pressure Transmitter/Pressure Switch - Extension	۷	$۳۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
Flow Transmitter/ Diff. Pressure Transmitter - Extension of Binak B/C Manifold	۹۴	$۴۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۶
PMR For Flow Transmitter/ Diff. Pressure Transmitter - Extension	۱۰	$۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
TBE/TBA For Flow Transmitter/ Diff. Pressure Transmitter - Exter	۱۵	$۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۹
VDR/TBA For Flow Transmitter/ Diff. Pressure Transmitter - Exte	۷	$۳۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۶
Corrosion Coupon/Probe	۲۲	$۴۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۰
PMR For Corrosion Coupon/Probe - Extension of Binak B/C Man	۱۰	$۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
TBE/TBA For Corrosion Coupon/Probe - Extension of Binak B/C	۱۵	$۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰
VDR/TBA For Corrosion Coupon/Probe - Extension of Binak B/C	۷	$۳۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۰
Instrument/F&G Cable	۲۱	$۴۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
PMR For Instrument/F&G Cable - Extension of Binak B/C Manifo	۱۰	$۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
TBE/TBA For Instrument/F&G Cable - Extension of Binak B/C Ma	۱۵	$۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
VDR/TBA For Instrument/F&G Cable - Extension of Binak B/C M	۷	$۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
Orifice and Restriction Orifice Plate	۲۰	$۴۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۰

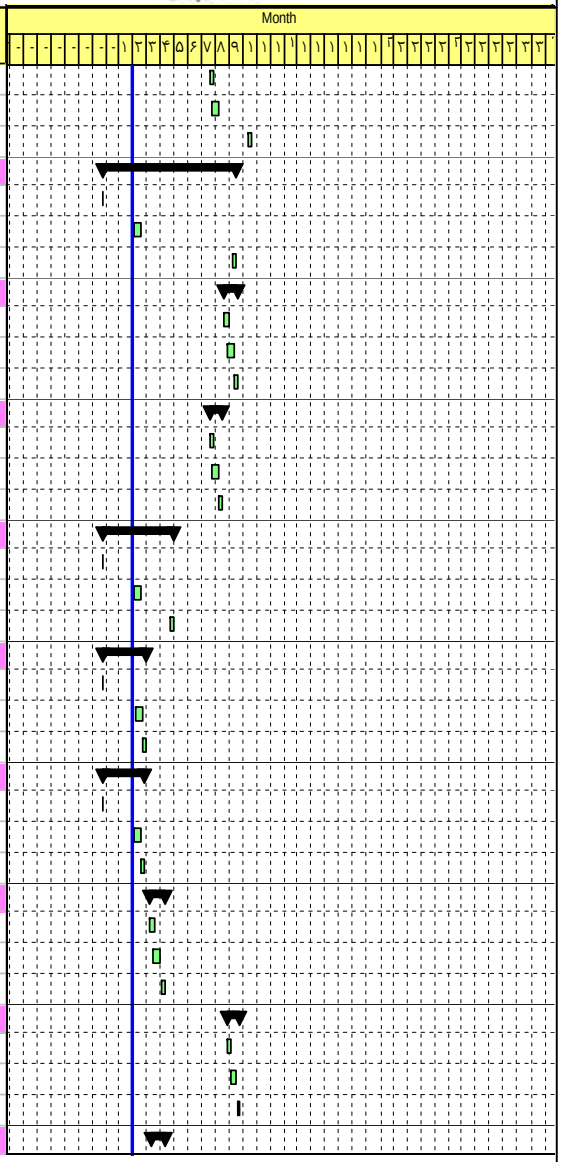

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
PMR For Orifice and Restriction Orifice Plate - Extension of Binak	۱۰	$۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
TBE/TBA For Orifice and Restriction Orifice Plate - Extension of E	۱۵	$۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۳
VDR/TBA For Orifice and Restriction Orifice Plate - Extension of I	۷	$۳۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۰
Control Valves	۱۰۸	$۶۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۵
PMR For Control Valves - Extension of Binak B/C Manifold	۱۰	$۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
TBE/TBA For Control Valves - Extension of Binak B/C Manifold	۱۵	$۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
VDR/TBA For Control Valves - Extension of Binak B/C Manifold	۷	$۵۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۵
(Pressure Safety Valves (PSV	۲۰	$۶۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۰
PMR For Pressure Safety Valves (PSV) - Extension of Binak B/C	۱۰	$۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
TBE/TBA For Pressure Safety Valves (PSV) - Extension of Binak	۱۵	$۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۳
VDR/TBA For Pressure Safety Valves (PSV) - Extension of Binak	۷	$۵۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۰
F&G Devices	۱۸	$۶۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۹
PMR For F&G Detector - Extension of Binak B/C Manifold	۱۰	$۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
TBE/TBA For F&G Detector - Extension of Binak B/C Manifold	۱۵	$۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۲
VDR/TBA For F&G Detector - Extension of Binak B/C Manifold	۷	$۵۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۹
Control System/Console/Furniture	۳۵	$۸۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
PMR For Control System/Console/Furniture - Extension of Binak	۱۰	$۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
TBE/TBA For Control System/Console/Furniture - Extension of Bi	۱۵	$۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰
VDR/TBA For Control System/Console/Furniture - Extension of B	۷	$۶۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ON/OFF & Shutdown Valves	۴۱	$۶۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۰
PMR For ON/OFF & Shutdown Valves - Extension of Binak B/C I	۱۰	$۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
TBE/TBA For ON/OFF & Shutdown Valves - Extension of Binak E	۱۵	$۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰
VDR/TBA For ON/OFF & Shutdown Valves - Extension of Binak	۷	$۵۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۰
ESD System	۴۶	$۸۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
PMR For ESD System - Extension of Binak B/C Manifold	۱۰	$۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
TBE/TBA For ESD System - Extension of Binak B/C Manifold	۳۰	$۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۴
VDR/TBA For ESD System - Extension of Binak B/C Manifold	۷	$۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
F&G System	۴۶	$۸۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
PMR For F&G System - Extension of Binak B/C Manifold	۱۰	$۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
TBE/TBA For F&G System - Extension of Binak B/C Manifold	۳۰	$۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۴
VDR/TBA For F&G System - Extension of Binak B/C Manifold	۷	$۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
Level Transmitter	۷۱	$۴۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۹
PMR For Level Transmitter - W007S & Manifold	۱۰	$۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۳
TBE For Level Transmitter - W007S & Manifold	۳۰	$۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۹
VDR For Level Transmitter - W007S & Manifold	۷	$۳۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۹
Safety & Fire Fighting	۷۹	$۱۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۴
Fire Fighting and Safety Equipment	۴۹	$۹۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۲

Month

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary

Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
PMR For Fire Fighting and Safety Equipment - Manifold & W007S	۱۰	$۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۵
TBE For Fire Fighting and Safety Equipment - Manifold & W007S	۳۰	$۱۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۱
VDR For Fire Fighting and Safety Equipment - Manifold & W007S	۷	$۷۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۲
Safety Sign	۵۱	$۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۴
PMR For Fire Safety Sign - Manifold & W007S	۱۰	$۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۶
TBE For Fire Safety Sign - Manifold & W007S	۳۰	$۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۲
VDR For Fire Safety Sign - Manifold & W007S	۷	$۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۴
Electrical	۱۶۴	$۷۶۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۸
Tray/Ladder and Accessories	۴۱	$۵۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۰
PMR For Tray/Ladder and Accessories - Manifold & W007S	۱۰	$۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸
TBE For Tray/Ladder and Accessories - Manifold & W007S	۱۵	$۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
VDR For Tray/Ladder and Accessories - Manifold & W007S	۷	$۴۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۰
DC Charger	۴۱	$۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
PMR For DC Charger - Manifold & W007S	۱۰	$۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
TBE For DC Charger - Manifold & W007S	۱۵	$۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۹
VDR For DC Charger - Manifold & W007S	۷	$۴۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
Earthing & Lightning System	۶۳	$۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۶
PMR For Earthing & Lightning System - Manifold & W007S	۱۰	$۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
TBE For Earthing & Lightning System - Manifold & W007S	۱۵	$۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۵
VDR For Earthing & Lightning System - Manifold & W007S	۷	$۴۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۶
UPS System	۸۴	$۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۱
PMR For UPS System - Manifold & W007S	۱۰	$۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۹
TBE For UPS System - Manifold & W007S	۱۵	$۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۰
VDR For UPS System - Manifold & W007S	۷	$۴۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۱
Transmission Over Head Line Equipment	۶۰	$۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۱
PMR For Transmission Over head Line Equipment - W007S	۱۰	$۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۰
TBE For Transmission Over head Line Equipment - W007S	۱۵	$۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
VDR For Transmission Over head Line Equipment - W007S	۷	$۴۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۱
Lighting and Small Power Equipment	۶۴	$۵۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
PMR For Lighting and Small Power Equipment - W007S	۱۰	$۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۷
TBE For Lighting and Small Power Equipment - W007S	۱۵	$۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۹
VDR For Lighting and Small Power Equipment - W007S	۷	$۴۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
Capacitor Bank	۴۲	$۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
PMR For Capacitor Bank - W007S	۱۰	$۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۶
TBE For Capacitor Bank - W007S	۱۵	$۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۸
VDR For Capacitor Bank - W007S	۸	$۴۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
Lighting & Distribution Main Panels	۶۰	$۵۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۱

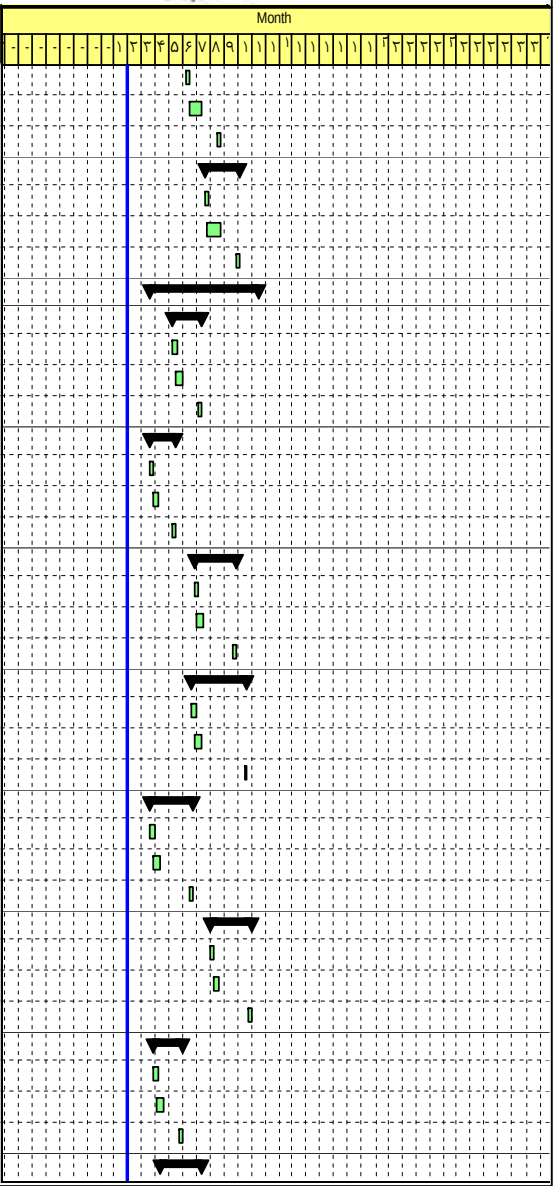

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
PMR For Lighting & Distribution Main Panels - W007S	۱۰	$۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۰
TBE For Lighting & Distribution Main Panels - W007S	۱۵	$۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
VDR For Lighting & Distribution Main Panels - W007S	۷	$۴۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۱
Transformers	۶۰	$۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۸
PMR For Transformers - W007S	۱۰	$۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۶
TBE For Transformers - W007S	۱۵	$۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۸
VDR For Transformers - W007S	۷	$۴۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۸
Power & Control Cables	۴۶	$۵۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۸
PMR For Power & Control Cables - Manifold & W007S	۱۰	$۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
TBE For Power & Control Cables - Manifold & W007S	۱۶	$۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
VDR For Power & Control Cables - Manifold & W007S	۷	$۴۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۸
Electrical Bulk Items	۴۳	$۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۲
PMR For Electrical Bulk Items - Manifold & W007S	۱۰	$۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۰
TBE For Electrical Bulk Items - Manifold & W007S	۱۵	$۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
VDR For Electrical Bulk Items - Manifold & W007S	۷	$۴۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۲
LV Switchgear & MCC	۶۲	$۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۹
PMR For LV Switchgear & MCC - Manifold & W007S	۱۰	$۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
TBE For LV Switchgear & MCC - Manifold & W007S	۱۵	$۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۹
VDR For LV Switchgear & MCC - Manifold & W007S	۷	$۴۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۹
Emergency Diesel Generator	۶۲	$۵۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۲
PMR For Emergency Diesel Generator - W007S	۱۰	$۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
TBE For Emergency Diesel Generator - W007S	۱۵	$۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۳
VDR For Emergency Diesel Generator - W007S	۷	$۴۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۲
Structure	۳۰	$۵۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
Steel Structure Items	۲۲	$۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۷
PMR For Steel Structure Items - W007S/Manifold Extension	۷	$۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۲
TBE For Steel Structure Items - W007S/Manifold Extension	۲۰	$۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۲
VDR For Steel Structure Items - W007S/Manifold Extension	۵	$۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۷
Anchor Bolts	۳۰	$۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
PMR For Anchor Bolts - W007S/Manifold Extension	۱۰	$۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۵
TBE For Anchor Bolts - W007S/Manifold Extension	۳۰	$۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
VDR For Anchor Bolts - W007S/Manifold Extension	۵	$۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
Blast Proof Doors	۳۰	$۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
PMR For Blast Proof Doors - W007S/Manifold Extension	۱۰	$۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۵
TBE For Blast Proof Doors - W007S/Manifold Extension	۳۰	$۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
VDR For Blast Proof Doors - W007S/Manifold Extension	۵	$۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
Civil	۱۱	$۳۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۶

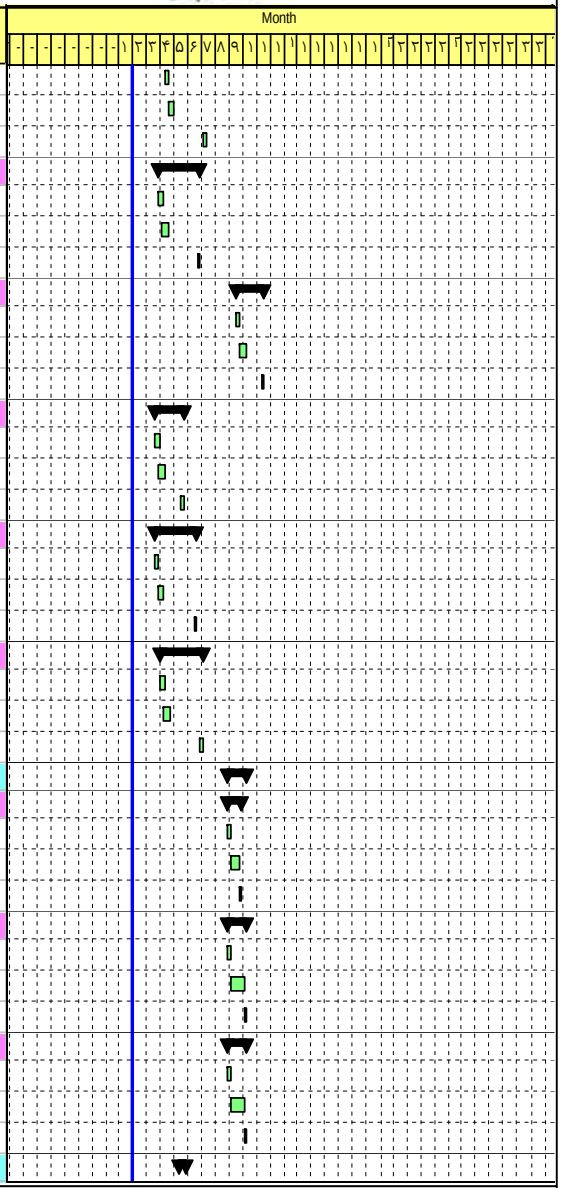

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Geomembrane	۱۱	$۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۶
PMR For Geomembrane - W007S	۵	$۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۴
TBE For Geomembrane - W007S	۵	$۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
VDR For Geomembrane - W007S	۵	$۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۶
Geotextile	۱۱	$۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۶
PMR For Geotextile - W007S	۵	$۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۴
TBE For Geotextile - W007S	۵	$۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
VDR For Geotextile - W007S	۵	$۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۶
Commissioning Engineering	۳۸۷	$۵۵۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹
Operability Review	۵	$۱۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۹
Pre-Commissioning, Commissioning & Startup Procedure - Manifold &	۴۴	$۳۳۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Operating Manual - Manifold & W007S	۳۰	$۱۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۴
Field Engineering	۴۷۷	$۴،۱۵۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
Technical/Site Queries	۴۴	$۲،۰۷۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
As-Built Document Booklets - (Manifold &) W007S	۱۰	$۲،۰۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
As-Built Document Booklets - Manifold	۰	$۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹
Engineering Final Documentation	۲۲۵	$۲،۷۷۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵
Final Engineering Dossier - (Manifold &)W007S	۱۰	$۲،۷۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۵
Final Engineering Dossier - Manifold	۰	$۰		۱۴۰۲/۰۱/۳۰
PROCUREMENT	۳۵۹	$۵۳۶،۴۵۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۴
Wellhead Facility and Flowline	۳۵۹	$۳۷۱،۹۷۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۴
Mechanical	۲۲۰	$۲۰،۴۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۷
Elevated Tanks - W007S	۱۹۹	$۸،۱۸۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
Tendering & Selection	۶۰	$۳۲۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۰
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۴۹۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۵
Manufacturing / Fabrication / Supply	۲۲۰	$۴،۰۹۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
Final Inspection	۱۲	$۸۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
Delivery On Site	۷	$۱،۶۳۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۳
Submitting Vendor Data Book	۵	$۴۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
Delivering Spare Parts	۵	$۴۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
Drums - W007S	۲۲۰	$۱۲،۲۷۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۷
Tendering & Selection	۶۰	$۴۹۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۰
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۷۳۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۵
Manufacturing / Fabrication / Supply	۲۵۰	$۶،۱۳۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
Final Inspection	۱۲	$۱،۲۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۵
Delivery On Site	۷	$۲،۴۵۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۲
Submitting Vendor Data Book	۵	$۶۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۷

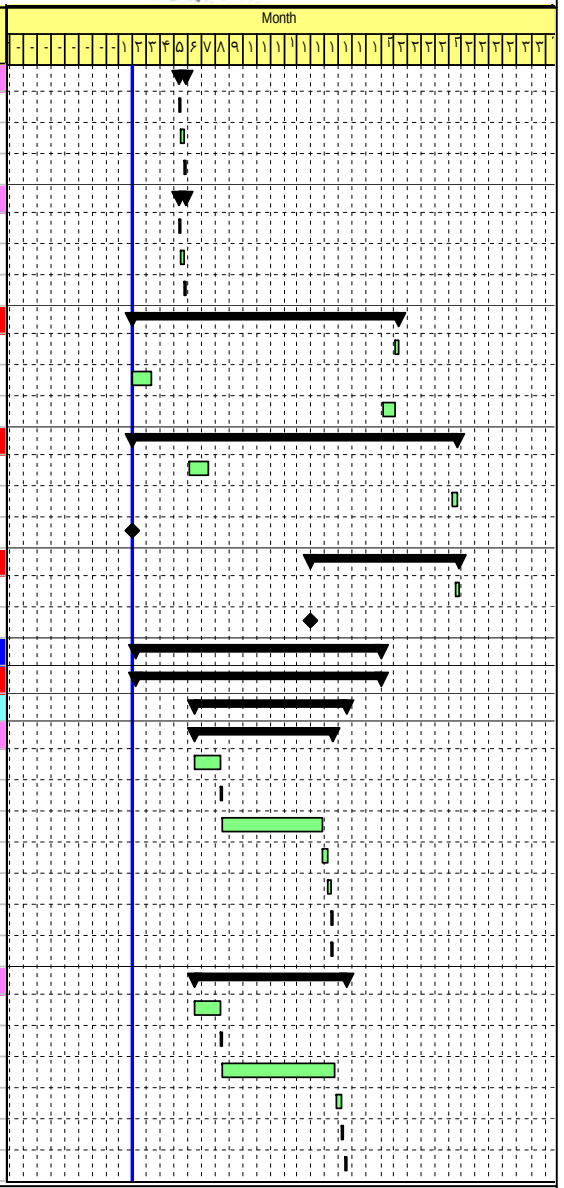

Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Delivering Spare Parts	۵	$۶۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۷
HVAC	۱۲۰	$۳،۷۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۴
Main HVAC Equipment - W007S	۱۲۰	$۳،۷۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۴
Tendering & Selection	۳۰	$۱۴۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۰
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۲۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۵
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۲۰	$۱،۸۶۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Final Inspection	۱۲	$۳۷۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۳
Delivery On Site	۷	$۹۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۰
Submitting Vendor Data Book	۵	$۱۸۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۴
Piping	۲۹۱	$۴۴،۷۴۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۹
Pipes - W007S	۱۷۶	$۸،۹۵۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
Tendering & Selection	۳۱	$۳۵۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۳
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۵۳۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۸
Manufacturing / Fabrication / Supply	۲۱۰	$۴،۴۷۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
Final Inspection	۱۲	$۸۹۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
Delivery On Site	۷	$۲،۲۳۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۵
Submitting Vendor Data Book	۵	$۴۴۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
Fittings - W007S	۱۵۶	$۳،۳۵۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
Tendering & Selection	۳۱	$۱۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۲۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۸
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۸۰	$۱،۶۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
Final Inspection	۱۲	$۳۳۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
Delivery On Site	۷	$۸۳۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۵
Submitting Vendor Data Book	۵	$۱۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
Flanges - W007S	۱۵۶	$۳،۳۵۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
Tendering & Selection	۳۱	$۱۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۲۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۸
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۸۰	$۱،۶۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
Final Inspection	۱۲	$۳۳۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
Delivery On Site	۷	$۸۳۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۵
Submitting Vendor Data Book	۵	$۱۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
Manual Valves - W007S	۱۵۹	$۱۵،۶۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۴
Tendering & Selection	۳۰	$۶۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۹۴۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۸۰	$۷،۸۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
Final Inspection	۱۲	$۱،۵۶۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۸

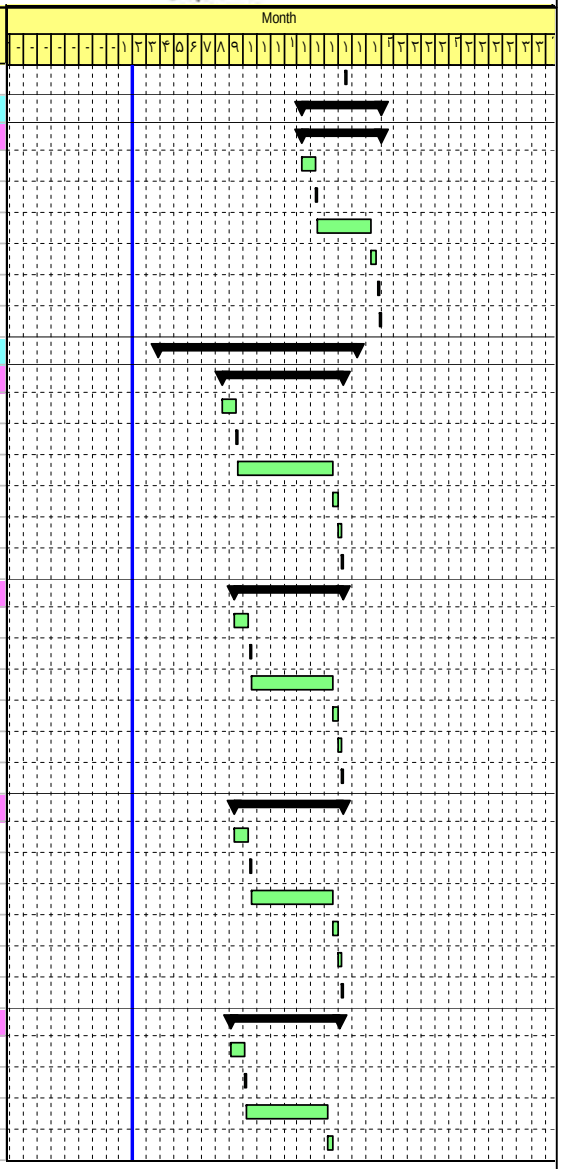

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Delivery On Site	۷	$۳،۱۳۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۵
Submitting Vendor Data Book	۵	$۷۸۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
Delivering Spare Parts	۵	$۷۸۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۴
Gaskets - W007S	۱۷۸	$۱،۳۴۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۹
Tendering & Selection	۳۱	$۵۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۸۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۸
Manufacturing / Fabrication / Supply	۲۱۰	$۶۷۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۶
Final Inspection	۱۲	$۱۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۸
Delivery On Site	۷	$۳۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۴
Submitting Vendor Data Book	۵	$۶۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۹
Bolt/Nuts - W007S	۱۱۶	$۸۹۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۱
Tendering & Selection	۳۰	$۳۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۵۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۷
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۲۰	$۴۴۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۸
Final Inspection	۱۲	$۸۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۰
Delivery On Site	۷	$۲۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۶
Submitting Vendor Data Book	۵	$۴۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۱
Sampling Connection Set - W007S	۷۹	$۲،۲۳۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۰
Tendering & Selection	۳۰	$۸۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۴
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۱۳۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۹
Manufacturing / Fabrication / Supply	۶۰	$۱،۱۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۷
Final Inspection	۱۲	$۲۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸
Delivery On Site	۷	$۵۵۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۵
Submitting Vendor Data Book	۵	$۱۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۰
Stone Trap - W007S	۷۷	$۶،۷۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۳
Tendering & Selection	۳۰	$۲۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۷
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۴۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۲
Manufacturing / Fabrication / Supply	۶۰	$۳،۳۵۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۰
Final Inspection	۱۲	$۶۷۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۲
Delivery On Site	۷	$۱،۶۷۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۹
Submitting Vendor Data Book	۵	$۳۳۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۳
Pipe Support - W007S	۸۴	$۲،۲۳۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۳
Tendering & Selection	۳۰	$۸۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۴
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۱۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۹
Manufacturing / Fabrication / Supply	۶۰	$۱،۱۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
Final Inspection	۱۲	$۲۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۱

Month

Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Summary
Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Delivery On Site	۷	$۵۵۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۸
Submitting Vendor Data Book	۵	$۱۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۳
Pipeline	۱۵۷	$۱۱۵،۱۲۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۴
Line Pipes - W007S	۱۵۷	$۹۷،۸۵۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
Tendering & Selection	۳۰	$۳،۹۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۵،۸۷۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۳
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۸۰	$۴۸،۹۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
Final Inspection	۱۲	$۹،۷۸۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۰
Delivery On Site	۷	$۲۴،۴۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۷
Submitting Vendor Data Book	۵	$۴،۸۹۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
Flow Line Support - W007S	۱۵۶	$۱۷،۲۶۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۴
Tendering & Selection	۳۰	$۶۹۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۰
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۱،۰۳۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۵
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۸۰	$۸،۶۳۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۰
Final Inspection	۱۲	$۱،۷۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۲
Delivery On Site	۷	$۴،۳۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۹
Submitting Vendor Data Book	۵	$۸۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۴
Control & Instrumentation	۲۹۹	$۱۱،۹۰۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
Control System/Console/Furniture	۱۸۲	$۹۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۹
Tendering & Selection	۶۰	$۳۹	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۸
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۵۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۲
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۸۰	$۴۸۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
Final Inspection	۱۲	$۹۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۲
Delivery On Site	۷	$۱۹۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
Submitting Vendor Data Book	۵	$۴۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
Delivering Spare Parts	۵	$۴۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۹
ESD System	۱۸۳	$۹۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۴
Tendering & Selection	۶۰	$۳۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۲
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۵۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۷
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۸۰	$۴۸۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۵
Final Inspection	۱۲	$۹۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۷
Delivery On Site	۷	$۱۹۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۴
Submitting Vendor Data Book	۵	$۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۹
Delivering Spare Parts	۵	$۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۴
F&G System	۱۸۳	$۹۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۴
Tendering & Selection	۶۰	$۳۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۲

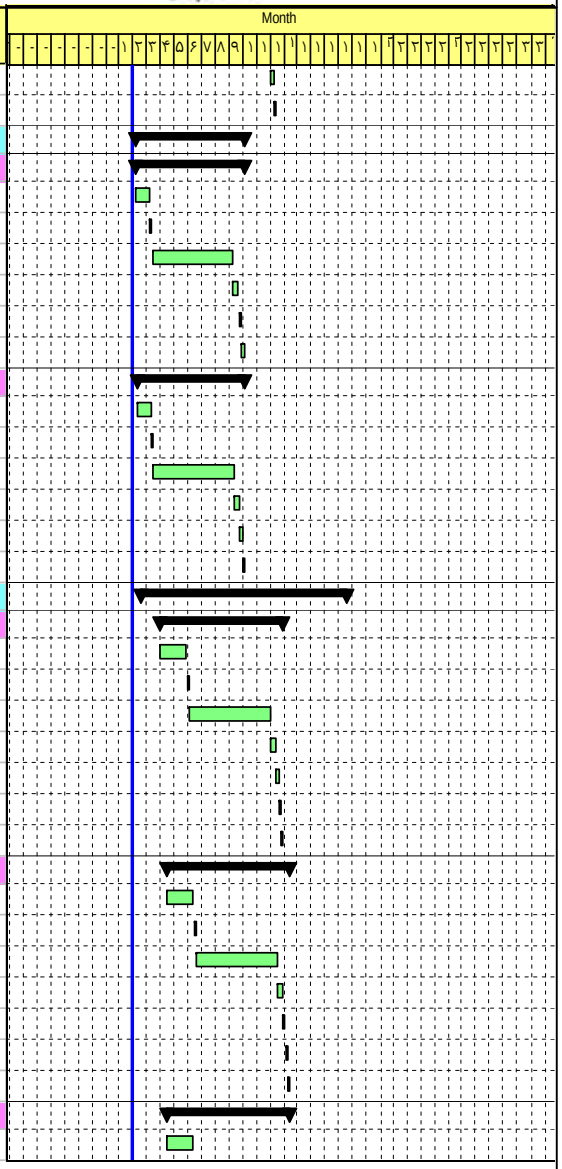

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۵۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۷
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۸۰	$۴۸۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۵
Final Inspection	۱۲	$۹۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۷
Delivery On Site	۷	$۱۹۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۴
Submitting Vendor Data Book	۵	$۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۹
Delivering Spare Parts	۵	$۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۴
Pneumatic On/Off & Shutdown Valves	۱۸۲	$۷۵۵	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۹
Tendering & Selection	۶۰	$۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۸
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۴۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۲
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۸۰	$۳۷۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
Final Inspection	۱۲	$۷۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۲
Delivery On Site	۷	$۱۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
Submitting Vendor Data Book	۵	$۳۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
Delivering Spare Parts	۵	$۳۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۹
Control Valves	۱۸۲	$۷۵۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۷
Tendering & Selection	۶۰	$۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۶
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۴۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۱
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۸۰	$۳۷۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۸
Final Inspection	۱۲	$۷۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۰
Delivery On Site	۷	$۱۵۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۷
Submitting Vendor Data Book	۵	$۳۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۲
Delivering Spare Parts	۵	$۳۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۷
(Pressure Safety Valves (PSV	۱۸۲	$۷۵۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
Tendering & Selection	۶۰	$۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۱
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۴۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۶
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۸۰	$۳۷۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۴
Final Inspection	۱۲	$۷۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۶
Delivery On Site	۷	$۱۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
Submitting Vendor Data Book	۵	$۳۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۸
Delivering Spare Parts	۵	$۳۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
F&G Devices	۱۷۷	$۷۵۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۴
Tendering & Selection	۶۰	$۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۰
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۴۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۵
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۸۰	$۳۷۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
Final Inspection	۱۲	$۷۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۸
Delivery On Site	۷	$۱۵۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۴

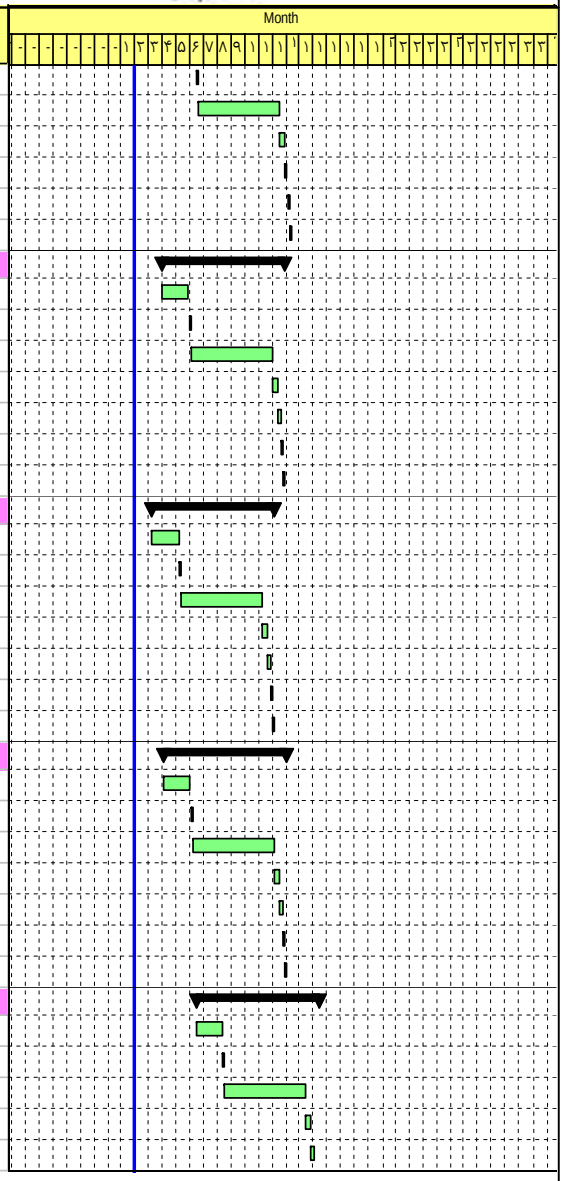

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Submitting Vendor Data Book	۵	$۳۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۹
Delivering Spare Parts	۵	$۳۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۴
Orifice and Restriction Orifice Plate	۱۸۲	$۵۴۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
Tendering & Selection	۶۰	$۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۱
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۳۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۶
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۸۰	$۲۷۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۴
Final Inspection	۱۲	$۵۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۶
Delivery On Site	۷	$۱۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
Submitting Vendor Data Book	۵	$۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۸
Delivering Spare Parts	۵	$۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
Corrosion Coupon/Probe	۱۸۲	$۵۴۵	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۹
Tendering & Selection	۶۰	$۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۸
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۳۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۲
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۸۰	$۲۷۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
Final Inspection	۱۲	$۵۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۲
Delivery On Site	۷	$۱۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
Submitting Vendor Data Book	۵	$۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
Delivering Spare Parts	۵	$۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۹
Pressure Transmitter	۱۸۲	$۵۴۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۹
Tendering & Selection	۶۰	$۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۷
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۳۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۲
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۸۰	$۲۷۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
Final Inspection	۱۲	$۵۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۲
Delivery On Site	۷	$۱۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۹
Submitting Vendor Data Book	۵	$۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۴
Delivering Spare Parts	۵	$۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۹
Flow Transmitter/ Diff. Pressure Transmitter	۱۵۷	$۵۴۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
Tendering & Selection	۶۰	$۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۳۰
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۴
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۴۰	$۲۷۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
Final Inspection	۱۲	$۵۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
Delivery On Site	۷	$۱۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
Submitting Vendor Data Book	۵	$۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۸
Delivering Spare Parts	۵	$۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
Instrument/F&G Cable	۱۴۸	$۵۴۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۳
Tendering & Selection	۶۰	$۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۶

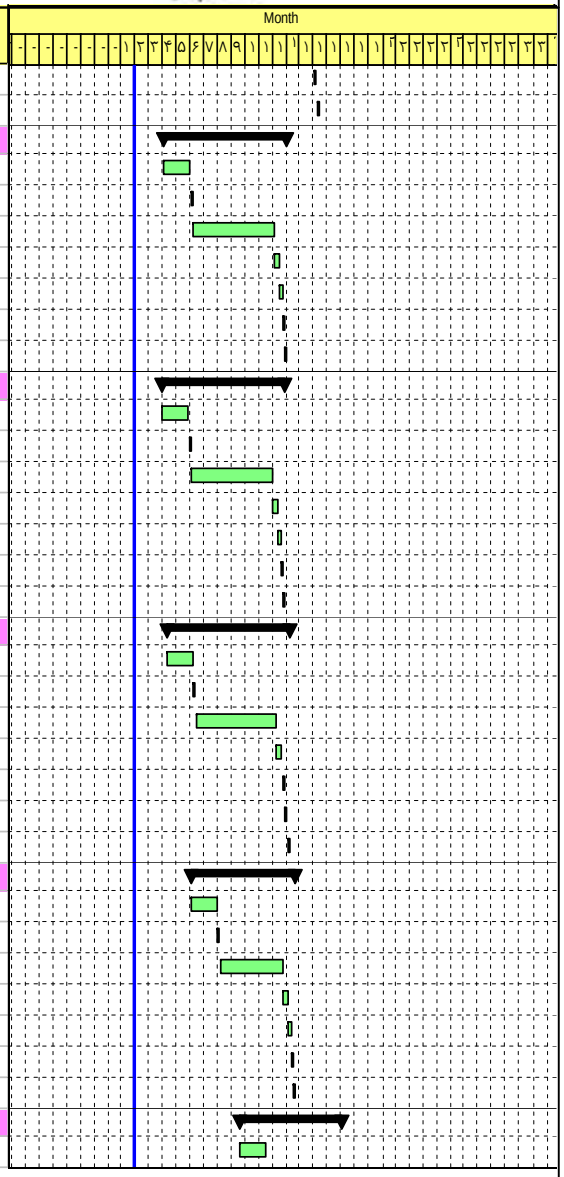

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۳۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۱
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۴۰	$۲۷۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
Final Inspection	۱۲	$۵۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
Delivery On Site	۷	$۱۳۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
Submitting Vendor Data Book	۵	$۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۳
Instrument/F&G Junction box and Gland	۱۵۶	$۵۴۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
Tendering & Selection	۳۰	$۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۱
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۳۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۶
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۸۰	$۲۷۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۵
Final Inspection	۱۲	$۵۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
Delivery On Site	۷	$۱۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۳
Submitting Vendor Data Book	۵	$۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
Instrument Installation Accessories	۱۵۰	$۵۴۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۶
Tendering & Selection	۶۰	$۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۳۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۴۰	$۲۷۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۲
Final Inspection	۱۲	$۵۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۴
Delivery On Site	۷	$۱۳۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۱
Submitting Vendor Data Book	۵	$۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۶
Differential Pressure/Pressure Gauge	۱۵۵	$۵۴۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
Tendering & Selection	۶۰	$۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۷
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۳۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۲
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۴۰	$۲۷۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
Final Inspection	۱۲	$۵۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۰
Delivery On Site	۷	$۱۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۷
Submitting Vendor Data Book	۵	$۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
Delivering Spare Parts	۵	$۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
Temperature Gauge - Manifold & W007S	۱۵۵	$۵۴۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
Tendering & Selection	۶۰	$۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۷
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۳۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۲
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۴۰	$۲۷۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
Final Inspection	۱۲	$۵۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۰
Delivery On Site	۷	$۱۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۷
Submitting Vendor Data Book	۵	$۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
Delivering Spare Parts	۵	$۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
Instrument Cable Tray/Ladder - Manifold & W007S	۱۵۰	$۵۴۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۶

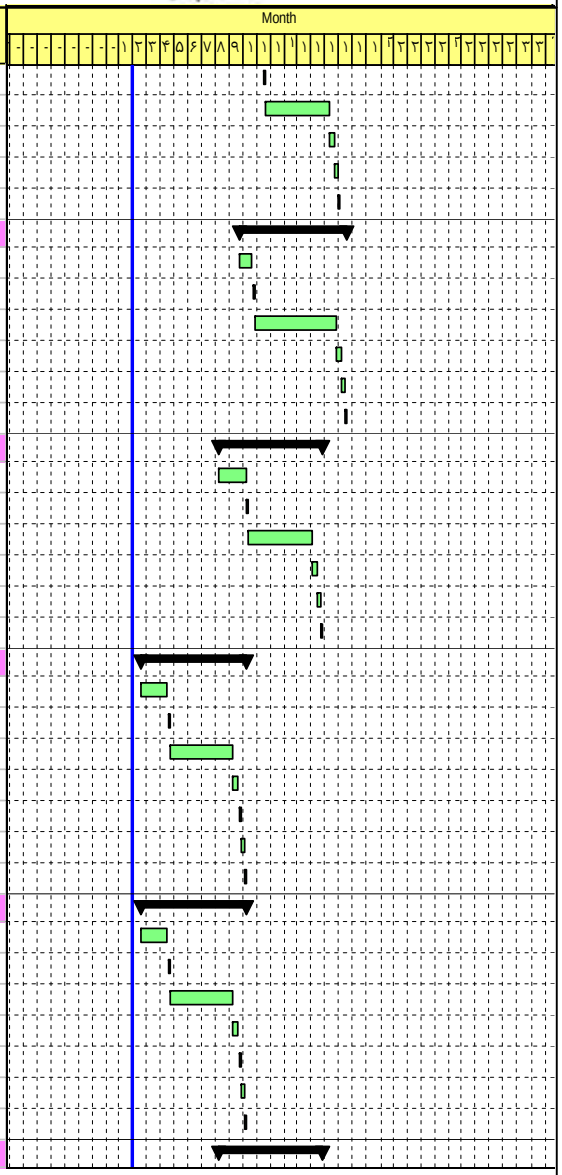

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Tendering & Selection	۶۰	$۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۳۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۴۰	$۲۷۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۲
Final Inspection	۱۲	$۵۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۴
Delivery On Site	۷	$۱۳۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۱
Submitting Vendor Data Book	۵	$۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۶
Instrument Tube and Fitting - Manifold & W007S	۱۵۱	$۵۴۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
Tendering & Selection	۶۰	$۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۸
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۴۰	$۲۷۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۷
Final Inspection	۱۲	$۵۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
Delivery On Site	۷	$۱۳۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۶
Submitting Vendor Data Book	۵	$۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
Safety & Fire Fighting	۸۲	$۱،۷۸۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
Fire Safety Sign - Manifold & W007S	۵۶	$۳۵۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
Tendering & Selection	۳۰	$۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۲
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۷
Manufacturing / Fabrication / Supply	۲۰	$۱۷۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷
Final Inspection	۱۲	$۳۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۹
Delivery On Site	۷	$۸۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۶
Submitting Vendor Data Book	۵	$۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
Fire Fighting and Safety Equipment - Manifold & W007S	۵۳	$۱،۴۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۹
Tendering & Selection	۳۰	$۵۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۰
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۸۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۵
Manufacturing / Fabrication / Supply	۲۰	$۷۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۵
Final Inspection	۱۲	$۱۴۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۷
Delivery On Site	۷	$۳۵۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۴
Submitting Vendor Data Book	۵	$۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۹
Electrical	۲۶۴	$۱۷۴،۲۳۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
LV Switchgear & MCC - Manifold & W007S	۱۷۲	$۱۶،۹۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
Tendering & Selection	۶۰	$۶۷۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۷
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۱،۰۱۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۲
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۵۰	$۸،۴۵۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
Final Inspection	۱۲	$۱،۶۹۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۲
Delivery On Site	۷	$۳،۳۸۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۹
Submitting Vendor Data Book	۲۰	$۸۴۵	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۹

Month

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary

Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Delivering Spare Parts	۵	$۸۴۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
Tray/Ladder and Accessories - Manifold & W007S	۱۲۱	$۱،۳۹۴	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
Tendering & Selection	۳۰	$۵۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۹
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۸۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۲۰	$۶۹۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۲
Final Inspection	۱۲	$۱۳۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
Delivery On Site	۷	$۳۴۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۱
Submitting Vendor Data Book	۵	$۷۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
DC Charger - Manifold & W007S	۱۷۰	$۱۰،۸۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
Tendering & Selection	۲۵	$۴۳۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۳
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۶۴۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۸۰	$۵،۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
Final Inspection	۱۲	$۱،۰۸۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۷
Delivery On Site	۷	$۲،۱۶۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۴
Submitting Vendor Data Book	۲۰	$۵۴۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۴
Delivering Spare Parts	۵	$۵۴۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
Electrical Bulk Items - Manifold & W007S	۹۵	$۱،۳۹۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۶
Tendering & Selection	۳۰	$۵۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۰
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۸۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
Manufacturing / Fabrication / Supply	۹۰	$۶۹۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۲
Final Inspection	۱۲	$۱۳۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۴
Delivery On Site	۷	$۳۴۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
Submitting Vendor Data Book	۵	$۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۶
Earthing & Lightning System - Manifold & W007S	۱۰۴	$۶،۳۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
Tendering & Selection	۶۰	$۲۵۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۴
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۳۷۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۹
Manufacturing / Fabrication / Supply	۶۰	$۳،۱۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
Final Inspection	۱۲	$۶۳۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
Delivery On Site	۷	$۱،۲۶۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۸
Submitting Vendor Data Book	۵	$۳۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۳
Delivering Spare Parts	۵	$۳۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
UPS System - Manifold & W007S	۱۸۰	$۱۰،۳۸۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
Tendering & Selection	۶۰	$۴۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۶۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۴
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۸۰	$۵،۱۹۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۳
Final Inspection	۱۲	$۱،۰۳۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۵

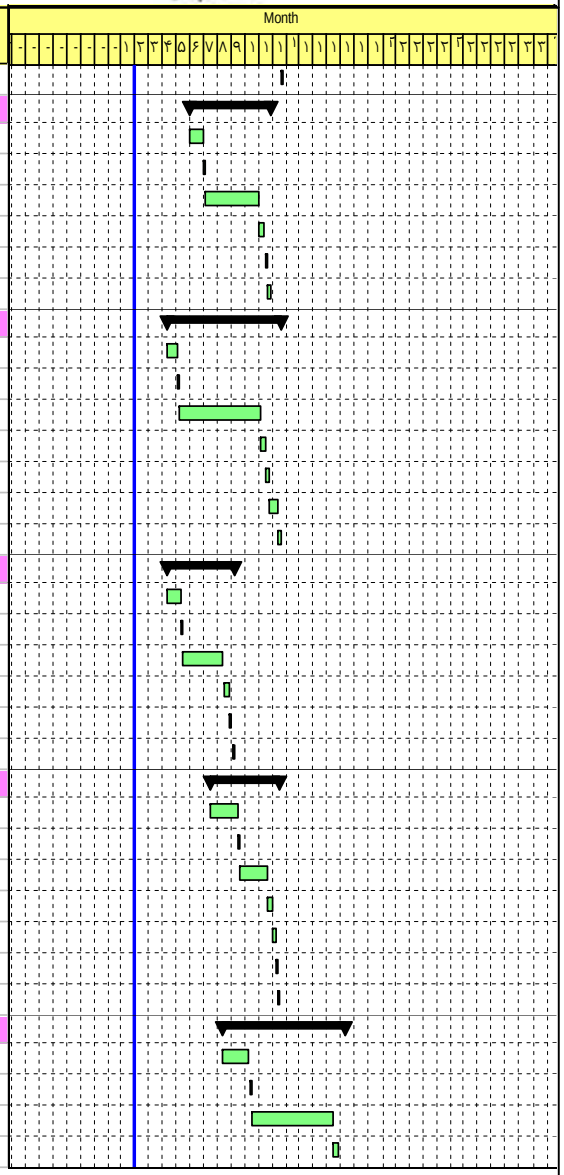

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Delivery On Site	۷	$۲،۰۷۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
Submitting Vendor Data Book	۵	$۵۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
Delivering Spare Parts	۵	$۵۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
Transformers - W007S	۲۰۷	$۱۹،۵۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۳
Tendering & Selection	۶۰	$۷۸۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۶
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۱،۱۷۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۱
Manufacturing / Fabrication / Supply	۲۱۰	$۹،۷۵۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۹
Final Inspection	۱۲	$۱،۹۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۲
Delivery On Site	۷	$۳،۹۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۹
Submitting Vendor Data Book	۲۰	$۹۷۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۹
Delivering Spare Parts	۵	$۹۷۶	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۳
Capacitor Bank - W007S	۱۴۳	$۳،۲۵۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۸
Tendering & Selection	۳۰	$۱۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۷
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۱۹۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۲
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۵۰	$۱،۶۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
Final Inspection	۱۲	$۳۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
Delivery On Site	۷	$۶۵۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۸
Submitting Vendor Data Book	۵	$۱۶۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۳
Delivering Spare Parts	۵	$۱۶۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۸
Emergency Diesel Generator - W007S	۱۶۳	$۱۶،۹۳۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
Tendering & Selection	۶۰	$۶۷۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۱
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۱،۰۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۶
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۳۵	$۸،۴۶۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۹
Final Inspection	۱۲	$۱،۶۹۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۱
Delivery On Site	۷	$۳،۳۸۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
Submitting Vendor Data Book	۲۰	$۸۴۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
Delivering Spare Parts	۵	$۸۴۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
Transmission Over head Line Equipment - W007S	۱۱۷	$۶۵،۸۹۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
Tendering & Selection	۶۰	$۲،۶۳۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۹
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۳،۹۵۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۴
Manufacturing / Fabrication / Supply	۹۰	$۳۲،۹۴۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۲
Final Inspection	۱۲	$۶،۵۸۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۴
Delivery On Site	۷	$۱۶،۴۷۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
Submitting Vendor Data Book	۵	$۳،۲۹۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
Lighting & Distribution Main Panels - W007S	۱۴۳	$۳،۹۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۲
Tendering & Selection	۶۰	$۱۵۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۰

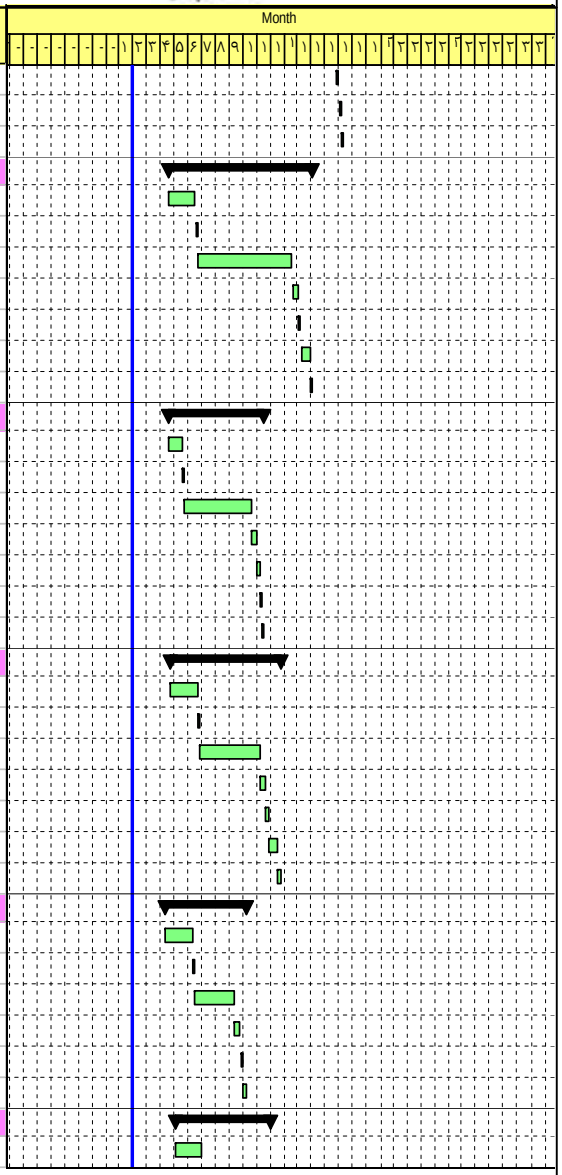

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۲۳۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۴
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۲۰	$۱،۹۵۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۳
Final Inspection	۱۲	$۳۹۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۵
Delivery On Site	۷	$۷۸۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۲
Submitting Vendor Data Book	۵	$۱۹۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۷
Delivering Spare Parts	۵	$۱۹۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۲
Lighting and Small Power Equipment - W007S	۱۱۷	$۷،۹۴۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۹
Tendering & Selection	۶۰	$۳۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۴۷۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۴
Manufacturing / Fabrication / Supply	۸۵	$۳،۹۷۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۹
Final Inspection	۱۲	$۷۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۲
Delivery On Site	۷	$۱،۵۸۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۹
Submitting Vendor Data Book	۵	$۳۹۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۴
Delivering Spare Parts	۵	$۳۹۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۹
Power & Control Cables - Manifold & W007S	۱۴۵	$۹،۵۸۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
Tendering & Selection	۳۰	$۳۸۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۶
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۵۷۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۶۵	$۴،۷۹۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۵
Final Inspection	۱۲	$۹۵۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
Delivery On Site	۷	$۲،۳۹۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۳
Submitting Vendor Data Book	۵	$۴۷۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
Extension of Binak B/C Manifold	۲۳۱	$۱۶۴،۴۷۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۶
Mechanical	۸۸	$۵،۶۵۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۱
Pumps - Extension of Binak B/C Manifold	۸۸	$۵،۶۵۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۱
Tendering & Selection	۱۰	$۲۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۳۳۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۶
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۰۰	$۲،۸۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
Final Inspection	۷	$۵۶۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۰
Delivery On Site	۷	$۱،۱۳۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۷
Submitting Vendor Data Book	۵	$۲۸۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۱
Delivering Spare Parts	۵	$۲۸۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۱
Piping	۱۹۴	$۳۵،۸۸۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۱
Pipes - Extension of Binak B/C Manifold	۶۶	$۱۴،۶۴۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۸
Tendering & Selection	۷	$۵۸۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۹
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۸۷۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۴
Manufacturing / Fabrication / Supply	۷۰	$۷،۳۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۹

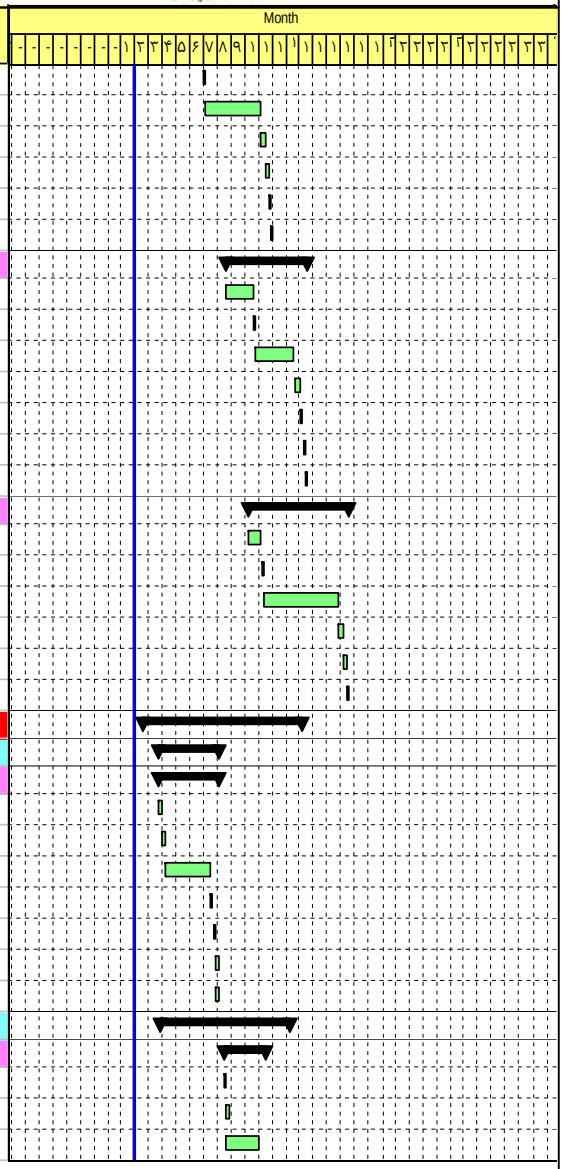

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Final Inspection	۷	$۱،۴۶۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۶
Delivery On Site	۷	$۳،۶۶۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۳
Submitting Vendor Data Book	۵	$۷۳۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۸
Fittings - Extension of Binak B/C Manifold	۷۷	$۱،۹۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
Tendering & Selection	۱۰	$۷۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۲
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۱۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۷
Manufacturing / Fabrication / Supply	۸۰	$۹۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
Final Inspection	۷	$۱۹۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
Delivery On Site	۷	$۴۸۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
Submitting Vendor Data Book	۵	$۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
Flanges - Extension of Binak B/C Manifold	۷۷	$۱،۹۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
Tendering & Selection	۱۰	$۷۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۲
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۱۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۷
Manufacturing / Fabrication / Supply	۸۰	$۹۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
Final Inspection	۷	$۱۹۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
Delivery On Site	۷	$۴۸۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
Submitting Vendor Data Book	۵	$۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
Manual Valves - Extension of Binak B/C Manifold	۸۱	$۸،۶۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۱
Tendering & Selection	۱۰	$۳۴۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۲
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۵۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۷
Manufacturing / Fabrication / Supply	۸۰	$۴،۳۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
Final Inspection	۷	$۸۶۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
Delivery On Site	۷	$۱،۷۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
Submitting Vendor Data Book	۵	$۴۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
Delivering Spare Parts	۵	$۴۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۱
Gaskets - Extension of Binak B/C Manifold	۷۷	$۲،۳۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
Tendering & Selection	۱۰	$۹۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۲
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۱۴۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۷
Manufacturing / Fabrication / Supply	۸۰	$۱،۱۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
Final Inspection	۷	$۲۳۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
Delivery On Site	۷	$۵۸۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
Submitting Vendor Data Book	۵	$۱۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
Bolt/Nuts - Extension of Binak B/C Manifold	۷۷	$۳،۵۸۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
Tendering & Selection	۱۰	$۱۴۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۲
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۲۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۷
Manufacturing / Fabrication / Supply	۸۰	$۱،۷۹۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۷

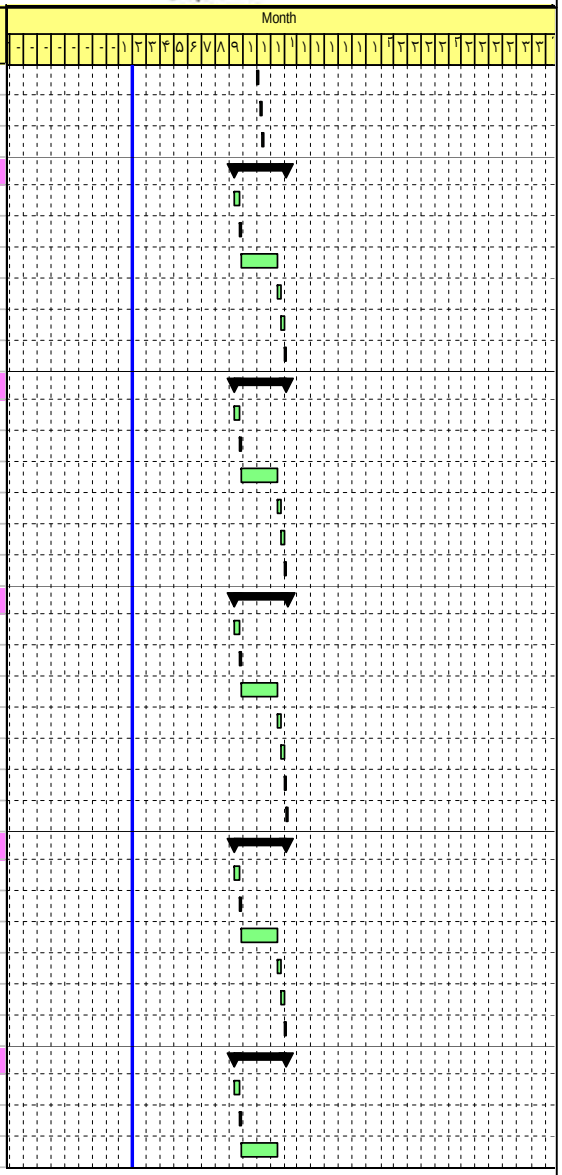

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Final Inspection	۷	$۳۵۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
Delivery On Site	۷	$۸۹۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
Submitting Vendor Data Book	۵	$۱۷۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
Sampling Connection Set - Extension of Binak B/C Manifold	۶۲	$۱،۹۳۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶
Tendering & Selection	۱۰	$۷۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۴
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۱۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۹
Manufacturing / Fabrication / Supply	۶۰	$۹۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۷
Final Inspection	۷	$۱۹۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۴
Delivery On Site	۷	$۴۸۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۱
Submitting Vendor Data Book	۵	$۹۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۶
Pipe Support - Extension of Binak B/C Manifold	۶۶	$۸۹۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۸
Tendering & Selection	۱۰	$۳۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۴
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۵۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۹
Manufacturing / Fabrication / Supply	۶۰	$۴۴۹	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۹
Final Inspection	۷	$۹۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۶
Delivery On Site	۷	$۲۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۳
Submitting Vendor Data Book	۵	$۴۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۸
Control & Instrumentation	۲۳۱	$۹۰،۶۲۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۶
DCS System - Extension of Binak B/C Manifold	۱۱۱	$۳۷،۱۵۷	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۴
Tendering & Selection	۲۰	$۱،۴۸۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۹
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۲،۲۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۴
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۲۰	$۱۸،۵۷۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۰
Final Inspection	۷	$۳،۷۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷
Delivery On Site	۷	$۷،۴۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
Submitting Vendor Data Book	۵	$۱،۸۵۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
Delivering Spare Parts	۵	$۱،۸۵۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴
F&G System - Extension of Binak B/C Manifold	۱۱۲	$۱۸،۱۲۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۹
Tendering & Selection	۲۰	$۷۲۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۱،۰۸۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۲۰	$۹،۰۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۵
Final Inspection	۷	$۱،۸۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۲
Delivery On Site	۷	$۳،۶۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۹
Submitting Vendor Data Book	۵	$۹۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۴
Delivering Spare Parts	۵	$۹۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۹
ESD System - Extension of Binak B/C Manifold	۱۱۲	$۲۶،۲۸۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۹
Tendering & Selection	۲۰	$۱،۰۵۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳

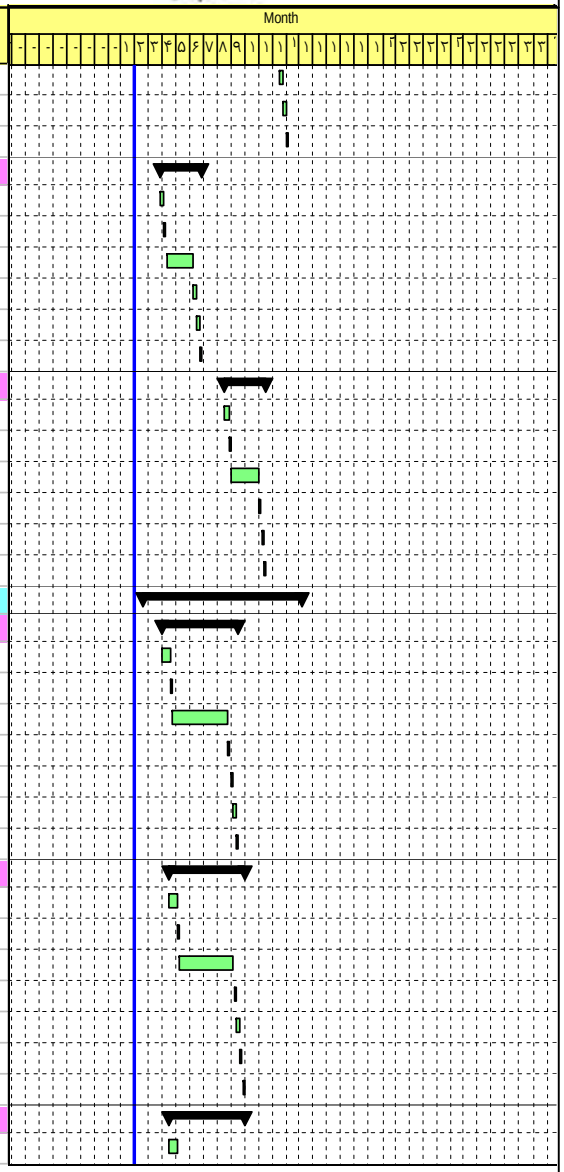

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۱،۵۷۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۲۰	$۱۳،۱۴۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۵
Final Inspection	۷	$۲،۶۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۲
Delivery On Site	۷	$۵،۲۵۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۹
Submitting Vendor Data Book	۵	$۱،۳۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۴
Delivering Spare Parts	۵	$۱،۳۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۹
ON/OFF & Shutdown Valves - Extension of Binak B/C Manifold	۹۷	$۹۹۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
Tendering & Selection	۲۰	$۴۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۹
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۶۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۳
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۰۰	$۴۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۰
Final Inspection	۷	$۱۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۷
Delivery On Site	۷	$۱۹۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۴
Submitting Vendor Data Book	۵	$۵۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۹
Delivering Spare Parts	۵	$۵۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
Control Valves	۹۵	$۹۹۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۲
Tendering & Selection	۱۵	$۴۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۶۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۲
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۰۰	$۴۹۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۹
Final Inspection	۷	$۱۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
Delivery On Site	۷	$۱۹۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۳
Submitting Vendor Data Book	۵	$۵۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۸
Delivering Spare Parts	۵	$۵۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۲
(Pressure Safety Valves (PSV	۹۴	$۹۹۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۳
Tendering & Selection	۱۵	$۴۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۸
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۶۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۲
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۰۰	$۴۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۹
Final Inspection	۷	$۱۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۶
Delivery On Site	۷	$۱۹۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۳
Submitting Vendor Data Book	۵	$۵۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۸
Delivering Spare Parts	۵	$۵۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۳
F&G Devices	۱۰۳	$۸۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
Tendering & Selection	۱۵	$۳۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۷
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۱
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۱۰	$۴۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۰
Final Inspection	۷	$۸۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۷
Delivery On Site	۷	$۱۷۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۹

Month

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary

Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Submitting Vendor Data Book	۵	$۴۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۲
Delivering Spare Parts	۵	$۴۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
Orifice and Restriction Orifice Plate	۱۰۳	$۳۷۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
Tendering & Selection	۱۵	$۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۸
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۳
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۱۰	$۱۸۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۹
Final Inspection	۱۲	$۳۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۱
Delivery On Site	۷	$۷۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۸
Submitting Vendor Data Book	۵	$۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۳
Delivering Spare Parts	۵	$۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
Corrosion Coupon/Probe	۱۰۵	$۳۷۲	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
Tendering & Selection	۱۵	$۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۴
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۹
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۱۰	$۱۸۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۵
Final Inspection	۱۲	$۳۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۷
Delivery On Site	۷	$۷۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۴
Submitting Vendor Data Book	۵	$۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۹
Delivering Spare Parts	۵	$۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
Pressure Transmitter	۱۰۳	$۴۹۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۸
Tendering & Selection	۱۵	$۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۳
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۱۰	$۲۴۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۰
Final Inspection	۱۲	$۵۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۱
Delivery On Site	۷	$۱۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۸
Submitting Vendor Data Book	۵	$۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۳
Delivering Spare Parts	۵	$۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۸
Flow Transmitter/ Diff. Pressure Transmitter	۱۰۶	$۴۹۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۳
Tendering & Selection	۱۵	$۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۳
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۱۰	$۲۴۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۵
Final Inspection	۱۲	$۵۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۶
Delivery On Site	۷	$۱۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
Submitting Vendor Data Book	۵	$۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۸
Delivering Spare Parts	۵	$۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۳
Instrument/F&G Cable	۸۷	$۶۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
Tendering & Selection	۱۵	$۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۱

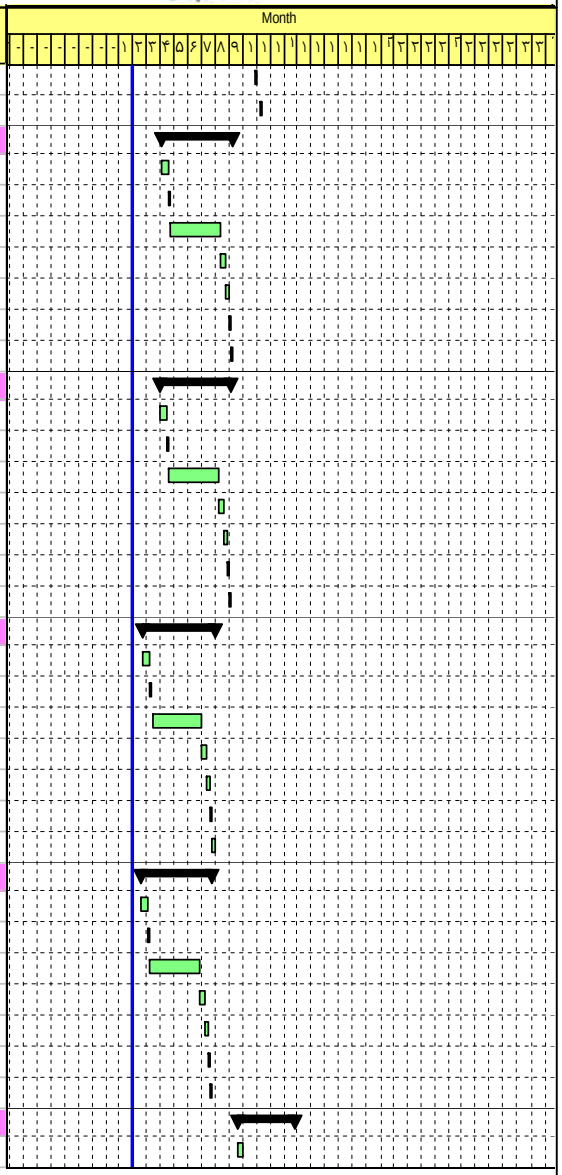

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary

Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۳۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
Manufacturing / Fabrication / Supply	۹۰	$۳۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
Final Inspection	۷	$۶۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
Delivery On Site	۷	$۱۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۰
Submitting Vendor Data Book	۵	$۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
Instrument/F&G Junction box and Gland	۹۴	$۴۹۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۶
Tendering & Selection	۱۵	$۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۶
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۰۰	$۲۴۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۱
Final Inspection	۱۲	$۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
Delivery On Site	۷	$۱۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۱
Submitting Vendor Data Book	۵	$۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۶
Instrument Installation Accessories	۹۶	$۳۷۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۶
Tendering & Selection	۱۵	$۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۲
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۷
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۰۰	$۱۸۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۷
Final Inspection	۷	$۳۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۴
Delivery On Site	۷	$۹۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۱
Submitting Vendor Data Book	۵	$۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۶
Differential Pressure/Pressure Gauge	۹۸	$۴۹۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
Tendering & Selection	۱۵	$۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۳
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۰۰	$۲۴۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۵
Final Inspection	۱۲	$۵۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۷
Delivery On Site	۷	$۱۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
Submitting Vendor Data Book	۵	$۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۸
Delivering Spare Parts	۵	$۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
Temperature Gauge	۹۸	$۴۹۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
Tendering & Selection	۱۵	$۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۳
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۰۰	$۲۴۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۵
Final Inspection	۱۲	$۵۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۷
Delivery On Site	۷	$۱۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
Submitting Vendor Data Book	۵	$۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۸
Delivering Spare Parts	۵	$۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
Instrument Tube and Fitting	۸۳	$۶۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۱

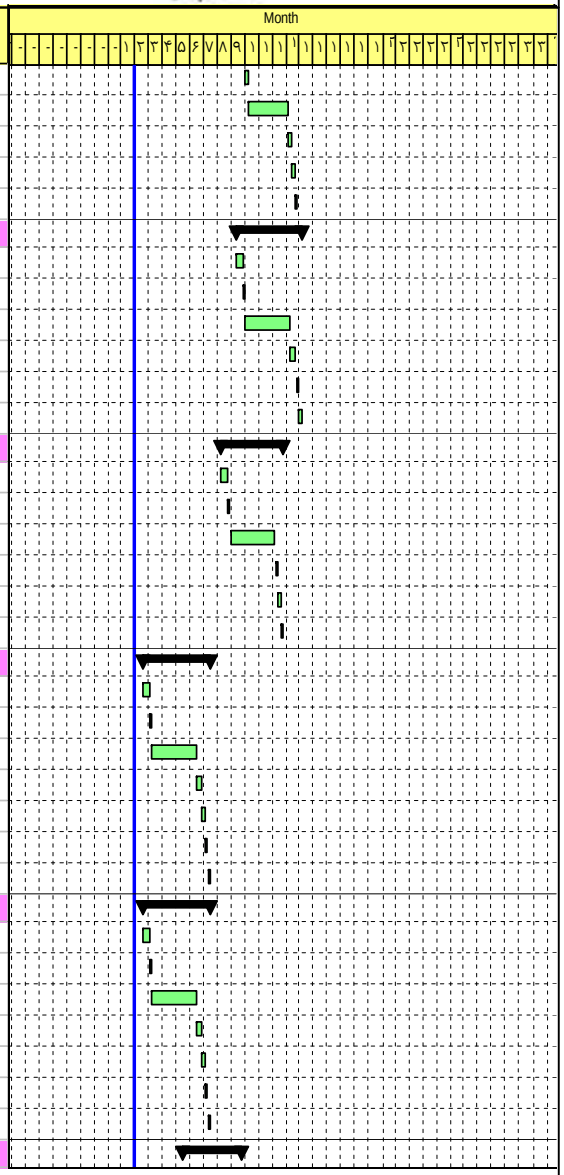

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Tendering & Selection	۱۰	$۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۳۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
Manufacturing / Fabrication / Supply	۹۰	$۳۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷
Final Inspection	۱۲	$۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
Delivery On Site	۷	$۱۵۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
Submitting Vendor Data Book	۵	$۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
Instrument Cable Tray	۹۲	$۳۷۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۱
Tendering & Selection	۱۵	$۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۲
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۷
Manufacturing / Fabrication / Supply	۹۰	$۱۸۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۷
Final Inspection	۱۲	$۳۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۹
Delivery On Site	۷	$۹۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۶
Submitting Vendor Data Book	۵	$۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۱
Safety & Fire Fighting	۸۲	$۱،۷۹۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
Fire Fighting and Safety Equipment - Extension of Binak B/C Manifold	۵۳	$۱،۳۳۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۹
Tendering & Selection	۳۰	$۵۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۰
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۸۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۵
Manufacturing / Fabrication / Supply	۲۰	$۶۶۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۵
Final Inspection	۱۲	$۱۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۷
Delivery On Site	۷	$۳۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۴
Submitting Vendor Data Book	۵	$۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۹
Fire Safety Sign - Extension of Binak B/C Manifold	۵۶	$۴۵۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
Tendering & Selection	۳۰	$۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۲
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۷
Manufacturing / Fabrication / Supply	۲۰	$۲۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷
Final Inspection	۱۲	$۴۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۹
Delivery On Site	۷	$۱۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۶
Submitting Vendor Data Book	۵	$۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
Electrical	۱۹۰	$۳۰،۵۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
LV Switchgear & MCC - Extension of Binak B/C Manifold	۱۰۱	$۴،۸۹۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۴
Tendering & Selection	۱۵	$۱۹۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۹
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۲۹۴	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۳
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۱۰	$۲،۴۴۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۰
Final Inspection	۷	$۴۹۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷
Delivery On Site	۷	$۹۷۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
Submitting Vendor Data Book	۵	$۲۴۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹

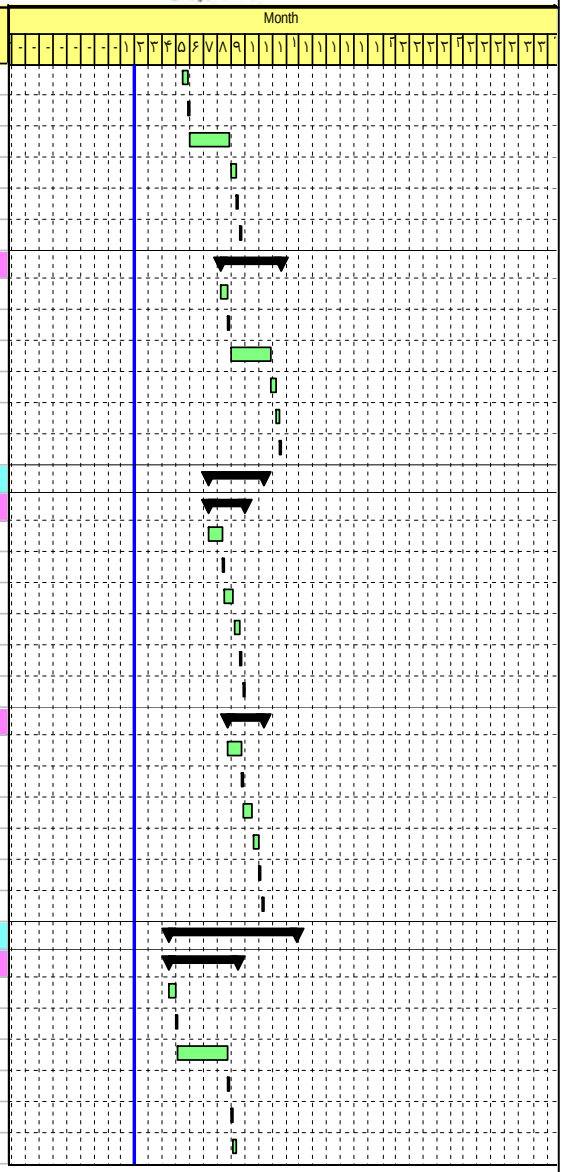

Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Summary
Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Delivering Spare Parts	۵	$۲۴۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴
UPS System - Extension of Binak B/C Manifold	۹۸	$۱۲،۲۳۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۳
Tendering & Selection	۱۵	$۴۹۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۴
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۷۳۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۹
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۰۰	$۶،۱۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
Final Inspection	۷	$۱،۲۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
Delivery On Site	۷	$۲،۴۴۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۳
Submitting Vendor Data Book	۵	$۶۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۸
Delivering Spare Parts	۵	$۶۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۳
DC Charger - Extension of Binak B/C Manifold	۱۰۱	$۸،۱۵۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۴
Tendering & Selection	۱۵	$۳۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۹
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۴۸۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۳
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۱۰	$۴،۰۷۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۰
Final Inspection	۷	$۸۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷
Delivery On Site	۷	$۱،۶۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
Submitting Vendor Data Book	۵	$۴۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
Delivering Spare Parts	۵	$۴۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴
Earthing & Lightning System	۱۰۱	$۸۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
Tendering & Selection	۱۵	$۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۴
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۴۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۹
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۱۰	$۴۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۹
Final Inspection	۷	$۸۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۶
Delivery On Site	۵	$۱۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
Submitting Vendor Data Book	۵	$۴۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
Delivering Spare Parts	۷	$۴۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۳
Power & Control Cables - Extension of Binak B/C Manifold	۶۵	$۱،۶۳۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
Tendering & Selection	۱۵	$۶۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۹۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۶
Manufacturing / Fabrication / Supply	۶۰	$۸۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
Final Inspection	۷	$۱۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
Delivery On Site	۷	$۴۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۰
Submitting Vendor Data Book	۵	$۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
Tray/Ladder and Accessories	۶۵	$۱،۱۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
Tendering & Selection	۱۵	$۴۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۴
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۹
Manufacturing / Fabrication / Supply	۶۰	$۵۵۵	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۷

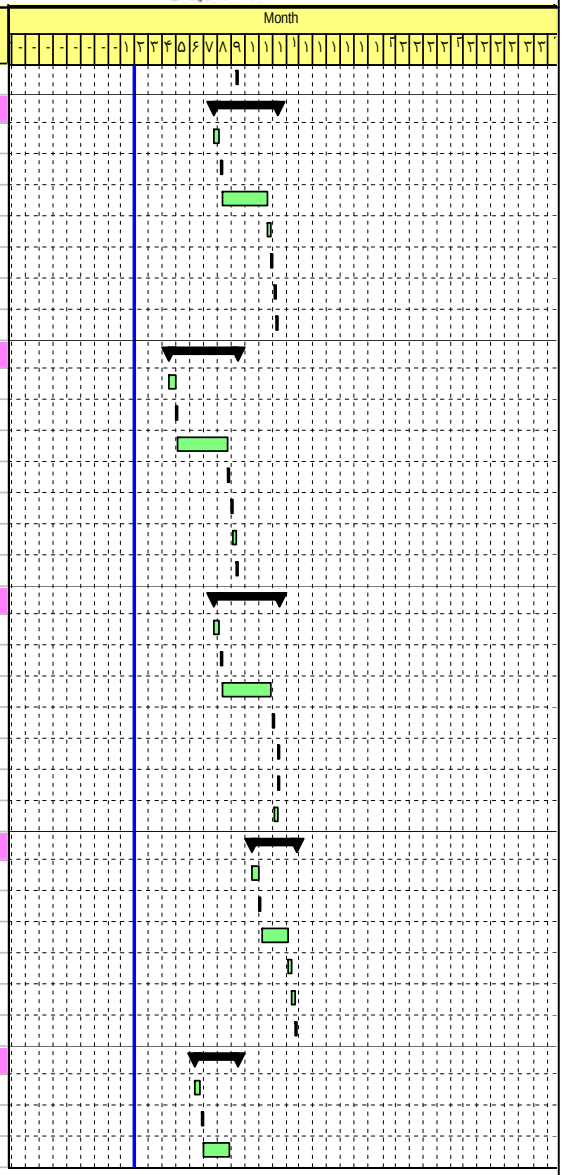

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Final Inspection	۷	$۱۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
Delivery On Site	۷	$۲۷۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
Submitting Vendor Data Book	۵	$۵۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
Electrical Bulk Items - Extension of Binak B/C Manifold	۱۰۲	$۱،۶۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
Tendering & Selection	۱۵	$۶۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۱۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
Manufacturing / Fabrication / Supply	۱۱۰	$۸۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۲
Final Inspection	۱۲	$۱۶۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
Delivery On Site	۷	$۴۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
Submitting Vendor Data Book	۵	$۸۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
Construction	۴۵۱	$۲۸۴،۰۷۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۸
Wellhead Facility and Flowline	۴۵۱	$۲۳۰،۰۹۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۸
Wellpad and Access Road	۲۳۶	$۱۲۰،۸۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۹
Access Road	۱۳۲	$۲۴،۱۶۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
Wellpad Access Road	۱۳۲	$۱۵،۷۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
Access Road Preparation	۲۵	$۷،۰۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۸
Filling and Compaction	۳۵	$۳،۱۴۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
Sub-Base Layer	۴۵	$۲،۳۵۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۶
Construction of Culvert and Bridge	۱۱۷	$۳،۱۴۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
bridge	۵۲	$۱،۴۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
Excavation	۸	$۱۴۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
lean concrete	۲	$۱۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۱
wall	۱۹	$۲۵۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۲
reinforcement	۱۳	$۲۸۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۳
form working	۲۵	$۱۴۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۷
concrete pouring	۳	$۳۳۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
protect stone	۵	$۷۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۵
Backfill	۳	$۷۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
culverts	۴۰	$۱،۷۲۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۶
pipeway culvert	۲۰	$۶۹۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۷
pipeway	۲۰	$۵۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۶
pipeline culvert	۲۰	$۵۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۶
Burn Pit Access Road	۳۶	$۸،۴۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۰
ROW Preparation	۲۰	$۵،۹۱۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۷
Filling and Compaction	۱۵	$۱،۶۹۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۱
Sub-Base Layer	۱۹	$۸۴۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۰
Wellpad	۲۳۶	$۹۶،۶۴۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۹

Month

Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

HIRGAN ENERGY

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
بسته های کاری سطح الارض

شرکت توسعه نیروی ایران

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Water Supply	۲۰	$۶،۷۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۲
Water Supply	۳۰	$۶،۷۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۲
Site Preparation	۴۵	$۱۹،۳۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۶
Site Preparation W007S	۶۵	$۱۹،۳۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۶
Civil Work	۳۸	$۴،۸۳۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۰
(Excavation and Soil Removal (Cellar	۳۰	$۳،۱۴۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
Installation of Conductor Pipe	۳۰	$۲۴۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۷
(Form Work (Above Cellar	۲۵	$۲۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۳
Armed Concrete	۳۱	$۱،۲۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۰
Surface Preparation	۱۳	$۷،۷۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۶
Gravel Paving	۲۰	$۷،۷۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۶
Mud Channel	۸۶	$۱۱،۵۹۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۵
Excavation	۴۰	$۱،۱۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۷
Soil Removal, Filling and Compaction of Mud Pit Area	۴۰	$۱،۷۴۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۶
Construction of Mud Pit's Walls	۶۰	$۴،۰۵۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۵
Supply & Installation sealling Layer	۱۵	$۳،۴۷۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۱
Backfill	۵	$۱،۱۶۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۱
Mud Pit	۱۱۱	$۳۱،۸۹۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۹
Soil Removal, Filling and Compaction of Mud Pit Area	۶۰	$۱۱،۱۶۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۷
Construction of Mud Pit's Walls	۴۵	$۶،۳۷۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۱
Supply & Installation sealling Layer	۳۵	$۱۴،۳۵۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۹
SepticTank	۴۳	$۳،۸۶۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۲
Excavation & Soil Transfer	۳۰	$۱،۱۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
Levelling	۱۳	$۱۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۹
Tank Supply	۳۰	$۱،۹۳۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
Tank Execution	۶	$۳۸۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
Backfilling & Compaction	۶	$۲۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۲
Burn Pit	۳۱	$۷،۷۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۶
Soil Removal, Triming ,Filling and Compaction of Burn Pit Area	۲۵	$۶،۱۸۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
Construction & Installation of Support	۳۰	$۳۸۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
Welding, Installation and Testing	۲۰	$۱،۱۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۶
Gasoil Pad	۱۷	$۲،۸۹۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
Excavation	۱۳	$۵۸۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
lean concrete	۲	$۸۷۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۱
Form work	۱۰	$۲۹۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
Armed Concrete	۳	$۱،۱۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
Helipad	۵۱	$۲،۳۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۲

Month

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Excavation & Soil Transfer	۳۰	$۲۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
levelling	۱۰	$۲۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۶
Lean Concrete	۳	$۳۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۹
Reinforced Work	۶	$۳۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۶
Formwork	۱۵	$۳۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۲
Main Concrete Pouring	۵	$۴۶۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۷
Backfilling & Compaction	۱۰	$۲۵۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۷
Paint Marking	۶	$۴۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۲
Wellhead Facility and Flowline	۲۷۴	$۱۰۱،۲۴۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
Civil, Structure & Architecture	۲۵۶	$۴۷،۵۸۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
Civil Work	۱۴۵	$۲۰،۹۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
Right of Way	۱۰	$۷،۳۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۸
(Steel Works (Wellhead Facilities	۱۵	$۴،۸۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۳
Well Pad Fencing	۴۰	$۳،۱۴۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۷
(… Out Door Post Works For Gantry (Fundation, Fencing	۱۰	$۲،۵۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
(…Out Door Post Works For Wellhead Post (Fundation, Fencir	۱۰	$۳،۱۴۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
Buildings	۱۶۸	$۲۰،۹۳۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۹
Construction of Guard House	۹۸	$۵،۸۶۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
Foundation	۲۴	$۱،۴۶۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۵
(Excavation & Soil Transfer (Removing of Vegetal Soil	۸	$۲۹۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۴
Levelling	۳	$۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۶
Lean Concrete	۲	$۱۴۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
Reinforced Work	۶	$۲۹۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۵
Formwork	۱۳	$۱۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۷
Main Concrete Pouring	۵	$۵۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۲
Backfilling & Compaction	۳	$۷۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۵
Structure	۲۹	$۲،۳۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
Structural Installation	۱۳	$۱،۱۷۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۱
Structural Painting	۱۰	$۴۶۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
Shop Fabrication of Steel Structure	۱۵	$۴۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۸
Steel Material Supply	۲۰	$۲۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۳
Architectural	۴۷	$۲،۰۵۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
Wall Execution	۲۵	$۱،۰۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
Roof Covering	۱۹	$۲۴۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۲
(Roof Execution (Block Joist, Concrete Pouring	۱۵	$۳۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
(Building Walkway (around Building	۱۵	$۱۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱

Month

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
(Joinery (Cornice, Façade, Plaster	۲	$۳۸۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
Construction of Switchgear	۱۵۳	$۸،۳۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۹
Foundation	۲۰	$۲،۰۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۷
(Excavation & Soil Transfer (Removing of Vegetal Soil	۶	$۴۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۸
Levelling	۳	$۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Lean Concrete	۲	$۲۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۲
Reinforced Work	۱۰	$۴۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲
Formwork	۶	$۱۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
Main Concrete Pouring	۵	$۸۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۴
Backfilling & Compaction	۳	$۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۷
Structure	۳۹	$۳،۳۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۶
Steel Material Supply	۱۵	$۱،۶۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۶
Shop Fabrication of Steel Structure	۱۵	$۶۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۲
Structural Installation	۱۰	$۶۷۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۲
Structural Painting	۱۵	$۳۳۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۶
Architectural	۱۲۳	$۲،۹۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۹
Wall Execution	۱۰	$۱،۴۳۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۱
Roof Covering	۸	$۳۴۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۹
(Roof Execution (Block Joist, Concrete Pouring	۷	$۴۴۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۶
(Building Walkway (around Building	۱۳	$۱۵۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۹
(Joinery (Cornice, Façade, Plaster	۱۰	$۵۵۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۶
(Construction of Outdoor Post (new Gantry	۴۱	$۶،۷۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۷
Foundation	۲۸	$۱،۶۷۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۱
(Excavation & Soil Transfer (Removing of Vegetal Soil	۱۰	$۳۳۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۶
Levelling	۶	$۳۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
Lean Concrete	۲	$۱۶۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۵
Reinforced Work	۹	$۳۳۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
Formwork	۱۰	$۱۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
Main Concrete Pouring	۵	$۶۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۸
Backfilling & Compaction	۳	$۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۱
Structure	۴۱	$۴،۰۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۷
Steel Material Supply	۲۵	$۲،۰۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
Shop Fabrication of Steel Structure	۱۹	$۸۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۵
Structural Installation	۱۳	$۸۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۲
Structural Painting	۱۵	$۴۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۷
(...,Civil Works(Paving,Gravel,Roads,Trench,Fence	۱۱	$۱،۰۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۲

Month

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary

Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Civil Works	۲۰	$۱،۰۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۲
Shelters	۴۱	$۵،۷۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۱
Diesel Generator Shelter	۳۴	$۴،۲۸۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۰
Fabrication	۳۱	$۲،۹۹۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۴
Installation	۳۱	$۱،۲۸۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰
Fire Fighting Shelter	۲۶	$۱،۴۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱
Fabrication	۳۱	$۹۹۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
Installation	۱۳	$۴۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۱
Flowline	۴۴	$۱۲،۱۴۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
Construction of Pipe Support	۴	$۱،۸۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۲
Construction of Pipe Support	۷	$۱،۸۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۲
Installation of Pipe Supports	۴	$۱،۸۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۴
Installation of Pipe Supports	۷	$۱،۸۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۴
Flowline Installation "۶	۲۱	$۷،۸۹۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
COLD CUT	۱۵	$۳۹۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
Material Handeling	۱۸	$۹۴۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۸
Fit-Up & Welding	۲۲	$۵،۲۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
Bending	۱۵	$۸۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۷
NDT	۱۵	$۵۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۷
Hydrostatic Test	۱۹	$۶۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۶
Pigging and Hydrostatic Test "۶	۲۵	$۶۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۶
Piping	۲۰	$۵،۰۶۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
Sweep Bend Installation	۱۰	$۲۵۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
(…Construction of Spools (Fit up, Welding, NDT	۱۵	$۱،۷۷۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۰
Valves, Fitting and Spools Installation and Hydrotest	۱۰	$۲،۷۸۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۸
Painting	۱۰	$۲۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
Mechanical	۷	$۶،۰۷۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
Fuel Oil Storage Drum	۱۰	$۳،۰۳۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
Potable Water Tank	۱۰	$۳،۰۳۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
Instrument Works	۱۰	$۵،۰۶۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
Devices Installation and Piping Connecton	۱۵	$۵،۰۶۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
Electrical	۲۱	$۲۰،۲۴۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۸
Over Head line	۱۰	$۱۰،۹۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۸
Wellhead Electrical Equipment	۱۵	$۲،۲۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
(Outdoor Post (new Gantry	۱۰	$۵،۴۶۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
(Outdoor Post (Wellhead Post	۱۰	$۱،۶۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
Pre-commissioning	۵	$۵،۰۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۲

Month

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary

Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

HIRGAN ENERGY

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
بسته های کاری سطح الارض

شرکت توسعه نیروی ایران

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Pre-commissioning	۷	$۴،۵۵۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
(Ready for Comm. Certificate (RFCC	۴	$۵۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۱
Safety & Fire Fighting	۷	$۲،۳۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
Safety & Fire Fighting	۱۰	$۲،۳۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
(Job Site HSE Supervision (Surface	۳۳۳	$۴۶۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۶
(Job Site HSE Supervision (Surface	۵۰۰	$۴۶۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۶
Commissioning , Startup & Handover	۵۲	$۲،۹۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۸
Commissioning	۱۶	$۸۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۵
Materials & Utilities Ready for Commissioning	۳	$۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۵
Receiving Facilities Ready for Commissioning	۲	$۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۷
Permits Obtained for Commissioning	۱۰	$۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۸
Integrated Commissioning	۲	$۷۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۰
(Ready for Startup Certificate (RFSU	۱۵	$۴۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۵
Startup & Performance Test	۱۴	$۱،۱۹۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۲
Startup & Performance Test Run	۳	$۹۵۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۸
(Start of Production (SOP	۱۵	$۲۳۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۲
Handover	۲۲	$۸۹۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۸
Compiling & Submitting Final Documentation	۲۰	$۲۶۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
Training of Operator's Personnel	۲	$۳۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
(Provisional Acceptance Certificate (PAC	۱۵	$۲۶۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۸
Manifold Extension	۱۹۰	$۵۳،۹۷۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۹
Civil, Structure & Architecture	۵۸	$۱۰،۷۹۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۷
Site Preparation	۳۰	$۵۴۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
Fence & Gate & Civil Works & Roads	۱۵	$۱،۰۷۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۵
Foundation	۲۰	$۴،۸۵۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۵
Steel Works	۳۰	$۴،۳۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۷
Mechanic	۱۳	$۲،۱۵۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲
Installation Pump	۲۰	$۲،۱۵۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲
Piping	۴۲	$۱۱،۶۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۹
Pipe sleeper/Support	۱۰	$۳،۴۸۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۳
Material Handeling	۱۰	$۲،۳۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۱
Fit-Up & Welding	۱۰	$۳،۴۸۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۱
Hydrotest	۱۰	$۱،۱۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۹
NDT	۷	$۱،۱۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
Control & Instrumentation	۱۰۴	$۲۵،۹۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۰
Tray&Ladder	۳۸	$۱،۵۵۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
Tray & Ladder	۲۰	$۹۳۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰

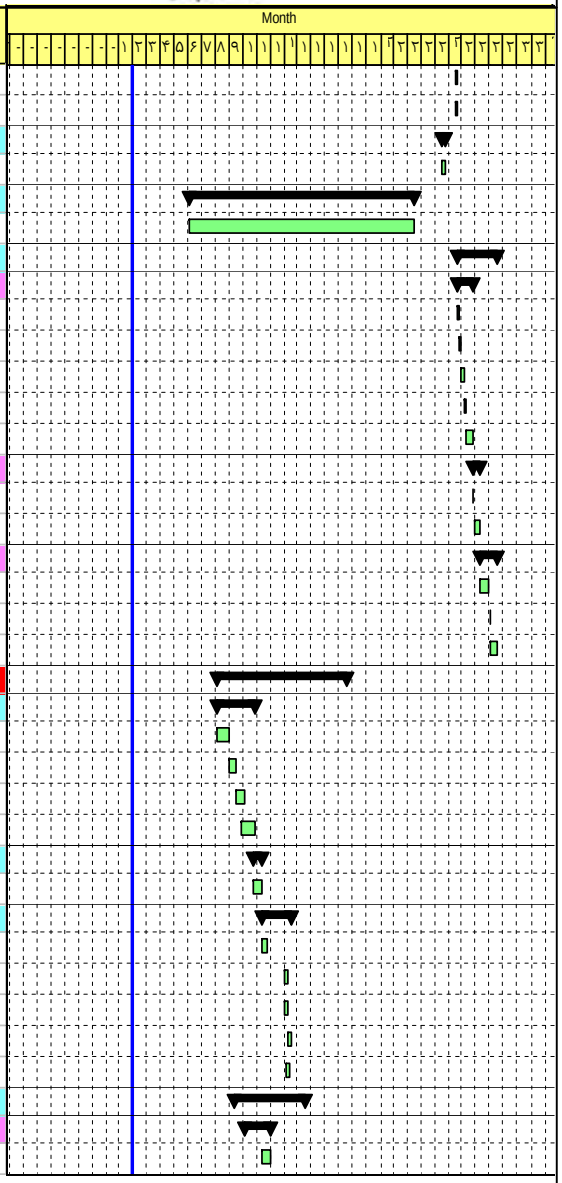

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
support installation for cable trays	۲۰	$۶۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۵
CONDUIT	۱۱	$۵۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
Conduit	۱۵	$۵۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
Junction Boxes	۱۰	$۲،۵۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۸
(Digital (on/off	۱۵	$۱،۹۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۱
Analog	۶	$۶۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۸
CABLING	۱۵	$۵،۷۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۲
Cable Laying	۱۰	$۲،۸۵۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۵
Cable Arragement	۵	$۸۵۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۰
(Test after cabling(continuity Test	۴	$۲۸۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
Cable Marking&Tag	۴	$۵۷۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۸
Connection & Glanding	۴	$۱،۱۴۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۲
DCS System	۱۲	$۳،۳۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۵
marshaling cabinets	۶	$۲،۵۶۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
operator desks	۳	$۴۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۸
engineering sations	۳	$۲۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
printers	۲	$۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
operator stations	۳	$۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۵
ESD System	۹	$۳،۳۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۶
marshaling cabinets	۶	$۲،۵۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۶
operator desks	۳	$۴۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
engineering sations	۳	$۲۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۲
printers	۲	$۶۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۴
operator stations	۳	$۶۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۶
F & G System	۱۷	$۳،۳۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۰
F & G system panel	۷	$۱،۳۴۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۶
operator station & printer	۴	$۵۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۱
engineering station	۴	$۵۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۵
operator stations	۴	$۲۳۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۹
Gas detectors	۴	$۳۳۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۲
(manual alarm call points (MAC	۴	$۱۶۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
smoke detectors	۴	$۲۶۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۰
FIELD INSTRUMENT	۹۹	$۵،۴۴۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۹
Calibration	۱۲	$۱،۲۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۹
Calibration	۱۹	$۱،۲۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۹
Installation	۹۶	$۴،۱۸۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۶

Month

Actual Work | Remaining Work | Critical Remaining Work | Summary | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
FE - FLOW ELEMENTS (ORIFICE PLATE & FLANGE) Orifice	۱۰	$۵۴۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۹
CC - CORROSION COUPON	۱۰	$۵۴۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۹
CP/CT - CORROSION PROBE / TRANSMITTER WITH DATA	۱۰	$۳۹۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۹
PG - PRESSURE GAUGE	۱۰	$۴۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۹
PT - SMART PRESSURE TRANSMITTER	۱۰	$۲۹۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۹
FT - SMART DIFF. (FLOW) PRESSURE TRANSMITTER	۱۰	$۲۴۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۹
(FCV & PCV (flow control valve -Pressure awitch valve	۱۰	$۵۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۹
On/Off Valve	۱۰	$۵۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۶
PRESSURE SAFETY VALVE	۱۰	$۵۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۶
TT - SMART TEMPERATURE TRANSMITTER	۱۰	$۲۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۶
(Job Site HSE Supervision (Surface	۱۰۸	$۱۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۰
(Job Site HSE Supervision (Surface	۱۶۰	$۱۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Mechanical Completion & Pre-commissioning	۸	$۲،۶۹۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰
Mechanical Completion & Pre-commissioning	۱۰	$۲،۶۹۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰
Commissioning, Startup & Handover	۵۳	$۷۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۹
Startup & Performance Test	۱۲	$۲۸۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
Startup & Performance Test Run	۵	$۲۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
(Start of Production (SOP	۱۵	$۵۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
Handover	۲۰	$۲۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۹
Training of Operator's Personnel	۵	$۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۶
(Provisional Acceptance Certificate (PAC	۳	$۸۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۹
Compiling & Submitting Final Documentation	۲۰	$۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
Commissioning	۲۲	$۲۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
Materials & Utilities Ready for Commissioning	۴	$۱۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۳
Receiving Facilities Ready for Commissioning	۳	$۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۶
Permits Obtained for Commissioning	۱۰	$۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶
Integrated Commissioning	۳	$۱۶۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۸
(Ready for Startup Certificate (RFSU	۱۵	$۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
Package 07-Workover # 14	۳۲۲	$۵۰۳،۶۶۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۷
ENGINEERING	۲۶۷	$۱۳،۳۸۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۳
Basic Design Endorsement	۱۷	$۶۶۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
Endorsement Report For Basic Design & Scope of Work	۳۰	$۶۶۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
Value Engineering	۲۹	$۴۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
Value Engineering Study Report	۴۴	$۴۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
Detail Design	۲۶۷	$۷،۳۶۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
Process	۵۲	$۳۵۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
Drawing/Diagram	۲۲	$۲۴۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۳

Month

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
P&ID for Diesel Oil Drum- BK14	۳۵	$۱۲۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۳
P&ID for Potable Water Tank - BK14	۳۵	$۱۲۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۳
List	۳۰	$۵۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Line List - BK14	۴۴	$۵۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Data Sheet	۴۰	$۵۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
Process Data Sheets For Instrument Devices - BK14	۳۰	$۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۲
Process Data Sheets For Fuel Oil Storage Drum of Well Pads	۳۰	$۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
Process Data Sheets For Potable Water Tank of Well Pads	۳۰	$۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
Mechanical	۶۴	$۴۹۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
Basis/Criteria	۳۳	$۵۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
Mechanical Design Criteria	۵۴	$۵۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
Specification	۵۳	$۸۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
Specification For Pressure Vessels	۵۴	$۴۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
Specification For Atmospheric Above Ground Welded Steel Tanks	۷۹	$۴۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
Data Sheets	۳۰	$۱۳۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
Data Sheets For Fuel Oil Storage Drum of Well Pads	۳۵	$۶۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
Data Sheets For Potable Water Tank of Well Pads	۳۵	$۶۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
Drawing/Diagram	۲۲	$۲۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۶
Standard Detail Drawing For Pressure Vessels and Heat Exchang	۱۴	$۱۰۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۶
Standard Detail Drawing For Storage Tanks	۱۴	$۱۰۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۶
HVAC/Plumbing	۲۴۶	$۴۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
Basis/Criteria	۲۴	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۳
HVAC & Plumbing Design Criteria	۴۰	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۳
Specification	۴۲	$۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
Specification For HVAC Equipment	۶۴	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
Specification For Duct Work & Pipe Work	۶۴	$۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
Calculation	۹۴	$۹۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
HVAC Calculation Note For Switchgear Building - BK14	۳۵	$۴۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
HVAC Calculation Note For Security Building - BK14	۳۵	$۴۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
Data Sheets	۲۵	$۴۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Data Sheets For Main HVAC Equipment - BK14	۳۵	$۴۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Drawing/Diagram	۱۴۳	$۲۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Standard Drawing For HVAC & Plumbing	۱۴	$۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
Symbol & Legend For HVAC & Plumbing	۴۸	$۲	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۶
HVAC System Layout For Switchgear Building - BK14	۳۵	$۵۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۰
HVAC System Layout For Security Building - BK14	۳۵	$۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۵
Plumbing & Sewage Piping Layout For Switchgear Building - BK14	۳۵	$۵۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۴

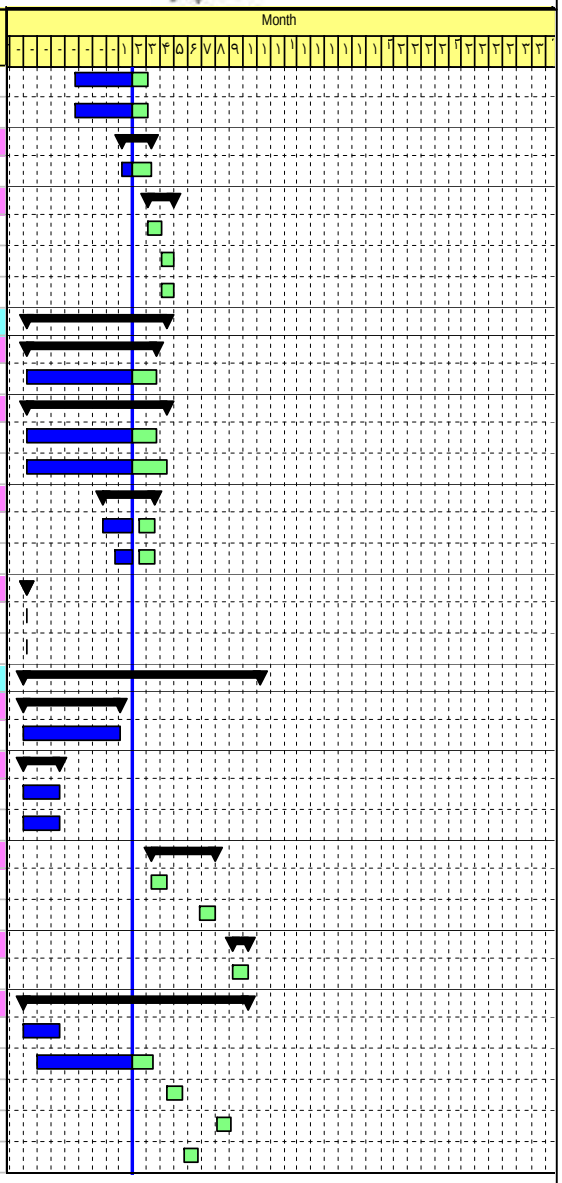

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Plumbing & Sewage Piping Layout For Security Building - BK14	۳۵	$۵۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۰
MTO	۲۰	$۴۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
MTO For Building HVAC & Plumbing Systems - BK14	۳۰	$۴۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
Piping	۳۰	$۳۵۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۹
Basis/Criteria	۲۴	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
Piping Design Criteria	۳۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
Specification	۲۸	$۱۳۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Color Coding and Marking	۳۹	$۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Transportation, Handling, Storage of pipes	۳۹	$۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Metallic Pipes	۳۹	$۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Fittings, Flanges, Gaskets and Bolts	۳۹	$۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۶
Specification For Painting	۳۹	$۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۴
(Specification For Lining (Internal Protection of Equipment by Pair	۳۹	$۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Material Requirements in Sour service	۳۹	$۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Manual Valves	۳۹	$۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Plant Piping Systems Pressure Testing	۳۹	$۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Welding of Plant Piping System	۳۹	$۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Flexibility Analysis	۳۹	$۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Pipe Support	۳۹	$۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Piping Cleaning and Flushing	۳۹	$۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۴
Drawing/Diagram	۸	$۱۰۵	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
Standard Pipe Support Drawings	۱۴	$۱۰۵	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
MTO	۴	$۱۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۹
MTO For Pipes - BK14	۷	$۱۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۹
Electrical	۱۳۱	$۱،۷۸۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۷
Basis/Criteria	۳۳	$۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲
Electrical System Design Criteria	۵۴	$۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲
Specification	۳۵	$۱۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۷
Specification For LV Switchgear & Motor Control Centers	۴۹	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Specification For MV Switchgear	۴۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Specification For UPS System	۴۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Specification For Transformers	۴۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۷
Specification For DC Charger	۴۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۶
Specification For Earthing & Lightning System	۴۹	$۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
Specification For Lighting & Small Power System	۴۹	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
Specification For Bulk Materials	۴۹	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۶

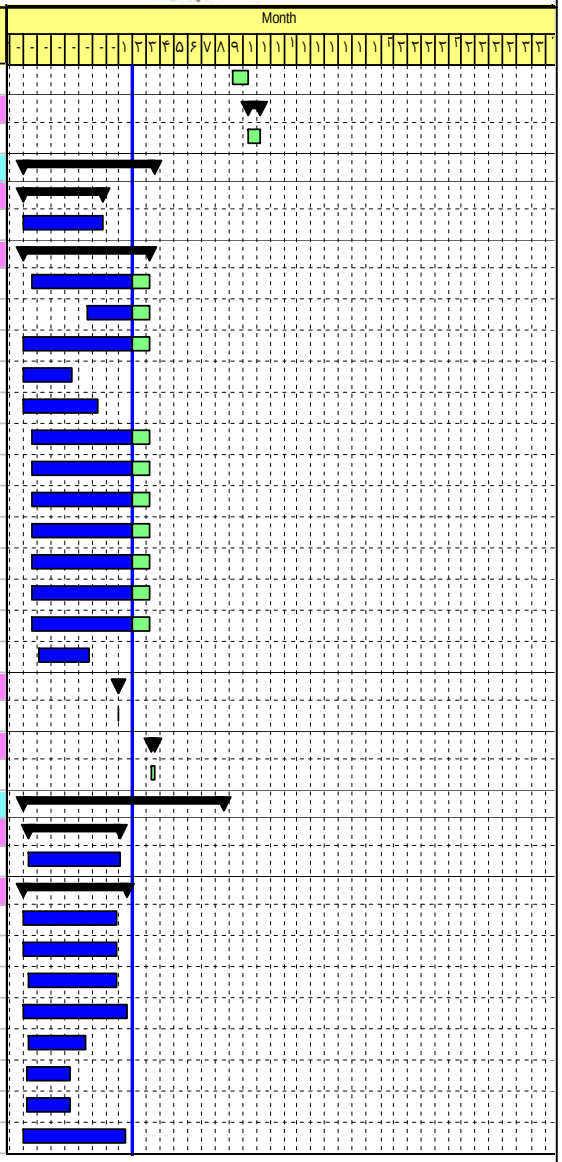

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Specification For Diesel Generator	۴۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
Specification For LV Induction Motors	۴۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Specification For Electrical Requirements of Packaged Units	۴۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
Specification For Capacitor Bank	۴۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Specification For Distribution & Lighting Panels	۴۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
Specification For Power & Control Cables	۴۹	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Specification For Cathodic Protection System	۴۹	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۶
Specification For MV Induction Motors	۴۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Specification For NGR	۴۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Specification For Overhead Transmission Lines	۴۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Calculation	۱۲۸	$۱۹۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۷
Calculation Note For Lighting System of Well Pads Switchgear Bu	۵۰	$۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۶
Calculation Note For Lighting System of Well Pads Security Buildi	۵۰	$۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۶
Calculation Note For Lighting System of Well Pads Area	۵۵	$۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
Calculation Note For Cable Sizing of Well Pads	۵۵	$۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۳
Calculation Note For UPS System of Well Pads	۵۵	$۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۷
Calculation Note For Earthing & Lightning System of Well Pads	۵۵	$۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۳
Calculation Note For Diesel Generator Sizing of Well Pads	۵۵	$۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
Calculation Note For DC Charger of Well Pads	۵۵	$۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
Calculation Note For LV Capacitor Bank of Well Pads	۴۰	$۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۳
Calculation Note For 11 KV Over Head Line Sag and Tension	۴۰	$۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۳
Calculation Note For 33 KV Over Head Line Sag and Tension	۴۰	$۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۳
Data Sheets	۱۰۸	$۱۶۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
Data Sheets For UPS of Well Pads	۳۰	$۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
Data Sheets For DC Charger of Well Pads	۳۰	$۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۳
Data Sheets For Diesel Generator of Well Pads	۳۰	$۱۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۳
Data Sheets For LV Capacitor Bank of Well Pads	۳۰	$۱۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۹
Data Sheets For LV Switchgear of Well Pads	۳۰	$۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۹
Data Sheets For Power & Control Cables of Well Pads	۳۰	$۱۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۹
Data Sheets For Power Transformers of Well Pads	۳۰	$۱۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۹
Data Sheets For Distribution & Lighting Panels of Well Pads	۳۰	$۱۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Data Sheets For 11 KV Over Head Line Equipment	۲۵	$۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Data Sheets For 33 KV Over Head Line Equipment	۲۵	$۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Drawing/Diagram	۱۱۵	$۴۷۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۰
Electrical Legend and Symbols	۴۰	$۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۷
Typical Installation Details & Notes For Earthing and Lightning Prc	۱۴	$۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۷

Month

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary

Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Typical Installation Details & Notes For Lighting System	۱۴	$۱۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۳
Typical Installation Details & Notes For Power System	۱۴	$۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۷
Installation Details & Notes For Cathodic Protection Systems	۵۰	$۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Typical Installation Details For Over Head Line Equipment	۱۴	$۸	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۶
Installation Detail & Notes for Connection OHL to Gantries for We	۴۵	$۳۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۳
Electrical Typical Schematic Diagrams For LV Panels of Well Pad:	۱۴	$۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۸
Control Logic Diagram For LV Incomers of Well Pads	۴۵	$۱۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۳
Earthing Layout For Electrical Tower (Gantry) of Well Pads	۴۵	$۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۷
Cable Route Layout For Electrical Tower (Gantry) of Well Pads	۴۵	$۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۰
Overall Single Line Diagram of Well Pads	۴۵	$۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۳
Single Line Diagram For LV Switchgear of Well Pads	۴۵	$۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۳
Single Line Diagram For LV Power Distribution Panel of Well Pad	۴۵	$۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۲
Single Line Diagram For DC Charger of Well Pads	۴۵	$۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۳
Single Line Diagram For Capacitor Banks of Well Pads	۴۵	$۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۳
Interconnection Wiring Diagram of Well Pads	۴۵	$۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۲
Area Lighting & Small Power Layout of Well Pads of Well Pads	۴۰	$۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۹
Lighting & Small Power Layout For Switchgear Building of Well P:	۴۵	$۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۶
Lighting & Small Power Layout For Security Building of Well Pads	۴۵	$۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۰
Area Electrical Cable Route & Section Layout of Well Pads	۳۰	$۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۴
Electrical Cable Route & Section Layout For Switchgear Building	۳۰	$۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۴
Electrical Equipment Arrangement Layout For Switchgear Building	۳۰	$۲۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
Earthing & Lightning Layout for well pads	۳۰	$۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
۱۱KV Over Head Line Study Report	۴۴	$۴۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۳
۳۳KV Over Head Line Study Report	۴۴	$۴۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۰
List	۵۸	$۵۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۷
Electrical Load List of Well Pads	۴۰	$۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
Electrical Power & Control Cable List of Well Pads	۵۰	$۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۷
Cable Drum Schedule and Cutting List of Well Pads	۵۰	$۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۷
Report	۷۰	$۳۳۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۸
Electrical Network (Load Flow, Motor Starting & Short Circuit) Stu	۵۴	$۹۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
Relay Coordination & Setting Study Report of Well Pads	۵۴	$۹۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۸
۱۱KV Over Head Line Study Report	۴۴	$۷۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۳۳KV Over Head Line Study Report	۴۴	$۷۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۳۰
MTO	۱۰۳	$۴۳۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۷
MTO For Transmission Over Head Line - BK14	۷	$۱۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۰
MTO For Lighting & Small Powers - BK14	۷	$۶۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۷

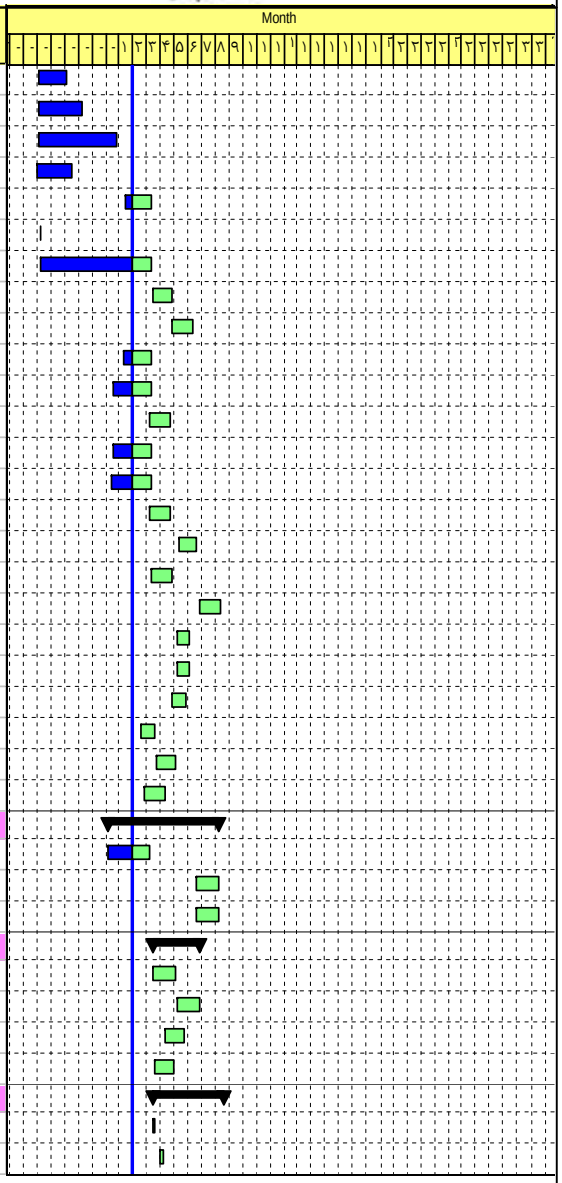

© Primavera Systems, Inc.

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
بسته های کاری سطح الارض

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
MTO For Power & Control Cables - BK14	۷	$۶۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۴
MTO For Tray/Ladder and Accessories - BK14	۷	$۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۱
MTO For Electrical Bulk Items - BK14	۷	$۶۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۷
MTO For Earthing & Lightning Systems - BK14	۷	$۶۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۳
Architecture	۱۶۳	$۷۷۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
Basis/Criteria	۴۷	$۱۵۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
Architectural Design Criteria	۷۴	$۱۵۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
Specification	۲۵	$۱۹۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Buildings General Specification	۴۴	$۱۹۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Drawing/Diagram	۱۴۴	$۱۸۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۷
Architectural Drawing For Diesel Generator Shelter of Well Pads	۵۴	$۶۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۶
Architectural Drawing For Switchgear Building of Well Pads - BK-	۴۴	$۶۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Architectural Drawing For Security Building of Well Pads - BK-14	۴۴	$۶۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۷
MTO	۲۴	$۲۳۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
MTO For Architectural Works - BK14	۳۵	$۲۳۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
Civil	۸۱	$۷۴۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۵
Basis/Criteria	۵۸	$۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Civil Design Criteria	۶۴	$۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Design Criteria for Sewerage & Drainage	۴۴	$۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Design Criteria for Road and Paving	۴۴	$۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Specification	۵۸	$۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
Specification For Civil Works	۷۹	$۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
Specification For Road & Paving	۶۴	$۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Specification For Fence & Gate	۶۴	$۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۵
Specification For Earth Work	۶۴	$۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Specification For Sewerage & Drainage	۶۴	$۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۱
Specification For Geological & Geotechnical Survey	۴۴	$۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Drawing/Diagram	۶۸	$۵۶۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۳
Standard Drawing For Civil Works	۳۰	$۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۹
Standard Drawing For Slope Protection Details	۶۴	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
Standard Drawing For Roads	۶۴	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Standard Drawing For Electrical Cable Trench	۶۴	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
Standard Drawing For Manholes	۶۴	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Standard Drawing For Catch Basins	۶۴	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Standard Drawing For Sewerage & Drainage Details	۳۰	$۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Standard Drawing For Civil Underground Crossings	۳۸	$۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۶

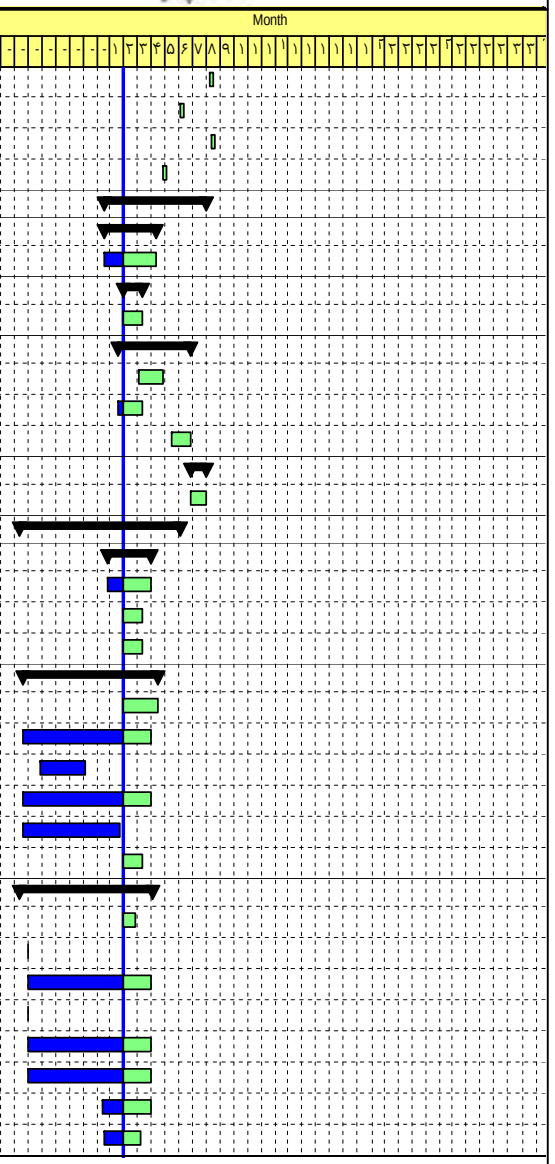

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Standard Drawing For Fence & Gate Details	۶۴	$۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۹
Standard Drawing For Concrete Continues Weight	۳۸	$۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷
Standard Drawing For Major Floodway Crossing	۳۸	$۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
Standard Drawing For Culvert & Details	۳۸	$۱۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۴
Standard Drawing For Valve Box	۳۸	$۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۲
Standard Drawing For Fire Hydrant Pit	۳۸	$۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
Standard Drawing For Pavings	۳۸	$۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
Standard Drawing For Earth Pit	۳۸	$۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
Standard Detail For Pipe Bedding	۵۰	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
Standard Details of Miscellaneous Items	۵۰	$۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
BINAK Oil Field Project Overall Well Location/Facilities Layout	۳۰	$۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۹
Civil and Structural drawings - BK14	۳۰	$۱۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۳
General Civil Layout - BK14	۳۰	$۱۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۳
Rough Grading Plans -BK14	۳۰	$۱۵۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۳
Report	۶	$۹۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۴
Site Visit Report (Civil Work) - BK14	۱۰	$۹۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۴
MTO	۴۲	$۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۵
MTO For Civil Works - BK14	۶۴	$۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۵
Structure	۱۱۷	$۹۸۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۸
Basis/Criteria	۳۸	$۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Structural Design Criteria	۶۴	$۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Design Criteria For Steel Structure	۴۴	$۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Design Criteria For Load & Forces	۴۴	$۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Specification	۶۰	$۸۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Specification For Concrete Work	۶۴	$۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Specification For Storage Tank Foundation	۳۸	$۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۸
Specification for Fabrication of Steel Structures	۶۴	$۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۹
Specification For Grouting	۶۴	$۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۸
Specification for Erection of Steel Structures	۶۴	$۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۹
Specification for Fireproofing	۶۴	$۲۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۵
Specification For Steel Structural Works	۳۷	$۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۵
Drawing/Diagram	۱۱۳	$۶۳۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۱
Standard Drawing For Fire Proofing	۶۴	$۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۸
Standard Drawing For Anchor Bolts	۶۴	$۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۳
Standard Drawing For Steel Stairs	۶۴	$۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Standard Drawing For Operating Platform	۳۸	$۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۱

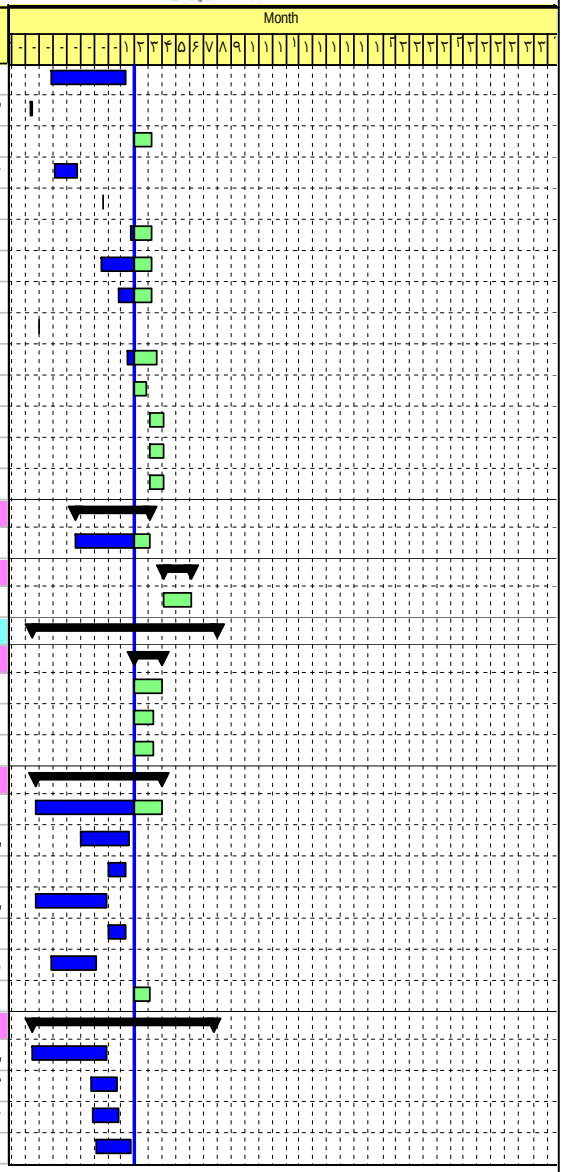

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Standard Drawing For Handrail	۳۸	$۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۰
Standard Drawing For Insert Plates in Concrete	۳۸	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۴
Standard Details For Ladder & Safety Cage	۶۴	$۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۷
Standard Drawing For Lighting pole foundation Plan & Details	۳۸	$۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
General Notes - Steel Structures	۳۸	$۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۱
General Notes - Reinforced Concrete Structures	۳۸	$۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۷
Standard Drawing For Structural Built-up Sections	۴۴	$۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Standard Drawing For Steel Flooring, Grating and Chequered Pla	۴۴	$۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۳
Concrete Reinforcement Shape Code	۴۴	$۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Standard Drawing For Septic Tank	۴۴	$۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Fuel Oil Storage Drum Detail Drawing For Well Pads - BK-14	۳۰	$۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
Foundation Drawing For Security Building For Well Pads - BK-14	۴۴	$۶۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۵
Structural Drawing For Security Building For Well Pads - BK-14	۴۴	$۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۷
Foundation Drawing For Switchgear Building For Well Pads - BK-	۴۴	$۶۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۵
Structural Drawing For Switchgear Building For Well Pads - BK-14	۴۴	$۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۷
Foundation Drawing For Potable Water Tank For Well Pads - BK-	۴۴	$۶۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۲
Foundation Drawing For Diesel Generator Shelter For Well Pads	۴۴	$۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۸
Structural Drawing For Diesel Generator Shelter For Well Pads -	۴۴	$۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۱
MTO	۴	$۲۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۸
MTO For Structural Works - BK14	۷	$۲۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۸
General	۷۳	$۱،۴۷۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲
Geotechnic	۶۴	$۱،۱۸۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Procedure/Plan	۲۸	$۹۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۳
Geotechnical Investigation Plan for Well Pads	۴۴	$۹۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۳
Report	۲۵	$۱،۰۸۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Geotechnical Investigation Report - BK14	۴۴	$۱،۰۸۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Survey	۲۹	$۱۴۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۴
Drawing/Diagram	۲۹	$۱۴۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۴
Over Head Line Plan and Profile - BK14	۴۶	$۱۴۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۴
QC/QA	۷۳	$۱۴۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲
QC Management	۷۳	$۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۲
Project Audit Procedure	۴۴	$۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Specification For Final Data Book (FDB) Requirements	۴۴	$۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Non Conformance Control Procedure	۳۶	$۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۷
Corrective Action Procedure	۳۶	$۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۲
Material Reciving, Storage, Handling Procedure	۳۹	$۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۷

Month

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary

Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Packing, Marking, Transportation Procedure	۳۹	$۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Criticality Assessment Procedure	۳۹	$۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Project Quality Plan	۴۴	$۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Technical Query Procedure	۴۴	$۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
QC General Document	۴۱	$۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
(Quality Control Plan (QCP	۳۹	$۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification for Welding Procedure	۴۴	$۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
(Heat Treatment Procedure (Pre Heating , PWHT	۴۴	$۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Welder Performance Qualification Test (WQT) Procedure	۴۴	$۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
NDT Procedure	۴۴	$۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Surface Preparation and Coating/Painting Procedure	۴۴	$۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Control of Inspection Measuring and Test Equipment Procedure	۴۴	$۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
QC Discipline Document	۵۴	$۱۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Piping	۲۵	$۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
ITP For Piping Works	۴۴	$۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
(PIPING PWPS (Preliminary Welding Procedure Specificatio	۴۴	$۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
(PIPING WPS (Welding Procedure Specification	۴۴	$۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
(PIPING PQR (Procedure Qualification Record	۴۴	$۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
PIPING PWPS (Preliminary Welding Procedure Specificatior	۴۴	$۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
PIPING WPS (Preliminary Welding Procedure Specification)	۴۴	$۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
PIPING PQR (Procedure Qualification Record) for Repair W	۴۴	$۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Field Joint Coating Procedure For Pipeline	۴۴	$۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Pressure Test Procedure	۴۴	$۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
.Telecomm	۲۵	$۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
ITP For Telecommunication Installation	۴۴	$۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Safety	۲۵	$۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
ITP For Safety Installation	۴۴	$۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Architectural	۲۵	$۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
ITP For Architectural Works	۴۴	$۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Mechanical	۲۵	$۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
ITP For Mechanical Installation	۴۴	$۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Structure	۲۵	$۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
ITP For Steel Structural Works	۴۴	$۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
(Steel Structure WPS (Welding Procedure Specification	۴۴	$۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
(Steel Structure PQR (Procedure Qualification Record	۴۴	$۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Steel Structure WPS (Welding Procedure Specification) For I	۴۴	$۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲

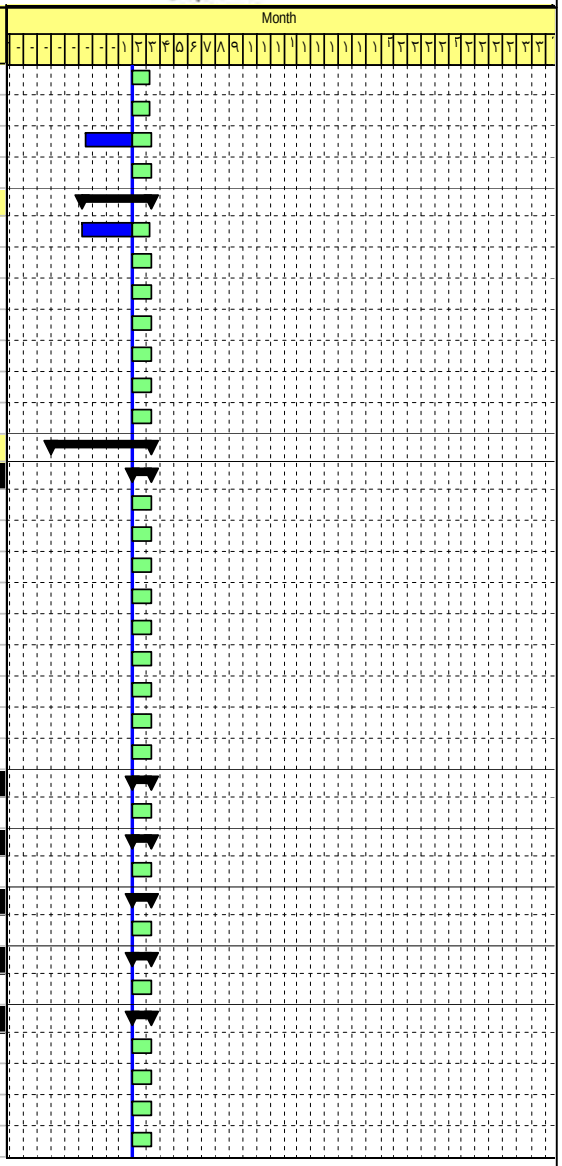

© Primavera Systems, Inc.

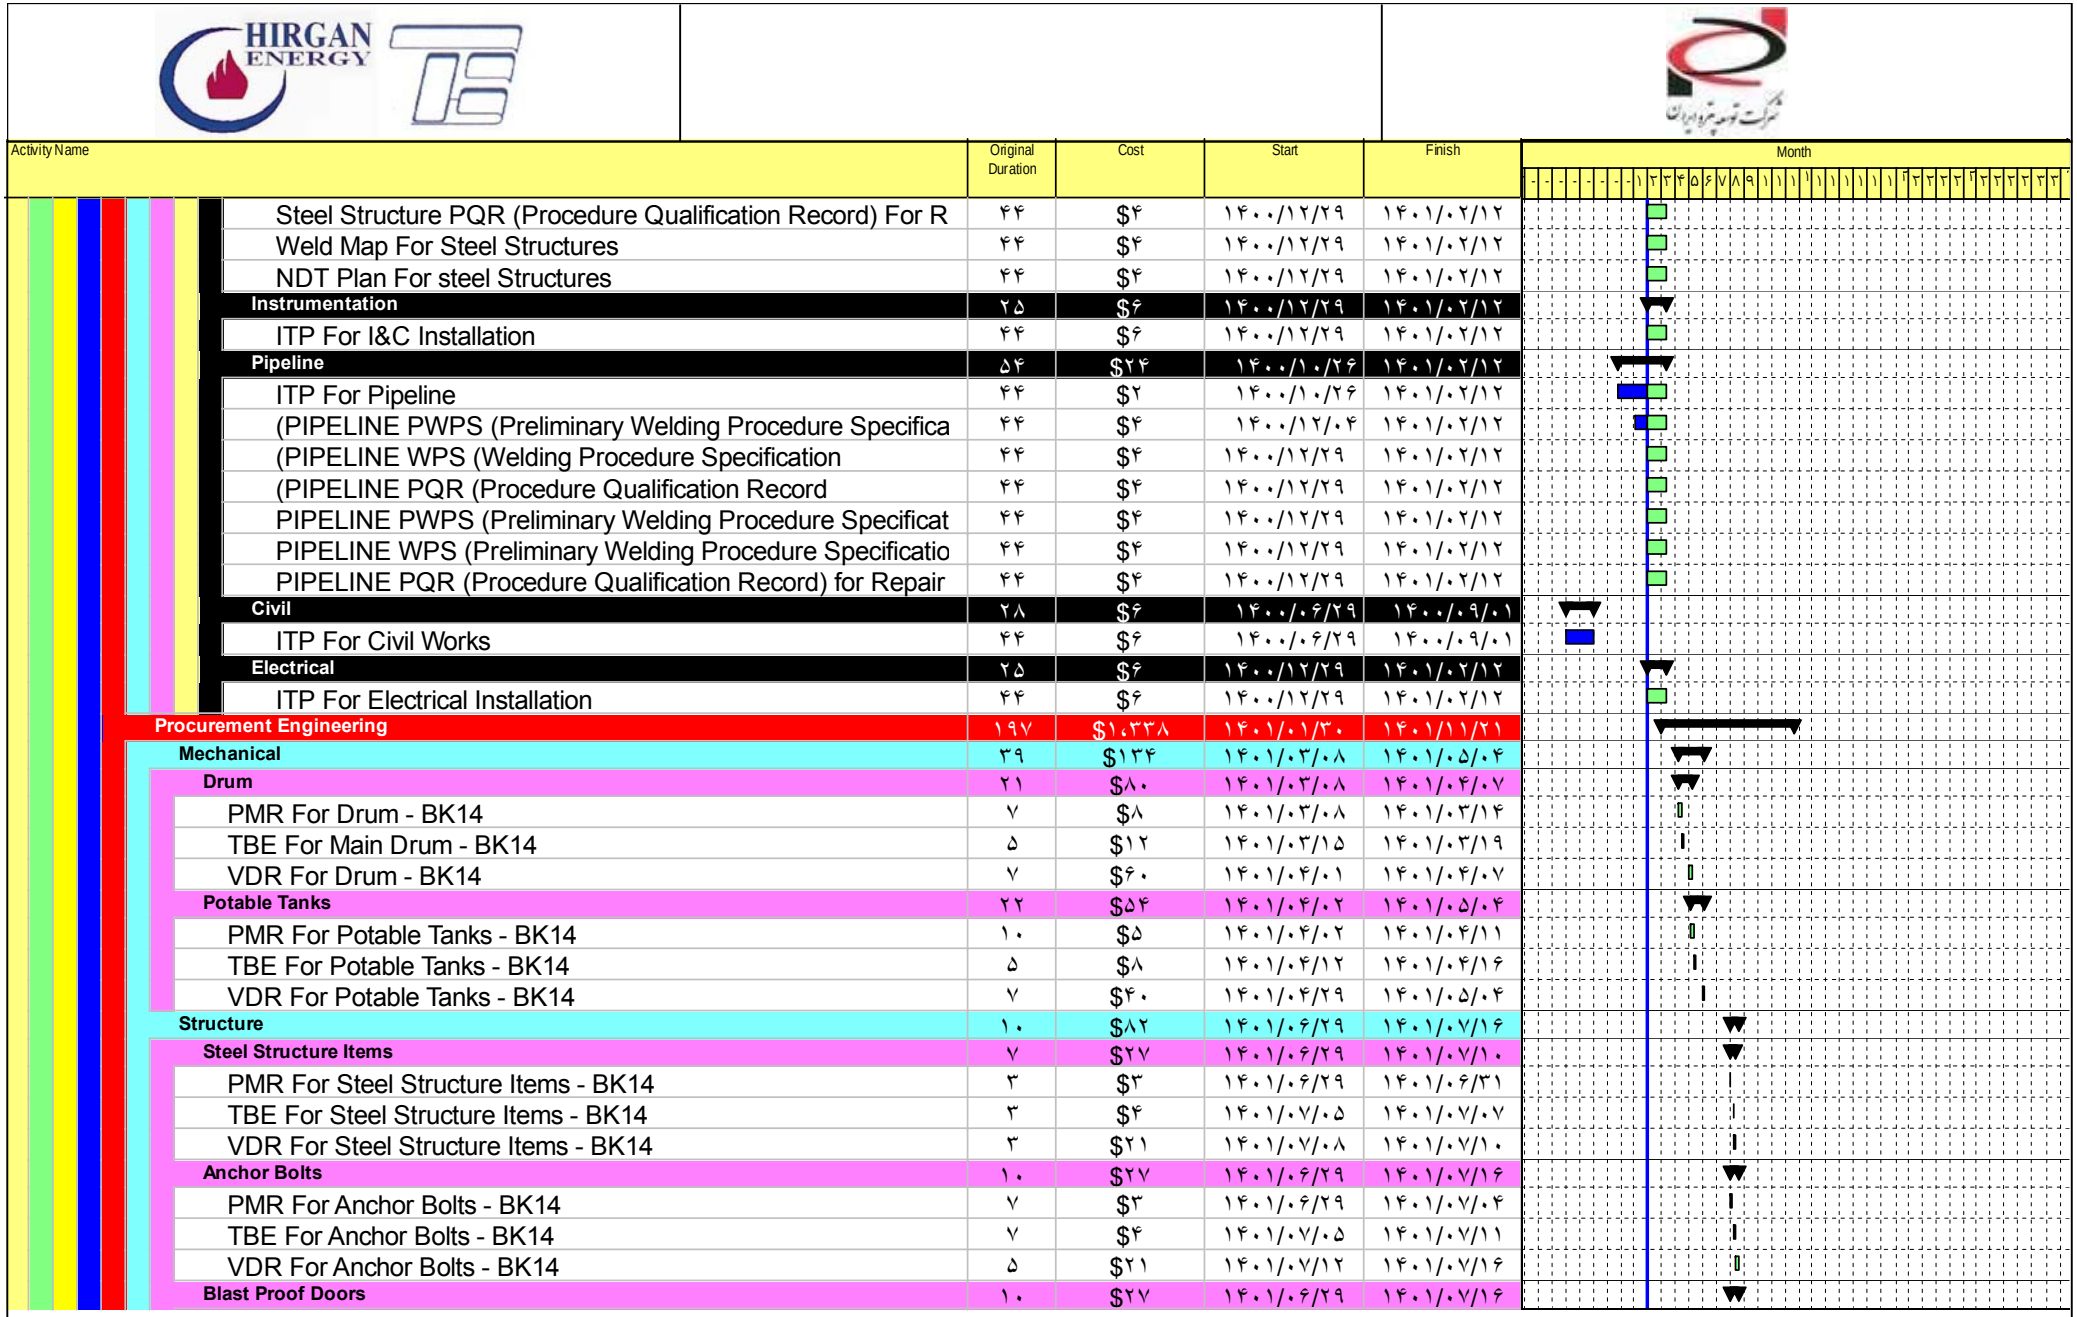

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Steel Structure PQR (Procedure Qualification Record) For R	۴۴	$۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Weld Map For Steel Structures	۴۴	$۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
NDT Plan For steel Structures	۴۴	$۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Instrumentation	۲۵	$۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
ITP For I&C Installation	۴۴	$۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Pipeline	۵۴	$۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
ITP For Pipeline	۴۴	$۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
(PIPELINE PWPS (Preliminary Welding Procedure Specifica	۴۴	$۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
(PIPELINE WPS (Welding Procedure Specification	۴۴	$۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
(PIPELINE PQR (Procedure Qualification Record	۴۴	$۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
PIPELINE PWPS (Preliminary Welding Procedure Specificat	۴۴	$۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
PIPELINE WPS (Preliminary Welding Procedure Specificatio	۴۴	$۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
PIPELINE PQR (Procedure Qualification Record) for Repair	۴۴	$۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Civil	۲۸	$۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۱
ITP For Civil Works	۴۴	$۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۱
Electrical	۲۵	$۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
ITP For Electrical Installation	۴۴	$۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Procurement Engineering	۱۹۷	$۱،۳۳۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۱
Mechanical	۳۹	$۱۳۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۴
Drum	۲۱	$۸۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۷
PMR For Drum - BK14	۷	$۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۴
TBE For Main Drum - BK14	۵	$۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۹
VDR For Drum - BK14	۷	$۶۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۷
Potable Tanks	۲۲	$۵۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۴
PMR For Potable Tanks - BK14	۱۰	$۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۱
TBE For Potable Tanks - BK14	۵	$۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۶
VDR For Potable Tanks - BK14	۷	$۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۴
Structure	۱۰	$۸۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۶
Steel Structure Items	۷	$۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۰
PMR For Steel Structure Items - BK14	۳	$۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
TBE For Steel Structure Items - BK14	۳	$۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۷
VDR For Steel Structure Items - BK14	۳	$۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۰
Anchor Bolts	۱۰	$۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۶
PMR For Anchor Bolts - BK14	۷	$۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۴
TBE For Anchor Bolts - BK14	۷	$۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۱
VDR For Anchor Bolts - BK14	۵	$۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۶
Blast Proof Doors	۱۰	$۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۶

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
PMR For Blast Proof Doors - BK14	۷	$۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۴
TBE For Blast Proof Doors - BK14	۷	$۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۱
VDR For Blast Proof Doors - BK14	۵	$۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۶
Electrical	۱۴۸	$۹۷۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
UPS System	۳۵	$۷۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
PMR For UPS System - BK14	۷	$۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۸
TBE For UPS System - BK14	۲۰	$۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۷
VDR For UPS System - BK14	۷	$۵۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
Transformers	۳۳	$۷۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۱
PMR For Transformers - BK14	۷	$۷	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۵
TBE For Transformers - BK14	۲۰	$۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۵
VDR For Transformers - BK14	۷	$۵۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۱
Transmission Over head Line	۳۶	$۹۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۲
PMR For Transmission Over head Line - BK14	۷	$۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
TBE For Transmission Over head Line - BK14	۲۰	$۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
VDR For Transmission Over head Line - BK14	۷	$۶۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۲
LV Switchgear & MCC	۳۳	$۷۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۱
PMR For LV Switchgear & MCC - BK14	۷	$۷	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۵
TBE For LV Switchgear & MCC - BK14	۲۰	$۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۵
VDR For LV Switchgear & MCC - BK14	۷	$۵۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۱
Emergency Diesel Generator	۲۷	$۷۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
PMR For Emergency Diesel Generator - BK14	۷	$۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۰
TBE For Emergency Diesel Generator - BK14	۱۵	$۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۵
VDR For Emergency Diesel Generator - BK14	۷	$۵۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
DC Charger	۳۱	$۷۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۱
PMR For DC Charger - BK14	۷	$۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۰
TBE For DC Charger - BK14	۲۰	$۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۰
VDR For DC Charger - BK14	۷	$۵۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۱
Capacitor Bank	۲۹	$۷۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
PMR For Capacitor Bank - BK14	۷	$۷	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۵
TBE For Capacitor Bank - BK14	۲۰	$۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۵
VDR For Capacitor Bank - BK14	۷	$۵۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
Lighting & Distribution Main Panels	۳۵	$۷۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۴
PMR For Lighting & Distribution Main Panels - BK14	۷	$۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۹
TBE For Lighting & Distribution Main Panels - BK14	۲۰	$۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۸
VDR For Lighting & Distribution Main Panels - BK14	۷	$۵۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۴
Earthing & Lightning System	۲۷	$۷۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۱

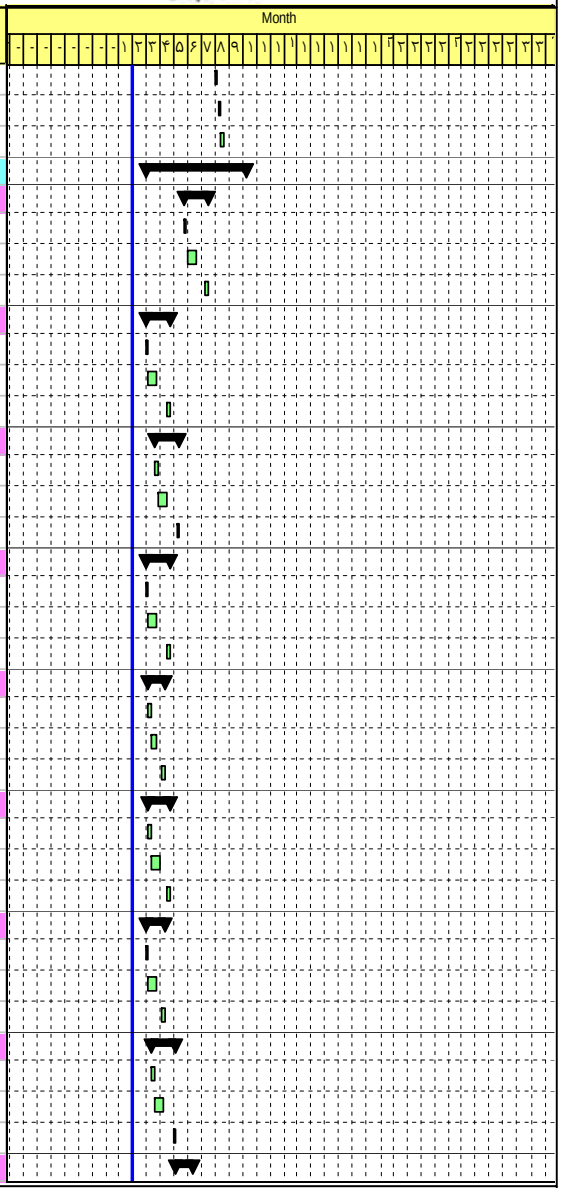

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
PMR For Earthing & Lightning System - BK14	۷	$۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۰
TBE For Earthing & Lightning System - BK14	۱۵	$۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
VDR For Earthing & Lightning System - BK14	۷	$۵۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۱
Lighting and Small Power Equipment	۳۳	$۷۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۷
PMR For Lighting and Small Power Equipment - BK14	۷	$۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۴
TBE For Lighting and Small Power Equipment - BK14	۲۰	$۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳
VDR For Lighting and Small Power Equipment - BK14	۷	$۵۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۷
Tray/Ladder and Accessories	۲۹	$۷۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۴
PMR For Tray/Ladder and Accessories - BK14	۷	$۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۸
TBE For Tray/Ladder and Accessories - BK14	۲۰	$۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۷
VDR For Tray/Ladder and Accessories - BK14	۷	$۵۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۴
Power & Control Cables	۳۹	$۷۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
PMR For Power & Control Cables - BK14	۷	$۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۱
TBE For Power & Control Cables - BK14	۲۰	$۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
VDR For Power & Control Cables - BK14	۷	$۵۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
Electrical Bulk Items	۲۶	$۷۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
PMR For Electrical Bulk Items - BK14	۷	$۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۴
TBE For Electrical Bulk Items - BK14	۱۰	$۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
VDR For Electrical Bulk Items - BK14	۷	$۵۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
Piping	۳۸	$۵۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳
Pipe	۳۸	$۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳
PMR For Pipes - BK14	۷	$۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۶
TBE For Pipes - BK14	۲۵	$۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۰
VDR For Pipes - BK14	۷	$۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۳
Pipe Support	۲۷	$۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
PMR For Pipe Support - BK14	۵	$۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
TBE For Pipe Support - BK14	۱۵	$۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۷
VDR For Pipe Support - BK14	۷	$۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
Civil	۱۰	$۵۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۰
Geomembrane	۱۰	$۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۰
PMR For Geomembrane - BK14	۷	$۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۰
TBE For Geomembrane - BK14	۵	$۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۵
VDR For Geomembrane - BK14	۵	$۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۰
Geotextile	۱۰	$۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۰
PMR For Geotextile - BK14	۷	$۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۰
TBE For Geotextile - BK14	۵	$۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۵
VDR For Geotextile - BK14	۵	$۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۰

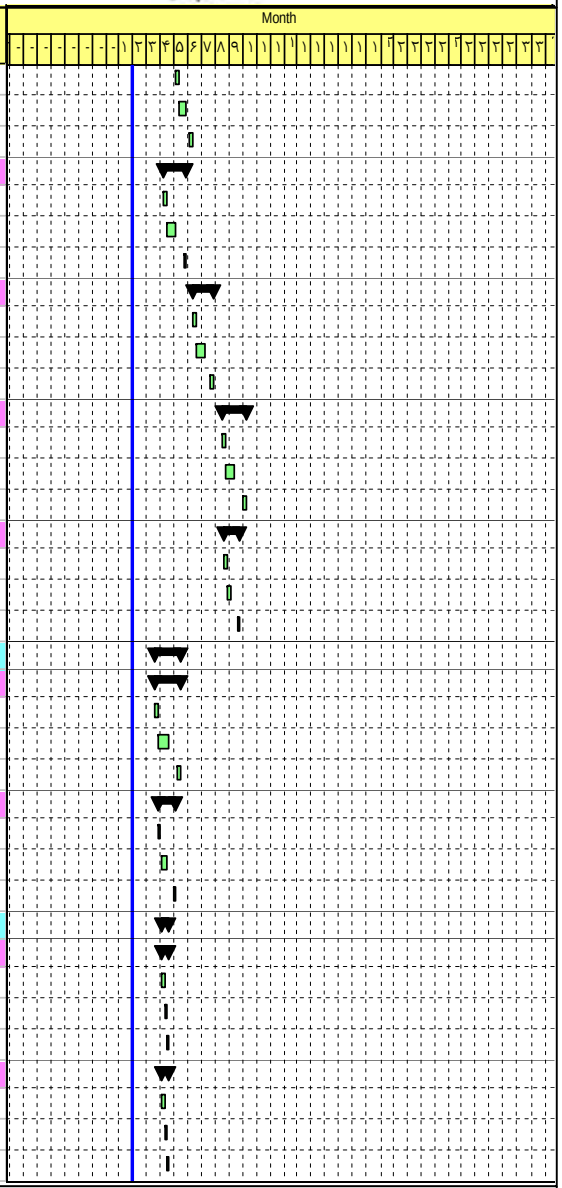

Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Summary
Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
HVAC	۲۸	$۴۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۱
Main HVAC Equipment	۲۸	$۴۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۱
PMR For Main HVAC Equipment - BK14	۷	$۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۷
TBE For Main HVAC Equipment - BK14	۱۵	$۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۲
VDR For Main HVAC Equipment - BK14	۷	$۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۱
Commissioning Engineering	۲۵۶	$۲۶۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۳
Operability Review	۵	$۵۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۴
Pre-Commissioning, Commissioning & Startup Procedure - BK14	۴۴	$۱۶۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Operating Manual - BK14	۲۵	$۵۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۳
Field Engineering	۲۰۰	$۲،۰۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۸
Technical/Site Queries	۴۴	$۱،۰۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۵
Dossier	۳	$۱،۰۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۸
As-Built Document Booklets - BK14	۵	$۱،۰۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۸
Engineering Final Documentation	۵	$۱،۳۳۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۳
Final Engineering Dossier - BK14	۵	$۱،۳۳۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۳
PROCUREMENT	۲۱۰	$۳۲۷،۵۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۹
Mechanical	۶۳	$۱۶،۰۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۰
Fuel Oil Storage Drum	۳۹	$۹،۶۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۷
Tendering & Selection	۷	$۳۸۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۶
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۵۷۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
Manufacturing / Fabrication / Supply	۳۰	$۴،۸۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
Final Inspection	۷	$۹۶۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۶
Delivery On Site	۵	$۱،۹۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۱
Submitting Vendor Data Book	۳	$۴۸۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۴
Delivering Spare Parts	۳	$۴۸۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۷
Potable Water Tank	۴۳	$۶،۴۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۰
Tendering & Selection	۷	$۲۵۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۳
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۳۸۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۸
Manufacturing / Fabrication / Supply	۳۰	$۳،۲۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۷
Final Inspection	۷	$۶۴۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
Delivery On Site	۷	$۱،۲۸۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۰
Submitting Vendor Data Book	۵	$۳۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۵
Delivering Spare Parts	۵	$۳۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۰
Piping	۵۱	$۳۰،۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۱
Pipes - BK14	۴۵	$۲۴،۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۱
Tendering & Selection	۷	$۹۶۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۱،۴۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۶

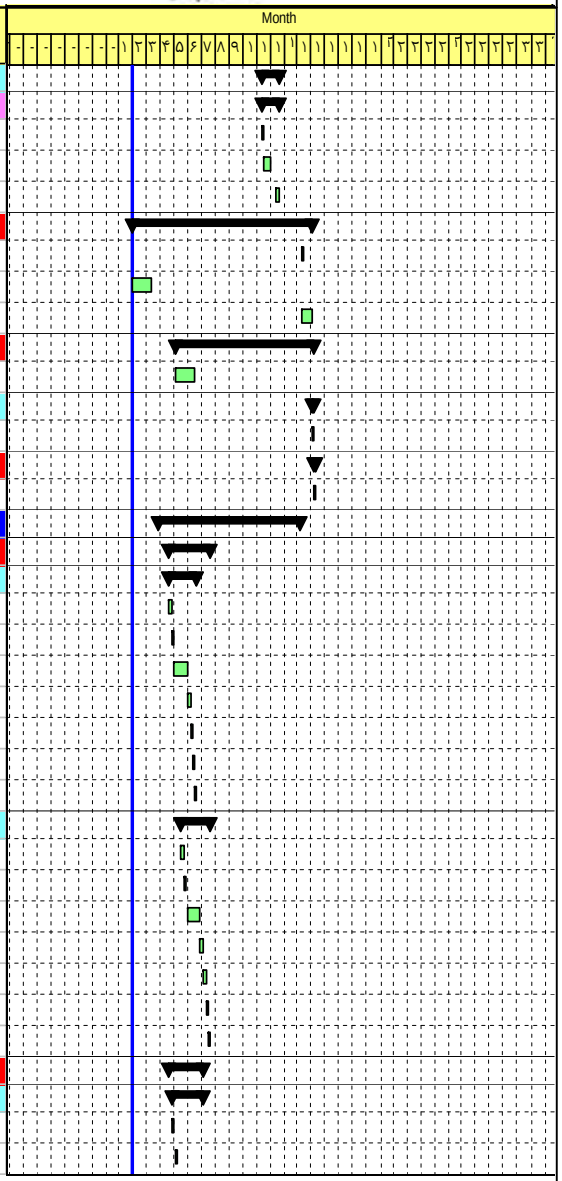

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Manufacturing / Fabrication / Supply	۴۰	$۱۲،۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۵
Final Inspection	۷	$۲،۴۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
Delivery On Site	۵	$۶،۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۷
Submitting Vendor Data Book	۵	$۱،۲۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۱
Pipe Support - BK14	۴۰	$۶،۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۶
Tendering & Selection	۷	$۲۴۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۴
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۳۶۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۹
Manufacturing / Fabrication / Supply	۳۰	$۳،۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸
Final Inspection	۷	$۶۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۴
Delivery On Site	۷	$۱،۵۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۱
Submitting Vendor Data Book	۵	$۳۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۶
HVAC	۴۱	$۵،۹۹۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۹
Main HVAC Equipment - BK14	۴۱	$۵،۹۹۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۹
Tendering & Selection	۷	$۲۴۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۹
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۳۶۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۴
Manufacturing / Fabrication / Supply	۳۵	$۲،۹۹۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۹
Final Inspection	۷	$۵۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۶
Delivery On Site	۷	$۱،۴۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۴
Submitting Vendor Data Book	۵	$۳۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۹
Electrical	۱۵۷	$۲۷۵،۴۹۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۵
Electrical Bulk Items - BK14	۴۵	$۲،۲۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
Tendering & Selection	۷	$۸۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۱۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
Manufacturing / Fabrication / Supply	۳۵	$۱،۱۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۱
Final Inspection	۷	$۲۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۸
Delivery On Site	۷	$۵۵۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
Submitting Vendor Data Book	۵	$۱۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
Lighting and Small Power Equipment - BK14	۴۶	$۱۲،۷۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۷
Tendering & Selection	۷	$۵۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۷۶۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۰
Manufacturing / Fabrication / Supply	۳۵	$۶،۳۵۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۴
Final Inspection	۷	$۱،۲۷۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
Delivery On Site	۷	$۲،۵۴۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۷
Submitting Vendor Data Book	۵	$۶۳۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۲
Delivering Spare Parts	۵	$۶۳۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۷
DC Charger - BK14	۵۰	$۱۷،۲۷۴	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۱

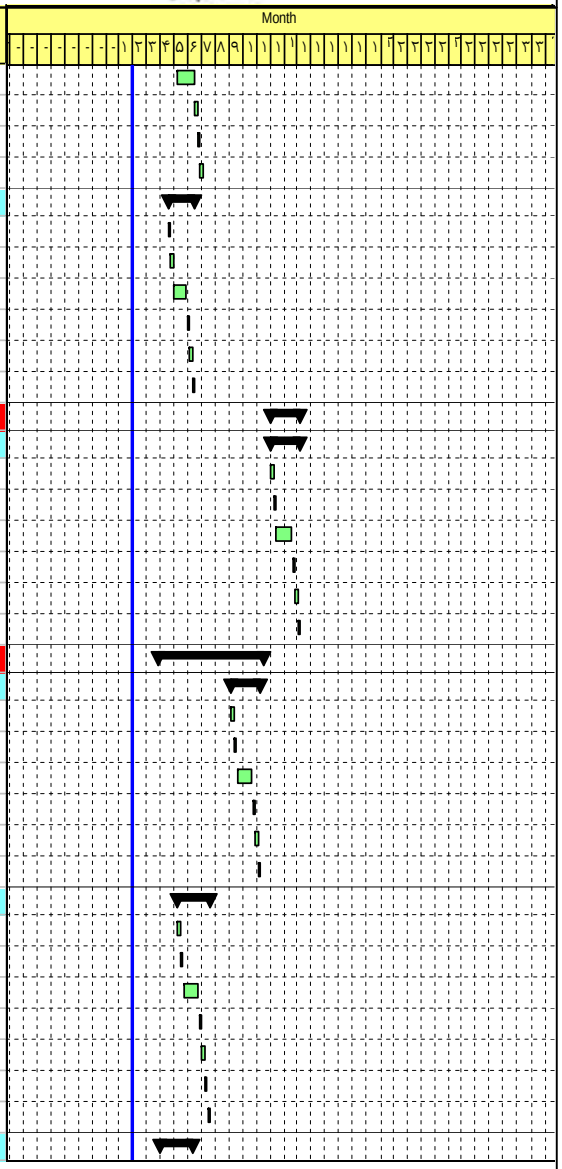

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Tendering & Selection	۱۰	$۶۹۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۹
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۱،۰۳۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۴
Manufacturing / Fabrication / Supply	۳۵	$۸،۶۳۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۸
Final Inspection	۷	$۱،۷۲۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
Delivery On Site	۷	$۳،۴۵۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۱
Submitting Vendor Data Book	۵	$۸۶۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۶
Delivering Spare Parts	۵	$۸۶۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۱
Tray/Ladder and Accessories - BK14	۴۲	$۲،۲۳۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۰
Tendering & Selection	۵	$۸۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۲
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۱۳۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۷
Manufacturing / Fabrication / Supply	۳۵	$۱،۱۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۱
Final Inspection	۷	$۲۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۸
Delivery On Site	۷	$۵۵۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۵
Submitting Vendor Data Book	۵	$۱۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۰
Lighting & Distribution Main Panels - BK14	۴۵	$۶،۲۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۵
Tendering & Selection	۵	$۲۴۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۳
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۳۷۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۸
Manufacturing / Fabrication / Supply	۳۵	$۳،۱۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۱
Final Inspection	۷	$۶۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۸
Delivery On Site	۷	$۱،۲۴۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۵
Submitting Vendor Data Book	۵	$۳۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۰
Delivering Spare Parts	۵	$۳۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۵
Capacitor Bank - BK14	۴۵	$۵،۲۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۱
Tendering & Selection	۵	$۲۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۳۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۴
Manufacturing / Fabrication / Supply	۳۵	$۲،۶۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
Final Inspection	۷	$۵۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
Delivery On Site	۷	$۱،۰۴۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۲
Submitting Vendor Data Book	۵	$۲۶۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۷
Delivering Spare Parts	۵	$۲۶۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۱
Emergency Diesel Generator - BK14	۴۵	$۲۶،۸۳۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۱
Tendering & Selection	۵	$۱،۰۷۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۱،۶۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۴
Manufacturing / Fabrication / Supply	۳۵	$۱۳،۴۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
Final Inspection	۷	$۲،۶۸۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
Delivery On Site	۷	$۵،۳۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۲

Month

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Submitting Vendor Data Book	۵	$۱،۳۴۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۷
Delivering Spare Parts	۵	$۱،۳۴۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۱
UPS System - BK14	۴۶	$۱۶،۶۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
Tendering & Selection	۵	$۶۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۱
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۹۹۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۶
Manufacturing / Fabrication / Supply	۳۵	$۸،۳۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۰
Final Inspection	۷	$۱،۶۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۷
Delivery On Site	۷	$۳،۳۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۴
Submitting Vendor Data Book	۵	$۸۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۹
Delivering Spare Parts	۵	$۸۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
Transformers - BK14	۴۵	$۳۰،۳۶۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۱
Tendering & Selection	۵	$۱،۲۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۹
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۱،۸۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۴
Manufacturing / Fabrication / Supply	۳۵	$۱۵،۱۸۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۸
Final Inspection	۷	$۳،۰۳۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
Delivery On Site	۷	$۶،۰۷۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۱
Submitting Vendor Data Book	۵	$۱،۵۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۶
Delivering Spare Parts	۵	$۱،۵۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۱
Earthing & Lightning System - BK14	۴۰	$۱۰،۱۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۲
Tendering & Selection	۵	$۴۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۶۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۴
Manufacturing / Fabrication / Supply	۲۵	$۵،۰۵۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۹
Final Inspection	۷	$۱،۰۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
Delivery On Site	۷	$۲،۰۲۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۲
Submitting Vendor Data Book	۵	$۵۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۷
Delivering Spare Parts	۵	$۵۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۲
LV Switchgear & MCC - BK14	۴۱	$۲۶،۲۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۶
Tendering & Selection	۵	$۱،۰۴۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۹
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۱،۵۷۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۴
Manufacturing / Fabrication / Supply	۳۰	$۱۳،۱۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۳
Final Inspection	۷	$۲،۶۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۰
Delivery On Site	۷	$۵،۲۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۷
Submitting Vendor Data Book	۵	$۱،۳۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۱
Delivering Spare Parts	۵	$۱،۳۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۶
Transmission Over head Line - BK14	۳۶	$۱۰۴،۱۹۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۱
Tendering & Selection	۵	$۴،۱۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۱

Month

© Primavera Systems, Inc.

HIRGAN ENERGY

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک

بسته های کاری سطح الارض

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۶،۲۵۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
Manufacturing / Fabrication / Supply	۳۰	$۵۲،۰۹۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۴
Final Inspection	۷	$۱۰،۴۱۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۱
Delivery On Site	۵	$۲۶،۰۴۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۶
Submitting Vendor Data Book	۵	$۵،۲۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۱
Power & Control Cables - BK14	۳۸	$۱۵،۳۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۵
Tendering & Selection	۵	$۶۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۶
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۹۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
Manufacturing / Fabrication / Supply	۲۵	$۷،۶۵۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۶
Final Inspection	۷	$۱،۵۳۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۳
Delivery On Site	۷	$۳،۸۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
Submitting Vendor Data Book	۵	$۷۶۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۵
Construction	۲۶۳	$۱۶۲،۷۷۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۷
Wellpad and Access Road	۵۰	$۴۸،۸۳۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۵
Access Road	۲۶	$۱۹،۵۳۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۰
Access Road	۲۶	$۱۷،۵۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۰
Access Road Preparation	۵	$۱۰،۵۴۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۷
Filling and Compaction	۱۰	$۸۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۶
Sub-Base Layer	۱۵	$۱،۷۵۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۰
Retaining wall	۱۰	$۳،۵۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۴
Excavation	۵	$۳۵۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۲
lean concrete	۲	$۵۲۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۴
form working	۵	$۱،۲۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۹
concrete pouring	۵	$۱،۴۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۴
Construction of Culvert and Bridge	۲۲	$۸۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۰
bridge	۲۲	$۳۵۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۰
Excavation	۵	$۳۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۲
lean concrete	۲	$۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۴
wall	۵	$۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۹
reinforcement	۵	$۷۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۴
form working	۵	$۳۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۹
concrete pouring	۵	$۱۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۳
protect stone	۲	$۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۵
Backfill	۵	$۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۰
culverts	۶	$۵۲۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۶
pipeway culvert	۵	$۲۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۲

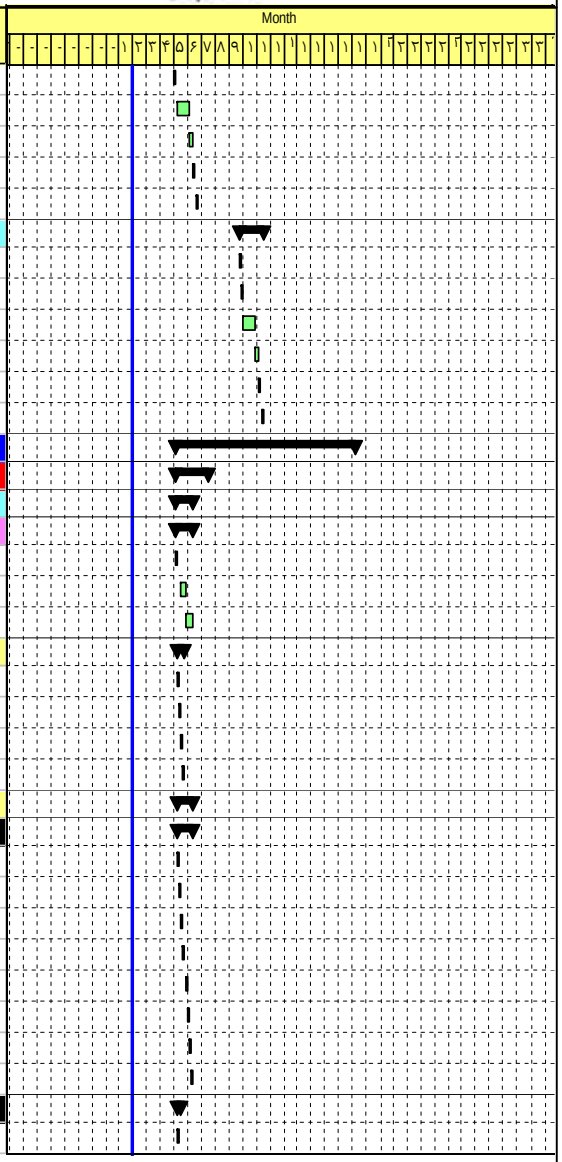

Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
pipeway	۲	$۱۵۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۴
pipeline culvert	۲	$۱۵۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۶
Burn Pit Access Road	۱۵	$۱،۹۵۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۱
ROW Preparation	۱۰	$۱،۰۷۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۷
Filling and Compaction	۱۰	$۳۹۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۷
Sub-Base Layer	۵	$۴۸۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۱
Wellpad	۵۰	$۲۹،۲۹۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۵
Site Preparation	۶	$۴،۳۹۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۷
Site Preparation #14	۱۰	$۴،۳۹۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۷
Civil Work	۶	$۷،۶۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۷
(Excavation and Soil Removal (Cellar	۳	$۴،۹۵۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۰
Installation of Conductor Pipe	۵	$۳۸۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
(Form Work (Above Cellar	۵	$۳۸۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
Armed Concrete	۲	$۱،۹۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۷
Burn Pit	۳۴	$۱،۱۷۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۵
Soil Removal, Triming ,Filling and Compaction of Burn Pit Area	۱۵	$۹۳۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۱
Construction & Installation of Support	۲۰	$۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
Welding, Installation and Testing	۱۵	$۱۷۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۵
Surface Preparation	۴	$۸۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۲
Gravel Paving	۵	$۸۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۲
Mud Channel	۴	$۸۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۲
Excavation & Repair	۵	$۸۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۲
Mud Pit	۷	$۴،۳۹۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۱
Soil Removal, Filling and Compaction of Mud Pit Area	۷	$۱،۵۳۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۷
Construction of Mud Pit's Walls	۵	$۸۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
Supply & Installation sealling Layer	۷	$۱،۹۷۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۱
SepticTank	۱۱	$۲،۰۵۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۵
Excavation & Soil Transfer	۴	$۶۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۴
Levelling	۲	$۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۶
Tank Supply	۷	$۱،۱۶۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۷
Tank Execution	۳	$۱۹۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
Backfilling & Compaction	۶	$۶۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۵
Gasoil Pad	۸	$۱،۴۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۹
Excavation	۳	$۲۹۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۰
lean concrete	۲	$۴۳۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲
Form work	۵	$۱۴۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۷
Armed Concrete	۲	$۵۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۹

Month

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary

Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Demolition & Disassemble	۴	$۴،۳۹۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۴
Demolition of concrete support	۳	$۱،۳۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۰
Fence Disassmble	۴	$۳،۰۷۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۴
Water Supply	۱۰	$۲،۰۵۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۷
Water Supply	۱۵	$۲،۰۵۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۷
Wellhead Facility and Flowline	۱۳۹	$۱۱۱،۴۹۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۳
Civil, Structure & Architecture	۱۱۸	$۳۹،۰۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۹
Civil Works	۳۵	$۱۰،۹۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
(Steel Works(Wellhead Facilities	۵	$۴،۹۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۶
(… Out Door Post Works For New Gantry (Fundation, Fencing	۵	$۲،۷۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
(… Out Door Post Works For Wellhead Post (Fundation, Fencinç	۵	$۲،۷۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
Well Pad Fencing	۵	$۵۴۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۶
Buildings	۹۱	$۲۱،۸۵۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۹
Construction of Guard House	۸۸	$۶،۱۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۶
Foundation	۳۸	$۱،۸۹۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۶
(Excavation & Soil Transfer (Removing of Vegetal Soil	۲	$۳۷۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
Levelling	۳۰	$۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۳
Lean Concrete	۲	$۱۹۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۵
Reinforced Work	۳	$۳۷۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۸
Formwork	۷	$۱۵۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
Main Concrete Pouring	۵	$۷۴۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
Backfilling & Compaction	۶	$۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۶
Structure	۱۳	$۲،۴۴۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۳
Steel Material Supply	۵	$۱،۲۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۱
Shop Fabrication of Steel Structure	۵	$۴۹۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
Structural Installation	۵	$۴۹۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
Structural Painting	۲	$۲۴۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۳
Architectural	۳۷	$۱،۷۷۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۶
Wall Execution	۲	$۸۶۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۵
Roof Covering	۲	$۲۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۷
(Roof Execution (Block Joist, Concrete Pouring	۲	$۲۶۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۹
(Building Walkway (around Building	۳	$۹۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۲
(Joinery (Cornice, Faï?½ade, Plaster	۲	$۳۳۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۶
Construction of Switchgear	۹۱	$۱۵،۷۳۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۹
Foundation	۲۲	$۴،۸۷۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۱
(Excavation & Soil Transfer (Removing of Vegetal Soil	۲	$۹۷۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
Levelling	۵	$۹۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۸

Month

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary

Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Lean Concrete	۲	$۴۸۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
Reinforced Work	۷	$۹۷۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
Formwork	۳	$۳۹۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Main Concrete Pouring	۵	$۱،۹۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۵
Backfilling & Compaction	۶	$۴۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۱
Structure	۱۱	$۶،۲۹۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۴
Steel Material Supply	۴	$۳،۱۴۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۳
Shop Fabrication of Steel Structure	۴	$۱،۲۵۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۷
Structural Installation	۴	$۱،۲۵۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
Structural Painting	۳	$۶۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۴
Architectural	۶۰	$۴،۵۶۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۹
Wall Execution	۵	$۲،۲۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۹
Roof Covering	۳	$۵۴۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۲
(Roof Execution (Block Joist, Concrete Pouring	۲	$۶۹۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
(Building Walkway (around Building	۵	$۲۳۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
(Joinery (Cornice, Faï?½ade, Plaster	۵	$۸۶۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۹
Shelters	۷	$۶،۲۴۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۵
Fire Fighting Shelter	۷	$۵،۱۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۵
Fabrication	۵	$۳،۵۸۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
Installation	۴	$۱،۵۳۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۵
Diesel Generator Shelter	۷	$۱،۱۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۵
Fabrication	۵	$۷۸۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
Installation	۴	$۳۳۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۵
Mechanical	۵	$۱۱،۱۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۸
Fuel Oil Storage Drum	۷	$۵،۵۷۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۸
Potable Water Tank	۷	$۵،۵۷۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۸
Piping	۱۲	$۱۱،۱۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۳
Sweep Bend Installation	۵	$۵۵۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
(…Piping Work (Fit up, Welding, NDT	۷	$۴،۴۶۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۸
Valves, Fitting and Spools Installation and Hydrotest	۵	$۶،۱۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۳
Instrument Works	۱	$۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۴
Devices Installation and Piping Connecton	۵	$۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۴
Electrical	۹۲	$۴۷،۹۴۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۴
Over Head line	۱۰	$۳۴،۰۴۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۰
Wellhead Electrical Equipment	۵	$۳،۸۳۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۴
Dismantling of existing Gantry	۷	$۲،۳۹۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۲

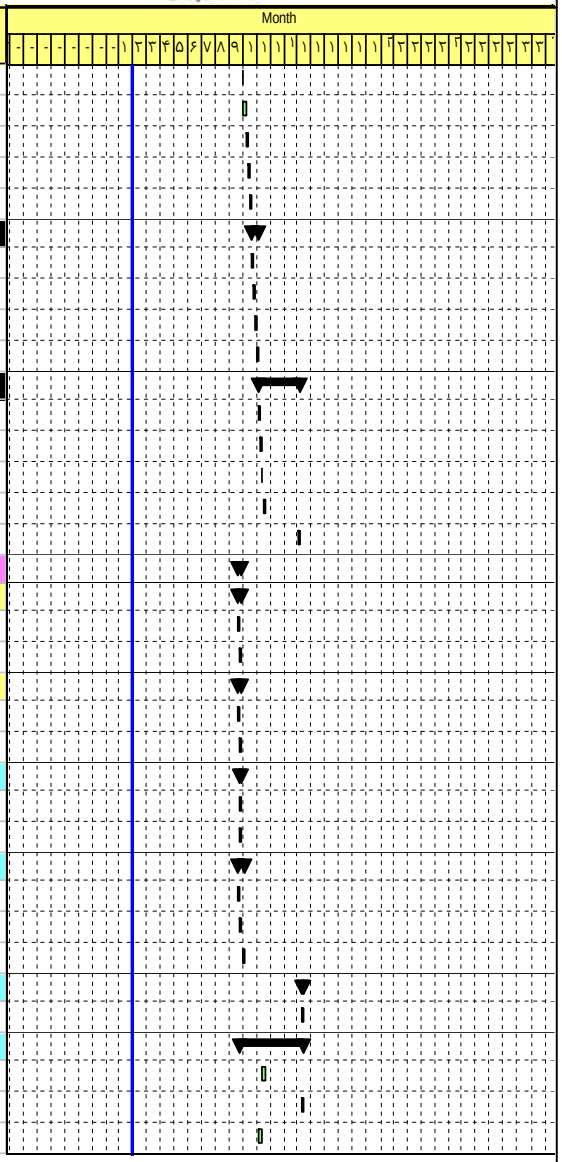

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
(Outdoor Post (new Gantry	۷	$۳،۸۳۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۸
(Outdoor Post (Wellhead Post	۷	$۳،۸۳۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۸
Pre-commissioning	۸	$۲،۲۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۳
Pre-commissioning	۵	$۲،۰۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۸
(Ready for Comm.Certificate(RFCC	۵	$۲۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۳
(Job Site HSE Supervision (Surface	۸۲	$۳۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
(Job Site HSE Supervision (Surface	۱۲۵	$۳۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
Commissioning, Startup & Handover	۵۸	$۲،۱۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۷
Commissioning	۲۰	$۶۳۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۴
Materials & Utilities Ready for Commissioning	۳	$۳۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۶
Receiving Facilities Ready for Commissioning	۲	$۳۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۸
Permits Obtained for Commissioning	۱۰	$۳۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۸
Integrated Commissioning	۲	$۵۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰
(Ready for Startup Certificate (RFSU	۱۵	$۳۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۴
Startup & Performance Test	۱۲	$۸۴۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
Startup & Performance Test Run	۳	$۶۷۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
(Start of Production (SOP	۱۵	$۱۶۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
Handover	۲۶	$۶۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۷
Compiling & Submitting Final Documentation	۲۰	$۱۹۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۱
Training of Operator's Personnel	۲	$۲۵۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۳
(Provisional Acceptance Certificate (PAC	۱۵	$۱۹۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۷
Package 08-Workover # 12	۳۰۹	$۴۰۸،۹۸۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۹
ENGINEERING	۲۸۳	$۱۳،۳۸۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۹
Basic Design Endorsement	۱۷	$۶۶۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
Endorsement Report For Basic Design & Scope of Work	۳۰	$۶۶۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
Value Engineering	۲۹	$۴۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
Value Engineering Study Report	۴۴	$۴۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
Detail Design	۲۸۳	$۷،۳۶۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
Process	۵۶	$۳۵۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۰
Drawing/Diagram	۲۹	$۲۴۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
P&ID for Diesel Oil Drum- BK12	۴۴	$۱۲۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
P&ID for Potable Water Tank - BK12	۴۴	$۱۲۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
List	۲۷	$۵۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Line List - BK12	۴۴	$۵۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Data Sheet	۲۶	$۵۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۰
Process Data Sheets For Instrument Devices - BK12	۳۹	$۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۰
Process Data Sheets For Fuel Oil Storage Drum of Well Pads	۲۵	$۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۲

Month

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary

Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Process Data Sheets For Potable Water Tank of Well Pads	۲۵	$۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۲
Mechanical	۶۴	$۴۹۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
Basis/Criteria	۳۳	$۵۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
Mechanical Design Criteria	۵۴	$۵۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
Specification	۵۳	$۸۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
Specification For Pressure Vessels	۵۴	$۴۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
Specification For Atmospheric Above Ground Welded Steel Tanks	۷۹	$۴۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
Data Sheets	۲۳	$۱۳۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
Data Sheets For Fuel Oil Storage Drum of Well Pads	۲۵	$۶۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
Data Sheets For Potable Water Tank of Well Pads	۲۵	$۶۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
Drawing/Diagram	۲۲	$۲۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۶
Standard Detail Drawing For Pressure Vessels and Heat Exchang	۱۴	$۱۰۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۶
Standard Detail Drawing For Storage Tanks	۱۴	$۱۰۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۶
HVAC/Plumbing	۲۶۲	$۴۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
Basis/Criteria	۴۰	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۳
HVAC & Plumbing Design Criteria	۶۴	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۳
Specification	۴۲	$۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
Specification For HVAC Equipment	۶۴	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
Specification For Duct Work & Pipe Work	۶۴	$۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
Calculation	۹۰	$۹۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۵
HVAC Calculation Note For Switchgear Building - BK12	۴۴	$۴۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۴
HVAC Calculation Note For Security Building - BK12	۴۴	$۴۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۵
Drawing/Diagram	۱۳۹	$۲۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۵
Standard Drawing For HVAC & Plumbing	۱۴	$۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
Symbol & Legend For HVAC & Plumbing	۳۵	$۲	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۳
HVAC System Layout For Switchgear Building - BK12	۳۰	$۵۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۳
HVAC System Layout For Security Building - BK12	۳۰	$۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۵
Plumbing & Sewage Piping Layout For Switchgear Building - BK12	۳۰	$۵۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۲
Plumbing & Sewage Piping Layout For Security Building - BK12	۳۰	$۵۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۵
Data Sheets	۳۱	$۴۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
Data Sheets For Main HVAC Equipment - BK12	۴۴	$۴۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
MTO	۵	$۴۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
MTO For Building HVAC & Plumbing Systems - BK12	۷	$۴۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
Piping	۳۰	$۳۵۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۹
Basis/Criteria	۲۴	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
Piping Design Criteria	۳۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
Specification	۳۰	$۱۳۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۸

Month

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary

Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Specification For Color Coding and Marking	۳۹	$۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Transportation, Handling, Storage of pipes	۳۹	$۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For the Design of Piping in Mechanical Packages	۴۰	$۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
Specification For Metallic Pipes	۳۹	$۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Fittings, Flanges, Gaskets and Bolts	۳۹	$۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۶
Specification For Painting	۳۹	$۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۴
(Specification For Lining (Internal Protection of Equipment by Pair	۳۹	$۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Material Requirements in Sour service	۳۹	$۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Manual Valves	۳۹	$۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Plant Piping Systems Pressure Testing	۳۹	$۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Welding of Plant Piping System	۳۹	$۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Flexibility Analysis	۳۹	$۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Piping Cleaning and Flushing	۳۹	$۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۴
Drawing/Diagram	۸	$۱۰۵	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
Standard Pipe Support Drawings	۱۴	$۱۰۵	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
MTO	۴	$۱۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۹
MTO For Pipes - BK12	۷	$۱۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۹
Electrical	۱۶۳	$۱،۷۸۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
Basis/Criteria	۳۳	$۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲
Electrical System Design Criteria	۵۴	$۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲
Specification	۳۵	$۱۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۷
Specification For LV Switchgear & Motor Control Centers	۴۹	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Specification For MV Switchgear	۴۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Specification For UPS System	۴۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Specification For Transformers	۴۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۷
Specification For DC Charger	۴۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۶
Specification For Earthing & Lightning System	۴۹	$۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
Specification For Lighting & Small Power System	۴۹	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
Specification For Bulk Materials	۴۹	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۶
Specification For Diesel Generator	۴۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
Specification For LV Induction Motors	۴۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Specification For Electrical Requirements of Packaged Units	۴۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
Specification For Capacitor Bank	۴۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Specification For Distribution & Lighting Panels	۴۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
Specification For Power & Control Cables	۴۹	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Specification For Cathodic Protection System	۴۹	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۶

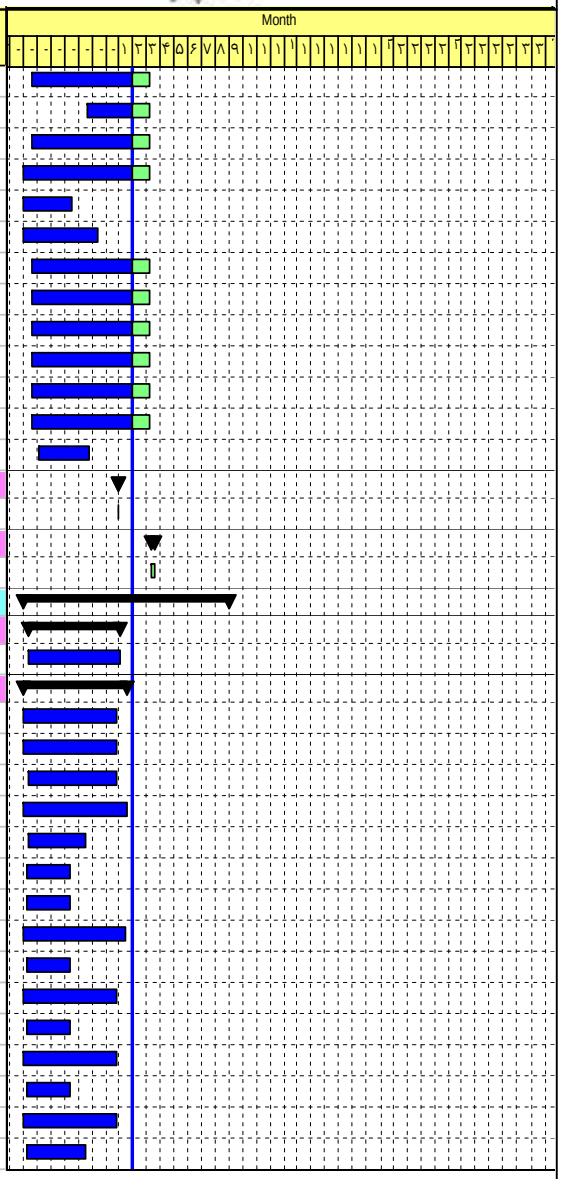

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary

Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Specification For MV Induction Motors	۴۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Specification For NGR	۴۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Specification For Overhead Transmission Lines	۴۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Calculation	۱۶۳	$۱۹۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
Calculation Note For Lighting System of Well Pads Switchgear Bu	۶۴	$۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
Calculation Note For Lighting System of Well Pads Security Buildi	۶۴	$۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
Calculation Note For Lighting System of Well Pads Area	۷۴	$۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۸
Calculation Note For Cable Sizing of Well Pads	۷۴	$۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
Calculation Note For UPS System of Well Pads	۷۴	$۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
Calculation Note For Earthing & Lightning System of Well Pads	۷۴	$۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
Calculation Note For Diesel Generator Sizing of Well Pads	۶۴	$۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۶
Calculation Note For DC Charger of Well Pads	۷۴	$۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
Calculation Note For LV Capacitor Bank of Well Pads	۴۴	$۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
Calculation Note For 11 KV Over Head Line Sag and Tension	۴۴	$۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
Calculation Note For 33 KV Over Head Line Sag and Tension	۴۴	$۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
Data Sheets	۱۳۷	$۱۶۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۹
Data Sheets For UPS of Well Pads	۵۹	$۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۹
Data Sheets For DC Charger of Well Pads	۵۹	$۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Data Sheets For Diesel Generator of Well Pads	۵۹	$۱۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Data Sheets For LV Capacitor Bank of Well Pads	۵۹	$۱۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
Data Sheets For LV Switchgear of Well Pads	۵۴	$۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
Data Sheets For Power & Control Cables of Well Pads	۵۹	$۱۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
Data Sheets For Power Transformers of Well Pads	۵۹	$۱۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
Data Sheets For Distribution & Lighting Panels of Well Pads	۵۹	$۱۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۰
Data Sheets For 11 KV Over Head Line Equipment	۴۴	$۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۶
Data Sheets For 33 KV Over Head Line Equipment	۴۴	$۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۶
Drawing/Diagram	۱۴۶	$۴۷۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹
Electrical Legend and Symbols	۴۹	$۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۷
Typical Installation Details & Notes For Earthing and Lightning Prc	۱۴	$۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۷
Typical Installation Details & Notes For Lighting System	۱۴	$۱۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۳
Typical Installation Details & Notes For Power System	۱۴	$۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۷
Installation Details & Notes For Cathodic Protection Systems	۷۴	$۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Typical Installation Details For Over Head Line Equipment	۱۴	$۸	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۶
Installation Detail & Notes for Connection OHL to Gantries for We	۵۴	$۳۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
Electrical Typical Schematic Diagrams For LV Panels of Well Pad:	۱۴	$۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۸
Control Logic Diagram For LV Incomers of Well Pads	۷۴	$۱۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۱

Month

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary

Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Earthing Layout For Electrical Tower (Gantry) of Well Pads	۶۴	$۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۷
Cable Route Layout For Electrical Tower (Gantry) of Well Pads	۷۴	$۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶
Overall Single Line Diagram of Well Pads	۷۹	$۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
Single Line Diagram For LV Switchgear of Well Pads	۷۴	$۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۶
Single Line Diagram For LV Power Distribution Panel of Well Pad	۷۴	$۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
Single Line Diagram For DC Charger of Well Pads	۷۴	$۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۶
Single Line Diagram For Capacitor Banks of Well Pads	۷۴	$۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۶
Interconnection Wiring Diagram of Well Pads	۶۴	$۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
Area Lighting & Small Power Layout of Well Pads of Well Pads	۷۴	$۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶
Lighting & Small Power Layout For Switchgear Building of Well P	۶۴	$۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۴
Lighting & Small Power Layout For Security Building of Well Pads	۶۴	$۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹
Area Electrical Cable Route & Section Layout of Well Pads	۷۹	$۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۱
Electrical Cable Route & Section Layout For Switchgear Building	۷۴	$۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶
Electrical Equipment Arrangement Layout For Switchgear Building	۷۹	$۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۸
Earthing & Lightning Layout for well pads	۶۴	$۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۰
۱۱KV Over Head Line Study Report	۴۴	$۴۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۳۳KV Over Head Line Study Report	۴۴	$۴۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۳۰
List	۷۴	$۵۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
Electrical Load List of Well Pads	۴۵	$۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۳
Electrical Power & Control Cable List of Well Pads	۷۴	$۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
Cable Drum Schedule and Cutting List of Well Pads	۷۴	$۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
Report	۷۰	$۳۳۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۸
Electrical Network (Load Flow, Motor Starting & Short Circuit) Stu	۵۴	$۹۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
Relay Coordination & Setting Study Report of Well Pads	۵۴	$۹۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۸
۱۱KV Over Head Line Study Report	۴۴	$۷۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۳۳KV Over Head Line Study Report	۴۴	$۷۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۳۰
MTO	۱۰۳	$۴۳۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۷
MTO For Transmission Over Head Line - BK12	۷	$۱۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۰
MTO For Lighting & Small Powers - BK12	۷	$۶۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۷
MTO For Power & Control Cables - BK12	۷	$۶۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۴
MTO For Tray/Ladder and Accessories - BK12	۷	$۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۱
MTO For Electrical Bulk Items - BK12	۷	$۶۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۷
MTO For Earthing & Lightning Systems - BK12	۷	$۶۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۳
Architecture	۱۷۷	$۷۷۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۱۴۰۱/۰۵/۳۰
Basis/Criteria	۴۷	$۱۵۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
Architectural Design Criteria	۷۴	$۱۵۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۱

Month

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary

Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Specification	۲۵	$۱۹۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Buildings General Specification	۴۴	$۱۹۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Drawing/Diagram	۱۵۸	$۱۸۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۳
Architectural Drawing For Diesel Generator Shelter of Well Pads	۴۰	$۶۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۲
Architectural Drawing For Switchgear Building of Well Pads - BK-	۴۰	$۶۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
Architectural Drawing For Security Building of Well Pads - BK-12	۴۰	$۶۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۳
MTO	۵	$۲۳۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۰
MTO For Architectural Works - BK12	۷	$۲۳۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۰
Civil	۸۰	$۷۴۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۳
Basis/Criteria	۵۸	$۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Civil Design Criteria	۶۴	$۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Design Criteria for Sewerage & Drainage	۴۴	$۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Design Criteria for Road and Paving	۴۴	$۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Specification	۵۸	$۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
Specification For Civil Works	۷۹	$۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
Specification For Road & Paving	۶۴	$۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Specification For Fence & Gate	۶۴	$۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۵
Specification For Earth Work	۶۴	$۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Specification For Sewerage & Drainage	۶۴	$۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۱
Specification For Geological & Geotechnical Survey	۴۴	$۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Drawing/Diagram	۵۰	$۵۶۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۱
Standard Drawing For Civil Works	۴۵	$۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۳
Standard Drawing For Slope Protection Details	۴۵	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
Standard Drawing For Roads	۴۵	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۳
Standard Drawing For Electrical Cable Trench	۴۵	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
Standard Drawing For Manholes	۴۵	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۳
Standard Drawing For Catch Basins	۴۵	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۳
Standard Drawing For Sewerage & Drainage Details	۴۵	$۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۳
Standard Drawing For Civil Underground Crossings	۳۸	$۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
Standard Drawing For Fence & Gate Details	۴۵	$۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۹
Standard Drawing For Concrete Continues Weight	۳۸	$۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷
Standard Drawing For Major Floodway Crossing	۳۸	$۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
Standard Drawing For Culvert & Details	۳۸	$۱۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۴
Standard Drawing For Valve Box	۳۸	$۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۲
Standard Drawing For Fire Hydrant Pit	۳۸	$۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
Standard Drawing For Cable Pull Pit	۴۵	$۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۳

Month

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary

Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Standard Drawing For Pavings	۳۸	$۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
Standard Drawing For Earth Pit	۳۸	$۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
Standard Detail For Pipe Bedding	۵۰	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
Standard Details of Miscellaneous Items	۵۰	$۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
BINAK Oil Field Project Overall Well Location/Facilities Layout	۴۵	$۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۳
Civil and Structural drawings - BK12	۴۰	$۱۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۱
General Civil Layout - BK12	۴۰	$۱۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۱
Rough Grading Plans -BK12	۴۰	$۱۵۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۱
Report	۲۵	$۹۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Site Visit Report (Civil Work) - BK12	۴۴	$۹۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
MTO	۳۰	$۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۳
MTO For Civil Works - BK12	۴۴	$۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۳
Structure	۱۳۶	$۹۸۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۸
Basis/Criteria	۳۸	$۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Structural Design Criteria	۶۴	$۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Design Criteria For Steel Structure	۴۴	$۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Design Criteria For Load & Forces	۴۴	$۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Specification	۶۰	$۸۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Specification For Concrete Work	۶۴	$۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Specification For Storage Tank Foundation	۳۸	$۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۸
Specification for Fabrication of Steel Structures	۶۴	$۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۹
Specification For Grouting	۶۴	$۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۸
Specification for Erection of Steel Structures	۶۴	$۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۹
Specification for Fireproofing	۶۴	$۲۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۵
Specification For Steel Structural Works	۳۷	$۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۵
Drawing/Diagram	۱۳۱	$۶۳۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۱
Standard Drawing For Fire Proofing	۴۰	$۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۸
Standard Drawing For Anchor Bolts	۴۰	$۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۳
Standard Drawing For Steel Stairs	۴۰	$۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Standard Drawing For Operating Platform	۳۸	$۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۱
Standard Drawing For Handrail	۳۸	$۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۰
Standard Drawing For Insert Plates in Concrete	۳۸	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۴
Standard Details For Ladder & Safety Cage	۴۰	$۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۷
Standard Drawing For Lighting pole foundation Plan & Details	۳۸	$۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
General Notes - Steel Structures	۳۸	$۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۱
General Notes - Reinforced Concrete Structures	۳۸	$۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۷

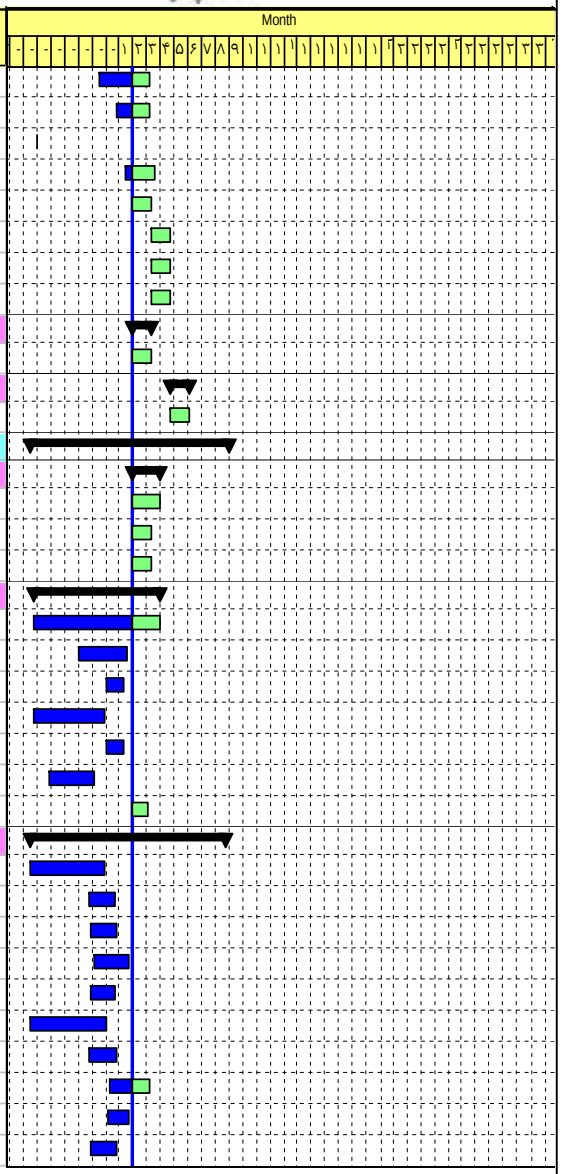

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Standard Drawing For Structural Built-up Sections	۳۰	$۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۹
Standard Drawing For Steel Flooring, Grating and Chequered Pla	۳۰	$۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۳
Concrete Reinforcement Shape Code	۳۰	$۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۹
Standard Drawing For Septic Tank	۳۰	$۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۹
Fuel Oil Storage Drum Detail Drawing For Well Pads - BK-12	۳۰	$۶۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۷
Foundation Drawing For Security Building For Well Pads - BK-12	۳۰	$۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۲
Structural Drawing For Security Building For Well Pads - BK-12	۳۰	$۶۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۱
Foundation Drawing For Switchgear Building For Well Pads - BK·	۳۰	$۶۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۱
Structural Drawing For Switchgear Building For Well Pads - BK-12	۳۰	$۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۰
Foundation Drawing For Potable Water Tank For Well Pads - BK-	۳۰	$۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۵
Foundation Drawing For Diesel Generator Shelter For Well Pads	۳۰	$۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۱
Structural Drawing For Diesel Generator Shelter For Well Pads -	۳۰	$۶۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۰
MTO	۵	$۲۵۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۸
MTO For Structural Works - BK12	۷	$۲۵۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۸
General	۷۷	$۱،۴۷۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹
Geotechnic	۶۴	$۱،۱۸۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Procedure/Plan	۲۸	$۹۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۳
Geotechnical Investigation Plan for Well Pads	۴۴	$۹۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۳
Report	۲۵	$۱،۰۸۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Geotechnical Investigation Report - BK12	۴۴	$۱،۰۸۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Survey	۲۷	$۱۴۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۹
Drawing/Diagram	۲۷	$۱۴۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۹
Over Head Line Plan and Profile - BK12	۳۹	$۱۴۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۹
QC/QA	۷۳	$۱۴۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲
QC Management	۷۳	$۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۲
Project Audit Procedure	۴۴	$۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Specification For Final Data Book (FDB) Requirements	۴۴	$۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Non Conformance Control Procedure	۳۶	$۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۷
Corrective Action Procedure	۳۶	$۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۲
Material Reciving, Storage, Handling Procedure	۳۹	$۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Packing, Marking, Transportation Procedure	۳۹	$۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Criticality Assessment Procedure	۳۹	$۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Project Quality Plan	۴۴	$۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Technical Query Procedure	۴۴	$۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
QC General Document	۴۱	$۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
(Quality Control Plan (QCP	۳۹	$۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification for Welding Procedure	۴۴	$۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲

Month

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary

Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
(Heat Treatment Procedure (Pre Heating , PWHT	۴۴	$۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Welder Performance Qualification Test (WQT) Procedure	۴۴	$۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
NDT Procedure	۴۴	$۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Surface Preparation and Coating/Painting Procedure	۴۴	$۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Control of Inspection Measuring and Test Equipment Procedure	۴۴	$۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
QC Discipline Document	۵۴	$۱۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۵
Piping	۵۴	$۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۵
ITP For Piping Works	۴۴	$۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
(PIPING PWPS (Preliminary Welding Procedure Specificatio	۴۴	$۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
(PIPING WPS (Welding Procedure Specification	۴۴	$۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
(PIPING PQR (Procedure Qualification Record	۴۴	$۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
PIPING PWPS (Preliminary Welding Procedure Specificatior	۴۴	$۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
PIPING WPS (Preliminary Welding Procedure Specification)	۴۴	$۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
PIPING PQR (Procedure Qualification Record) for Repair W	۴۴	$۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Field Joint Coating Procedure For Pipeline	۴۴	$۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Pressure Test Procedure	۴۴	$۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۵
.Telecomm	۲۵	$۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
ITP For Telecommunication Installation	۴۴	$۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Safety	۲۵	$۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
ITP For Safety Installation	۴۴	$۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Architectural	۲۵	$۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
ITP For Architectural Works	۴۴	$۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Mechanical	۲۵	$۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
ITP For Mechanical Installation	۴۴	$۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Structure	۲۵	$۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
ITP For Steel Structural Works	۴۴	$۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
(Steel Structure WPS (Welding Procedure Specification	۴۴	$۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
(Steel Structure PQR (Procedure Qualification Record	۴۴	$۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Steel Structure WPS (Welding Procedure Specification) For I	۴۴	$۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Steel Structure PQR (Procedure Qualification Record) For R	۴۴	$۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Weld Map For Steel Structures	۴۴	$۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
NDT Plan For steel Structures	۴۴	$۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Instrumentation	۲۵	$۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
ITP For I&C Installation	۴۴	$۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Pipeline	۵۴	$۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
ITP For Pipeline	۴۴	$۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۲

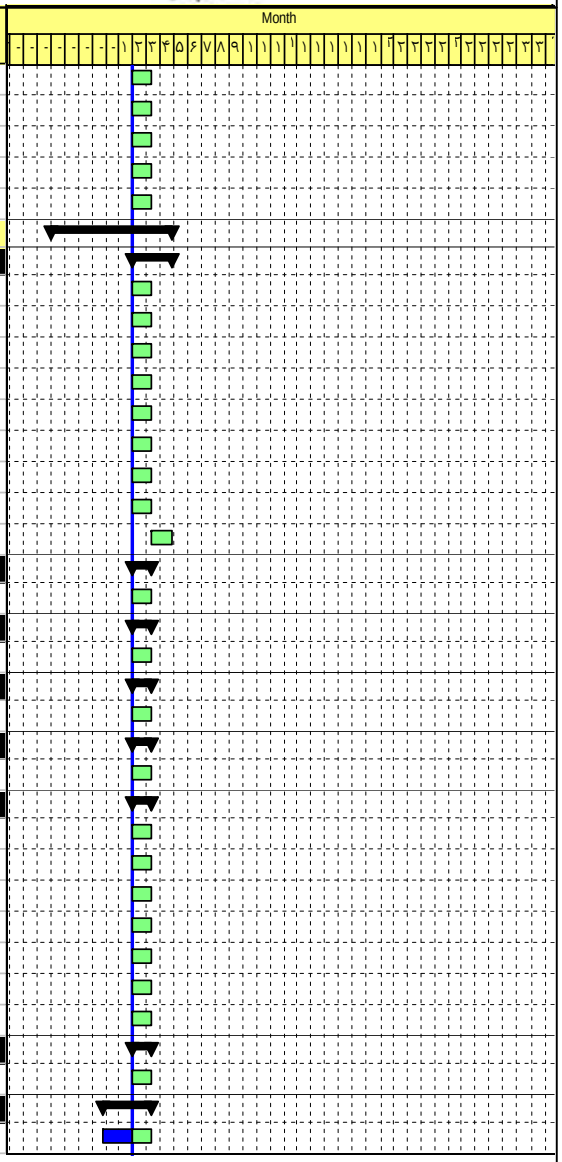

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
(PIPELINE PWPS (Preliminary Welding Procedure Specifica	۴۴	$۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
(PIPELINE WPS (Welding Procedure Specification	۴۴	$۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
(PIPELINE PQR (Procedure Qualification Record	۴۴	$۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
PIPELINE PWPS (Preliminary Welding Procedure Specificat	۴۴	$۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
PIPELINE WPS (Preliminary Welding Procedure Specificatio	۴۴	$۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
PIPELINE PQR (Procedure Qualification Record) for Repair	۴۴	$۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Civil	۲۸	$۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۱
ITP For Civil Works	۴۴	$۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۱
Electrical	۲۵	$۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
ITP For Electrical Installation	۴۴	$۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Procurement Engineering	۱۸۱	$۱،۳۳۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
Mechanical	۳۰	$۱۳۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
Drum	۲۵	$۸۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
PMR For Drum - BK12	۵	$۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۷
TBE For Main Drum - BK12	۵	$۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۲
VDR For Drum - BK12	۷	$۶۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
Potable Tanks	۳۰	$۵۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
PMR For Potable Tanks - BK12	۲۰	$۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۲
TBE For Potable Tanks - BK12	۵	$۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۷
VDR For Potable Tanks - BK12	۷	$۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
Electrical	۱۳۸	$۱،۰۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۴
Electrical Bulk Items	۲۷	$۷۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۴
PMR For Electrical Bulk Items - BK12	۲۰	$۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۷
TBE For Electrical Bulk Items - BK12	۳۰	$۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۴
VDR For Electrical Bulk Items - BK12	۷	$۵۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
Lighting & Distribution Main Panels	۲۴	$۷۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۶
PMR For Lighting & Distribution Main Panels - BK12	۲۰	$۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۰
TBE For Lighting & Distribution Main Panels - BK12	۳۰	$۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۶
VDR For Lighting & Distribution Main Panels - BK12	۷	$۵۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
Earthing & Lightning System	۲۵	$۷۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۹
PMR For Earthing & Lightning System - BK12	۲۰	$۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۳
TBE For Earthing & Lightning System - BK12	۳۰	$۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۹
VDR For Earthing & Lightning System - BK12	۷	$۵۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۷
Lighting and Small Power Equipment	۲۷	$۷۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۴
PMR For Lighting and Small Power Equipment - BK12	۲۰	$۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۷
TBE For Lighting and Small Power Equipment - BK12	۳۰	$۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۴
VDR For Lighting and Small Power Equipment - BK12	۷	$۵۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶

Month

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary

Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

HIRGAN ENERGY

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک

بسته های کاری سطح الارض

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Tray/Ladder and Accessories	۲۴	$۷۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۷
PMR For Tray/Ladder and Accessories - BK12	۲۰	$۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
TBE For Tray/Ladder and Accessories - BK12	۳۰	$۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۷
VDR For Tray/Ladder and Accessories - BK12	۷	$۵۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۹
Power & Control Cables	۲۶	$۷۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
PMR For Power & Control Cables - BK12	۲۰	$۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
TBE For Power & Control Cables - BK12	۳۰	$۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
VDR For Power & Control Cables - BK12	۷	$۵۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۳
Transmission Over head Line	۲۴	$۹۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۶
PMR For Transmission Over head Line - BK12	۲۰	$۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۹
TBE For Transmission Over head Line - BK12	۳۰	$۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۶
VDR For Transmission Over head Line - BK12	۷	$۷۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۳
Emergency Diesel Generator	۲۵	$۷۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۹
PMR For Emergency Diesel Generator - BK12	۲۰	$۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۳
TBE For Emergency Diesel Generator - BK12	۳۰	$۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۹
VDR For Emergency Diesel Generator - BK12	۷	$۵۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
Transformers	۲۴	$۷۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴
PMR For Transformers - BK12	۲۰	$۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
TBE For Transformers - BK12	۳۰	$۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۴
VDR For Transformers - BK12	۷	$۵۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
LV Switchgear & MCC	۲۴	$۷۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴
PMR For LV Switchgear & MCC - BK12	۲۰	$۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
TBE For LV Switchgear & MCC - BK12	۳۰	$۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۴
VDR For LV Switchgear & MCC - BK12	۷	$۵۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
UPS System	۲۳	$۷۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۷
PMR For UPS System - BK12	۲۰	$۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۰
TBE For UPS System - BK12	۳۰	$۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۷
VDR For UPS System - BK12	۷	$۵۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۶
DC Charger	۲۵	$۷۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۹
PMR For DC Charger - BK12	۲۰	$۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۳
TBE For DC Charger - BK12	۳۰	$۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۹
VDR For DC Charger - BK12	۷	$۵۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
Capacitor Bank	۲۴	$۷۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴
PMR For Capacitor Bank - BK12	۲۰	$۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
TBE For Capacitor Bank - BK12	۳۰	$۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۴
VDR For Capacitor Bank - BK12	۷	$۵۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
Structure	۳۰	$۸۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۱

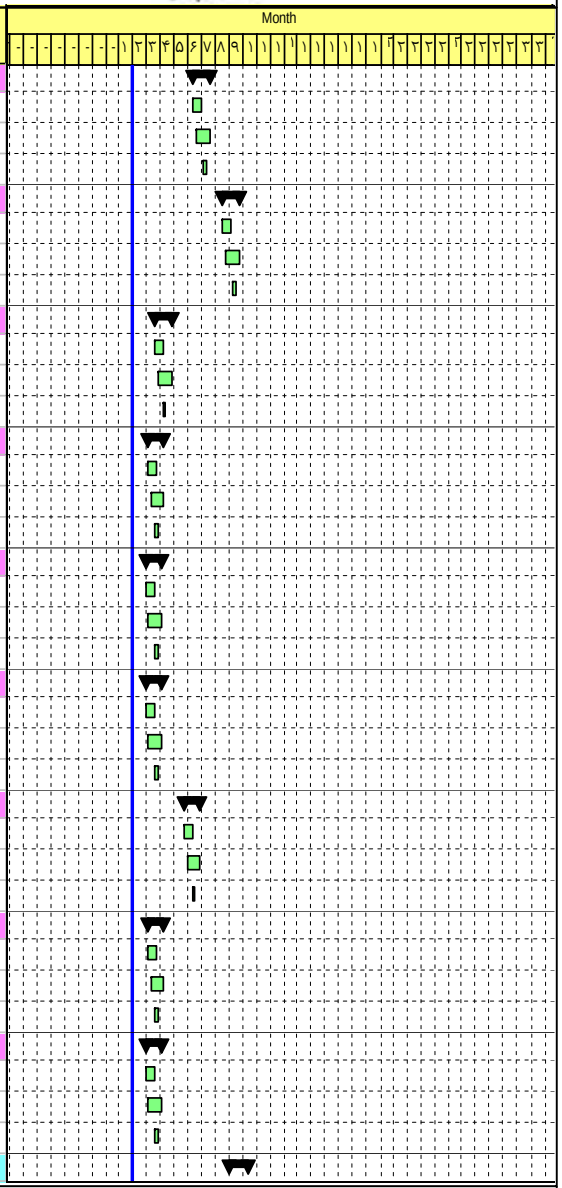

Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Summary
Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Steel Structure Items	۱۴	$۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۷
PMR For Steel Structure Items - BK12	۱۰	$۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
TBE For Steel Structure Items - BK12	۷	$۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۲
VDR For Steel Structure Items - BK12	۵	$۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۷
Anchor Bolts	۳۰	$۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۱
PMR For Anchor Bolts - BK12	۱۰	$۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
TBE For Anchor Bolts - BK12	۳۰	$۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۵
VDR For Anchor Bolts - BK12	۶	$۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۱
Blast Proof Doors	۳۰	$۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۱
PMR For Blast Proof Doors - BK12	۱۰	$۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
TBE For Blast Proof Doors - BK12	۳۰	$۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۵
VDR For Blast Proof Doors - BK12	۶	$۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۱
HVAC	۳۱	$۴۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
Main HVAC Equipment	۳۱	$۴۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
PMR For Main HVAC Equipment - BK12	۷	$۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
TBE For Main HVAC Equipment - BK12	۲۰	$۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۹
VDR For Main HVAC Equipment - BK12	۷	$۳۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
Piping	۴۰	$۵۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
Pipe	۳۵	$۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
PMR For Pipes - BK12	۷	$۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۶
TBE For Pipes - BK12	۲۵	$۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۰
VDR For Pipes - BK12	۷	$۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
Pipe Support	۳۵	$۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
PMR For Pipe Support - BK12	۷	$۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۲
TBE For Pipe Support - BK12	۲۵	$۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۷
VDR For Pipe Support - BK12	۷	$۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
Commissioning Engineering	۲۴۷	$۲۶۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۹
Operability Review	۵	$۵۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۴
Pre-Commissioning, Commissioning & Startup Procedure - BK12	۴۴	$۱۶۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Operating Manual - BK12	۳۰	$۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۹
Field Engineering	۲۰۵	$۳،۳۴۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۹
Technical/Site Queries	۴۴	$۱،۰۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۳
As-Built Document Booklets - BK12	۱۰	$۱،۰۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۹
Dossier	۳۱	$۱،۳۳۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۳
Final Engineering Dossier - BK12	۴۴	$۱،۳۳۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۳
PROCUREMENT	۲۱۰	$۲۵۸،۵۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۸
Mechanical	۵۴	$۱۶،۰۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۳

Month

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary

Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Drum	۵۴	$۹،۶۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
Tendering & Selection	۵	$۳۸۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۷
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۵۷۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
Manufacturing / Fabrication / Supply	۴۰	$۴،۸۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۰
Final Inspection	۷	$۹۶۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۷
Delivery On Site	۷	$۱،۹۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۴
Submitting Vendor Data Book	۵	$۴۸۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۹
Delivering Spare Parts	۵	$۴۸۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
Potable Tanks	۴۴	$۶،۴۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
Tendering & Selection	۷	$۲۵۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۳
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۳۸۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
Manufacturing / Fabrication / Supply	۳۰	$۳،۲۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۷
Final Inspection	۷	$۶۴۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۴
Delivery On Site	۷	$۱،۲۸۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۱
Submitting Vendor Data Book	۵	$۳۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۶
Delivering Spare Parts	۵	$۳۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
Piping	۴۹	$۳۰،۰۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
Pipes - BK12	۴۷	$۲۴،۰۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۹
Tendering & Selection	۷	$۹۶۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۷
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۱،۴۴۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
Manufacturing / Fabrication / Supply	۴۰	$۱۲،۰۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۰
Final Inspection	۷	$۲،۴۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۷
Delivery On Site	۷	$۶،۰۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۴
Submitting Vendor Data Book	۵	$۱،۲۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۹
Pipe Support - BK12	۴۴	$۶،۰۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
Tendering & Selection	۷	$۲۴۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۳
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۳۶۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
Manufacturing / Fabrication / Supply	۳۵	$۳،۰۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۲
Final Inspection	۷	$۶۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۹
Delivery On Site	۷	$۱،۵۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۶
Submitting Vendor Data Book	۵	$۳۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
HVAC	۴۶	$۵،۹۹۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۸
Main HVAC Equipment - BK12	۴۶	$۵،۹۹۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۸
Tendering & Selection	۵	$۲۴۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۳۶۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
Manufacturing / Fabrication / Supply	۴۰	$۲،۹۹۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۹

Month

Actual Work | Remaining Work | Critical Remaining Work | Milestone | Summary

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Final Inspection	۷	$۶۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
Delivery On Site	۷	$۱،۴۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
Submitting Vendor Data Book	۵	$۳۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۸
Electrical	۱۶۹	$۲۰۶،۵۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
Tray/Ladder and Accessories - BK12	۶۲	$۲،۱۶۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۰
Tendering & Selection	۱۰	$۸۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۸
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۱۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۲
Manufacturing / Fabrication / Supply	۶۰	$۱،۰۸۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
Final Inspection	۷	$۲۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
Delivery On Site	۷	$۵۴۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۵
Submitting Vendor Data Book	۵	$۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۰
Emergency Diesel Generator - BK12	۵۴	$۲۶،۱۴۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱
Tendering & Selection	۵	$۱،۰۴۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۵
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۱،۵۶۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۰
Manufacturing / Fabrication / Supply	۵۰	$۱۳،۰۷۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
Final Inspection	۷	$۲،۶۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
Delivery On Site	۷	$۵،۲۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۲
Submitting Vendor Data Book	۵	$۱،۳۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۷
Delivering Spare Parts	۵	$۱،۳۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۱
DC Charger - BK12	۵۴	$۱۶،۸۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱
Tendering & Selection	۵	$۶۷۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۵
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۱،۰۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۰
Manufacturing / Fabrication / Supply	۵۰	$۸،۴۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
Final Inspection	۷	$۱،۶۸۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
Delivery On Site	۷	$۳،۳۶۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۲
Submitting Vendor Data Book	۵	$۸۴۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۷
Delivering Spare Parts	۵	$۸۴۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۱
Electrical Bulk Items - BK12	۴۹	$۲،۱۶۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۳
Tendering & Selection	۵	$۸۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۹
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۱۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
Manufacturing / Fabrication / Supply	۴۰	$۱،۰۸۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۴
Final Inspection	۷	$۲۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۱
Delivery On Site	۷	$۵۴۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۸
Submitting Vendor Data Book	۵	$۱۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۳
Transmission Over head Line - BK12	۵۷	$۳۹،۵۴۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۳
Tendering & Selection	۵	$۱،۵۸۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۱

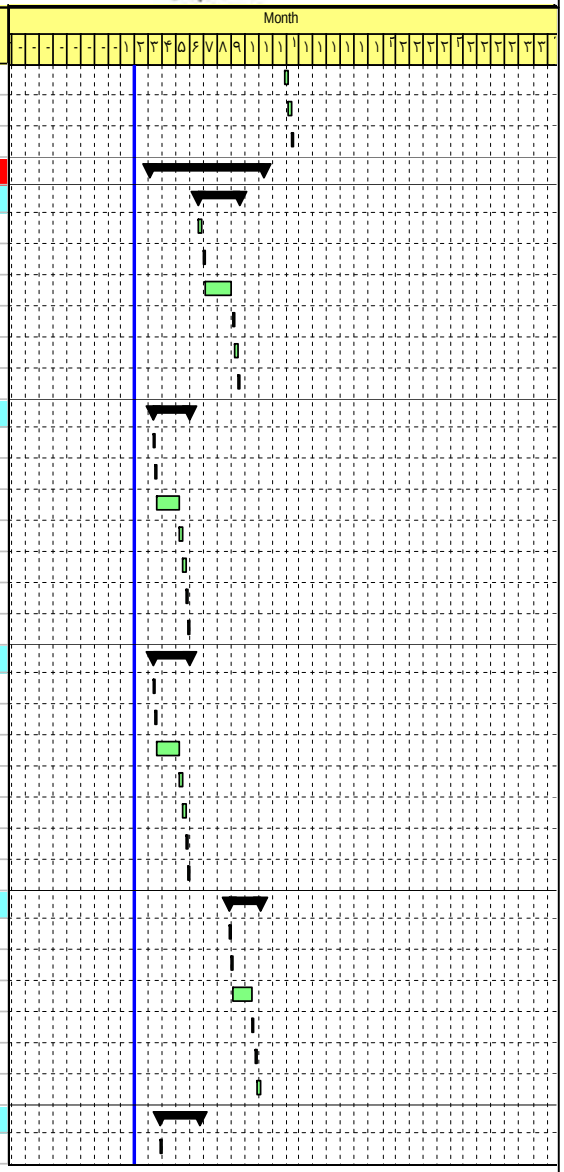

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۲،۳۷۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۶
Manufacturing / Fabrication / Supply	۶۰	$۱۹،۷۷۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۴
Final Inspection	۷	$۳،۹۵۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۱
Delivery On Site	۷	$۹،۸۸۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۸
Submitting Vendor Data Book	۵	$۱،۹۷۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۳
Transformers - BK12	۷۸	$۲۹،۵۹۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۱
Tendering & Selection	۱۰	$۱،۱۸۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۵
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۱،۷۷۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۰
Manufacturing / Fabrication / Supply	۶۵	$۱۴،۷۹۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۳
Final Inspection	۷	$۲،۹۵۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
Delivery On Site	۷	$۵،۹۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۶
Submitting Vendor Data Book	۲۱	$۱،۴۸۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۷
Delivering Spare Parts	۵	$۱،۴۸۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۱
LV Switchgear & MCC - BK12	۷۴	$۲۵،۵۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶
Tendering & Selection	۱۰	$۱،۰۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۵
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۱،۵۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۰
Manufacturing / Fabrication / Supply	۶۰	$۱۲،۷۶۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۸
Final Inspection	۷	$۲،۵۵۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
Delivery On Site	۷	$۵،۱۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۱
Submitting Vendor Data Book	۲۰	$۱،۲۷۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۱
Delivering Spare Parts	۵	$۱،۲۷۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۶
Capacitor Bank - BK12	۷۴	$۵،۱۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۷
Tendering & Selection	۱۰	$۲۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۵
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۳۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۰
Manufacturing / Fabrication / Supply	۶۰	$۲،۵۵۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۸
Final Inspection	۷	$۵۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
Delivery On Site	۷	$۱،۰۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۱
Submitting Vendor Data Book	۲۰	$۲۵۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۱
Delivering Spare Parts	۶	$۲۵۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۷
Lighting & Distribution Main Panels - BK12	۶۷	$۶،۱۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۳
Tendering & Selection	۱۰	$۲۴۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۷
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۳۶۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
Manufacturing / Fabrication / Supply	۶۰	$۳،۰۵۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۰
Final Inspection	۷	$۶۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۶
Delivery On Site	۷	$۱،۲۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
Submitting Vendor Data Book	۵	$۳۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۸

Month

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary

Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Delivering Spare Parts	۵	$۳۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۳
Lighting and Small Power Equipment - BK12	۵۷	$۱۲،۳۷۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
Tendering & Selection	۱۰	$۴۹۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۷۴۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
Manufacturing / Fabrication / Supply	۴۱	$۶،۱۸۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۰
Final Inspection	۷	$۱،۲۳۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۷
Delivery On Site	۷	$۲،۴۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۴
Submitting Vendor Data Book	۵	$۶۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۹
Delivering Spare Parts	۵	$۶۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
Power & Control Cables - BK12	۵۳	$۱۴،۹۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
Tendering & Selection	۱۰	$۵۹۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۸۹۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۶
Manufacturing / Fabrication / Supply	۴۰	$۷،۴۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۶
Final Inspection	۷	$۱،۴۹۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۳
Delivery On Site	۷	$۳،۷۳۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
Submitting Vendor Data Book	۵	$۷۴۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
UPS System - BK12	۷۰	$۱۶،۱۹۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
Tendering & Selection	۷	$۶۴۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۴
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۹۷۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۹
Manufacturing / Fabrication / Supply	۷۰	$۸،۰۹۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۷
Final Inspection	۷	$۱،۶۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۴
Delivery On Site	۷	$۳،۲۳۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
Submitting Vendor Data Book	۵	$۸۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۶
Delivering Spare Parts	۵	$۸۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
Earthing & Lightning System - BK12	۵۰	$۹،۸۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۲
Tendering & Selection	۵	$۳۹۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
Contract Effectiveness/Purchase Order Placed	۵	$۵۹۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۰
Manufacturing / Fabrication / Supply	۴۰	$۴،۹۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۹
Final Inspection	۷	$۹۸۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
Delivery On Site	۷	$۱،۹۶۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۲
Submitting Vendor Data Book	۵	$۴۹۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۷
Delivering Spare Parts	۵	$۴۹۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۲
Construction	۲۵۹	$۱۳۷،۰۸۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۹
Wellpad and Access Road	۸۶	$۴۱،۱۲۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۷
Access Road	۳۷	$۱۴،۳۹۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲
Wellpad Access Road	۳۷	$۱۲،۹۵۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲

Month

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary

Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

HIRGAN ENERGY

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
بسته های کاری سطح الارض

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Access Road Preparation	۱۰	$۷،۷۷۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
Filling and Compaction	۵	$۶۴۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۷
Sub-Base Layer	۵	$۱،۲۹۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۲
Retaining wall	۱۵	$۲،۵۹۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۲
Excavation	۱۰	$۲۵۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۰
lean concrete	۵	$۳۸۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
form working	۲	$۹۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۷
concrete pouring	۵	$۱،۰۳۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۲
Construction of Culvert and Bridge	۲۱	$۶۴۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۲
bridge	۲۱	$۲۵۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۲
Excavation	۱۰	$۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۰
lean concrete	۲	$۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۲
wall	۳	$۴۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
reinforcement	۳	$۵۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۷
form working	۲	$۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۹
concrete pouring	۵	$۷۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۴
protect stone	۳	$۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۷
Backfill	۶	$۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۲
culverts	۱۲	$۳۸۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۹
pipeway culvert	۸	$۱۵۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
pipeway	۴	$۱۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۲
pipeline culvert	۷	$۱۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۹
Burn Pit Access Road	۱۱	$۱،۴۳۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۴
ROW Preparation	۱۰	$۷۹۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۸
Filling and Compaction	۵	$۲۸۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۲
Sub-Base Layer	۲	$۳۶۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۴
Wellpad	۸۶	$۲۶،۷۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۷
Water Supply	۱۹	$۱،۸۷۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
Water Supply	۲۵	$۱،۸۷۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
Demolition & Disassemble	۶	$۴،۰۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۸
Demolition of concrete Well Pad	۵	$۱،۲۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۴
Fence Disassmble	۴	$۲،۸۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۸
Site Preparation	۱۹	$۴،۰۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
Site Preparation #12	۳۰	$۴،۰۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
Surface Preparation	۲	$۱،۰۶۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۶
Gravel Paving	۴	$۱،۰۶۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۶
Civil Work	۲۳	$۶،۶۸۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۲

Month

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
(Excavation and Soil Removal (Cellar	۱۵	$۴،۳۴۴	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۴
Installation of Conductor Pipe	۱۵	$۴۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۴
(Form Work (Above Cellar	۹	$۲۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۳
Armed Concrete	۱۰	$۱،۶۷۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۲
Mud Channel	۱۰	$۸۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۴
Excavation & Repair	۱۵	$۸۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۴
Mud Pit	۲۰	$۴،۰۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
Soil Removal, Filling and Compaction of Mud Pit Area	۱۵	$۱،۴۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۹
Construction of Mud Pit's Walls	۱۹	$۸۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۷
Supply & Installation sealling Layer	۶	$۱،۸۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
SepticTank	۳۹	$۱،۸۷۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۲
Excavation & Soil Transfer	۲۰	$۵۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
Levelling	۱۵	$۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۸
Tank Supply	۲۰	$۱،۰۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
Tank Execution	۱۵	$۱۷۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۲
Backfilling & Compaction	۱۰	$۵۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۲
Burn Pit	۵۸	$۱،۰۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۷
Soil Removal, Triming ,Filling and Compaction of Burn Pit Area	۳۰	$۸۵۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۱
Construction & Installation of Support	۳۵	$۵۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۶
Welding, Installation and Testing	۱۵	$۱۶۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۷
Gasoil Pad	۹	$۱،۳۳۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
Excavation	۵	$۲۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۱
lean concrete	۲	$۴۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۳
Form work	۳	$۱۳۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۶
Armed Concrete	۵	$۵۳۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
Wellhead Facility and Flowline	۷۱	$۹۳،۹۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Civil, Structure & Architecture	۴۹	$۳۲،۸۶۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۵
Civil Works	۱۱	$۶،۹۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۸
(Steel Works(Wellhead Facilities	۱۰	$۳،۱۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
(… Out Door Post Works For New Gantry (Fundation, Fencing	۷	$۱،۷۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۸
(… Out Door Post Works For Wellhead Post (Fundation, Fencinc	۱۲	$۱،۷۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۳
Well Pad Fencing	۱۲	$۳۴۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۳
Buildings	۴۹	$۲۰،۰۴۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۵
Construction of Guard House	۲۹	$۵،۶۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۴
Foundation	۱۹	$۱،۷۴۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
(Excavation & Soil Transfer (Removing of Vegetal Soil	۲	$۳۴۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۳
Levelling	۵	$۳۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۸

Month

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary

Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Lean Concrete	۲	$۱۷۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
Reinforced Work	۵	$۳۴۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۵
Formwork	۴	$۱۳۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
Main Concrete Pouring	۵	$۶۷۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۴
Backfilling & Compaction	۶	$۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
Structure	۱۳	$۲،۲۴۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۳
Steel Material Supply	۵	$۱،۱۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۸
Shop Fabrication of Steel Structure	۷	$۴۴۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۵
Structural Installation	۵	$۴۴۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۰
Structural Painting	۳	$۲۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۳
Architectural	۱۵	$۱،۶۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۴
Wall Execution	۵	$۷۹۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
Roof Covering	۴	$۱۹۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۲
(Roof Execution (Block Joist, Concrete Pouring	۴	$۲۴۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۶
(Building Walkway (around Building	۵	$۸۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۱
(Joinery (Cornice, Faï?½ade, Plaster	۳	$۳۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۴
Construction of Switchgear	۴۹	$۱۴،۴۳۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۵
Foundation	۱۸	$۴،۴۷۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۷
(Excavation & Soil Transfer (Removing of Vegetal Soil	۲	$۸۹۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۳
Levelling	۶	$۸۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
Lean Concrete	۲	$۴۴۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۲
Reinforced Work	۵	$۸۹۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۷
Formwork	۴	$۳۵۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۰
Main Concrete Pouring	۵	$۱،۷۴۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۵
Backfilling & Compaction	۲	$۴۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۷
Structure	۱۲	$۵،۷۷۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۰
Steel Material Supply	۵	$۲،۸۸۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۸
Shop Fabrication of Steel Structure	۵	$۱،۱۵۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۳
Structural Installation	۵	$۱،۱۵۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۸
Structural Painting	۲	$۵۷۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۰
Architectural	۳۶	$۴،۱۸۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۵
Wall Execution	۴	$۲،۰۴۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۴
Roof Covering	۳	$۴۹۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۷
(Roof Execution (Block Joist, Concrete Pouring	۳	$۶۳۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
(Building Walkway (around Building	۳	$۲۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۳
(Joinery (Cornice, Faï?½ade, Plaster	۲	$۷۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۵

Month

Actual Work | Remaining Work | Critical Remaining Work | Summary | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Shelters	۱۳	$۵،۹۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
Diesel Generator Shelter	۱۳	$۴،۸۵۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
Fabrication	۱۰	$۳،۳۹۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۱
Installation	۷	$۱،۴۵۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
Fire Fighting Shelter	۱۳	$۱،۰۶۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
Fabrication	۱۰	$۷۴۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۱
Installation	۷	$۳۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
Piping	۱۷	$۹،۳۹۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
Sweep Bend Installation	۷	$۴۷۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۸
(…Piping Work (Fit up, Welding, NDT	۱۵	$۳،۷۵۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۶
Valves, Fitting and Spools Installation and Hydrotest	۱۰	$۵،۱۶۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
Instrument Works	۴	$۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۲
Devices Installation and Piping Connecton	۷	$۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۲
Mechanical	۵	$۹،۳۹۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
Fuel Oil Storage Drum	۷	$۴،۶۹۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
Potable Water Tank	۷	$۴،۶۹۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
Electrical	۵۳	$۴۰،۳۷۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲
Over Head line	۱۵	$۲۱،۴۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۶
Wellhead Electrical Equipment	۷	$۱۲،۱۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۲
(Outdoor Post (Wellhead Post	۱۰	$۶،۸۶۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۳
Pre-commissioning	۵	$۱،۸۷۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Pre-commissioning	۷	$۱،۶۹۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۶
(Ready for Comm.Certificate(RFCC	۵	$۱۸۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۵
(Job Site HSE Supervision (Surface	۱۳۵	$۲۷۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۷
(Job Site HSE Supervision (Surface	۲۰۰	$۲۷۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۷
Commissioning, Startup & Handover	۵۸	$۱،۷۸۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۹
Commissioning	۲۱	$۵۳۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۶
Materials & Utilities Ready for Commissioning	۳	$۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۸
Receiving Facilities Ready for Commissioning	۲	$۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۳۰
Permits Obtained for Commissioning	۱۰	$۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۹
Integrated Commissioning	۲	$۴۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۱
(Ready for Startup Certificate (RFSU	۱۵	$۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۶
Startup & Performance Test	۱۲	$۷۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۳
Startup & Performance Test Run	۳	$۵۷۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۹
(Start of Production (SOP	۱۵	$۱۴۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۳
Handover	۲۵	$۵۳۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۹
Compiling & Submitting Final Documentation	۲۰	$۱۶۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۲

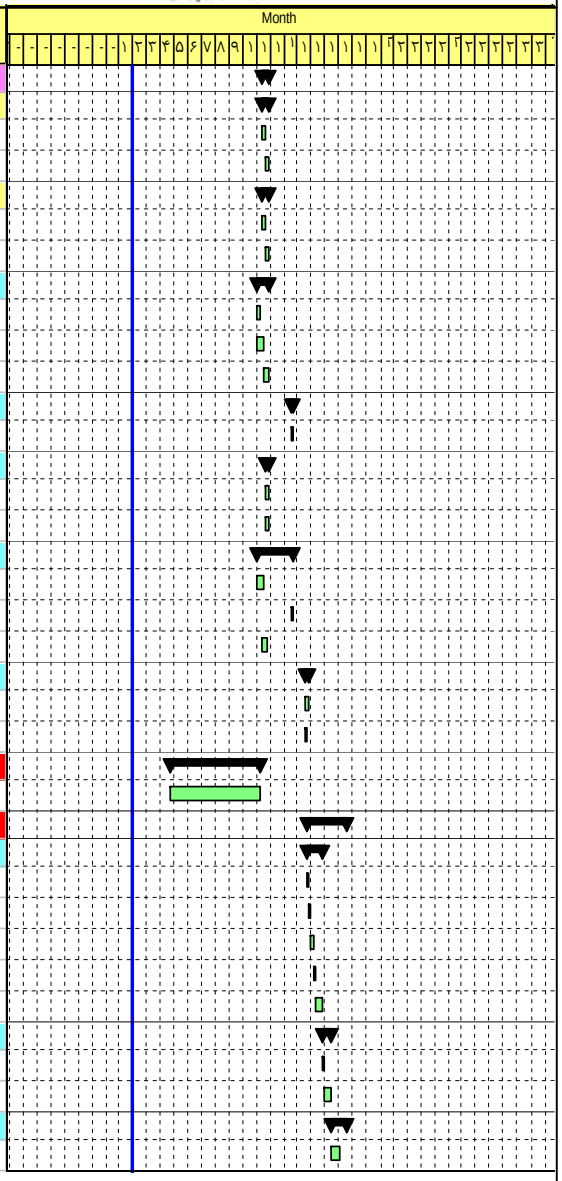

Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Training of Operator's Personnel	۲	$۲۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۴
(Provisional Acceptance Certificate (PAC	۱۵	$۱۶۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۹
Package 09-Workover # 15	۳۴۱	$۶۱۳,۲۷۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۳
ENGINEERING	۲۸۵	$۱۳,۳۸۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۶
Basic Design Endorsement	۱۷	$۶۶۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
Endorsement Report For Basic Design & Scope of Work	۳۰	$۶۶۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
Value Engineering	۲۹	$۴۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
Value Engineering Study Report	۴۴	$۴۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
Detail Design	۲۸۳	$۷,۳۶۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۵
Process	۶۷	$۳۵۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۹
Drawing/Diagram	۲۹	$۲۴۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
P&ID for Diesel Oil Drum- BK15	۴۴	$۱۲۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
P&ID for Potable Water Tank - BK15	۴۴	$۱۲۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
List	۲۷	$۵۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Line List - BK15	۴۴	$۵۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Data Sheet	۵۹	$۵۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۹
Process Data Sheets For Instrument Devices - BK15	۳۶	$۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۷
Process Data Sheets For Fuel Oil Storage Drum of Well Pads	۵۵	$۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۹
Process Data Sheets For Potable Water Tank of Well Pads	۴۵	$۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
Mechanical	۷۳	$۴۹۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
Basis/Criteria	۳۳	$۵۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
Mechanical Design Criteria	۵۴	$۵۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
Specification	۵۳	$۸۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
Specification For Pressure Vessels	۵۴	$۴۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
Specification For Atmospheric Above Ground Welded Steel Tanks	۷۹	$۴۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
Data Sheets	۴۸	$۱۳۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
Data Sheets For Fuel Oil Storage Drum of Well Pads	۶۴	$۶۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
Data Sheets For Potable Water Tank of Well Pads	۶۴	$۶۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
Drawing/Diagram	۲۲	$۲۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۶
Standard Detail Drawing For Pressure Vessels and Heat Exchang	۱۴	$۱۰۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۶
Standard Detail Drawing For Storage Tanks	۱۴	$۱۰۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۶
HVAC/Plumbing	۲۶۲	$۴۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۵
Basis/Criteria	۴۰	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۳
HVAC & Plumbing Design Criteria	۶۴	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۳
Specification	۴۲	$۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
Specification For HVAC Equipment	۶۴	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
Specification For Duct Work & Pipe Work	۶۴	$۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۸

Month

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary

Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Calculation	۶۰	$۹۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
HVAC Calculation Note For Switchgear Building - BK15	۴۴	$۴۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
HVAC Calculation Note For Security Building - BK15	۴۴	$۴۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۴
Data Sheets	۳۰	$۴۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۸
Data Sheets For Main HVAC Equipment - BK15	۴۴	$۴۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۸
Drawing/Diagram	۱۲۸	$۲۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۸
Standard Drawing For HVAC & Plumbing	۱۴	$۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
Symbol & Legend For HVAC & Plumbing	۴۸	$۲	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۶
HVAC System Layout For Switchgear Building - BK15	۴۴	$۵۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۴
HVAC System Layout For Security Building - BK15	۴۴	$۵۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۷
Plumbing & Sewage Piping Layout For Switchgear Building - BK15	۴۴	$۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۸
Plumbing & Sewage Piping Layout For Security Building - BK15	۴۴	$۵۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۰
MTO	۵	$۴۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۵
MTO For Building HVAC & Plumbing Systems - BK15	۷	$۴۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۵
Piping	۳۰	$۳۵۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۹
Basis/Criteria	۲۴	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
Piping Design Criteria	۳۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
Specification	۲۸	$۱۳۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Color Coding and Marking	۳۹	$۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Transportation, Handling, Storage of pipes	۳۹	$۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For the Design of Piping in Mechanical Packages	۳۹	$۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Metallic Pipes	۳۹	$۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Fittings, Flanges, Gaskets and Bolts	۳۹	$۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۶
Specification For Painting	۳۹	$۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۴
(Specification For Lining (Internal Protection of Equipment by Pair	۳۹	$۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Material Requirements in Sour service	۳۹	$۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Manual Valves	۳۹	$۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Plant Piping Systems Pressure Testing	۳۹	$۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Welding of Plant Piping System	۳۹	$۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Flexibility Analysis	۳۹	$۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
Specification For Piping Cleaning and Flushing	۳۹	$۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۴
Drawing/Diagram	۸	$۱۰۵	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
Standard Pipe Support Drawings	۱۴	$۱۰۵	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
MTO	۴	$۱۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۹
MTO For Pipes - BK15	۷	$۱۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۹
Electrical	۱۵۲	$۱،۷۸۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
Basis/Criteria	۳۳	$۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲

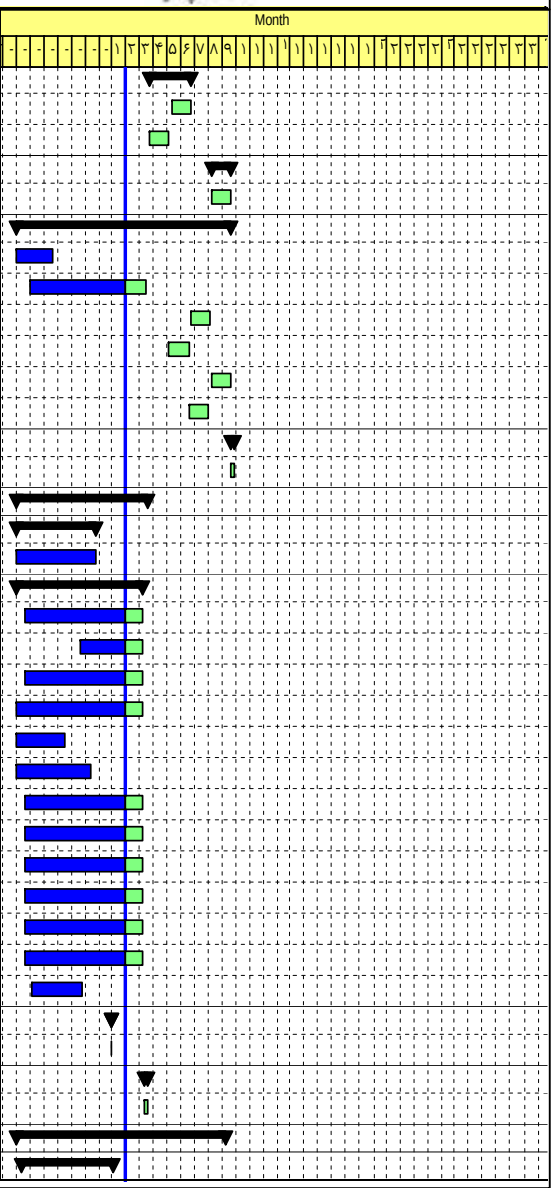

Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone
Summary

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Electrical System Design Criteria	۵۴	$۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲
Specification	۳۵	$۱۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۷
Specification For LV Switchgear & Motor Control Centers	۴۹	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Specification For MV Switchgear	۴۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Specification For UPS System	۴۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Specification For Transformers	۴۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۷
Specification For DC Charger	۴۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۶
Specification For Earthing & Lightning System	۴۹	$۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
Specification For Lighting & Small Power System	۴۹	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
Specification For Bulk Materials	۴۹	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۶
Specification For Diesel Generator	۴۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
Specification For LV Induction Motors	۴۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Specification For Electrical Requirements of Packaged Units	۴۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
Specification For Capacitor Bank	۴۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Specification For Distribution & Lighting Panels	۴۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
Specification For Power & Control Cables	۴۹	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Specification For Cathodic Protection System	۴۹	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۶
Specification For MV Induction Motors	۴۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Specification For NGR	۴۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Specification For Overhead Transmission Lines	۴۹	$۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Calculation	۸۹	$۱۹۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۴
Calculation Note For Lighting System of Well Pads Switchgear Bu	۵۵	$۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۰
Calculation Note For Lighting System of Well Pads Security Buildi	۵۵	$۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۰
Calculation Note For Lighting System of Well Pads Area	۶۰	$۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۴
Calculation Note For Cable Sizing of Well Pads	۶۰	$۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
Calculation Note For UPS System of Well Pads	۶۰	$۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
Calculation Note For Earthing & Lightning System of Well Pads	۶۰	$۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
Calculation Note For Diesel Generator Sizing of Well Pads	۵۵	$۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۳
Calculation Note For DC Charger of Well Pads	۶۰	$۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
Calculation Note For LV Capacitor Bank of Well Pads	۴۰	$۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
Calculation Note For 11 KV Over Head Line Sag and Tension	۴۰	$۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۳
Calculation Note For 33 KV Over Head Line Sag and Tension	۴۰	$۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۳
Data Sheets	۱۴۷	$۱۶۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
Data Sheets For UPS of Well Pads	۵۹	$۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
Data Sheets For DC Charger of Well Pads	۵۹	$۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
Data Sheets For Diesel Generator of Well Pads	۵۹	$۱۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۷

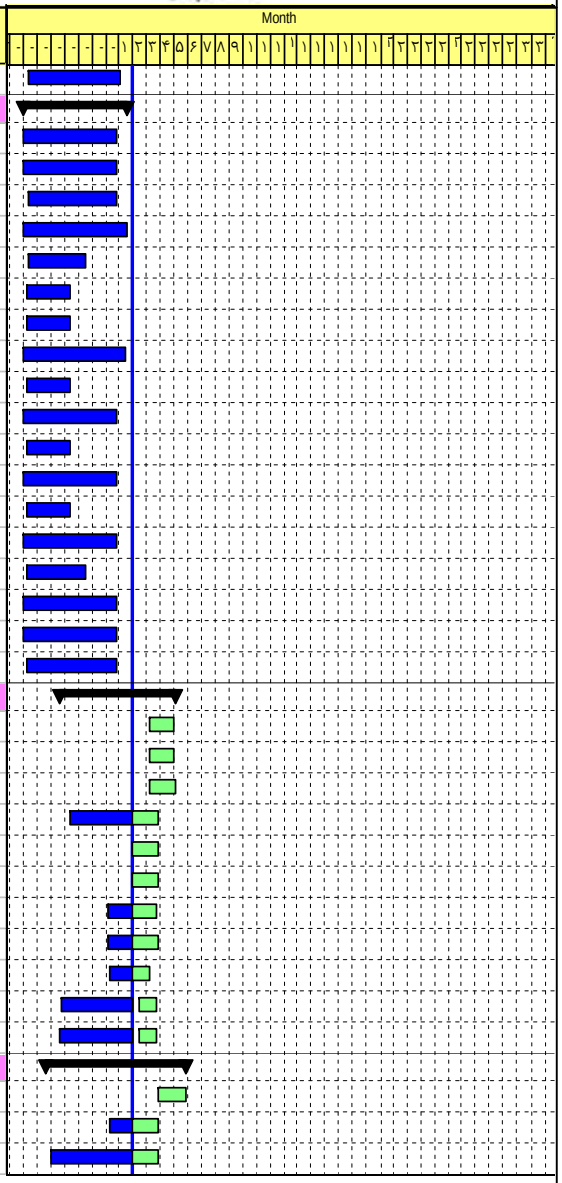

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary

Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Data Sheets For LV Capacitor Bank of Well Pads	۵۹	$۱۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
Data Sheets For LV Switchgear of Well Pads	۵۴	$۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
Data Sheets For Power & Control Cables of Well Pads	۵۹	$۱۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
Data Sheets For Power Transformers of Well Pads	۵۹	$۱۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
Data Sheets For Distribution & Lighting Panels of Well Pads	۵۹	$۱۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۱۱KV Over Head Line Study Report	۴۴	$۲۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۳۳KV Over Head Line Study Report	۴۴	$۲۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۶
Drawing/Diagram	۱۴۶	$۴۷۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹
Electrical Legend and Symbols	۴۹	$۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۷
Typical Installation Details & Notes For Earthing and Lightning Prc	۱۴	$۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۷
Typical Installation Details & Notes For Lighting System	۱۴	$۱۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۳
Typical Installation Details & Notes For Power System	۱۴	$۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۷
Installation Details & Notes For Cathodic Protection Systems	۷۴	$۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
Typical Installation Details For Over Head Line Equipment	۱۴	$۸	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۶
Installation Detail & Notes for Connection OHL to Gantries for We	۵۴	$۳۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
Electrical Typical Schematic Diagrams For LV Panels of Well Pad:	۱۴	$۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۸
Control Logic Diagram For LV Incomers of Well Pads	۷۴	$۱۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
Earthing Layout For Electrical Tower (Gantry) of Well Pads	۶۴	$۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۷
Cable Route Layout For Electrical Tower (Gantry) of Well Pads	۷۴	$۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶
Overall Single Line Diagram of Well Pads	۷۹	$۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
Single Line Diagram For LV Switchgear of Well Pads	۷۴	$۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۶
Single Line Diagram For LV Power Distribution Panel of Well Pad	۷۴	$۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
Single Line Diagram For DC Charger of Well Pads	۷۴	$۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۶
Single Line Diagram For Capacitor Banks of Well Pads	۷۴	$۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۶
Interconnection Wiring Diagram of Well Pads	۶۴	$۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
Area Lighting & Small Power Layout of Well Pads of Well Pads	۷۴	$۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶
Lighting & Small Power Layout For Switchgear Building of Well P:	۶۴	$۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۴
Lighting & Small Power Layout For Security Building of Well Pads	۶۴	$۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹
Area Electrical Cable Route & Section Layout of Well Pads	۷۹	$۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۱
Electrical Cable Route & Section Layout For Switchgear Building	۷۴	$۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶
Electrical Equipment Arrangement Layout For Switchgear Building	۷۹	$۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۸
Earthing & Lightning Layout for well pads	۶۴	$۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۰
۱۱KV Over Head Line Study Report	۴۴	$۴۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۳۳KV Over Head Line Study Report	۴۴	$۴۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۳۰
List	۷۴	$۵۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
Electrical Load List of Well Pads	۴۵	$۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۳

Month

Actual Work | Remaining Work | Critical Remaining Work | Summary | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Electrical Power & Control Cable List of Well Pads	۷۴	$۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
Cable Drum Schedule and Cutting List of Well Pads	۷۴	$۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
Report	۷۰	$۳۳۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۸
Electrical Network (Load Flow, Motor Starting & Short Circuit) Stu	۵۴	$۹۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
Relay Coordination & Setting Study Report of Well Pads	۵۴	$۹۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۸
۱۱KV Over Head Line Study Report	۴۴	$۷۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۳۳KV Over Head Line Study Report	۴۴	$۷۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۳۰
MTO	۹۸	$۴۳۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
MTO For Transmission Over Head Line - BK15	۷	$۱۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۷
MTO For Lighting & Small Powers - BK15	۷	$۶۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۲
MTO For Power & Control Cables - BK15	۷	$۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
MTO For Tray/Ladder and Accessories - BK15	۷	$۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۶
MTO For Electrical Bulk Items - BK15	۷	$۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۸
MTO For Earthing & Lightning Systems - BK15	۷	$۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
Architecture	۱۸۱	$۷۷۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۶
Basis/Criteria	۴۷	$۱۵۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
Architectural Design Criteria	۷۴	$۱۵۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
Specification	۲۵	$۱۹۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Buildings General Specification	۴۴	$۱۹۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Drawing/Diagram	۱۷۷	$۱۸۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹
Architectural Drawing For Diesel Generator Shelter of Well Pads	۴۴	$۶۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹
Architectural Drawing For Switchgear Building of Well Pads - BK-	۴۴	$۶۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
Architectural Drawing For Security Building of Well Pads - BK-15	۴۴	$۶۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
MTO	۵	$۲۳۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۶
MTO For Architectural Works - BK15	۷	$۲۳۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۶
Civil	۵۹	$۷۴۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
Basis/Criteria	۵۸	$۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Civil Design Criteria	۶۴	$۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Design Criteria for Sewerage & Drainage	۴۴	$۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Design Criteria for Road and Paving	۴۴	$۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Specification	۵۸	$۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
Specification For Civil Works	۷۹	$۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
Specification For Road & Paving	۶۴	$۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Specification For Fence & Gate	۶۴	$۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۵
Specification For Earth Work	۶۴	$۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Specification For Sewerage & Drainage	۶۴	$۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۱
Specification For Geological & Geotechnical Survey	۴۴	$۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲

Month

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary

Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.

HIRGAN ENERGY

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک

بسته های کاری سطح الارض

Activity Name	Original Duration	Cost	Start	Finish
Drawing/Diagram	۵۴	$۵۶۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵
Standard Drawing For Civil Works	۴۵	$۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۳
Standard Drawing For Slope Protection Details	۴۵	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
Standard Drawing For Roads	۴۵	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۳
Standard Drawing For Electrical Cable Trench	۴۵	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
Standard Drawing For Manholes	۴۵	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۳
Standard Drawing For Catch Basins	۴۵	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۳
Standard Drawing For Sewerage & Drainage Details	۴۵	$۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۳
Standard Drawing For Civil Underground Crossings	۳۸	$۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
Standard Drawing For Fence & Gate Details	۴۵	$۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۹
Standard Drawing For Concrete Continues Weight	۳۸	$۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷
Standard Drawing For Major Floodway Crossing	۳۸	$۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
Standard Drawing For Culvert & Details	۳۸	$۱۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۴
Standard Drawing For Valve Box	۳۸	$۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۲
Standard Drawing For Fire Hydrant Pit	۳۸	$۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
Standard Drawing For Cable Pull Pit	۴۵	$۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۳
Standard Drawing For Pavings	۳۸	$۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
Standard Drawing For Earth Pit	۳۸	$۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
Standard Detail For Pipe Bedding	۴۵	$۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
Standard Details of Miscellaneous Items	۴۵	$۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۳
BINAK Oil Field Project Overall Well Location/Facilities Layout	۴۵	$۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۳
Civil and Structural drawings - BK15	۴۴	$۱۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۵
General Civil Layout - BK15	۴۴	$۱۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۵
Rough Grading Plans -BK15	۴۴	$۱۵۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۵
Report	۲۵	$۹۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Site Visit Report (Civil Work) - BK15	۴۴	$۹۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
MTO	۵	$۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
MTO For Civil Works - BK15	۷	$۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
Structure	۱۲۵	$۹۸۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۱
Basis/Criteria	۳۸	$۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Structural Design Criteria	۶۴	$۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Design Criteria For Steel Structure	۴۴	$۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Design Criteria For Load & Forces	۴۴	$۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
Specification	۶۰	$۸۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Specification For Concrete Work	۶۴	$۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
Specification For Storage Tank Foundation	۳۸	$۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۸

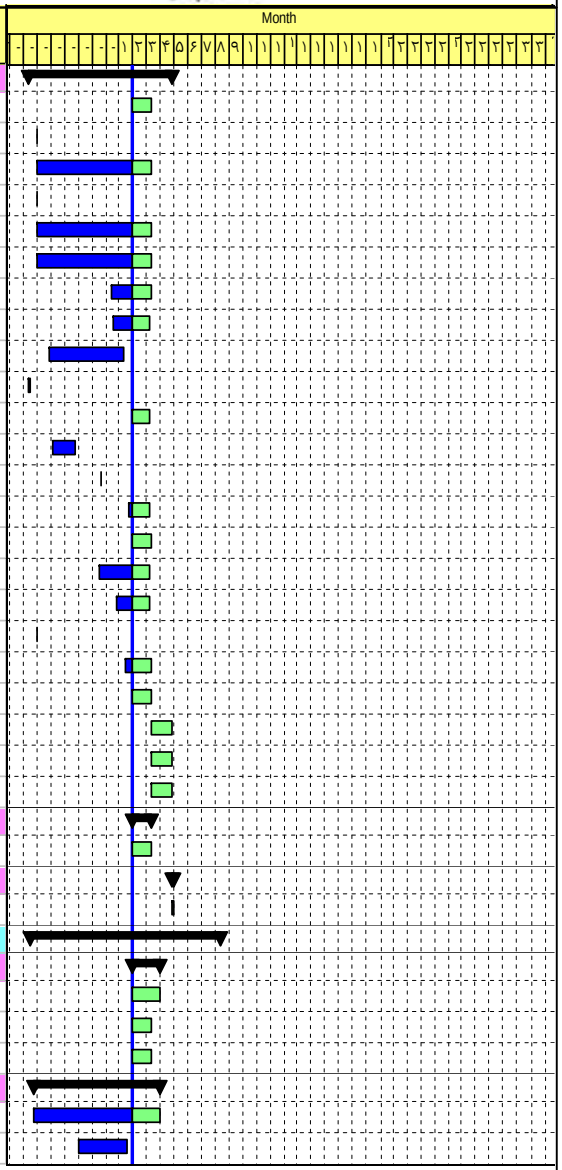

Actual Work | Critical Remaining Work | Summary
Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Primavera Systems, Inc.
