

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه: ۱ از ۱۳۲
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03

طرح نگهداشت و افزایش تولید ۲۷ مخزن

VALUE ENGINEERING STUDY REPORT

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک

Rev.	Date	Purpose of Issue/Status	Prepared by:	Checked by:	Approved by:	CLIENT Approval
D03	OCT. 2022	AFD	3 RD Party	M.Fakharian	M.Mehrshad	
D02	JUL. 2022	IFA	3 RD Party	M.Fakharian	M.Mehrshad	
D01	APR. 2022	IFA	3 RD Party	M.Fakharian	M.Mehrshad	
D00	JAN. 2022	IFC	3 RD Party	M.Fakharian	M.Mehrshad	

Class: 3

CLIENT Doc. Number: F0Z-707338

Status:

IDC: Inter-Discipline Check
 IFC: Issued For Comment
 IFA: Issued For Approval
 AFD: Approved For Design
 AFC: Approved For Construction
 AFP: Approved For Purchase
 AFQ: Approved For Quotation
 IFI: Issued For Information
 AB-R: As-Built for CLIENT Review
 AB-A: As-Built –Approved

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه پتروایران 	
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۲ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

فهرست مطالب

پیش گفتار:	۸
فصل ۱ - چکیده ای از کل فعالیت ها و نتایج حاصله در مطالعات مهندسی ارزش	۱۰
الف (چکیده ای از فعالیت ها و نتایج پیش کارگاه	۱۰
ب (چکیده ای از کل فعالیت ها و نتایج کارگاه مطالعات	۱۰
(۱) فعالیت های انجام شده در فاز ۱ (فاز استراتژیک)	۱۱
(۲) فعالیت های انجام شده در فاز ۲ (فاز خلاقیت)	۱۱
(۳) فعالیت های انجام شده در فاز ۳ (فاز قضاوت)	۱۱
(۴) فعالیت های انجام شده در فاز ۴ (فاز توسعه)	۱۲
(۵) فعالیت های انجام شده در فاز ۵ (فاز ارائه)	۱۳
(۶) اهم نتایج حاصله از کل مطالعات	۱۳
فصل ۲ - شرح فعالیت ها و نتایج حاصله از پیش کارگاه مطالعات مهندسی ارزش	۱۶
۱- خلاصه شرح فعالیتهای انجام شده در پیش کارگاه	۱۶
نمودار شماره ۱ - مراحل انجام شده در پیش کارگاه	۱۶
مرحله ۱-۱) شرح استراتژیهای نهایی شده جهت اجرای کارگاه	۱۹
۱-۱-۱- محدوده انجام مطالعات مهندسی ارزش	۱۹
۱-۱-۲- بررسی اهداف مطالعات مهندسی ارزش	۲۰
۱-۱-۳- ذینفعان پروژه و نوع انتفاع آنها	۲۲
۱-۱-۴- محدوددهای ممنوعه در مطالعات ارزش پروژه	۲۵
مرحله ۲-۱) تحلیل کارکردها	۲۵
۱- تعیین کارکردهای پروژه	۲۵
۲- تدوین نمودار FAST پروژه	۲۶
نمودار شماره ۲ : نمودار تحلیلی FAST تجمیعی	۲۸
نمودار شماره ۳ : نمودار تحلیلی FAST ایستگاه تقویت فشار گاز و SLUG CATCHER و خط لوله انتقال میعانات گازی	۲۹
نمودار شماره ۴ : نمودار تحلیلی FAST خط لوله گاز	۳۰
نمودار شماره ۵ - نمودار تحلیلی FAST ، تأسیسات سرچاهی و خطوط لوله به منیفولد	۳۱
نمودار شماره ۶ : نمودار تحلیلی FAST مجموعه منیفولد	۳۲
مرحله ۳-۱) بررسی ریسکهای وارد بر پروژه	۳۳
گام اول : گروه بندی ریسکها	۳۳
گام دوم : تعیین ریسکها	۳۳
گام سوم : تحلیل ریسکها	۳۳
گام چهارم : تعیین عوامل تأثیر گذار بر ریسکها	۳۳
مرحله ۴-۱) عارضه یابی	۳۷
۴-۱-۱ - تعیین عارضه	۳۷
۴-۱-۲- بررسی و تشخیص علل ایجاد عارضه ها	۳۷

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک	 							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								شماره صفحه : ۳ از ۱۳۲
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

۳۹	مرحله ۱-۵) بررسی مشخصه های اصلی عملکردی (FPS) Functional Performance Specifications
۳۹	نمودار شماره ۷: نمایش هدف از دستیابی به مشخص های اصلی کارکردی
۳۹	۱- تعیین محدوددهای FPS
۴۰	نمودار شماره ۸: چگونگی دستیابی به دامنه های مشخصه های اصلی کارکردی
۴۰	۲- تعیین مشخصه های اصلی عملکردی FPS
۴۱	نمودار شماره ۹: چگونگی دستیابی به مشخصه های اصلی کارکردی
۴۱	نمودار شماره ۱۰: موارد کاربرد مشخصه های اصلی کارکردی در کارگاه
۶۷	مرحله ۱-۷) تدوین برنامه های کارگاه مهندسی ارزش
۶۷	(۱) تعیین برنامه گروه کار در کارگاه مهندسی ارزش
۶۷	(۲) تعیین برنامه زمانی و مکانی کارگاه
۷۰	فصل ۳- شرح فعالیت ها و نتایج حاصله از کارگاه مطالعات مهندسی ارزش
۷۰	نمودار شماره ۱۱: نمایش فازهای اجرایی کارگاه مطالعات مهندسی ارزش
۷۰	نحوه حضور اعضا مطالعات مهندسی ارزش
۷۱	نکات ضعف و قوت در مطالعات ارزش انجام شده :
۷۳	فاز ۱ کارگاه:
۷۳	آغازین
۷۴	فاز ۱ کارگاه - آغازین
۷۴	بررسی و تایید مجدد استراتژی ها و تصمیمات تدوین شده در پیش کارگاه
۷۵	فاز ۲ کارگاه: خلاقیت
۷۶	فاز ۲ کارگاه: خلاقیت
۷۶	شرح فعالیتهای انجام شده در فاز خلاقیت و ایده پردازی
۷۷	فاز ۳ کارگاه: قضاوت
۷۸	فاز ۳ کارگاه مطالعات ارزش: قضاوت
۷۸	۱-۳ نحوه بررسی ایده ها
۷۹	۲-۳ شرح مقام های در نظر گرفته شده جهت تعلق به ایده ها در فاز قضاوت :
۷۹	۱-۲-۳ شرح مقام گزینه
۷۹	۲-۲-۳ شرح مقام توصیه
۷۹	۳-۲-۳ شرح مقام تذکر
۸۰	۴-۲-۳ شرح ایده
۸۰	۳-۳ شرح فعالیتهای انجام شده در فاز قضاوت
۸۲	فاز ۴ کارگاه: توسعه
۸۳	فاز ۴ کارگاه: توسعه
۸۳	۱-۴ بخش های مطالعاتی انجام شده در بررسی ، توسعه و امکانسنجی ، در فاز قضاوت:
۸۴	۲-۴ نتایج حاصله از بررسی های انجام شده در مطالعات فاز توسعه :
۸۶	فاز ۵ کارگاه:

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								شماره صفحه : ۴ از ۱۳۲
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

- ۸۶.....ارائه
- ۸۷ فاز ۵: فاز ارائه و نتایج حاصله در محدوده تأسیسات سرچاهی و خطوط انتقال نفت آنها و مجموعه منیفولد.....
- ۸۷ ۱-۵ فاز ارائه.....
- ۸۷ ۲-۵ نتایج حاصله در محدوده تأسیسات سرچاهی و خطوط انتقال نفت آنها و مجموعه منیفولد.....

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۵ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

فهرست جداول

- جدول ۱- لیست شرکت کنندگان در پیش کارگاه ۱۷
- جدول ۲- ماتریس مقایسه زوجی دو طرفه وزن دهی به اهداف ۲۱
- جدول ۳- شرح اهداف و وزن آنها (بر اساس اولویت) ۲۲
- جدول ۴- برآورد میزان تحقق اهداف ۲۲
- جدول ۵- ذبنفعان پروژه و مشکلات تعاملی آنها ۲۴
- جدول ۶- چارچوب ارزیابی میزان موفقیت، مطالعه بر کارکردهای ثانویه و اصلی ۲۷
- جدول ۷- نحوه سطح بندی شدت اثر ریسک ۳۴
- جدول ۸- نحوه سطح بندی احتمال وقوع ریسک ۳۴
- جدول ۹- ماتریس تعیین شدت خطر ریسک (شاخص شدت ریسک) ۳۵
- جدول ۱۱- عارضه های حاصل از نتایج عملکردی و علل ایجاد آنها ۳۸
- جدول ۱۲- مشخصه های اصلی کارکردی نمودار FST ایستگاه تقویت فشار گاز، لخته گیر و خط لوله میعانات گازی ۴۲
- جدول ۱۳- مشخصه های اصلی کارکردی نمودار FST خط لوله گاز ۵۳
- جدول ۱۴- مشخصه های اصلی کارکردی نمودار FST مجموعه منیفولد ۵۹
- جدول ۱۵- مشخصه های اصلی کارکردی نمودار FST تأسیسات سرچاهی ها و خطوط لوله انتقال نفت به منیفولد و برق رسانی آنها ۶۲
- جدول ۱۶- مشخصه های اصلی کارکردی مرتبط با ذبنفعان ۶۴
- جدول ۱۷- مشخصه های اصلی کارکردی مرتبط با ریسکهای وارده بر پروژه در مرحله EPC ۶۵
- جدول ۱۸- لیست اعضای شرکت کننده در جلسات کارگاه مطالعات (در فاز های آغازین، خلاقیت و قضاوت) ۷۱

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								شماره صفحه: ۶ از ۱۳۲
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

جدول ۱۹ - گزینه های (ایده های برتر) منتخب در فاز قضاوت ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

جدول ۲۰ - گزینه های نهایی شده در فاز توسعه ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								شماره صفحه: ۷ از ۱۳۲
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

فهرست نمودارها

- نمودار شماره ۱ - مراحل انجام شده در پیش کارگاه ۱۶
- نمودار شماره ۲: نمودار تحلیلی FAST تجمیعی ۲۸
- نمودار شماره ۳: نمودار تحلیلی FAST ایستگاه تقویت فشار گاز و SLUG CATCHER و خط لوله انتقال میعانات گازی ۲۹
- نمودار شماره ۴: نمودار تحلیلی FAST خط لوله گاز ۳۰
- نمودار شماره ۵ - نمودار تحلیلی FAST، تأسیسات سرچاهی و خطوط لوله به منیفولد ۳۱
- نمودار شماره ۶: نمودار تحلیلی FAST مجموعه منیفولد ۳۲
- نمودار شماره ۷: نمایش هدف از دستیابی به مشخص های اصلی کارکردی ۳۹
- نمودار شماره ۸: چگونگی دستیابی به دامنه های مشخصه های اصلی کارکردی ۴۰
- نمودار شماره ۹: چگونگی دستیابی به مشخصه های اصلی کارکردی ۴۱
- نمودار شماره ۱۰: موارد کاربرد مشخصه های اصلی کارکردی در کارگاه ۴۱
- نمودار شماره ۱۱: نمایش فازهای اجرایی کارگاه مطالعات مهندسی ارزش ۷۰

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۸ از ۱۳۲
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03

پیش گفتار:

با توجه به همبستگی بخشهای مختلف پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک در سطح الارض با یکدیگر ، باعث میگردد که احتمالاً ایجاد هر تغییری در عملیات EPC / بهره برداری در هر بخش ، موجب ایجاد تأثیراتی بر بخش های دیگر باشد. بنابر این تصمیم برآن شد که مطالعات در محدوده کل پروژه انجام و از مطالعات بررسی بخش ها به صورت مجزا و منفک از یکدیگر خودداری شود . لذا ، مطالعات مهندسی ارزش بر کل پروژه انجام و نتایج در چارچوب چهار گزارش به شرح ذیل ارائه می گردد :

- ۱) گزارش مطالعات ارزش با در نظر گیری تأثیرات نتایج کل مطالعات بر مجموعه فعالیت های پروژه
 - ۲) گزارش مطالعات با در نظر گیری تأثیرات نتایج حاصله از مهندسی ارزش بر مبحث " مجموعه ایستگاه تقویت فشار و سیستم لخته گیری گاز " بر مجموعه فعالیت های پروژه .
 - ۳) گزارش مطالعات با در نظر گیری تأثیرات مجزای نتایج حاصله از مهندسی ارزش بر مبحث " خطوط انتقال گاز/مایعات گازی از ایستگاه تقویت فشار گاز بینک تا ایستگاه تزریق گاز سیاهمکان/واحد بهره برداری بینک " بر مجموعه فعالیت های پروژه .
 - ۴) گزارش مطالعات با در نظر گیری تأثیرات مجزای نتایج حاصله از مهندسی ارزش بر مبحث " مجموعه تأسیسات سرچاهی و سیستم برق رسانی و خطوط لوله به منیفولد و تأسیسات منیفولد " بر مجموعه فعالیت های پروژه .
- قابل ذکر است که با توجه به انجام غیر تفکیکی مطالعات و اجرای آن بصورت جامع، مطالب سه گزارش ۲ الی ۴ فوق الذکر جهت حفظ ماهیت تجمیعی مطالعات ، تماماً تا فصل ۲ و فاز توسعه یکسان بوده و از آن مبحث به بعد در چارچوب محدوده های تعریف شده می باشند.

راهبر مطالعات : کامران جناب

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								شماره صفحه : ۹ از ۱۳۲
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

فصل ۱

چکیده ای از کل فعالیت ها و نتایج
حاصله از مطالعات مهندسی ارزش
انجام شده

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۱۰ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

فصل ۱ - چکیده ای از کل فعالیت ها و نتایج حاصله در مطالعات مهندسی ارزش

الف) چکیده ای از فعالیت ها و نتایج پیش کارگاه

با توجه به اهمیت وقت اعضای شرکت کننده در پیش کارگاه و از طرف دیگر افزایش بهره‌وری در مرحله کارگاه، اجرای مراحل پیش کارگاه در تاریخ‌های ۱۴۰۰/۱۰/۱ و ۱۴۰۰/۱۰/۴ و به مدت ۱۱ ساعت به نحوی برنامه‌ریزی گردید که با یک متد خاص و در یک زمان غیر پیوسته دو روزه و بالاترین کیفیت و دستاوردهای ممکن انجام پذیرد. لذا در این راستا، پیش کارگاه با حضور اعضای مشخص شده در جدول ۱، انجام و دستاوردهای ذیل که شرح آنها متعاقباً در فصل پیش کارگاه اعلام خواهد شد حاصل گردید:

- ❖ برنامه ریزی و تدوین استراتژی‌های انجام مطالعات ارزش پروژه به شرح موارد ذیل:
 - ✓ بررسی و تعیین محدوده انجام مطالعات مهندسی ارزش
 - ✓ بررسی و تعیین اهداف مطالعات
 - ✓ مشخص کردن وزن اهمیتی اهداف
 - ✓ بررسی و مشخص کردن میزان دسترسی به اهداف در فعالیت های اجرای پروژه
 - ✓ تعیین دینفعان اصلی پروژه و بررسی مشکلات تعاملی موجود بین آنها
 - ✓ بررسی موارد خطوط قرمزی، بطوریکه در طی مطالعات و جهت جلوگیری از اتلاف وقت به آنها پرداخته نشود
- ❖ شناسایی و تحلیل کارکردها و تدوین نمودارهای FAST
- ❖ تعیین ریسک‌های موجود در اجرای پروژه و تحلیل و مشخص کردن شدت خطر و عوامل تأثیرگذار بر هریک.
- ❖ بررسی عارضه‌های وارده بر نتایج عملکرد فعالیت‌های مورد اجرا در پروژه و تحلیل و شناسایی، علل ایجاد آنها
- ❖ بررسی مشخصه‌های اصلی کارکردی (FPS) Functional Performance Specification
- ❖ تدوین برنامه‌های تشکیل کارگاه، اعم از افراد تیم مطالعات، زمان و مکان تشکیل کارگاه.

ب) چکیده ای از کل فعالیت ها و نتایج کارگاه مطالعات

پس از پیش کارگاه، مرحله کارگاه مطالعات مهندسی ارزش در چارچوب فازهای استراتژی، خلاقیت، قضاوت، توسعه و ارائه انجام شد بطوریکه فازهای استراتژی، خلاقیت و قضاوت در یک کارگاه غیر پیوسته که در روزهای ۸ و ۷ و ۱۴ و ۱۵ دی سال ۱۴۰۰ در محل شرکت هیرگان به مدت ۳۲٫۵ ساعت و طی ۴ روز و با حضور اعضای نامبرده در جدول شماره (۱۸) برگزار گردید. و فاز توسعه

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۱۱ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

در خارج از کارگاه از تاریخ ۱۶ الی ۲۶ دی ۱۴۰۰ بطول انجامید ، بطوریکه در طی مدت فوق الذکر در چارچوب دو جلسه هماهنگی نظرات گروه های فاز توسعه جمع بندی گردید .

کلیات فعالیت های انجام شده در کارگاه مطالعات به شرح زیر ارائه میگردد:

(۱) فعالیت های انجام شده در فاز ۱ (فاز استراتژیک)

طی این فاز که دراول صبح روز ۷ دی سال ۱۴۰۰ پیش از شروع فاز خلاقیت بمدت ۳۰ دقیقه انجام شد، موارد انجام شده در پیش کارگاه بررسی و مجددا جهت یادآوری ، ارائه گردیدند .

(۲) فعالیت های انجام شده در فاز ۲ (فاز خلاقیت)

این فاز در تاریخ های ۷ و ۸ دی سال ۱۴۰۰ به مدت ۱۶ ساعت ایده پردازی با روش طوفان فکری و از طریق تمرکزدهی ذهن خلاق جمعی اعضاء کارگاه بر روی ۴۷۱ موضوع عملیاتی جهت اجرای پروژه (مشروحه در جداول ۱۲ الی ۱۷) صورت پذیرفت و بصورت متوسط هر ۱ دقیقه و ۴۴ ثانیه یک ایده ارائه گردیده و در نتیجه ۴۱۹ ایده (مشروحه در پیوست ۱) در طی این فاز کسب گردید.

(۳) فعالیت های انجام شده در فاز ۳ (فاز قضاوت)

این فاز که در تاریخ های ۱۴ و ۱۵ دی سال ۱۴۰۰ طی ۱۵ ساعت برگزار شد، ایده ها در صورت نیاز ابتدا توسط ایده دهنده تشریح و سپس مورد نقد جمعی قرار گرفته و نهایتاً توسط اعضاء کارگاه، هر یک از ایده ها در یکی از مقام های (جایگاه های اجرایی ایده) به شرح عناوین زیر قرار داده شدند.

- ❖ گزینه (ایده برتر): شامل ایده هایی که برارتقاء اهداف مطالعات تأثیر موثری داشته باشند
 - ❖ توصیه : ایده ای که انتظار تأثیر مثبت از آن می رود ولی امکان بررسی آنها در توان مطالعات نیست
 - ❖ تذکر : شامل ایده هایی که توصیه می شود که مورد اجرای صحیح قرار گیرند
 - ❖ ایده : ایده هایی که هیچ یک از مقام های بالا را کسب ننموده اند و در مقام ایده باقی مانده
- ۴۱۹ ایده در سه مرحله مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً نتایج زیر به تفکیک هر مقام کسب گردید: (نتایج کامل قضاوت برای هر یک از ۴۱۹ ایده در پیوست شماره یک درج گردیده است)

- ۸ ایده ، مقام گزینه (ایده های برتر) را کسب نمودند (جدول شماره ۱۹ و پیوست شماره ۵ نمایشگر گزینه های نهایی شده در فاز قضاوت است)
- ۱۹۰ ایده ، مقام توصیه را کسب نمودند (مشروحه در پیوست ۴)
- ۳۹ ایده ، مقام تذکر را کسب نمودند (مشروحه در پیوست ۳)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۱۲ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

- ۱۸۲ ایده مقامی کسب ننموده و در وضعیت ایده باقی ماندند (مشروحه در پیوست ۲)

شرح ایده هایی که مقام گزینه (ایده برتر) را در فاز قضاوت کسب نموده اند:

- ❖ حذف پکیج متانول ایستگاه جدید تقویت فشار بینک
- ❖ بهینه سازی سیستم Slug ایستگاه جدید تقویت فشار بینک
- ❖ تغییر مقصد خط کاندنسیست ۴ اینچی از واحد بهره برداری بینک به واحد کلاستر
- ❖ حذف خط کاندنسیست و استفاده از خط لوله موجود انتقال کاندنسیست در ایستگاه تقویت فشار موجود
- ❖ یکی کردن کمپرسورهای هوای ابزار دقیق و نیتروژن
- ❖ تغییر سایز خطوط داخل منیفولد بینک از ۶ اینچ به ۴ اینچ
- ❖ حذف پمپ Oil Sump Pit (P-1701) منیفولد بینک و تخلیه مایعات داخل Oil Sump Pit بصورت دستی تخلیه
- ❖ تغییر ابعاد ساختمان سوییچگیر چاه های W007S و W0046S و چاههای تعمیری

(۴) فعالیت های انجام شده در فاز ۴ (فاز توسعه)

بعد از اتمام فاز قضاوت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ بر اساس نظر اعضاء کارگاه مطالعات و قبول مسئولیت شرکت هیرگان انرژی مقرر شد که مطالعات بررسی، توسعه و امکان سنجی پنج گزینه (ایده برتر) منتخب در فاز قضاوت و مشروحه در در جدول شماره ۱۹ توسط شرکت هیرگان انرژی انجام پذیرد.

واحد مهندسی شرکت هیرگان انرژی پس از توافق انجام شده فوق الذکر، فعالیت های بررسی، توسعه و امکانسنجی خود را بر پنج گزینه (ایده برتر) منتخب فاز قضاوت را از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ شروع و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ به اتمام رسانید و نتایج حاصله را برای هر گزینه در فرم توسعه مربوطه درج نمود و در چارچوب نتایج حاصله فوق الذکر، وضعیت مقام های اجرایی ایده ها به شرح ذیل تغییر و نهایی گردید

- ۵ ایده، مقام گزینه (ایده های برتر) را کسب نمودند (جدول شماره ۲۰ و پیوست شماره ۵ نمایشگر نتیجه مطالعات گزینه های نهایی شده در فاز توسعه است)
- ۱۹۳ ایده، مقام توصیه را کسب نمودند (مشروحه در پیوست ۴)
- ۳۹ ایده، مقام تذکر را کسب نمودند (مشروحه در پیوست ۳)
- ۱۸۲ ایده مقامی کسب ننموده و در وضعیت ایده باقی ماندند (مشروحه در پیوست ۲)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۱۳ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

(۵) فعالیت های انجام شده در فاز ۵ (فاز ارائه)

پس از اتمام فاز توسعه ، جلسه اختتامیه ، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ با حضور اعضای کارگاه مطالعات تشکیل و هشت گزینه منتخب فاز توسعه مندرج در جدول شماره ۲۰ مورد نقد و بررسی قرار گرفته و نهایتاً ، پنج گزینه ذیل مورد تأیید قرار گرفتند.

شرح گزینه های نهایی منتخب در فاز ارائه :

- ❖ حذف پکیج متانول ایستگاه جدید تقویت فشار بینک
- ❖ بهینه سازی سیستم slug ایستگاه جدید تقویت فشار بینک
- ❖ تغییر مقصد خط کاندنسیت ۴ اینچی از واحد بهره برداری بینک به واحد کلاستر
- ❖ حذف خط کاندنسیت و استفاده از خط لوله موجود انتقال کاندنسیت در ایستگاه تقویت فشار موجود
- ❖ تغییر ابعاد ساختمان سوییچگیر چاه های W007S ، W0046S و چاههای تعمیری

(۶) اهم نتایج حاصله از کل مطالعات

- ❖ طی اطلاعات مندرج در فرم های توسعه هر یک از ۵ گزینه نهایی شده در فاز ارائه (که در پیوست شماره ۶ درج گردیده اند) ، تأثیرات مالی گزینه ها بر پروژه ، به شرح جداول شماره ۲۱ هر یک از گزارش ها ، موجب کاهش ۲,۳٪ از کل هزینه های اجرای EPC (CAPEX) خواهد شد .
- ❖ طی اطلاعات مندرج در فرم های توسعه هر یک از گزینه های نهایی شده در فاز ارائه (که در پیوست شماره ۶ درج گردیده اند) ، تأثیرات مالی گزینه ها بر فعالیت های بهره برداری ، به شرح جدول شماره ۲۲ هر یک از گزارش ها ، موجب کاهش خوبی از کل هزینه های بهره برداری (OPEX) به میزان ۰,۱۳۷۵٪ خواهد بود.
- ❖ طی اطلاعات مندرج در فرم های توسعه هر یک از گزینه های نهایی شده در فاز ارائه (که در پیوست شماره ۶ درج گردیده اند) ، تأثیرات زمانی گزینه ها بر فعالیت های اجرای پروژه (EPC) ، به شرح جداول شماره ۲۳ هر یک از گزارش ها ، موجب کاهش ۴ ماه از کل زمان برآورد شده علی الخصوص زمان اجرای پروژه خواهد شد .
- ❖ طی اطلاعات مندرج در فرم های توسعه هر یک از گزینه های نهایی شده در فاز ارائه (که در پیوست شماره ۶ درج گردیده اند) ، میزان امکان پذیری اجرای گزینه های نهایی شده طبق جداول شماره ۳۲ هر یک از گزارش ها ، در حد قابل اجرا به میزان ۷۰ الی ۹۰ درصد می باشد .

ملاحظه : با توجه به اینکه مسیر بحرانی در حین کار بصورت دینامیکی متغیر خواهد بود ، لذا نصف زمان های کاهشی محاسبه شده در جداول ۲۳ هر یک از گزارش ها ، به منظور تأثیر گزینه ها بر کاهش کل زمان یا تأخیرات کل پروژه ، در نظر گرفته شده است .

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۱۴ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

- ❖ طی اطلاعات مندرج در فرم های توسعه هر یک از گزینه های نهایی شده در فاز ارائه (که در پیوست شماره ۶ درج گردیده اند) ، تأثیرات گزینه ها بر اهداف مطالعات با توجه به جداول ۲۴ الی ۲۷ ، و نهایتاً جدول شماره ۲۸ هر یک از گزارش ها ، موجب ارتقاء اهداف به میزان نسبتاً خوبی و خصوصاً زمان پروژه به میزان زیادی خواهد شد .
- ❖ طی اطلاعات مندرج در فرم های توسعه هر یک از گزینه های نهایی شده در فاز ارائه (که در پیوست شماره ۶ درج گردیده اند) ، تأثیرات گزینه ها بر فعالیت های اجرای پروژه (EPC) در چارچوب نکات قوت و ضعف مندرج در جداول شماره ۲۹ هریک از گزارش ها ، در جمع مثبت و موجب ارتقاء خواهند شد .
- ❖ طی اطلاعات مندرج در فرم های توسعه هر یک از گزینه های نهایی شده در فاز ارائه (که در پیوست شماره ۶ درج گردیده اند) ، تأثیرات گزینه ها بر فعالیت های بهره برداری در چارچوب نکات قوت و ضعف مندرج در جداول شماره ۳۰ هریک از گزارش ها ، در جمع مثبت و موجب ارتقاء خواهند شد.
- ❖ طی اطلاعات مندرج در فرم های توسعه هر یک از گزینه های نهایی شده در فاز ارائه (که در پیوست شماره ۶ درج گردیده اند) ، تأثیرات گزینه ها بر وضعیت تعاملی پروژه با ذینفعان اصلی خود در جمع مثبت و موجب ارتقاء، به شرح جدول شماره ۳۱ هریک از گزارش ها می باشد.
- ❖ طی اطلاعات مندرج در فرم های توسعه هر یک از گزینه های نهایی شده در فاز ارائه (که در پیوست شماره ۶ درج گردیده اند)، گزینه ها بر ریسک های تعریف شده پروژه تأثیر قابل توجه ای نداشته .
- ❖ طی اطلاعات مندرج در فرم های توسعه هر یک از گزینه های نهایی شده در فاز ارائه (که در پیوست شماره ۶ درج گردیده اند)، و محاسبات انجام شده در جداول شماره ۳۳ و ۳۴ هر یک از گزارش ها، در کل تأثیرات گزینه ها بر اهداف پروژه موجب ارتقاء شاخص ارزش پروژه به میزان ۱۸,۴۴٪ می گردد.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								شماره صفحه : ۱۵ از ۱۳۲
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

فصل ۲

شرح فعالیت ها و نتایج حاصله از

پیش کارگاه

مطالعات مهندسی ارزش انجام شده

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ – ۰۷۳ – ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۱۶ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002		

فصل ۲ - شرح فعالیت ها و نتایج حاصله ازپیش کارگاه مطالعات مهندسی ارزش

۱- خلاصه شرح فعالیت های انجام شده در پیش کارگاه

پیش کارگاه که در تاریخ های ۱۴۰۰/۱۰/۱ و ۱۴۰۰/۱۰/۴ و به مدت ۱۴ ساعت و با حضور افراد مشروحه در جدول شماره یک ، تشکیل گردید ، فعالیت ها این فاز طبق نمودار شماره ۱ انجام پذیرفت که شرح و نتایج هر کدام متعاقباً ارائه می گردد:

نمودار شماره ۱ - مراحل انجام شده در پیش کارگاه



 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ – ۰۷۳ – ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۱۷ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

جدول ۱- لیست شرکت کنندگان در پیش کارگاه

اعضاء شرکت کننده در پیش کارگاه			
ردیف	نام و نام خانوادگی	سازمان محل خدمت	سمت
۱	وحید عبدشاهی	شرکت توسعه پتروایران	رئیس مهندسی
۲	سپیده اکبری	شرکت توسعه پتروایران	کارشناس ارشد کنترل و ابزار دقیق
۴	ساسان فرامرزپور	شرکت توسعه پتروایران	سرپرست فرآیند
۵	فرشید امیری	شرکت توسعه پتروایران	سرپرست خطوط لوله و خوردگی
۶	محمد فکور	شرکت توسعه پتروایران	کارشناس فرآیند
۷	هدیه ناصری زاده	شرکت توسعه پتروایران	سرپرست مکانیک
۸	مسعود اصغر نژاد	مشارکت هیرگان انرژی و طرح و بازرسی	رئیس مهندسی
۹	پریسا حاجی صادقی	مشارکت هیرگان انرژی و طرح و بازرسی	سرپرست کنترل ابزار دقیق و مخابرات
۱۰	امیر حسین صابر باغبان	مشارکت هیرگان انرژی و طرح و بازرسی	سرپرست ایمنی
۱۱	سعید قنبری	مشارکت هیرگان انرژی و طرح و بازرسی	کارشناس ارشد فرآیند
۱۲	محسن آریا فر	مشارکت هیرگان انرژی و طرح و بازرسی	سرپرست فرآیند
۱۳	حمید آدینه	مشارکت هیرگان انرژی و طرح و بازرسی	سرپرست مکانیک
۱۴	هومن شاهرخ	مشارکت هیرگان انرژی و طرح و بازرسی	سرپرست لوله کشی، خط لوله و متریال
۱۵	کامران جناب	شرکت سیراف	راهبر مطالعات ارزش
۱۶	بابک نیکوفر	شرکت سیراف	همیار راهبر پروژه
۱۷	حسین پیرهادی	شرکت سیراف	عضو تیم پروژه
۱۸	محمد بهرامی	شرکت سیراف	عضو تیم پروژه

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه: ۱۸ از ۱۳۲
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	
	D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK

خلاصه مراحل اجرای پیش کارگاه به شرح ذیل انجام گردید:

تدوین استراتژی های کارگاه مطالعه

- ☐ تعیین محدوده مطالعات ارزش
- ☐ تعیین اهداف مهندسی ارزش پروژه
- ☐ وزن دهی اهداف از دیدگاه اهمیتی
- ☐ بررسی وضعیت میزان تحقق اهداف در فعالیت های اجرای پروژه
- ☐ تعیین ذینفعان پروژه
- ☐ بررسی مشکلات تعاملی ذینفعان در راستای عملیات اجرایی پروژه
- ☐ تعیین خط قرمزها و موارد ممنوعه در مطالعات ارزش

تحلیل کارکردی

- ☐ تعیین کارکردهای
- ☐ تدوین نمودار FAST و تحلیل کارکردی پروژه

تحلیل ریسک های پروژه

- ☐ گروه بندی ریسک های موجود
- ☐ تعیین ریسک های هر گروه
- ☐ تعیین اندازه شدت هر یک از ریسک ها
- ☐ تعیین عوامل تاثیر گذار بر هر یک از ریسک ها

عارضه یابی نتایج عملکرد در اجرای پروژه

- ☐ بررسی نتایج عملکردی پروژه و تعیین عارضه های حاصله از آن
- ☐ بررسی عارضه های حاصله و مشخص کردن علل ایجادی هر یک از آنها

تعیین مشخصه های اصلی عملکردی:

- ☐ تعیین محدوده مشخصه های عملکردی
- ☐ تعیین مشخصه های اصلی عملکردی هر یک از محدوده ها

تدوین برنامه های اجرایی کارگاه مهندسی ارزش:

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">VALUE ENGINEERING STUDY REPORT</th></tr><tr><td>نسخه</td><td>سریال</td><td>نوع مدرک</td><td>رشته</td><td>تسهیلات</td><td>صادر کننده</td><td>بسته کاری</td><td>پروژه</td></tr><tr><td>D03</td><td>0002</td><td>RT</td><td>GE</td><td>110</td><td>PEDCO</td><td>SSGRL</td><td>BK</td></tr></table>	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK	شماره صفحه : ۱۹۰ از ۱۳۲
VALUE ENGINEERING STUDY REPORT																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK																			

☐ تدوین برنامه حضور افراد در کارگاه مهندسی ارزش

☐ تدوین برنامه کارگاه مهندسی ارزش

☐ تدوین برنامه اطلاعات لازمه و نحوه جمع آوری آنها

تدوین استراتژی

تعیین
محدوده

بررسی اهداف

بررسی
ذینفعان

بررسی
ممنوعه ها

شرح کامل هر یک از مراحل فوق الذکر، متعاقباً ارائه می گردد

مرحله ۱-۱) شرح استراتژی های نهایی شده جهت اجرای کارگاه

در این مرحله ، تصمیمات استراتژیک جهت کارگاه مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات لازمه به شرح زیر اخذ گردید:

☐ ۱-۱-۲- تعیین محدوده مطالعات ارزش

☐ ۲-۱-۲- تعیین اهداف مهندسی ارزش پروژه و وزن دهی و تعیین موقعیت آنها

☐ ۳-۱-۲- تعیین ذینفعان پروژه

☐ ۴-۱-۲- تعیین خط قرمزها و موارد ممنوعه در مطالعات ارزش

۱-۱-۱- محدوده انجام مطالعات مهندسی ارزش

در ابتدا توسط اعضای حاضر در جلسه پیش کارگاه، محدوده ای که مطالعات مهندسی ارزش این پروژه می باید در چارچوب آن مورد بررسی قرار گیرد ، به شرح زیر تعیین شد ، تا مراحل و فازهای مطالعات کارگاه مهندسی ارزش در این چارچوب صورت پذیرند.

تدوین استراتژی

تعیین محدوده

❖ تاسیسات سرچاهی ها و برق رسانی به آنها

❖ خطوط لوله از سرچاهی ها به منیفولد

❖ مجموعه منیفولد

❖ مجموعه Slug Catcher و خط لوله انتقال میعانات گازی

❖ خط لوله انتقال گاز از گلخاری به ایستگاه تقویت فشار گاز

❖ ایستگاه تقویت فشار گاز و نم زدایی

❖ خط لوله انتقال گاز به واحد تزریق گاز سیاهمکان

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">VALUE ENGINEERING STUDY REPORT</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادر کننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>SSGRL</td><td>PEDCO</td><td>110</td><td>GE</td><td>RT</td><td>0002</td><td>D03</td></tr></table>	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	شماره صفحه : ۲۰ از ۱۳۲
VALUE ENGINEERING STUDY REPORT																										
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03																			

۱-۲- بررسی اهداف مطالعات مهندسی ارزش



جهت بررسی اهداف مطالعات ارزش در کارگاه، مراحل زیر به ترتیب انجام گردیدند :

۱- تعیین اهداف

۲- وزن دهی اهداف

۳- ارزیابی اهداف

۱- تعیین اهداف :

منظور اهدافی است که می بایست مجموعه نتایج مطالعات مهندسی ارزش این پروژه به آنها دست یابد که بنا بر نظر جمع حاضر در پیش کارگاه، به شرح ذیل تعیین گردید تا مطالعات مهندسی ارزش این پروژه، در راستای برآورد سازی آنها پیش رود:

- ✓ بهینه سازی هزینه های CAPEX
- ✓ بهینه سازی هزینه های OPEX
- ✓ کاهش زمان / تأخیرات اجرای قرارداد
- ✓ ارتقاء کیفیت (پایداری و سهولت بهره برداری)

۲- وزن دهی اهداف :

با توجه به اینکه اهداف تعریف شده نسبت به پروژه از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند ، بنابراین پس از تعیین اهداف مطالعات مهندسی ارزش ، با استفاده از متد ماتریس مقایسه زوجی دو طرفه ، وزن دهی بر روی آنها انجام گردید که نتایج بررسی این متد در ماتریس زیر نمایش داده شده است .

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک							 	
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۲۱ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002		D03

جدول ۲- ماتریس مقایسه زوجی دو طرفه وزن دهی به اهداف

کد	اهداف	وزن	امتیاز			
				D	C	B
A	بهینه سازی هزینه های CAPEX	۳۳,۳۳	۲۴	A ۸ D ۴	A ۸ C ۴	A ۸ B ۴
B	بهینه سازی هزینه های OPEX	۱۹,۴۴	۱۴	B ۶ D ۶	B ۴ C ۸	B
C	کاهش زمان / تأخیرات اجرای قرارداد	۲۷,۷۸	۲۰	C ۸ D ۴	C	
D	ارتقاء کیفیت (پایداری و سهولت بهره برداری)	۱۹,۴۴	۱۴	D		
		۱۰۰	۷۲			

شرح ارزیابی	عدد ارزیابی
کاملاً با ارزشی تر	۱۲
با ارزشی تر	۱۰
نسبتاً با ارزشی تر	۸
هم ارزشی	۶
نسبتاً کم ارزشی تر	۴
کم ارزشی تر	۲
بی ارزشی	۰

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ – ۰۷۳ – ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								شماره صفحه : ۲۲ از ۱۳۲
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

نهایتاً با توجه به نتایج حاصله از متد ماتریس مقایسه زوجی دو طرفه بالا ، وزن اهداف با توجه به اولویت، در جدول شماره ۳ مشخص گردیده اند:

جدول ۳- شرح اهداف و وزن آنها (بر اساس اولویت)

وزن اهداف	شرح اهداف
۳۳	بهینه سازی هزینه های CAPEX
۲۸	کاهش زمان / تأخیرات اجرای قرارداد
۲۰	ارتقاء کیفیت (پایداری و سهولت بهره برداری)
۱۹	کاهش هزینه های OPEX

۳- ارزیابی اهداف :

پس از مرحله وزن دهی، اهداف تعیین شده توسط افراد حاضر در پیش کارگاه از دیدگاه میزان موفقیت در تحقق آنها در طراحی و عملیات انجام شده، مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج آن در جدول شماره ۴ درج گردیده است . این ارزیابی بر مبنای میزان تأمین اهداف تا زمان برگذاری پیش کارگاه می باشد:

جدول ۴- برآورد میزان تحقق اهداف

برآورد میزان تأمین نیازها و خواسته های مورد انتظار از اهداف تا این مرحله از پروژه					شرح اهداف
ناچیز	کم	نسبتا	زیاد	کاملا	
<٪۳۰	٪۳۰-٪۵۰	٪۵۰-٪۷۰	٪۷۰-٪۹۰	>٪۹۰	
	*				
	*				
*					بهینه سازی هزینه های CAPEX
					بهینه سازی هزینه های OPEX
					کاهش زمان / تأخیرات اجرای قرارداد
			*		ارتقاء کیفیت (پایداری و سهولت بهره برداری)

۱-۳- ذینفعان پروژه و نوع انتفاع آنها

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								شماره صفحه : ۲۳ از ۱۳۲
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

در این مرحله، ذینفعان پروژه توسط اعضای شرکت کننده به صورت زیر تعیین گردید:



- ☐ شرکت مناطق نفت خیز جنوب
- ☐ شرکت پترو ایران
- ☐ مشارکت شرکت های هیرگان انرژی و طرح و بازرسی
- ☐ پیمانکاران
- ☐ تأمین کنندگان
- ☐ بهره بردار
- ☐ پدافند غیرعامل
- ☐ ارگان های دولتی ذینفع

معارضین و افراد بومی مشکلات قابل ملاحظه در چارچوب تعامل با ذینفعان فوق الذکر که بتوان در کارگاه مطالعات ارزش مورد بررسی قرار داده و مشکلات مربوطه را رفع نمود، به شرح جدول شماره ۵ می باشند:

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ – ۰۷۳ – ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۲۴ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

جدول ۵ - ذینفعان پروژه و مشکلات تعاملی آنها

ذینفعان اصلی پروژه	
نام ذینفع اصلی پروژه	مشکلات تعاملی مهم ذینفع در ارتباط با پروژه
شرکت مناطق نفت خیز جنوب	تعدد نقطه نظرات طولانی بودن زمان اعلام نظرات
شرکت پترو ایران	بروکراسی تصمیم گیری
مشارکت شرکت های هیرگان انرژی و طرح و بازرسی	مشکل در جذب نیروهای متخصص و موثر بعثت مهاجرت نیروهای متخصص به خارج کشور کمبود نقدینگی به علت عدم اطمینان از پرداخت به موقع
پیمانکاران	کمبود نیروهای متخصص و موثر تأخیر در اجرای قراردادها ناکافی بودن کیفیت کار کمبود نقدینگی به علت عدم اطمینان از پرداخت به موقع اجبار به استفاده از پیمانکاران بومی
تأمین کنندگان	تحریم و محدود شدن امکان خرید از سازندگان خارجی ضعف فنی تأخیر در اجرای قراردادها
بهره بردار	کمبود اطلاعات مدون از واحدهای موجود
پدافند غیرعامل	
ارگان های دولتی ذینفع	اخذ مجوزهای مربوطه
معارضین و افراد بومی	زمانبری و مشکلات موجود در اخذ رضایت افراد بومی با توجه به مسئولیت اجتماعی استفاده از افراد بومی در ساخت ، کمبود نیروهای کارگری و فنی موثر

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ – ۰۷۳ – ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۲۵ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

۱-۱-۴- محدوده های ممنوعه در مطالعات ارزش پروژه

در این گام جهت جلوگیری از اتلاف وقت ، کلیه محدوده هایی که در مطالعات مهندسی ارزش پروژه قابل تغییر نبوده ، مشخص شده و به عنوان خطوط قرمز مطالعات ما شناخته شدند و سپس مقرر گردید که در مطالعات کارگاه وارد مباحثی که لازمه اجرای آنها تغییر در این موارد باشد ، وارد نگردیم.

تدوین استراتژی

بررسی ممنوعه ها

محدوده های ممنوعه در مطالعات مهندسی ارزش این پروژه به شرح زیر مشخص گردیدند:

❖ قوانین و محدودیت های زیست محیطی

❖ قوانین حریم

❖ موارد قراردادی

❖ الزامات و بخشنامه های دولتی

❖ عدول از حداقل های استاندارد

❖ افزایش بودجه پروژه

تحلیل کارکردی

تعیین کارکردها

مرحله ۱-۲) تحلیل کارکردها

در این مرحله فعالیت ها در طی دو بخش زیر انجام پذیرفتند :

۱- تعیین کارکردها

۲- تدوین نمودار FAST

۱- تعیین کارکردهای پروژه

به منظور تحلیل پروژه از دیدگاه کارکرد گرای، ابتدا فعالیت های پروژه را در قالب یک تحلیل تجمیعی (محدوده شماره ۱ زیر) بررسی و در نتیجه کل فعالیتها را جهت پوشش دهی تحلیل کارکردی کل پروژه ، به پنج محدوده تفکیکی زیر تقسیم نمودیم

۱) تحلیل کارکردی تجمیعی

۲) تحلیل کارکردی ایستگاه تقویت فشار گاز و SLUG CATCHER و خط لوله انتقال میعانات گازی

۳) تحلیل کارکردی خط لوله گاز

۴) تحلیل کارکردی تأسیسات سرچاهی و خطوط لوله به منیفولد

۵) تحلیل کارکردی مجموعه منیفولد

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۲۶ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	



سپس کارکردهای مشروحه زیر را برای هریک از محدوده های فوق الذکر بالا مشخص نمودیم :

- ۱) کارکرد نهایی (Highest Order Function) : کارکردی که هدف نهایی را مشخص میکند
- ۲) کارکرد اصلی (Basic Function) : کارکردی که راه رسیدن به هدف را مشخص میکند
- ۳) کارکرد مورد نیاز جهت تحقق کارکرد اصلی هستند (Secondary Function) کارکرد ثانویه
- ۴) کارکرد فراگیر (Pervasive function) : کارکردی که در تمامی کارکردهای ثانویه انجام گردد
- ۵) کارکرد طراحی (Designing function) : کارکردی که که معیارهای طراحی را مشخص میکند
- ۶) کارکرد ابتدایی (Initial Function) : کارکردی که نقطه آغاز فعالیت ها را مشخص می نماید

۲- تدوین نمودار FAST پروژه

پس از تعیین کارکردهای پروژه در هر یک از محدوده های مشخص شده ، نمودارهای FAST در محدوده های مشخص شده و با رعایت نکات زیر ، توسط اعضاء بررسی و تکمیل گردید.

نمودارهای FAST تحلیل و تدوین شده در پیشکارگاه:

- ۱) نمودار FAST تجمیعی
- ۲) نمودار FAST ایستگاه تقویت فشار گاز و SLUG CATCHER و خط لوله انتقال میعانات گازی
- ۳) نمودار FAST خط لوله گاز
- ۴) نمودار FAST تأسیسات سرچاهی و خطوط لوله به منیفولد
- ۵) نمودار FAST مجموعه منیفولد

نکات در نظر قرار گرفته شده در نمودارهای FAST :

- ❖ محدوده مطالعات مهندسی ارزش مشخص شده بطوریکه کارکردهای داخل این محدوده در مطالعات کارگاه مورد بررسی و تحلیل واقع می شوند و کارکردهای مرتبط با اهداف اصلی پروژه در سمت چپ خارج از محدوده و کارکرد ابتدایی پروژه در سمت راست خارج از محدوده قرار گرفته اند.
- ❖ کارکردهای مرتبط داده شده با خطوط افقی به طوری قرار گرفته اند که کارکرد یا کارکردهای واقع شده در سمت راست هر کارکرد چطور انجام شدن آن را توصیف می کند و کارکرد یا کارکردهای واقع شده در سمت چپ هر کارکرد توصیف گر چرا انجام شدن آن است.
- ❖ کارکردهای مرتبط با خطوط افقی نمایانگر اجرای همزمانی آنها یا پشتیبان بودن آنها می باشد.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ – ۰۷۳ – ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۲۷ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

- ❖ کارکرد نهایی (Highest Order Function) که در سمت چپ و خارج محدوده قرار گرفته اند.
- ❖ کارکرد اصلی (Basic Function) که بلافاصله بعد از کارکرد نهایی (از سمت راست) و در داخل محدوده مطالعات واقع شده است
- ❖ کارکرد ثانویه (Secondary Function) که بعد از کارکرد اصلی (از سمت راست) و در داخل محدوده قرار گرفته اند.
- ❖ کارکرد فراگیر (Pervasive function) که در گوشه سمت راست بالای نمودار قرار گرفته است .
- ❖ کارکرد طراحی (Designing function) که همان اهداف مطالعات تعریف شده می باشند و بدین دلیل در نمودار نمایش داده نشده اند .
- ❖ کارکرد ابتدایی (Initial Function) که در سمت راست خارج از محدوده قرار گرفته اند .

ملاحظه:

جهت مدیریت زمان و جلوگیری از اتلاف وقت اعضاء تیم کارگاه مطالعات ، در هر یک از نمودارهای FAST ، میزان قابلیت ایجاد تغییر های موفق در کارکردهای اصلی و ثانویه توسط اعضاء حاضر در جلسه مورد بررسی و تحلیل واقع گردید و در چارچوب جدول شماره ۶ ، قابلیت تغییر و موفقیت مطالعات بر هر یک از کارکردها با رنگ مورد توافق اعضاء (سبز / آبی / زرد / قرمز) مشخص شد و نهایتاً تصمیم بر این گردید که کارکردهایی که با رنگ سبز و آبی مشخص شده اند مورد مطالعه قرار گیرند و کارکردهای زرد و قرمز در مطالعات کنار گذاشته شوند .


قابل ذکر است که با توجه به نظر اعضاء پیش کارگاه و موقعیت زمانی پروژه ، تمامی کارکردها در محدوده رنگ سبز بوده و مورد مطالعه قرار خواهند گرفت .

جدول ۶ - چارچوب ارزیابی میزان موفقیت ، مطالعه بر کارکردهای ثانویه و اصلی

رنگ	میزان موفقیت در انجام مطالعه بر کارکرد	احتمال دستیابی به گزینه های نتیجه شده (از مطالعه بر کارکرد) که تأثیر موثری بر اهداف مطالعات خواهند داشت
سبز	زیاد	حدود ۷۵٪ الی ۱۰۰٪
آبی	نسبتاً	حدود ۴۰٪ الی ۷۴٪
زرد	کم	حدود ۵٪ الی ۳۹٪
قرمز	ناچیز	حدود ۱٪ الی ۴٪


 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۲۸ از ۱۳۲
	پروژه BK	بسته کاری SSGRL	صادر کننده PEDCO	تسهیلات 110	رشته GE	نوع مدرک RT	سریال 0002	

نمودار شماره ۲ : نمودار تحلیلی FAST تجمیعی

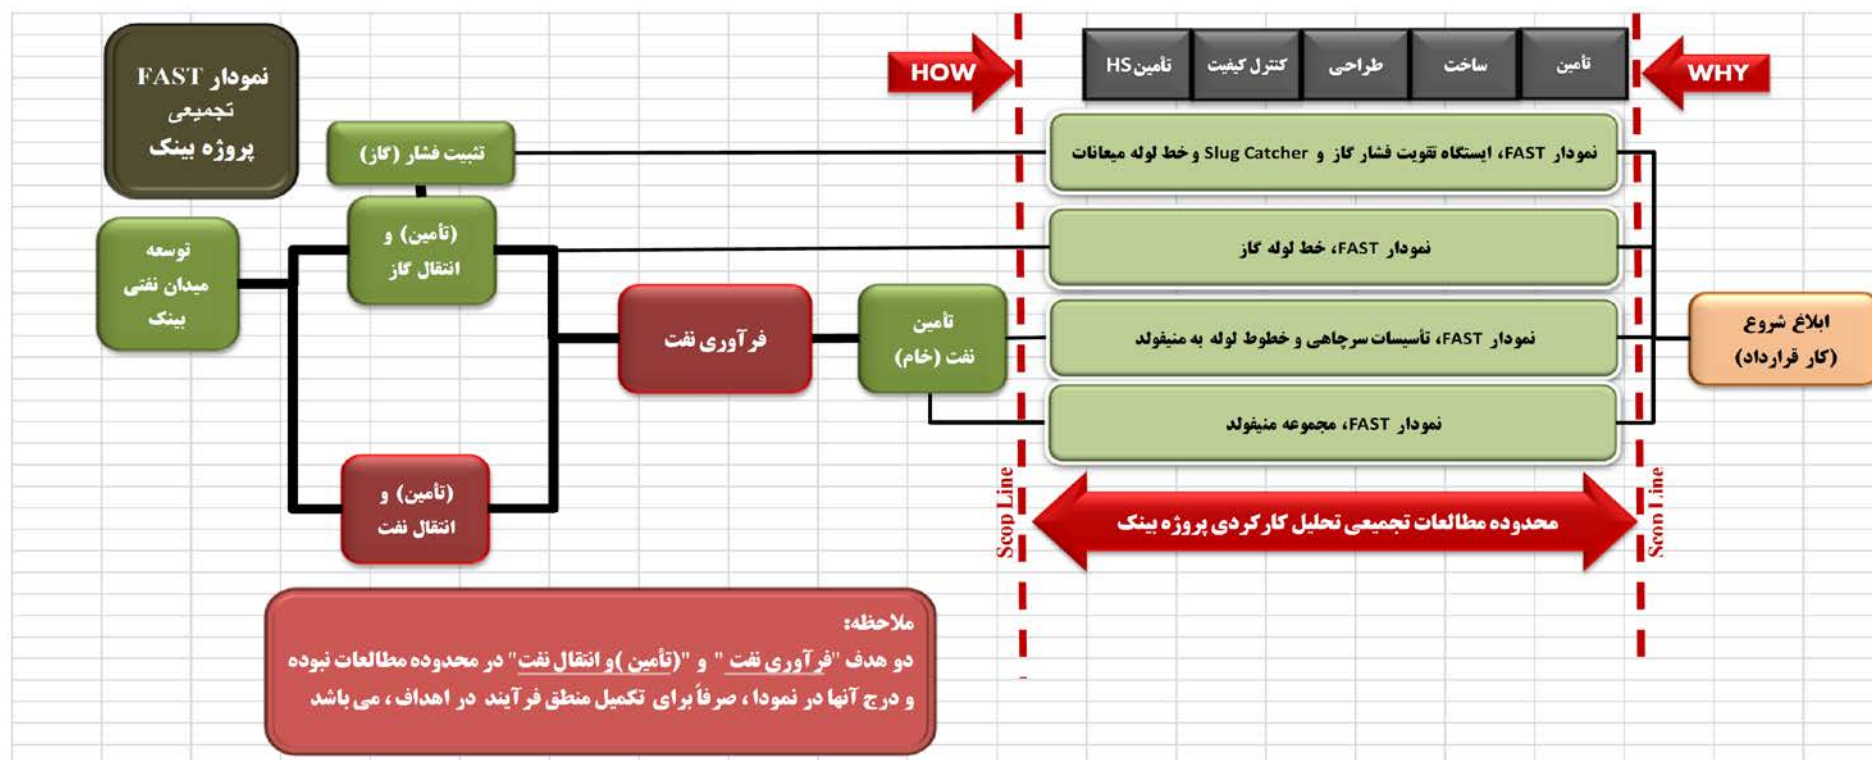

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۲۹ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

نمودار شماره ۳ : نمودار تحلیلی FAST ایستگاه تقویت فشار گاز و SLUG CATCHER و خط لوله انتقال میعانات گازی

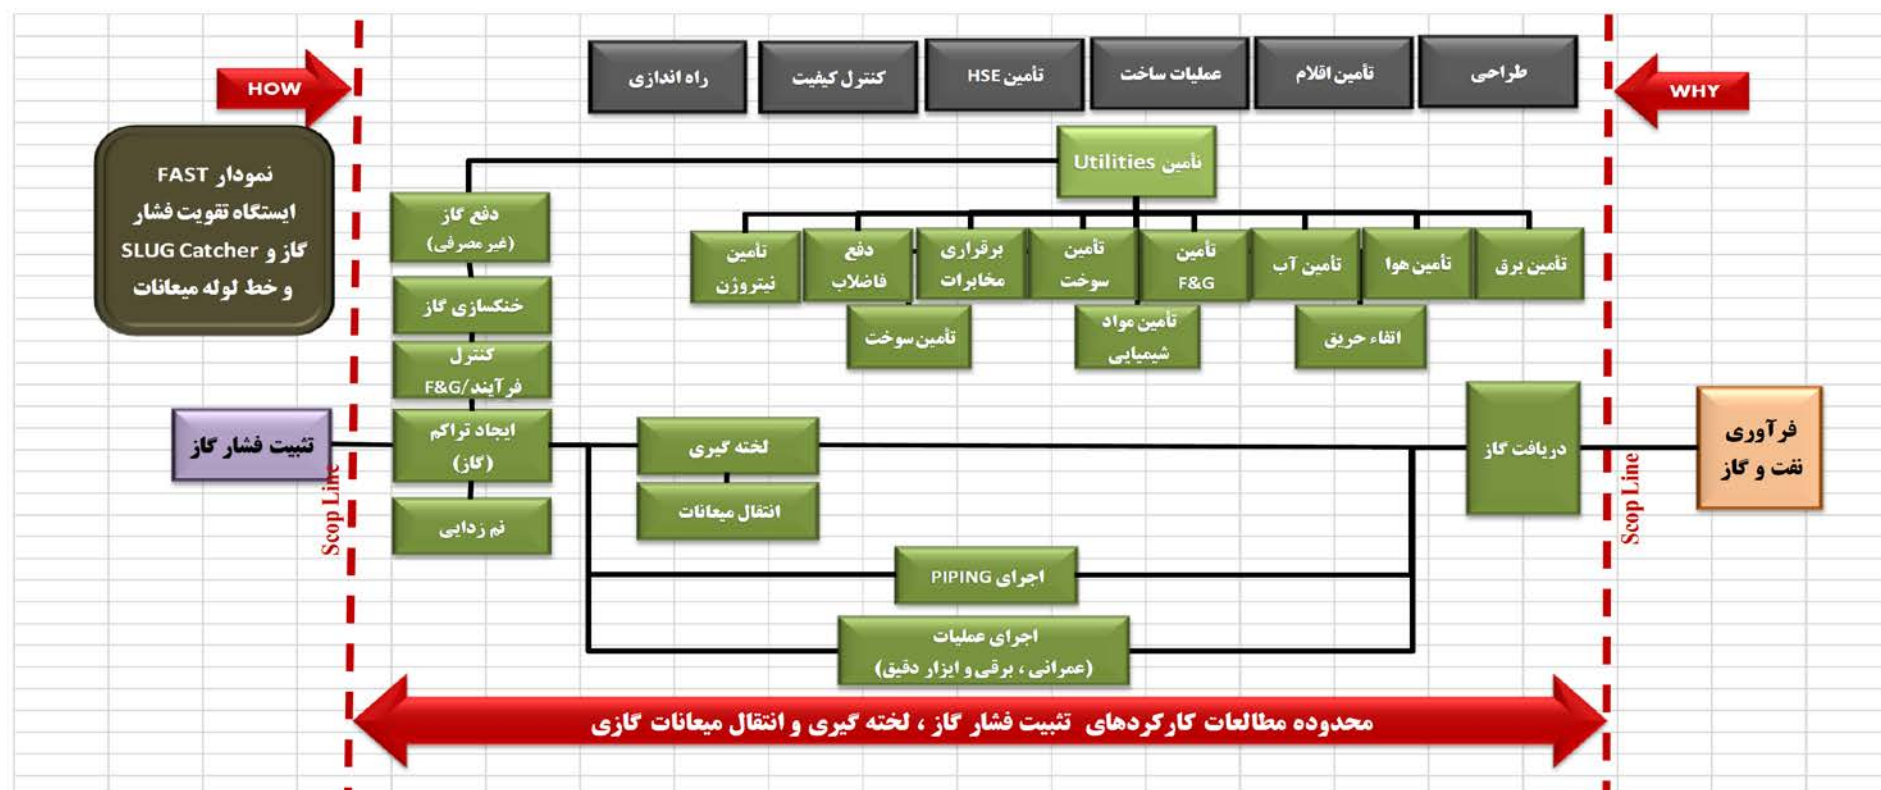


 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								شماره صفحه : ۳۰ از ۱۳۲
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

نمودار شماره ۴: نمودار تحلیلی FAST خط لوله گاز




 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۳۱ از ۱۳۲
	پروژه BK	بسته کاری SSGRL	صادر کننده PEDCO	تسهیلات 110	رشته GE	نوع مدرک RT	سریال 0002	

نمودار شماره ۵ - نمودار تحلیلی FAST، تأسیسات سرچاهی و خطوط لوله به منیفولد

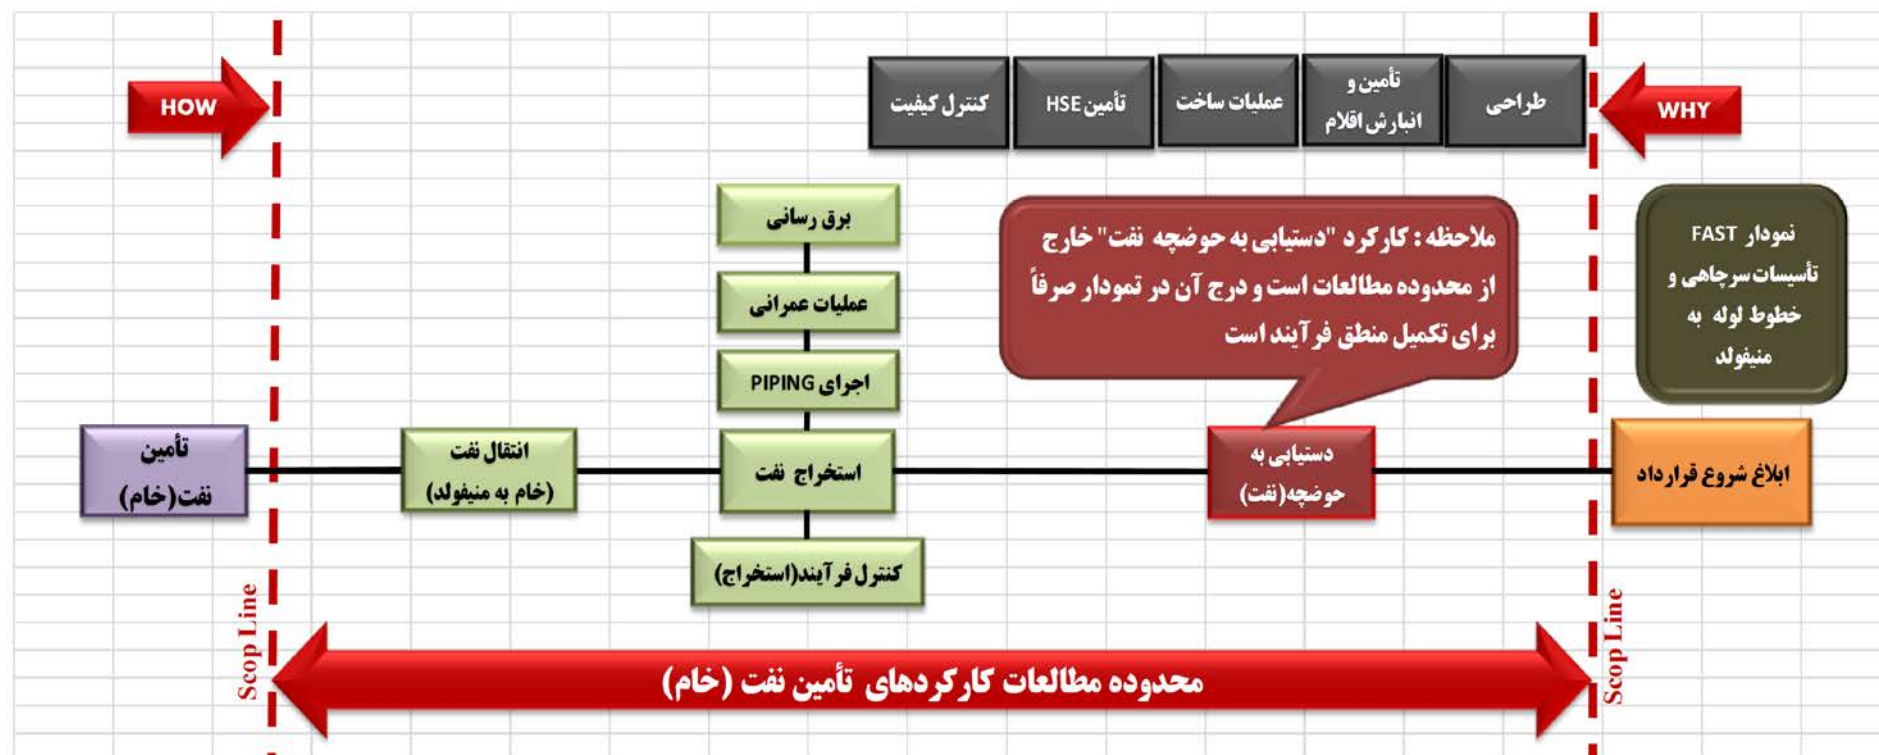

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								شماره صفحه : ۳۲ از ۱۳۲
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

نمودار شماره ۶ : نمودار تحلیلی FAST مجموعه منیفولد

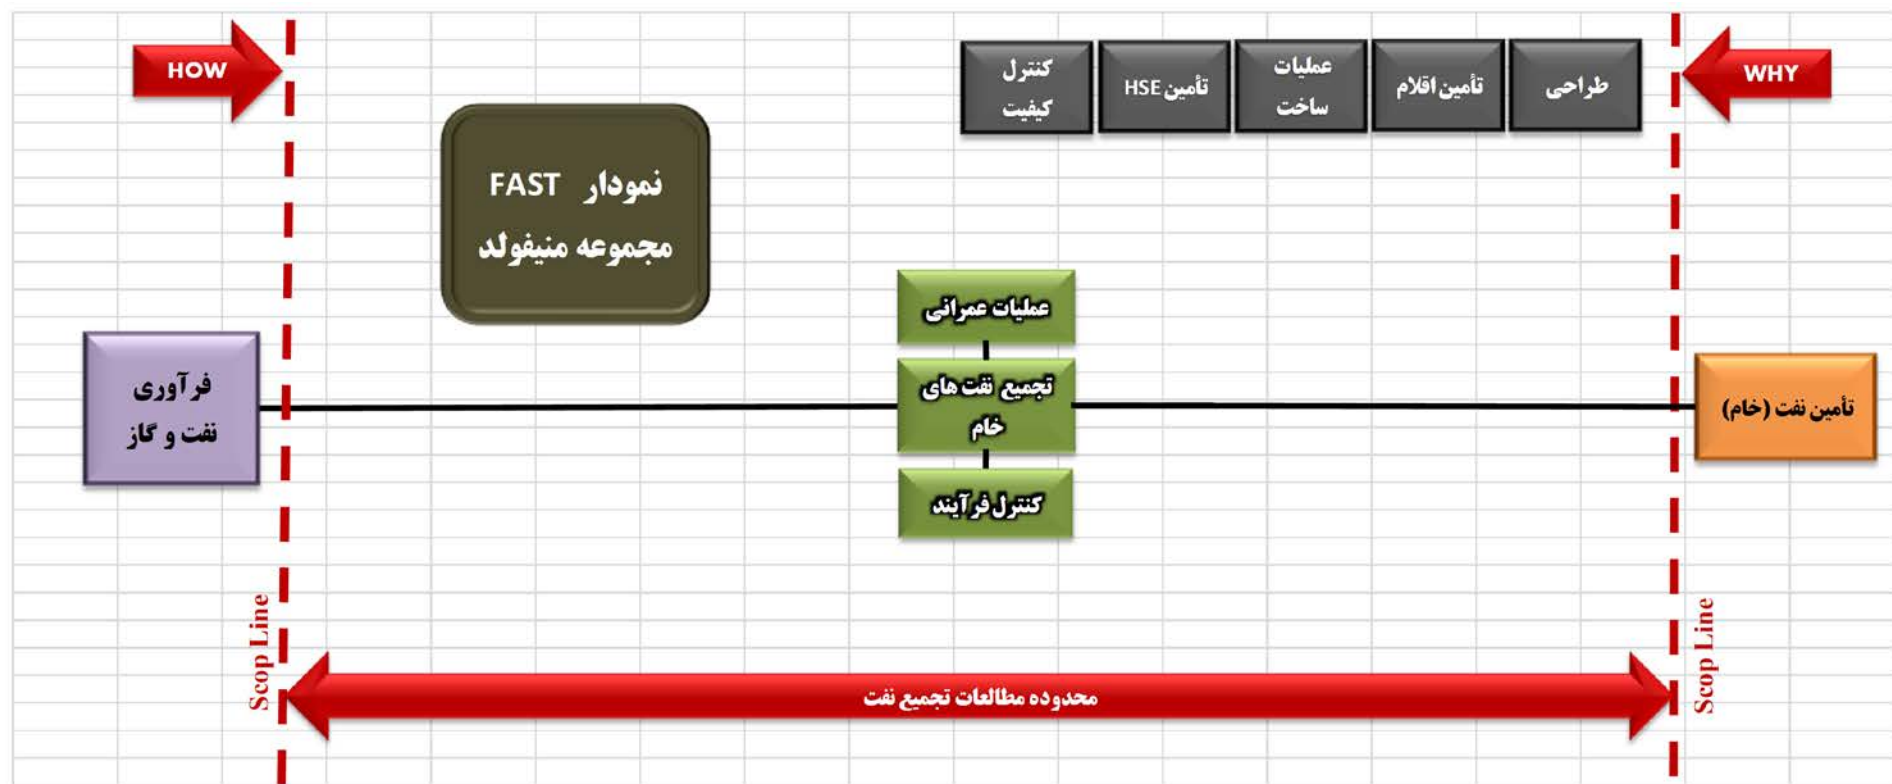

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۳۳ از ۱۳۲	
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری		پروژه
	D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL		BK

مرحله ۱-۳) بررسی ریسک های وارد بر پروژه

در این مرحله ریسک های وارد بر پروژه و شاخص شدت آنها به شرح و ترتیب گام های ذیل مورد بررسی قرار گرفته اند:

گام اول : گروه بندی ریسک ها

در این گام طبق نظر اعضای حاضر در پیش کارگاه، ریسک های موجود در اجرای پروژه به صورت کلی و در قالب ریسک های مربوط به مراحل عملیاتی EPC، مورد بررسی قرار گرفتند .

گام دوم : تعیین ریسک ها

سپس ریسک هایی که می توانند بر مراحل EPC پروژه موثر باشند ، بررسی و به شرح ذیل مشخص ، تعریف و در جدول شماره ۱۰ ، درج گردیدند :

✓ عدم امکان تأمین / مشکلات تأمینی بعضی از اقلام موثر بر پروژه

✓ موانع ناشی از عوامل طبیعی و محیطی

✓ به نفت نرسیدن

✓ توقف/فسخ قرارداد

گام سوم : تحلیل ریسک ها

در این گام از دیدگاه شاخص شدت خطر ریسک ، تحلیل ها لازم به شرح و ترتیب موارد زیر بر روی هر ریسک انجام شد :

0 تعیین سطح شدت اثر هر ریسک طبق جدول ۷ مشخص و در جداول مربوط به ریسک ها درج شده است.

0 تعیین میزان سطح احتمال وقوع هر ریسک در چارچوب جدول ۸ مشخص و در جداول مربوط به ریسک ها درج شده است.

0 پس از تعیین سطوح تعیین شده بالا، در چارچوب ماتریس مندرج در جدول شماره ۹ ، شدت خطر هر یک از ریسک ها تعیین و در جداول شماره ۱۰ درج شده است.

گام چهارم : تعیین عوامل تأثیر گذار بر ریسک ها

در نهایت نیز عوامل تأثیر گذار بر ریسک تعیین و تعریف شده و در جداول شماره ۱۰ درج گردیده است.

هر یک از ریسک های موجود در پروژه، در فاز خلاقیت کارگاه مطالعات مهندسی ارزش پروژه، به عنوان نقاط تمرکز بر ایده پردازی تعریف و مورد بررسی قرار خواهند گرفت و تلاش بر این خواهد بود تا ایده هایی در جهت کاهش ریسک های موجود ارائه گردد بطوریکه در فاز توسعه کارگاه، تأثیر هر گزینه در افزایش یا کاهش ریسک های موجود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								شماره صفحه : ۳۴ از ۱۳۲
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

جدول ۷- نحوه سطح بندی شدت اثر ریسک

شرح	طبقه	نام
متوقف شدن کامل / از بین رفتن کامل سیستم / حذف موضوع / تأثیر جدی بر کیفیت	۱	فاجعه آمیز
لطمه جدی به موضوع / توقف طولانی کار / خسارت های بزرگ مالی / تأثیر نسبتاً جدی بر کیفیت	۲	بحرانی
لطمه نسبتاً جدی به موضوع / توقف نسبی کار / خسارت های نسبی مالی / تأثیر کم بر کیفیت	۳	مرزی
لطمه کم به موضوع وارد شدن / توقف های مقطعی و کوتاه / خسارت های جزئی مالی	۴	قابل صرف نظر

جدول ۸- نحوه سطح بندی احتمال وقوع ریسک

شرح	حدود احتمال وقوع	سطح	نام سطح
به احتمال قوی خطر ریسک وجود دارد/ به صورت مکرر در پروژه ها یا پروژه های مشابه اتفاق افتاده است.	بیش از ۸۵٪	A	احتمال زیاد (مکرر)
احتمال خطر ریسک وجود دارد/ در پروژه یا پروژه های دیگر این اتفاق چندین بار تکرار شده است.	۸۵٪ الی ۵۱٪	B	محتمل
احتمال خطر ریسک نسبتاً وجود دارد/ در پروژه یا پروژه های دیگر کم و بیش این اتفاق رخ داده است.	۵۰٪ الی ۲۱٪	C	نسبتاً محتمل (گاه به گاه)
خطر ریسک با احتمال کم وجود دارد/ احتمال رخ دادن اتفاق در طول عمر سیستم هر چند کم ولی وجود دارد.	۲۰٪ الی ۱٪	D	احتمال کم (جزئی)
احتمال وقوع بسیار ناچیز است/ در طول عمر سیستم به ندرت رخ داده است به طوری که می توان فرض کرد که رخ نخواهد داد.	کمتر از ۱٪	E	غیر محتمل

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۳۵ از ۱۳۲
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03

جدول ۹- ماتریس تعیین شدت خطر ریسک (شاخص شدت ریسک)

		طبقه شدت اثر ریسک			
		فاجعه بار (۱)	بحرانی (۲)	مرزی (۳)	قابل صرف نظر (۴)
سطح احتمال وقوع ریسک	A احتمال زیاد (مکرر)	1 A	2 A	3 A	4 A
	B محتمل	1 B	2 B	3 B	4 B
	C نسبتاً محتمل (گاه به گاه)	1 C	2 C	3 C	4 C
	D احتمال کم (جزئی)	1 D	2 D	3 D	4 D
	E غیر محتمل	1 E	2 E	3 E	4 E

منطقه قرمز: دامنه شدت خطر ریسک مخاطره آمیز (پر خطر) است و می باید جهت حفظ پروژه حتماً اقدام نمود.

منطقه نارنجی: دامنه شدت خطر ریسک بالا (خطرناک) است و نیازمند تصمیم گیری است.

منطقه زرد: دامنه شدت خطر ریسک قابل قبول (کم خطر) است ولی نیازمند تجدید نظر است.

منطقه کرم: دامنه شدت خطر ریسک قابل قبول (ناچیز) است و نیازمند تجدید نظر نیست.



 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۳۷ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

مرحله ۱-۴- عارضه یابی

در این مرحله مطالعات عارضه یابی نتایج عملکرد پروژه ، طبق گام های مشروحه زیر ، تا مرحله تشخیص علل انجام پذیرفت بطوریکه مرحله اخذ راه حلهای رفع علل بر اساس اطلاعات حاصله در کارگاه مطالعات انجام پذیرد.



۱-۴-۱ - تعیین عارضه

در این مرحله با در نظر گیری نتایج عملکردی حاصله از فرآیند های عملیاتی پروژه توسط اعضای حاضر در پیش کارگاه و بررسی عارضه های وارده بر آنها ، عارضه های اصلی تأثیرگذار بر پروژه (با نظر گیری اهداف مطالعات) ، به شرح زیر شناسایی و تعریف گردیدند.

عارضه های شناسایی شده

- (۱) افزایش زمان پروژه نسبت به برآوردهای اولیه
- (۲) افزایش هزینه های CAPEX نسبت به برآوردهای اولیه
- (۳) بهینه نبودن عملیات تأمین
- (۴) بهینه نبودن بسترهای لازمه جهت ایجاد نوآوری در ساخت و تأمین

۱-۴-۲- بررسی و تشخیص علل ایجاد عارضه ها

اعضاء حاضر در پیش کارگاه ، پس از تشخیص عارضه ها ، هریک از آنها را مورد کنکاش قرارداده و علل ایجاد هریک از آنها را طبق نتایج مندرج در جدول شماره ۱۱ مشخص نمودند ، تا نهایتاً در کارگاه به راه حل های مناسبی که موجب رفع علل گردند دست یافته و بدین ترتیب بتوان ساختار اجرایی عملیات را ارتقاء داد .

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک	 																								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">VALUE ENGINEERING STUDY REPORT</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادر کننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>SSGRL</td><td>PEDCO</td><td>110</td><td>GE</td><td>RT</td><td>0002</td><td>D03</td></tr></table>	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	شماره صفحه : ۳۸ از ۱۳۲
VALUE ENGINEERING STUDY REPORT																										
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03																			

جدول ۱۱ - عارضه های حاصل از نتایج عملکردی و علل ایجاد آنها

جدول عارضه های حاصل از نتایج عملکرد پروژه		
شرح علل ایجاد عارضه	شرح عارضه	ردیف
تأخیر در تامین کالا / عملیات اجرایی عدم نتیجه گیری از آزمایشات تغییر مشخصات فنی تغییر شرح کار مشکلات معارضین عدم تامین اعتبار بموقع تغییر سیاست ها و نقطه نظرات متعدد کارفرما مجوزهای مرتبط با حریم و تقاطع برنامه ریزی نامناسب عوامل طبیعی	افزایش زمان پروژه نسبت به برآوردهای اولیه	۱
افزایش قیمت تجهیزات افزایش تورمی قیمت ها تغییر مشخصات فنی مشکلات محیط زیستی افزایش کار / تغییر شرح کار مشکلات پیش بینی نشده مرتبط با حریم ها و تقاطع ها برآوردهای اکتشافی نادرست تغییر مسیر خطوط لوله بعثت بررسی اولیه نادرست	افزایش هزینه های CAPEX نسبت به برآوردهای اولیه	۲
مشکلات تامین از منابع خارجی محدودیت های تامین کنندگان داخلی مشکلات تامین منابع مالی مشکلات زمان بندی در خرید	بهینه نبودن عملیات تامین	۳
الزام به رعایت AVL کارفرما لزوم اجرا بر اساس مدارک AFC شده عدم وجود اتاق فکر در مقاطع مختلف پروژه	بهینه نبودن بسترهای لازمه جهت ایجاد نوآوری در ساخت و تامین	۴

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ – ۰۷۳ – ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۳۹ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

مرحله ۵-۱) بررسی مشخصه های اصلی عملکردی Functional Performance Specifications (FPS)

با توجه به نمودار شماره ۸ ، هدف از تعریف مشخصه های اصلی کارکردی در این مرحله ، تفکیک موضوع مورد مطالعه به اجزاء هر چه کوچک تر در راستای تمرکز ذهن خلاق جمعی بر آنها و دستیابی هر چه بیشتر به ایده های موثر جهت دسترسی به اهداف ، می باشد.

نمودار شماره ۷: نمایش هدف از دستیابی به مشخصه های اصلی کارکردی



دستیابی به مشخصه های اصلی کارکردی در چهارچوب دو مرحله ذیل انجام گرفته است :

۱- تعیین محدوده های FPS

۲- تعیین FPS های هر محدوده

۱- تعیین محدوده های FPS

در این بخش محدوده های اصلی کارکردی که می بایست مطالعات مهندسی ارزش در کارگاه بر محدوده آن موضوعات متمرکز گردد، طبق نمودار شماره ۹ در چهارچوب کارکردهای هر یک از نمودارهای FAST ، ریسک ها ، ذینفعان و عارضه های تعریف و تدوین شده در پیش کارگاه ، تهیه و در جداول شماره ۱۲ الی ۱۶ و در ستون دامنه مشخصه های کارکردی " درج گردیده است .


 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">VALUE ENGINEERING STUDY REPORT</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادر کننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>SSGRL</td><td>PEDCO</td><td>110</td><td>GE</td><td>RT</td><td>0002</td><td>D03</td></tr></table>	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	شماره صفحه : ۴۰ از ۱۳۲
VALUE ENGINEERING STUDY REPORT																										
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03																			

نمودار شماره ۸: چگونگی دستیابی به دامنه های مشخصه های اصلی کارکردی



۲- تعیین مشخصه های اصلی عملکردی FPS

پس از تعیین محدوده های اصلی کارکردی که می باید مطالعات مهندسی ارزش در کارگاه بر دامنه موضوعات آنها متمرکز گردد، مشخصه های اصلی عملکردی (FPS) طبق نمودار شماره ۹، برای هر یک از دامنه ها قبل از کارگاه تعیین می گردد، به نحوی که طبق نمودار شماره ۱۰، تمرکز مطالعات کارگاهی بر آنها در مرحله ایده پردازی بصورت متمرکز سازی ذهن خلاق جمعی در چارچوب آنها آغاز می شود. لذا مشخصه های اصلی عملکردی مربوط برای هر یک از دامنه های تعریف شده در جداول شماره ۱۲ الی ۱۷ مشخص و در ستون مربوطه درج گردیده است، به نحوی که مطابق با دو شکل منظور شده در صفحه بعد، مشخصه های اصلی کارکردی تعریف گردیده اند.



نهایتاً با توجه به تصمیمات اخذ شده در مبحث تحلیل کارکردی، مقرر شد که کارکردهایی که با رنگ سبز و آبی مشخص شده اند مورد مطالعه قرار گیرند و کارکردهای زرد و قرمز در مطالعات کنار گذاشته شوند و در صورت تصمیم اعضای کارگاه مطالعات بر هر یک از دامنه ها، در چارچوب

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								شماره صفحه : ۴۱ از ۱۳۲
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	
	D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK	

مطالعات قرار گرفته شوند .

البته قابل ذکر است که تمامی کارکردها با در نظر گیری موقعیت زمانی پروژه در محدوده سبز بوده و مورد مطالعه قرار خواهند گرفت .

نمودار شماره ۹: چگونگی دستیابی به مشخصه های اصلی کارکردی



نمودار شماره ۱۰: موارد کاربرد مشخصه های اصلی کارکردی در کارگاه



 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ – ۰۷۳ – ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								شماره صفحه : ۴۲ از ۱۳۲
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

جدول ۱۲ - مشخصه های اصلی کارکردی نمودار FST ایستگاه تقویت فشار گاز ، لخته گیر و خط لوله میعانانات گازی

مشخصه های اصلی کارکردی مرتبط با کارکردهای نمودار FAST تقویت فشار گاز، لخته گیر و خط لوله میعانانات FPS(Functional Performance Specification)	
دامنه مشخصه های اصلی کارکردی	مشخصه های اصلی کارکردی در دامنه مشخص شده
نوع کمپرسور نوع آرایش کمپرسورها نوع درایور بهینه سازی فونداسیون تجهیزات جانبی سیستم های کنترلی عملیات نصب و برنامه آن ارتقاء SAFETY ارتقاء HSE در این عملیات نحوه بازرسی و کنترل کیفیت نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش عملیات بهینه کردن طراحی در این مبحث	بهینه سازی ایجاد تراکم گاز از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
نوع سیستم خنک کننده تعداد fan و موتور سازه و فونداسیون نحوه حفاظت در برابر ارتعاشات نحوه سیستم کنترل عملیات نصب و برنامه آن ارتقاء HSE در این عملیات نحوه بازرسی و کنترل کیفیت نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش عملیات بهینه کردن طراحی این مبحث	بهینه سازی سیستم خنک سازی گاز از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک							 	
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								شماره صفحه : ۴۳ از ۱۳۲
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

مشخصه های اصلی کارکردی مرتبط با کارکردهای نمودار FAST تقویت فشار گاز، لخته گیر و خط لوله میعان FPS(Functional Performance Specification)	
دایره مشخصه های اصلی کارکردی	مشخصه های اصلی کارکردی در دایره مشخص شده
بهینه سازی نوع تجهیزات / سیستم دفع بهینه سازی سیستم های کنترل بهینه سازی نحوه تخلیه فشار بهینه سازی فونداسیون بهینه سازی SAFETY بهینه سازی HSE در این عملیات بهینه سازی نحوه بازرسی و کنترل کیفیت بهینه سازی تأمین اقلام این بخش عملیات بهینه کردن طراحی این عملیات	بهینه سازی دفع گازهای زائد از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
Instrument سیستم های SCS و ESD و UCP کابل ها نحوه ارتباط بین سیستم ها اندازه گیری گاز بهینه سازی منطق بهره برداری بهینه سازی منطق قطع اضطراری سینی و نرده بان بهینه سازی تابلوها چیدمان اتاق کنترل ارتقاء SAFETY در این عملیات ارتقاء HSE در این عملیات نحوه بازرسی و کنترل کیفیت نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش بهینه کردن طراحی این مبحث	بهینه سازی کنترل فرآیند از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								شماره صفحه : ۴۴ از ۱۳۲
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	
	D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK	

مشخصه های اصلی کارکردی مرتبط با کارکردهای نمودار FAST تقویت فشار گاز، لخته گیر و خط لوله میعانات FPS(Functional Performance Specification)	
دامنه مشخصه های اصلی کارکردی	مشخصه های اصلی کارکردی در دامنه مشخص شده
بهینه سازی اجرای Piping از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی	چیدمان سایت لوله کشی خطوط فرآیندی لوله کشی خطوط جانبی آنالیز تنش سایپورت لوله ها فونداسیون ها دسترسی تجهیزات نحوه عایق بندی جوشکاری تست هیدرواستاتیک جنس لوله نوع عایق نوع پوشش ها نوع شیرآلات جنس شیرآلات FIRE PROOFING جلوگیری از نشتی SAFETY HSE بازرسی و کنترل کیفیت تأمین اقلام این بخش عملیات بهینه کردن طراحی
بهینه سازی تأمین برق از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی	بهینه سازی نحوه تأمین برق بهینه سازی نوع درایور ژنراتورها بهینه سازی ظرفیت ژنراتورها بهینه سازی خط انتقال برق بهینه سازی فونداسیون ها بهینه سازی پست ها و ترانسفورماتورها و کلیدها بهینه سازی سیستم های کنترل (PMS) بهینه سازی الکتروموتورها

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">VALUE ENGINEERING STUDY REPORT</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادر کننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>SSGRL</td><td>PEDCO</td><td>110</td><td>GE</td><td>RT</td><td>0002</td><td>D03</td></tr></table>	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	شماره صفحه : ۴۵ از ۱۳۲
VALUE ENGINEERING STUDY REPORT																										
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03																			

مشخصه های اصلی کارکردی مرتبط با کارکردهای نمودار FAST تقویت فشار گاز، لخته گیر و خط لوله میعانات FPS(Functional Performance Specification)	
دامنه مشخصه های اصلی کارکردی	مشخصه های اصلی کارکردی در دامنه مشخص شده
	بهینه سازی سیستم های حفاظتی بهینه سازی تابلوها بهینه سازی کابل های ارتباطی بهینه سازی سینی ها و نرده بان کابل بهینه سازی سیستم های روشنایی بهینه سازی حفاظت از صاعقه بهینه سازی سیستم حفاظت زمین بهینه سازی سیستم حفاظت الکترونیکی بهینه سازی سیستم UPS و باتری شارژر بهینه سازی چیدمان اتاق switch gear بهینه سازی عملیات نصب و برنامه آن بهینه سازی SAFETY بهینه سازی HSE در این عملیات بهینه سازی بازرسی و کنترل کیفیت بهینه سازی تأمین اقلام این بخش عملیات بهینه کردن طراحی این مبحث
بهینه سازی تأمین هوا از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی	بهینه سازی نوع و تعداد کمپرسورها بهینه سازی سیستم کنترل بهینه سازی سیستم درایور بهینه سازی مخزن ذخیره بهینه سازی توزیع هوا بهینه سازی فونداسیون بهینه سازی تجهیزات جانبی بهینه سازی عملیات و برنامه نصب بهینه سازی SAFETY بهینه سازی HSE در این عملیات بهینه سازی بازرسی و کنترل کیفیت بهینه سازی تأمین اقلام این عملیات بهینه سازی طراحی این مبحث

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">VALUE ENGINEERING STUDY REPORT</th></tr><tr><td>نسخه</td><td>سریال</td><td>نوع مدرک</td><td>رشته</td><td>تسهیلات</td><td>صادر کننده</td><td>بسته کاری</td><td>پروژه</td></tr><tr><td>D03</td><td>0002</td><td>RT</td><td>GE</td><td>110</td><td>PEDCO</td><td>SSGRL</td><td>BK</td></tr></table>	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK	شماره صفحه : ۴۶ از ۱۳۲
VALUE ENGINEERING STUDY REPORT																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK																			

مشخصه های اصلی کارکردی مرتبط با کارکردهای نمودار FAST تقویت فشار گاز، لخته گیر و خط لوله میعانات FPS(Functional Performance Specification)	
دامنه مشخصه های اصلی کارکردی	مشخصه های اصلی کارکردی در دامنه مشخص شده
بهینه سازی تأمین آب از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی	بهینه سازی نحوه تأمین آب بهینه کردن روش ذخیره سازی روش بهینه تصفیه آب بهینه سازی پمپ ها بهینه کردن فونداسیونها کنترل بهینه سیستم بهینه کردن HSE این عملیات بهینه کردن بازرسی و کنترل کیفیت تأمین بهینه اقلام این بخش عملیات بهینه کردن طراحی این مبحث
بهینه سازی تأمین F&G از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی	بهینه سازی نوع FLARE / STACK/تهیزات جانبی بهینه سازی حجم گاز خروجی بهینه سازی سیستم های اندازه گیری و کنترل بهینه سازی نحوه تخلیه فشار بهینه سازی فونداسیون و ارتفاع STACK بهینه سازی SAFETY بهینه سازی ساینز شبکه بهینه سازی HSE در این عملیات بهینه سازی نحوه بازرسی و کنترل کیفیت بهینه سازی تأمین اقلام این بخش عملیات بهینه کردن طراحی این عملیات

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">VALUE ENGINEERING STUDY REPORT</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادر کننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D03</td><td>0002</td><td>RT</td><td>GE</td><td>110</td><td>PEDCO</td><td>SSGRL</td><td>BK</td></tr></table>	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK	شماره صفحه : ۴۷ از ۱۳۲
VALUE ENGINEERING STUDY REPORT																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK																			

مشخصه های اصلی کارکردی مرتبط با کارکردهای نمودار FAST تقویت فشار گاز، لخته گیر و خط لوله میعانات FPS(Functional Performance Specification)	
دامنه مشخصه های اصلی کارکردی	مشخصه های اصلی کارکردی در دامنه مشخص شده
بهینه سازی اطفاء حریق از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی	نحوه تأمین آب آتش نشانی سیستم های خنک کننده FIRE FIGHTING SAFETY شبکه آب آتش نشانی سیستم های گازی (CO2) PERSONAL SAFETY بهینه سازی HSE در این عملیات نحوه بهینه بازرسی و کنترل کیفیت نحوه بهینه تأمین اقلام این عملیات بهینه کردن طراحی این مبحث
بهینه سازی تأمین سوخت از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی	کنترل فشار و دما سازه و فونداسیون جداسازی و تصفیه ذخیره سازی سوخت سیستم تخلیه مایعات و گازها سیستم اندازه گیری و کنترل SAFETY در این عملیات عملیات نصب و برنامه آن عملیات HSE در این عملیات عملیات بازرسی و کنترل کیفیت نحوه بهینه تأمین اقلام این عملیات بهینه کردن طراحی این مبحث
بهینه سازی برقراری مخابرات از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی	سیستم تلفن سیستم پیجینگ سیستم RTU شبکه LAN چگونگی HSE در طراحی و ساخت و تأمین این عملیات نحوه بازرسی و کنترل کیفیت نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش عملیات

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۴۸ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

مشخصه های اصلی کارکردی مرتبط با کارکردهای نمودار FAST تقویت فشار گاز، لخته گیر و خط لوله میعانات FPS(Functional Performance Specification)	
مشخصه های اصلی کارکردی در دامنه مشخص شده	دامنه مشخصه های اصلی کارکردی
نوع سیستم فاضلاب صنعتی سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی ظرفیت شبکه فاضلاب چگونگی HSE در این عملیات نحوه بازرسی و کنترل کیفیت نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش بهینه کردن طراحی این مبحث	بهینه سازی دفع فاضلاب از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
جنس و نوع و ضخامت و طول و سایز لوله پوشش دهی نحوه استقرار جاده های دسترسی مسیر ایجاد بستر و لوله گذاری عبور از موانع حفاظت کاتدیك سیستم کنترل اتصال لوله ها تست ها سাপورت گذاری برای خطوط لوله جریانی جریان سازی نفت خام و راه اندازی خط ارتقاء SAFETY فرآیندی در این عملیات ارتقاء HSE و نحوه بازرسی و کنترل کیفیت نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش عملیات بهینه کردن طراحی در رابطه با مبحث فوق	بهینه سازی خطوط انتقال میعانات گازی از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ – ۰۷۳ – ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								شماره صفحه : ۴۹ از ۱۳۲
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

مشخصه های اصلی کارکردی مرتبط با کارکردهای نمودار FAST تقویت فشار گاز، لخته گیر و خط لوله میعانات FPS(Functional Performance Specification)	
مشخصه های اصلی کارکردی در دامنه مشخص شده	دامنه مشخصه های اصلی کارکردی
نحوه بهینه ذخیره سازی نحوه بهینه تأمین نیتروژن بهینه سازی ظرفیت مخزن بهینه سازی سیستم کنترل بهینه سازی HSE در این عملیات بهینه سازی نحوه بازرسی و کنترل کیفیت نحوه بهینه تأمین اقلام این عملیات بهینه کردن طراحی این مبحث	بهینه کردن سیستم تأمین نیتروژن از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
بهینه سازی سازه های صنعتی بهینه سازی ساختمان های غیر صنعتی بهینه سازی تسطیح زمین بهینه سازی محوطه سازی بهینه سازی جاده ها بهینه سازی فضای سبز بهینه سازی کانال ها بهینه سازی سایبان ها بهینه سازی سیستم های سرمایش و گرمایش بهینه سازی حصار کشی ایستگاه بهینه سازی سیستم های حفاظتی محوطه بهینه سازی دفع آبهای سطحی بهینه سازی تأسیسات آب و گاز بهینه سازی SAFETY بهینه سازی HSE در این عملیات بهینه سازی نحوه بازرسی و کنترل کیفیت نحوه بهینه تأمین اقلام این عملیات بهینه سازی طراحی این مبحث	بهینه سازی عملیات عمرانی از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
نوع Slug Catcher System نحوه نصب Slug Catcher System فونداسیون ها محوطه سازی	بهینه سازی Slug Catcher System از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ – ۰۷۳ – ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								شماره صفحه : ۵۰ از ۱۳۲
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	
	D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK	

مشخصه های اصلی کارکردی مرتبط با کارکردهای نمودار FAST تقویت فشار گاز، لخته گیر و خط لوله میعانات FPS(Functional Performance Specification)	
دامنه مشخصه های اصلی کارکردی	مشخصه های اصلی کارکردی در دامنه مشخص شده
بهینه سازی فرآیند نم زدایی از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی	سیستم کنترل در Slug Catcher System ارتقاء SAFETY بهینه سازی نحوه بازرسی و کنترل کیفیت بهینه سازی تأمین اقلام این عملیات نصب، تست و راه اندازی
	نوع فرآیند نم زدایی نوع سیستم احیاء زمان و نحوه سوپچینگ بین احیا و نم زدایی فشار بهینه نم زدایی بهینه سازی حرارتی سیستم نم زدایی نوع کوره حرارتی نوع سیستم فیلتراسیون فونداسیون ها محوطه سازی ارتقاء SAFETY بهینه سازی نحوه بازرسی و کنترل کیفیت نصب، تست و راه اندازی بهینه سازی تأمین اقلام این عملیات

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک							 	
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۵۱ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

مشخصه های اصلی کارکردی مرتبط با کارکردهای نمودار FAST تقویت فشار گاز، لخته گیر و خط لوله میعانات FPS(Functional Performance Specification)	
دامنه مشخصه های اصلی کارکردی	مشخصه های اصلی کارکردی در دامنه مشخص شده
بهینه سازی Piping لخته گیر و نم زدایی از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی	چیدمان سایت لوله کشی خطوط فرآیندی لوله کشی خطوط جانبی اسلیپر و ساپورت لوله ها فونداسیون ها دسترسی تجهیزات نحوه عایق بندی جوشکاری تست هیدرواستاتیکی جنس لوله نوع عایق نوع پوشش ها نوع شیر آلات جنس شیر آلات FIRE PROOFING جلوگیری از نشتی SAFETY بازرسی و کنترل کیفیت نوع و تأمین اقلام این بخش عملیات
بهینه سازی سیستم های کنترل فرآیند لخته گیر و نم زدایی از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی	Field Instrument سیستم های ESD و DCS نحوه ارتباط و یکپارچگی بین سیستم ها موجود و جدید بهینه سازی منطق بهره برداری بهینه سازی منطق قطع اضطراری سینی و نرده بان و کابل ها بهینه سازی تابلوها چیدمان اتاق کنترل ارتقاء SAFETY در این عملیات نحوه نصب، FAT/SAT و راه اندازی و گارانتی نحوه بازرسی و کنترل کیفیت نوع ونحوه بهینه تأمین اقلام این بخش

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								شماره صفحه : ۵۲ از ۱۳۲
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

مشخصه های اصلی کارکردی مرتبط با کارکردهای نمودار FAST تقویت فشار گاز، لخته گیر و خط لوله میعانات FPS(Functional Performance Specification)	
مشخصه های اصلی کارکردی در دامنه مشخص شده	دامنه مشخصه های اصلی کارکردی
بهینه سازی سیستم های اندازه گیری و کنترل بهینه سازی نحوه تخلیه فشار بهینه سازی SAFETY فلسفه سیستم F&G بهینه سازی نحوه بازرسی و کنترل کیفیت نوع و بهینه سازی تأمین اقلام این بخش عملیات نصب، تست و راه اندازی	بهینه سازی تأمین F&G لخته گیر و نم زدایی از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
بهینه سازی نحوه تأمین برق بهینه سازی ساینینگ کابل های برق بهینه سازی فونداسیون ها بهینه سازی پست ها و ترانسفورماتورها و کلیدها بهینه سازی سیستم های کنترل(SCADA) بهینه سازی الکتروموتورها بهینه سازی سیستم های حفاظتی بهینه سازی تابلوها بهینه سازی کابل های ارتباطی و خطوط انتقال بهینه سازی سینی ها و نرده بان کابل بهینه سازی سیستم های روشنایی بهینه سازی حفاظت از صاعقه بهینه سازی سیستم حفاظت زمین بهینه سازی سیستم UPS و باتری شارژر بهینه سازی چیدمان اتاق switch gear بهینه سازی عملیات نصب و برنامه آن بهینه سازی SAFETY بهینه سازی موقعیت پست برق نوع و بهینه سازی تأمین اقلام این بخش عملیات	بهینه سازی تأمین برق لخته گیر و نم زدایی از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								شماره صفحه : ۵۳ از ۱۳۲
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	
	D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK	

جدول ۱۳ - مشخصه های اصلی کارکردی نمودار FST خط لوله گاز

مشخصه های اصلی کارکردی مرتبط با کارکردهای نمودار FAST انتقال گاز FPS(Functional Performance Specification)	
دامنه مشخصه های اصلی کارکردی	مشخصه های اصلی کارکردی در دامنه مشخص شده
بهینه سازی عملیات استقرار لوله ها از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی	نحوه ریشه کردن نحوه بارگیری از دپو نحوه حمل لوله (از دپو به مسیر خط لوله) نحوه زیر سازی لوله در کانال نحوه لوله گذاری نوع ماشین آلات لوله گذاری اجرای HSE نحوه بازرسی و کنترل کیفیت نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش عملیات بهینه کردن طراحی در رابطه با مبحث فوق
	نحوه انجام جوش نحوه خم کاری نوع ماشین آلات نوع تست جوش نوع الکترودها و یا مواد مصرفی نحوه پوشش دهی محل اتصال اجرای HSE در این عملیات نحوه بازرسی و کنترل کیفیت نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش عملیات بهینه کردن طراحی در این چارچوب

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								شماره صفحه : ۵۴ از ۱۳۲
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	
	D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK	

مشخصه های اصلی کارکردی مرتبط با کارکردهای نمودار FAST انتقال گاز FPS(Functional Performance Specification)	
دامنه مشخصه های اصلی کارکردی	مشخصه های اصلی کارکردی در دامنه مشخص شده
بهینه سازی عملیات حفاظت لوله ها از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی	نحوه سند بلاست نحوه عایق کاری نحوه حمل نحوه بارگیری و تخلیه نحوه عایق سر جوش نحوه حفاظت از زنگ دائمی نحوه حفاظت از زنگ موقت Zinc Earthing Cell Polarisation Cell Test Point بستر آندی(موقت و دائم) نوع تست پوشش SAFETY فرآیند HSE اجرای نحوه بازرسی و کنترل کیفیت نوع ونحوه تأمین اقلام این بخش عملیات بهینه کردن طراحی در رابطه با مبحث فوق

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">VALUE ENGINEERING STUDY REPORT</th></tr><tr><td>نسخه</td><td>سریال</td><td>نوع مدرک</td><td>رشته</td><td>تسهیلات</td><td>صادر کننده</td><td>بسته کاری</td><td>پروژه</td></tr><tr><td>D03</td><td>0002</td><td>RT</td><td>GE</td><td>110</td><td>PEDCO</td><td>SSGRL</td><td>BK</td></tr></table>	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK	شماره صفحه : ۵۵ از ۱۳۲
VALUE ENGINEERING STUDY REPORT																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK																			

مشخصه های اصلی کارکردی مرتبط با کارکردهای نمودار FAST انتقال گاز FPS(Functional Performance Specification)	
دایره مشخصه های اصلی کارکردی	مشخصه های اصلی کارکردی در دایره مشخص شده
بهینه سازی عملیات بستر سازی خط لوله از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی	نحوه انجام حفر کانال نحوه تعیین نقاط اندازه گیری اختلاف پتانسیل نحوه اجرای خاک سرنبدی وبالشکک گذاری داخل کانال نحوه چاکی گذاری نحوه انجام Back Fill نحوه انجام Connection چگونگی نصب علائم خط لوله چگونگی عبور از جاده ها چگونگی عبور از آبروها چگونگی عبور از گسل ها چگونگی رعایت حریم ها چگونگی عبور از کوه ها چگونگی HSE در طراحی و ساخت وتأمین این عملیات نحوه بازرسی و کنترل کیفیت نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش عملیات بهینه کردن طراحی در رابطه با مبحث فوق

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">VALUE ENGINEERING STUDY REPORT</th></tr><tr><td>نسخه</td><td>سریال</td><td>نوع مدرک</td><td>رشته</td><td>تسهیلات</td><td>صادر کننده</td><td>بسته کاری</td><td>پروژه</td></tr><tr><td>D03</td><td>0002</td><td>RT</td><td>GE</td><td>110</td><td>PEDCO</td><td>SSGRL</td><td>BK</td></tr></table>	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK	شماره صفحه : ۵۶ از ۱۳۲
VALUE ENGINEERING STUDY REPORT																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK																			

مشخصه های اصلی کارکردی مرتبط با کارکردهای نمودار FAST انتقال گاز FPS(Functional Performance Specification)	
دامنه مشخصه های اصلی کارکردی	مشخصه های اصلی کارکردی در دامنه مشخص شده
بهینه سازی عملیات احداث جاده دسترسی از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی	نوع و نحوه تامین ماشین آلات نحوه خاک برداری نرم نحوه خاک برداری سخت نحوه خاک برداری سنگی نحوه حمل خاک های مازاد انتخاب محل قرضه خاک نحوه شیب بندی ارتقاء SAFETY فرآیند نحوه احداث کانال های دفع آبهای سطحی نحوه مقاوم سازی جاده چگونگی نصب علائم چگونگی اجرای گرده ماهی عملیات HSE نحوه بازرسی و کنترل کیفیت نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش عملیات بهینه کردن طراحی در رابطه با مبحث فوق
	نوع و نحوه کنترل فرآیند ایستگاه های مخابراتی نصب تجهیزات روی خط لوله فیبرنوری چگونگی HSE در طراحی و ساخت و تأمین این عملیات نحوه بازرسی و کنترل کیفیت نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش عملیات بهینه کردن طراحی در رابطه با مبحث فوق
	جنس لوله نوع لوله ضخامت لوله سایز لوله در نقاط مختلف نوع Casing و تجهیزات مربوطه الکتروود
بهینه سازی عملیات تأمین و انبارش لوله ها از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ – ۰۷۳ – ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								شماره صفحه : ۵۷ از ۱۳۲
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

مشخصه های اصلی کارکردی مرتبط با کارکردهای نمودار FAST انتقال گاز FPS(Functional Performance Specification)	
مشخصه های اصلی کارکردی در دامنه مشخص شده	دامنه مشخصه های اصلی کارکردی
نحوه بارگیری از مبدا نحوه حمل لوله (از مبدا) نحوه تخلیه لوله نحوه دپو در محل محل دپو چگونگی HSE در طراحی و ساخت و تأمین این عملیات نحوه بازرسی و کنترل کیفیت بهینه کردن طراحی در رابطه با مبحث فوق نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش عملیات	
نوع و نحوه نصب تجهیزات ساخت ابنیه حصار کشی حفر گودال Valve Pit روش حفاظت از ایستگاه ها برق رسانی به ایستگاه ها نگاهی به SAFETY فرآیند اجرای HSE نحوه بازرسی و کنترل کیفیت نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش عملیات بهینه کردن طراحی	بهینه سازی عملیات برقراری ایستگاه های بین راهی از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک	 																								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">VALUE ENGINEERING STUDY REPORT</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادر کننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>SSGRL</td><td>PEDCO</td><td>110</td><td>GE</td><td>RT</td><td>0002</td><td>D03</td></tr></table>	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	شماره صفحه : ۵۸ از ۱۳۲
VALUE ENGINEERING STUDY REPORT																										
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03																			

مشخصه های اصلی کارکردی مرتبط با کارکردهای نمودار FAST انتقال گاز FPS(Functional Performance Specification)	
دامنه مشخصه های اصلی کارکردی	مشخصه های اصلی کارکردی در دامنه مشخص شده
بهینه سازی عملیات جریان سازی گاز در خط لوله (راه اندازی خط) از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی	اتصال خط به محل Feed نوع و نحوه اجرای تست پوشش / جوش / نشی / ایستگاهها جهت راه اندازی نحوه تامین آب یا مواد لازم جهت تست بهینه سازی عملیات رفع نواقص بهینه سازی عملیات تحویل دهی موقت / دائم بهینه سازی عملیات برجیدن کارگاه بهینه سازی عملیات HSE بهینه سازی عملیات بازرسی و کنترل کیفیت نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش عملیات بهینه کردن طراحی
انتخاب بهینه مسیر خط لوله از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی	رعایت مناطق زیست محیطی عبور از نواحی کم عارضه توپوگرافی حداقل عبور از باغات و جنگل ها و زمین های کشاورزی حفظ حریم مسائل ایمنی، اقتصادی و شرایط بهره برداری حداقل تقاطع با رودخانه و جاده ها رعایت پدافند غیر عامل زمین شناسی ، هیدرولوژی و لرزه شناسی بهینه کردن طراحی در رابطه با مبحث فوق

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ – ۰۷۳ – ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								شماره صفحه : ۵۹ از ۱۳۲
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

جدول ۱۴ - مشخصه های اصلی کارکردی نمودار FST مجموعه منیفولد

مشخصه های اصلی کارکردی مرتبط با کارکردهای نمودار FAST منیفولد FPS(Functional Performance Specification)	
دامنه مشخصه های اصلی کارکردی	مشخصه های اصلی کارکردی در دامنه مشخص شده
بهینه سازی تأسیسات لوله کشی مجموعه منیفولد از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی	نحوه چیدمان سایت نوع و نحوه لوله کشی خطوط فرآیندی نوع و نحوه لوله کشی خطوط جانبی آنالیز تنش نوع و نحوه اجرای ساپورت لوله ها فونداسیون ها دسترسی تجهیزات نوع و نحوه عایق بندی جوشکاری تست هیدرواستاتیک جنس لوله نوع پوشش ها نوع شیرآلات جنس شیرآلات FIRE PROOFING جلوگیری از نشتی ارتقاء SAFTY فرآیند مزبور بهینه سازی HSE این مبحث نحوه بازرسی و کنترل کیفیت نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش عملیات بهینه کردن طراحی این مبحث

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">VALUE ENGINEERING STUDY REPORT</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادر کننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>SSGRL</td><td>PEDCO</td><td>110</td><td>GE</td><td>RT</td><td>0002</td><td>D03</td></tr></table>	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	شماره صفحه : ۶۰ از ۱۳۲
VALUE ENGINEERING STUDY REPORT																										
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03																			

مشخصه های اصلی کارکردی مرتبط با کارکردهای نمودار FAST منیفولد FPS(Functional Performance Specification)	
دامنه مشخصه های اصلی کارکردی	مشخصه های اصلی کارکردی در دامنه مشخص شده
Instrument سیستم های SCS و ESD و UCP کابل ها نحوه ارتباط بین سیستم های کنترلی سیستم های اندازه گیری منطق بهره برداری منطق قطع اضطراری سینی و نرده بان تابلوها چیدمان اتاق کنترل چگونگی HSE در طراحی و ساخت و تأمین این عملیات نحوه بازرسی و کنترل کیفیت نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش عملیات بهینه کردن طراحی در رابطه با مبحث فوق	بهینه سازی تأسیسات کنترل فرآیند منیفولد از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی
سازه های صنعتی ساختمان های غیر صنعتی تسطیح زمین محوطه سازی جاده ها فضای سبز کانال ها سایبان ها سیستم های سرمایش و گرمایش حصار کشی ایستگاه دفع آبهای سطحی تأسیسات آب و گاز چگونگی HSE در طراحی و ساخت و تأمین این عملیات نحوه بازرسی و کنترل کیفیت نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش عملیات بهینه کردن طراحی در رابطه با مبحث فوق	بهینه سازی عملیات عمرانی جهت محوطه سازی مجموعه منیفولد از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">VALUE ENGINEERING STUDY REPORT</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادر کننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D03</td><td>0002</td><td>RT</td><td>GE</td><td>110</td><td>PEDCO</td><td>SSGRL</td><td>BK</td></tr></table>	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK	شماره صفحه : ۶۱ از ۱۳۲
VALUE ENGINEERING STUDY REPORT																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK																			

مشخصه های اصلی کارکردی مرتبط با کارکردهای نمودار FAST منیفولد FPS(Functional Performance Specification)	
دامنه مشخصه های اصلی کارکردی	مشخصه های اصلی کارکردی در دامنه مشخص شده
بهینه سازی تأسیسات برقراری F&G در مجموعه منیفولد از طریق بهینه کردن مشخصه های اصلی کارکردی	نوع سنسورها و سیستم مربوطه تعداد و آرایش نحوه ارتباط با سایر سیستم ها تابلوی کنترل کابل ها سینی ها و نردبان فرآیند اطفاء حریق منیفولد چگونگی HSE در طراحی و ساخت و تأمین این عملیات نحوه بازرسی و کنترل کیفیت نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش عملیات بهینه کردن طراحی در رابطه با مبحث فوق

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک	 																								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">VALUE ENGINEERING STUDY REPORT</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادر کننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D03</td><td>0002</td><td>RT</td><td>GE</td><td>110</td><td>PEDCO</td><td>SSGRL</td><td>BK</td></tr></table>	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK	شماره صفحه : ۶۲ از ۱۳۲
VALUE ENGINEERING STUDY REPORT																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK																			

جدول ۱۵ - مشخصه های اصلی کارکردی نمودار FST تأسیسات سرچاهی ها و خطوط لوله انتقال نفت به منیفولدو برق
رسانی آنها

مشخصه های اصلی کارکردی مرتبط با کارکردهای نمودار FAST تأسیسات سرچاهی FPS(Functional Performance Specification)	
دامنه مشخصه های اصلی کارکردی	مشخصه های اصلی کارکردی در دامنه مشخص شده
بهینه سازی تأسیسات سرچاهی ها	چگونگی تعبیه Well Pad چگونگی تعبیه Cellar گودال آتش نوع و تأمین تجهیزات استخراجی چگونگی تأمین برق عملیات استخراج نحوه تأمین برق سرچاهی ها اجرای Piping اجرای F&G نحوه اطفاء حریق ارتقاء SAFETY فرآیند ارتقاء HSE نحوه بازرسی و کنترل کیفیت در استخراج نحوه بهینه تأمین اقلام فرآیند استخراج بهینه کردن طراحی نحوه استخراج
	سازه های صنعتی ساختمان های غیر صنعتی تسطیح زمین محوطه سازی جاده دسترسی فضای سبز کانال ها سایبان ها حصار کشی ایستگاه سیستمهای امنیتی دفع آبهای سطحی تأسیسات آب و گاز و سرمایش و گرمایش ارتقاء HSE در این عملیات نحوه بازرسی و کنترل کیفیت نحوه بهینه تأمین اقلام این عملیات بهینه کردن طراحی این مبحث

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">VALUE ENGINEERING STUDY REPORT</th></tr><tr><td>نسخه</td><td>سریال</td><td>نوع مدرک</td><td>رشته</td><td>تسهیلات</td><td>صادر کننده</td><td>بسته کاری</td><td>پروژه</td></tr><tr><td>D03</td><td>0002</td><td>RT</td><td>GE</td><td>110</td><td>PEDCO</td><td>SSGRL</td><td>BK</td></tr></table>	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK	شماره صفحه : ۶۳ از ۱۳۲
VALUE ENGINEERING STUDY REPORT																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK																			

مشخصه های اصلی کارکردی مرتبط با کارکردهای نمودار FAST تأسیسات سرچاهی FPS(Functional Performance Specification)	
دامنه مشخصه های اصلی کارکردی	مشخصه های اصلی کارکردی در دامنه مشخص شده
بهینه سازی خطوط انتقال نفت از سرچاهی ها به مینفولد	جنس و نوع لوله پوشش دهی ضخامت لوله طول لوله نحوه استقرار سایز لوله جاده های دسترسی ایمنی مسیر ایجاد بستر و لوله گذاری عبور از موانع حفاظت کاتدیك سیستم کنترل اتصال لوله ها تست ها سাপورت گذاری برای خطوط لوله جریانی جریان سازی نفت خام و راه اندازی خط ارتقاء SAFETY فرآیندی در این عملیات ارتقاء HSE و نحوه بازرسی و کنترل کیفیت نحوه بهینه تأمین اقلام این بخش عملیات بهینه کردن طراحی در رابطه با مبحث فوق
	نحوه تأمین برق سرچاهی ها ساختمانهای برق نحوه بهینه انتخاب تجهیزات برق رسانی به چاه ها ارتقاء SAFETY فرآیند ارتقاء HSE نحوه بازرسی و کنترل کیفیت نحوه بهینه تأمین اقلام فرآیند بهینه کردن طراحی
بهینه سازی تأمین برق سرچاهی ها	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ – ۰۷۳ – ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۶۴ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

جدول ۱۶ - مشخصه های اصلی کارکردی مرتبط با دینفعان

مشخصه های اصلی کارکردی مرتبط با دینفعان پروژه (FPS(Functional Performance Specification)	
دامنه مشخصه های اصلی کارکردی (دینفع)	مشخصه های اصلی کارکردی (مشکلات تعاملی پروژه با دینفع)
بهینه سازی تعامل پروژه با شرکت مناطق نفت خیز جنوب از طریق بهبود مشخصه های اصلی کارکردی (رفع مشکلات تعاملی) مرتبط با دینفع	تعدد نقطه نظرات طولانی بودن زمان اعلام نظرات
بهینه سازی تعامل پروژه با شرکت پترو ایران از طریق بهبود مشخصه های اصلی کارکردی (رفع مشکلات تعاملی) مرتبط با دینفع	بروکراسی تصمیم گیری
بهینه سازی تعامل پروژه با مشارکت شرکت های هیرگان انرژی و طرح و بازرسی از طریق بهبود مشخصه های اصلی کارکردی (رفع مشکلات تعاملی) مرتبط با دینفع	مشکل در جذب نیروهای متخصص و موثر کافی بعثت مهاجرت نیروهای متخصص به خارج کشور کمبود نقدینگی به علت عدم اطمینان از پرداخت به موقع
بهینه سازی تعامل پروژه با پیمانکاران از طریق بهبود مشخصه های اصلی کارکردی (رفع مشکلات تعاملی) مرتبط با دینفع	کمبود نیروهای متخصص و موثر تأخیر در اجرای قراردادها ناکافی بودن کیفیت کار کمبود نقدینگی به علت عدم اطمینان از پرداخت به موقع اجبار به استفاده از پیمانکاران بومی
بهینه سازی تعامل پروژه با تأمین کنندگان از طریق بهبود مشخصه های اصلی کارکردی (رفع مشکلات تعاملی) مرتبط با دینفع	تحریم و محدود شدن امکان خرید از سازندگان خارجی ضعف فنی تأخیر در اجرای قراردادها
بهینه سازی تعامل پروژه با بهره بردار از طریق بهبود مشخصه های اصلی کارکردی (رفع مشکلات تعاملی) مرتبط با دینفع	کمبود اطلاعات مدون از واحدهای موجود
بهینه سازی تعامل پروژه با پدافند غیرعامل از طریق بهبود مشخصه های اصلی کارکردی (رفع مشکلات تعاملی) مرتبط با دینفع	طراحی های مجدد
بهینه سازی تعامل پروژه با ارگان های دولتی دینفع از طریق بهبود مشخصه های اصلی کارکردی (رفع مشکلات تعاملی) مرتبط با دینفع	اخذ مجوزهای مربوطه
بهینه سازی تعامل پروژه با معارضین و افراد بومی از طریق بهبود مشخصه های اصلی کارکردی (رفع مشکلات تعاملی) مرتبط با دینفع	زمانبری و مشکلات موجود در اخذ رضایت افراد بومی با توجه به مسئولیت اجتماعی استفاده از افراد بومی در ساخت ، کمبود نیروهای کارگری و فنی موثر

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ – ۰۷۳ – ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۶۵ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

جدول ۱۷ - مشخصه های اصلی کارکردی مرتبط با ریسکهای وارده بر پروژه در مرحله EPC

مشخصه های اصلی کارکردی مرتبط با ریسک ها FPS(Functional Performance Specification)	
مشخصه های اصلی کارکردی(عوامل موثر بر ریسک)	دامنه مشخصه های اصلی کارکردی(ریسک)
مشکلات تامین مالی تحریم محدودیت های تامین کنندگان داخلی مشکلات ترخیص کالا نبود تامین کننده موثر بعثت تحریم در ایران عدم همکاری تامین کنندگان خارجی بعثت تحریم عدم تامین برخی محصولات به صورت مقطعی نورم	کاهش شدت خطر ریسک: عدم امکان تامین / مشکلات تأمینی بعضی از اقلام موثر بر پروژه از طریق بهبود مشخصه های اصلی کارکردی (عوامل تأثیرگذار بر ریسک) مرتبط
مشکلات ناشی از کرونا مشکلات ناشی از معارضین کمبود برق کمبود آب وضعیت آب و هوای منطقه ای افزایش گرمایش هوا لزوم استفاده از افراد بومی وجود ریزگردهای فصلی	کاهش شدت خطر ریسک: موانع ناشی از عوامل طبیعی و محیطی از طریق بهبود مشخصه های اصلی کارکردی (عوامل تأثیرگذار بر ریسک) مرتبط
انتخاب پیمانکار ضعیف مشکلات انتقال ارز محدود بودن تامین کنندگان تغییرات MDP استراتژی پیمان سپاری نامناسب عدم تامین بموقع مالی توانمندی مدیریت پروژه تأمین بموقع کالا و تجهیزات پروژه کمبود دکل حفاری برنامه ریزی اولیه ی نامناسب	کاهش شدت خطر ریسک: افزایش زمان اجرای پروژه از طریق بهبود مشخصه های اصلی کارکردی (عوامل تأثیرگذار بر ریسک) مرتبط
اشتباه در مطالعات مخزن و برنامه حفاری	کاهش شدت خطر ریسک: به نفت نرسیدن از طریق بهبود مشخصه های اصلی کارکردی (عوامل تأثیرگذار بر ریسک) مرتبط

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">VALUE ENGINEERING STUDY REPORT</th></tr><tr><td>نسخه</td><td>سریال</td><td>نوع مدرک</td><td>رشته</td><td>تسهیلات</td><td>صادر کننده</td><td>بسته کاری</td><td>پروژه</td></tr><tr><td>D03</td><td>0002</td><td>RT</td><td>GE</td><td>110</td><td>PEDCO</td><td>SSGRL</td><td>BK</td></tr></table>	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK	شماره صفحه : ۶۶ از ۱۳۲
VALUE ENGINEERING STUDY REPORT																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK																			

نادرست/عملیاتی نبودن برخی از موارد قرارداد کمبود منابع مالی از سوی کارفرما کم شدن تقاضای نفت و گاز نسبت به عرضه عدم پایبندی پیمانکار به قراردادها قصور پیمانکاران فرعی ریالی بودن قرارداد تهدیدات پدافندی مشکلات زیست محیطی	کاهش شدت خطر ریسک: توقف/فسخ قرارداد از طریق بهبود مشخصه های اصلی کارکردی (عوامل تأثیرگذار بر ریسک) مرتبط
---	---

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۶۷ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

مرحله ۱-۷) تدوین برنامه های کارگاه مهندسی ارزش

در این بخش از پیش کارگاه ، اقدامات ذیل انجام خواهد پذیرفت :

(۱) برنامه گروه کار در کارگاه مهندسی ارزش

(۲) برنامه زمان و مکان تشکیل کارگاه مطالعات مهندسی ارزش

(۱) تعیین برنامه گروه کار در کارگاه مهندسی ارزش

با توجه به اینکه تیم تشکیل دهنده کارگاه مطالعات باید پوشش مناسبی از دیدگاه های تخصصی و مسئولیتی را با توجه به ماهیت مشخصه اصلی کارکردی داشته باشد ، مقرر شد که با در نظر گیری موارد مشروحه زیر ، و با هماهنگی کارفرمای طرح و کلیه دینفعان پروژه ، اعضاء تشکیل دهنده تیم کارگاه مطالعات مهندسی ارزش مشخص نمایند .

چگونگی انتخاب اعضاء تیم کارگاه مهندسی ارزش:

- ✓ اعضاء تیم باید با موضوع مورد بررسی آشنا باشند.
- ✓ تخصص های اعضاء تا حد امکان از نوع های مختلف و در رابطه با موضوع انتخاب شوند .
- ✓ تا حد امکان اعضا از افراد تصمیم گیرنده باشند.
- ✓ سعی شود افراد از واحدهای مختلف مرتبط با موضوع باشند.
- ✓ یک نفر از اعضا به عنوان هماهنگ و هدایت کننده تیم که آشنائی کامل با مهندسی ارزش داشته باشد انتخاب شود.
- ✓ بهتر است یک نفر متخصص خارج از سازمان در تیم باشد.
- ✓ تا حد امکان اعضاء تیم از افرادی با روحیه تیمی تشکیل شوند.

(۲) تعیین برنامه زمانی و مکانی کارگاه

مقرر شد که کارگاه مطالعات در روزهای ۸ و ۷ و ۱۴ و ۱۵ دی سال ۱۴۰۰ با در نظر گیری موارد مشروحه زیر برگزار گردد.

نکات مهم در برنامه ریزی جهت برپایی کارگاه مطالعات :

- تا حد امکان برگزاری کارگاه دور از محل کار باشد.
- چیدمان محل کار و ابزار به نحوی باید باشد که ارتباط و گفتمان افراد کارگاه با یک دیگر به راحتی امکان پذیر باشد.

تدوین
برنامه ها

برنامه گروه
کار

برنامه زمان
و مکان

تدوین
برنامه ها

برنامه گروه
کار

تدوین
برنامه ها

برنامه زمان
و مکان

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								شماره صفحه : ۶۸ از ۱۳۲
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

- چیدمان محل کار و ابزار باید به نحوی باشد که تسلط و ارتباط راهبر کارگاه با افراد کارگاه به راحتی امکان پذیر باشد
- زمان انجام کارگاه لازم است که به صورت روزهای کاری پیوسته در نظر گرفته شوند .

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۶۹ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

فصل ۳

شرح فعالیت ها و نتایج حاصله از

کارگاه

مطالعات مهندسی ارزش انجام شده

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ – ۰۷۳ – ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								شماره صفحه : ۷۰ از ۱۳۲
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

فصل ۳ - شرح فعالیت ها و نتایج حاصله از کارگاه مطالعات مهندسی ارزش

پس از پیش کارگاه ، مرحله کارگاه مطالعات مهندسی ارزش در چارچوب فازهای نمایش داده در نمودار شماره (۱۱) زیر انجام شد بطوریکه فازهای استراتژی ، خلاقیت و قضاوت در یک کارگاه غیر پیوسته که در روزهای ۸ و ۷ و ۱۴ و ۱۵ دی سال ۱۴۰۰ در محل شرکت هیرگان به مدت ۳۲٫۵ ساعت و طی ۴ روز و با حضور اعضاء نامبرده در جدول شماره (۱۸) برگزار گردید. و فاز توسعه در خارج از کارگاه انجام شد ، بطوریکه در طی مدت فوق الذکر در چارچوب دو جلسه هماهنگی نظرات گروه های فاز توسعه جمع بندی گردید .



نمودار شماره ۱۱ : نمایش فازهای اجرایی کارگاه مطالعات مهندسی ارزش

نحوه حضور اعضاء مطالعات مهندسی ارزش

مشخصات اعضاء حاضر در کارگاه مطالعات جهت سه فاز اولیه (استراتژی-خلاقیت-قضاوت) به شرح لیست جدول شماره ۱۸ می باشد .

نحوه حضور افراد در کارگاه مطالعات مهندسی ارزش که یکی از عوامل مهم موفقیت/شکست در مطالعات است به شرح موارد زیر انجام گردیده است :

- ❖ دربرگیری جمیع تخصص ها و دانش های مرتبط با پروژه . (که در این کارگاه به نحو خوبی رعایت گردیده بود)
- ❖ دربرگیری جمیع مسئولیت های سازمانی مرتبط با پروژه . (که در این کارگاه به نحو خوبی رعایت گردیده بود)
- ❖ حضور افراد تصمیم ساز مرتبط با پروژه ، (که در این کارگاه به نحو خوبی رعایت گردیده بود)
- ❖ حضور منظم اعضاء در جلسات کارگاه . (که در این کارگاه نسبتاً رعایت گردید)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ – ۰۷۳ – ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۷۱ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

جدول ۱۸- لیست اعضای شرکت کننده در جلسات کارگاه مطالعات (در فاز های آغازین ، خلاقیت و قضاوت)

اعضاء شرکت کننده در کارگاه مطالعات			
ردیف	نام و نام خانوادگی	سازمان محل خدمت	سمت
۱	مسعود اصغر نژاد	مشارکت هیرگان انرژی و طرح و بازرسی	رئیس مهندسی
۲	پریسا حاجی صادقی	مشارکت هیرگان انرژی و طرح و بازرسی	سرپرست کنترل ابزار دقیق و مخابرات
۳	حمید شکبیا	مشارکت هیرگان انرژی و طرح و بازرسی	سرپرست برق، حفاظت کاتدی
۴	محسن آریا فر	مشارکت هیرگان انرژی و طرح و بازرسی	سرپرست فرآیند
۵	رضا برلویی	مشارکت هیرگان انرژی و طرح و بازرسی	سرپرست سیویل، سازه و معماری
۶	هومن شاهرخی	مشارکت هیرگان انرژی و طرح و بازرسی	سرپرست لوله کشی، خط لوله و متریا
۷	امیر حسین صابر باغبان	مشارکت هیرگان انرژی و طرح و بازرسی	کارشناس ارشد ایمنی
۸	حمید آدینه	مشارکت هیرگان انرژی و طرح و بازرسی	سرپرست مکانیک و HVAC
۹	کامران جناب	شرکت سیراف	راهبر مطالعات
۱۰	بابک نیکوفر	شرکت سیراف	همیار راهبر پروژه
۱۱	حسین پیرهادی	شرکت سیراف	عضو تیم پروژه
۱۲	محمد بهرامی	شرکت سیراف	عضو تیم پروژه

نکات ضعف و قوت در مطالعات ارزش انجام شده :

قبل آغاز شرح فعالیتهای انجام شده در کارگاه مطالعات، لازم است ابتدا نقاط ضعف و قوت مطالعات مشخص شود و سپس با آگاهی از آنها سایر مطالب مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند.

نکات ضعف ::

- وضعیت خاص ایجاد شده بعلت شیوع ویروس کووید ۱۹ که موجب ایجاد خیلی از محدودیت ها در تشکیل جلسات گردید .
- غیر پیوسته بودن جلسات که موجب کاهش سینرژی افراد گروه مطالعاتی در فازهای خلاقیت و قضاوت و موجب کاهش بهره وری در این فازها گردید .

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								شماره صفحه : ۷۲ از ۱۳۲
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

نکات قوت :

- چیدمان خوب اعضاء کارگاه .
- علاقه اعضاء مطالعات به کار گروهی و انجام فعالیت های مهندسی ارزش خصوصاً در فاز های خلاقیت و قضاوت .
- دانش ایجاد شده در افراد حاضر کارگاه در رابطه باتولید

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۷۳ از ۱۳۲
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	
								D03



فاز ۱ کارگاه:

آغازین

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								شماره صفحه : ۷۴ از ۱۳۲
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	



فاز ۱ کارگاه - آغازین

بررسی و تایید مجدد استراتژی ها و تصمیمات تدوین شده در پیش کارگاه

طی این فاز که دراول صبح روز ۷ دی سال ۱۴۰۰ پیش از شروع فاز خلاقیت بمدت ۳۰ دقیقه انجام شد، موارد ذیل که در پیش کارگاه بررسی و مشخص شده بودند مجددا جهت یادآوری ، ارائه گردیدند .

- ☐ محدوده انجام مطالعات ارزش
- ☐ بررسی اهداف مهندسی ارزش
- ☐ خط قرمزها و موارد ممنوعه در مطالعات ارزش
- ☐ تحلیل کارکردی
- ☐ عارضه یابی
- ☐ ریسکهای وارده بر پروژه
- ☐ Functional Performance Specification (FPS)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">VALUE ENGINEERING STUDY REPORT</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادر کننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D03</td><td>0002</td><td>RT</td><td>GE</td><td>110</td><td>PEDCO</td><td>SSGRL</td><td>BK</td></tr></table>	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK	شماره صفحه : ۷۵ از ۱۳۲
VALUE ENGINEERING STUDY REPORT																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK																			



 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۷۶ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	



فاز ۲ کارگاه: خلاقیت

شرح فعالیتهای انجام شده در فاز خلاقیت و ایده پردازی

این فاز در تاریخ های ۸ و ۷ دی سال ۱۴۰۰ به مدت ۱۶ ساعت ایده پردازی با روش طوفان فکری و از طریق تمرکزدهی ذهن خلاق جمعی اعضاء کارگاه بر روی هر یک از ۴۷۱ موضوع تمرکزی (مشخصه های اصلی کارکردی FPS مشروحه درجداول ۱۲ الی ۱۷) صورت پذیرفت و بصورت متوسط هر ۱ دقیقه و ۴۴ ثانیه یک ایده ارائه گردیده و در نتیجه ۴۱۹ ایده در این فاز کسب گردید.

کل ایده های ارائه شده در این فاز به شرح جدول پیوست ۱ می باشد و با توجه به اینکه نظر اعضای کارگاه بر این بود که نتایج حاصله برخواسته از یک فعالیت گروهی است از ثبت نام ایده دهندگان خودداری شده و ایده های ارائه شده حاصل یک فعالیت گروهی است نه فردی.



اخذ نتیجه موفقیت آمیز
کسب ۴۱۹ ایده در فاز خلاقیت

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								شماره صفحه : ۷۷ از ۱۳۲
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	



فاز ۳ کارگاه :

قضاوت

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۷۸ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	



فاز ۳ کارگاه مطالعات ارزش : قضاوت

۱-۳ نحوه بررسی ایده ها

این فاز که در تاریخ های ۱۴ و ۱۵ دی سال ۱۴۰۰ طی ۱۵ ساعت برگزار شد، ایده ها در صورت نیاز ابتدا توسط ایده دهنده تشریح و سپس مورد نقد جمعی قرار گرفته و نهایتاً توسط اعضاء کارگاه، هر یک از ایده ها در یکی از مقام های (جایگاه های اجرایی ایده) به شرح عناوین زیر قرار داده شدند.

❖ گزینه (ایده برتر)

❖ توصیه

❖ تذکر

❖ ایده (ایده هایی که هیچ مقامی کسب ننموده اند)

شرح هر یک از مقام های بالا در صفحه بعد ارائه گردیده

فعاليتها در فاز قضاوت با توجه به موارد زیر انجام پذیرفته اند :

□ جهت جلوگیری از خطا در تمامی مدت قضاوت سعی بر این گردید ، در مواقعی که تجميع نظر تمامی افراد وجود نداشته باشد ، رای گیری انجام گردد بطوریکه افرادی که دارای شناخت کافی بر ایده نداشته باشند در رأی گیری شرکت نکرده و در وضعیت ممتنع قرار گیرند.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">VALUE ENGINEERING STUDY REPORT</th></tr><tr><td>نسخه</td><td>سریال</td><td>نوع مدرک</td><td>رشته</td><td>تسهیلات</td><td>صادرکننده</td><td>بسته کاری</td><td>پروژه</td></tr><tr><td>D03</td><td>0002</td><td>RT</td><td>GE</td><td>110</td><td>PEDCO</td><td>SSGRL</td><td>BK</td></tr></table>	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK	شماره صفحه : ۷۹ از ۱۳۲
VALUE ENGINEERING STUDY REPORT																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK																			

□ جهت ارتقاء کیفیت بررسی ها و کیفیت قضاوت ها، بعد از رأی گیری و در صورت وجود معترض، مجدداً ایده مورد نقد جمعی و رأی گیری مجدد قرار گرفته است.

□ با توجه به کمبود وقت اعضاء حاضر در کارگاه ، این مرحله با مهارت بکارگرفته شده و مدیریت زمان ، ضمن حفظ کیفیت از سرعت بسیار بالایی برخوردار گردید. بطوریکه متوسط زمان نقد و بررسی و قضاوت برای هر ایده حدوداً ۱ دقیقه ۳۵ ثانیه بطول انجامیده است .

۳-۲- شرح مقام های در نظر گرفته شده جهت تعلق به ایده ها در فاز قضاوت :

۳-۲-۱ شرح مقام گزینه

ایده ای که تصور میشود بر اهداف مطالعات تأثیر مثبت قابل توجه داشته باشد و لازم است که در فاز توسعه مورد بررسی جامع قرار گرفته و در صورت تأیید نهایی مورد اجرا قرار گیرند.

خصوصیاتی که یک گزینه باید دارا باشد:

- ❖ اجرای آن حتماً باید با شرایط فعلی پروژه امکان پذیر باشد.
- ❖ اجرای آن بر فعالیت های این پروژه باید موجب ارتقاء یک یا چند هدف مطالعات مهندسی ارزش باشد.

۳-۲-۲ شرح مقام توصیه

در موارد زیر یک ایده می تواند به مقام توصیه دست یابد :

- ❖ ایده ای که بر اهداف مطالعات تأثیر گذاری مثبت کمی داشته
- ❖ ایده ای که انتظار تأثیر مثبت از آن می رود ولی امکان بررسی در توان این مطالعات نبوده
- ❖ ایده ای که موجب ایجاد تأثیرات خوبی بر مجموعه می گردد ولی در چارچوب اهداف مطالعات یا در محدوده مطالعات نبوده

نهایتاً توصیه ها به واحد های ذیربط جهت بررسی و در صورت لازم اقدام مناسب ، ابلاغ می گردند

۳-۲-۳ شرح مقام تذکر

ایده هایی که در دستور اجرا می باشند یا مقرر و برنامه ریزی شده که اجرا گردند ولی اجرا نشده / نادرست اجرا میشوند / سابقه اجرا نشدن و یا اجرای نا صحیح آنها زیاد بوده / انتظار اجرای مناسب نمی رود ، بنا براین با اخذ این مقام ، به مسئولین مربوطه ، تذکر / توصیه می شود که در اجرای صحیح آنها بیشتر کوشا گردند

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۸۰ از ۱۳۲
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03

۳-۲-۴ شرح ایده

ایده های ارائه شده ای که به علل زیر ، در چارچوب یکی از مقام های فوق الذکر قرارنگرفته باشند، فقط در سطح ایده و با ارزش باقی مانده و نهایتاً در گزارش نهایی جهت اطلاع از ایده های بدون مقام و باقی مانده در وضعیت ایده که البته بعنوان ایده ارائه شده برای مطالعات با ارزش می باشند ، ثبت خواهند گردید و هیچگونه اقدامی بر آنها انجام نخواهید گردید.

شرح ۹ موردی که موجب عدم کسب مقام ایده می گردند :

۱. ایده هایی که مفهوم آن خیلی کلی و فاقد وسیله بوده
۲. ایده هایی که در برنامه های کاری لحاظ شده اند
۳. ایده هایی که روال کار می باشند و یا بصورت عرفی انجام میگردند
۴. ایده هایی که خارج از محدوده مطالعات تعریف شده هستند
۵. ایده هایی که جزء خطوط قرمز تعیین شده می باشند
۶. ایده هایی که تأثیر گذار بر اهداف و مجموعه نمی باشند
۷. ایده هایی که اجرای آنها امکان پذیر نیست
۸. ایده هایی که نامرتب بوده/ صحیح نمی باشند
۹. ایده هایی که موجب ضرر و زیان میشوند / بر اهداف به صورت تجمیعی، تأثیر منفی گذارده .

۳-۳ شرح فعالیتهای انجام شده در فاز قضاوت

انجام نقد و بررسی ایده ها و نهایتاً قضاوت بر آنها بطوری که قابلیت در سه مرحله که به شرح زیر انجام پذیرفت:

مرحله اول قضاوت: در این مرحله تمامی ۴۱۹ ایده ارائه شده در فاز خلاقیت مورد بررسی و قضاوت قرار گرفتند و

نتایج زیر حاصل گردید :

نتایج حاصله در مرحله اول قضاوت :

- ۵۶ ایده ، مقام گزینه را کسب نمودند
- ۱۶۲ ایده ، مقام توصیه را کسب نمودند
- ۲۸ ایده ، مقام تذکر را کسب نمودند
- ۱۷۳ ایده مقامی کسب ننموده و در وضعیت ایده باقی ماندند

مرحله دوم قضاوت : در این مرحله فقط ۵۶ گزینه اخذ شده (در مرحله اول قضاوت مورد بررسی دقیقتر قرار گرفت

و نهایتاً نتایج زیر حاصل می شود :

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک	 																								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">VALUE ENGINEERING STUDY REPORT</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادر کننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D03</td><td>0002</td><td>RT</td><td>GE</td><td>110</td><td>PEDCO</td><td>SSGRL</td><td>BK</td></tr></table>	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK	شماره صفحه : ۸۱ از ۱۳۲
VALUE ENGINEERING STUDY REPORT																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK																			

نتایج حاصله در مرحله دوم قضاوت :

- ۱۶ ایده ، مقام گزینه را کسب نمودند
- ۱۸۲ ایده ، مقام توصیه را کسب نمودند
- ۳۹ ایده ، مقام تذکر را کسب نمودند
- ۱۸۲ ایده مقامی کسب ننموده و در وضعیت ایده باقی ماندند

مرحله سوم قضاوت : در این مرحله ۱۶ گزینه منتخب در مرحله دوم قضاوت بر اساس اهداف مطالعات ، ارزش گذاری شدند و سپس ، بررسی مجدد بر اساس میزان ارزش های حاصله انجام شد و نهایتاً نتایج زیر حاصل شد :

نتایج حاصله در مرحله سوم قضاوت :

- ۸ ایده ، مقام گزینه (ایده های برتر) را کسب نمودند (جدول شماره ۱۹ و پیوست شماره ۵ نمایشگر گزینه های نهایی شده در فاز قضاوت است)
- ۱۹۰ ایده ، مقام توصیه را کسب نمودند
- ۳۹ ایده ، مقام تذکر را کسب نمودند
- ۱۸۲ ایده مقامی کسب ننموده و در وضعیت ایده باقی ماندند

جدول ۱۹ - گزینه های (ایده های برتر) منتخب در فاز قضاوت

شرح گزینه (ایده های برتر) منتخب در فاز قضاوت
حذف پکیج متانول ایستگاه جدید تقویت فشار بینک
بهینه سازی سیستم slug ایستگاه جدید تقویت فشار بینک
تغییر مقصد خط کاندنسیت ۴ اینچی از واحد بهره برداری بینک به واحد کلاستر
حذف خط کاندنسیت و استفاده از خط لوله موجود انتقال کاندنسیت در ایستگاه تقویت فشار موجود
یکی کردن کمپرسورهای هوای ابزار دقیق و نیتروژن
کاهش ساینز خطوط داخل مینیولند بینک از ۶ اینچ به ۴ اینچ
حذف پمپ Oil Sump Pit (P-1701) مینیولند بینک و تخلیه مایعات داخل Oil Sump Pit بصورت دستی
کاهش ابعاد ساختمان سوییچگیر چاه های W007S و W0046S

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک							 شرکت توسعه و ایران 	
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۸۲ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	



 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۸۳ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	



فاز ۴ کارگاه: توسعه

بعد از اتمام فاز قضاوت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ بر اساس نظر اعضاء کارگاه مطالعات و قبول مسئولیت مشارکت هیرگان انرژی و طرح و بازرسی مقرر شد که مطالعات بررسی ، توسعه و امکان سنجی پنج گزینه (ایده برتر) منتخب در فاز قضاوت و مشروحه در در جدول شماره ۱۹ توسط مشارکت مذکور انجام پذیرد .

پس از توافق انجام شده فوق الذکر، مشارکت مذکور بررسی ، توسعه و امکانسنجی خود را بر هشت گزینه (ایده برتر) منتخب فاز قضاوت ، در چارچوب بخش های مطالعاتی زیر از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ شروع و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ به اتمام رسانید .

۴-۱- بخش های مطالعاتی انجام شده در بررسی ، توسعه و امکانسنجی ، در فاز قضاوت:

- ❖ بررسی نقاط ضعف و قوت گزینه در مرحله اجرا
- ❖ بررسی نقاط ضعف و قوت گزینه در مرحله بهره برداری
- ❖ بررسی موانع و مشکلات احتمالی / موجود در زمان اجرا
- ❖ بررسی میزان امکان پذیری اجرای گزینه
- ❖ بررسی تأثیر گزینه ها بر زمان اجرا
- ❖ بررسی تأثیر گزینه ها بر هزینه های اجرا
- ❖ بررسی تأثیر گزینه ها بر هزینه های بهره برداری
- ❖ بررسی تأثیر گزینه ها بر اهداف مطالعات

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">VALUE ENGINEERING STUDY REPORT</th></tr><tr><td>نسخه</td><td>سریال</td><td>نوع مدرک</td><td>رشته</td><td>تسهیلات</td><td>صادر کننده</td><td>بسته کاری</td><td>پروژه</td></tr><tr><td>D03</td><td>0002</td><td>RT</td><td>GE</td><td>110</td><td>PEDCO</td><td>SSGRL</td><td>BK</td></tr></table>	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK	شماره صفحه : ۸۴ از ۱۳۲
VALUE ENGINEERING STUDY REPORT																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK																			

❖ بررسی میزان تأثیر گزینه ها بر ذینفعان

❖ بررسی میزان تأثیر گزینه ها بر ریسک ها

۴-۲- نتایج حاصله از بررسی های انجام شده در مطالعات فاز توسعه :

طبق بررسی های جامع انجام شده در فاز توسعه (که نتایج آن در فرم های توسعه هر یک از گزینه ها درج شده است) پنج گزینه (ایده برتر) منتخب فاز توسعه ، عبارت از : " حذف خط کاندنسیت و استفاده از خط لوله موجود انتقال کاندنسیت در ایستگاه تقویت فشار موجود " ، " بهینه سازی سیستم slug ایستگاه جدید تقویت فشار بینک " ، "حذف پکیج متانول ایستگاه جدید تقویت فشار بینک " ، " تغییر مقصد خط کاندنسیت ۴ اینچی از واحد بهره برداری بینک به واحد کلاستر " ، "کاهش ابعاد ساختمان سوییچگیر چاه های W0046S و W007S و چاههای تعمیری " به عنوان گزینه های اصلی مطالعات انتخاب گردیدند و یک گزینه (ایده برتر) دیگر منتخب فاز توسعه به عبارت از " یکی کردن کمپرسورهای هوای ابزار دقیق و نیتروژن " توصیه گردیدند .

دو گزینه "حذف پمپ Oil Sump Pit (P-1701) منیفولد بینک و تخلیه مایعات داخل Oil Sump Pit بصورت دستی " و "کاهش سائز خطوط داخل منیفولد بینک از ۶ اینچ به ۴ اینچ " به عنوان گزینه های مهندسی ارزش توسط کارفرما مورد تایید قرار نگرفتند.

بنا براین در چارچوب نتایج حاصله فوق الذکر ، وضعیت مقام های اجرایی ایده ها به شرح ذیل تغییر و نهایی گردید.

بنا براین در چارچوب نتایج حاصله فوق الذکر ، وضعیت مقام های اجرایی ایده ها به شرح ذیل تغییر و نهایی گردید

- ۵ ایده ، مقام گزینه (ایده های برتر) را کسب نمودند (جدول شماره ۲۰ و پیوست شماره ۵ نمایشگر نتیجه مطالعات گزینه های نهایی شده در فاز توسعه است)
- ۱۹۳ ایده ، مقام توصیه را کسب نمودند
- ۳۹ ایده ، مقام تذکر را کسب نمودند

۱۸۲ ایده مقامی کسب ننموده و در وضعیت ایده باقی ماندند فرم های توسعه تکمیل شده مربوط به هر یک از گزینه های مشروحه در جدول شماره ۱۹ ، در پیوست شماره ۶ ارائه گردیده اند

جدول ۲۰ - گزینه های نهایی شده در فاز توسعه

شرح گزینه های نهایی منتخب در فاز توسعه
بهینه سازی سیستم slug ایستگاه جدید تقویت فشار بینک
حذف پکیج متانول ایستگاه جدید تقویت فشار بینک
تغییر مقصد خط کاندنسیت ۴ اینچی از واحد بهره برداری بینک به واحد کلاستر
حذف خط کاندنسیت و استفاده از خط لوله موجود انتقال کاندنسیت در ایستگاه تقویت فشار موجود

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">VALUE ENGINEERING STUDY REPORT</th></tr><tr><td>نسخه</td><td>سریال</td><td>نوع مدرک</td><td>رشته</td><td>تسهیلات</td><td>صادر کننده</td><td>بسته کاری</td><td>پروژه</td></tr><tr><td>D03</td><td>0002</td><td>RT</td><td>GE</td><td>110</td><td>PEDCO</td><td>SSGRL</td><td>BK</td></tr></table>	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK	شماره صفحه : ۸۵ از ۱۳۲
VALUE ENGINEERING STUDY REPORT																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK																			

شرح گزینه های نهایی منتخب در فاز توسعه	
کاهش ساینز خطوط لوله داخل منیفولد بینک از ۶ اینچ به ۴ اینچ	
حذف پمپ Oil Sump Pit (P-1701) منیفولد بینک و تخلیه مایعات داخل Oil Sump Pit بصورت دستی	
کاهش ابعاد ساختمان سوییچگیر چاه های W007S و W0046S و چاههای تعمیر	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">VALUE ENGINEERING STUDY REPORT</th></tr><tr><td>نسخه</td><td>سریال</td><td>نوع مدرک</td><td>رشته</td><td>تسهیلات</td><td>صادر کننده</td><td>بسته کاری</td><td>پروژه</td></tr><tr><td>D03</td><td>0002</td><td>RT</td><td>GE</td><td>110</td><td>PEDCO</td><td>SSGRL</td><td>BK</td></tr></table>	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK	شماره صفحه : ۸۶ از ۱۳۲
VALUE ENGINEERING STUDY REPORT																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK																			

فاز ۵ کارگاه :

ارائه



 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ – ۰۷۳ – ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۸۷ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	



فاز ۵: فاز ارائه و نتایج حاصله در محدوده تأسیسات سرچاهی و خطوط انتقال نفت آنها و مجموعه منیفولد

۱-۵ فاز ارائه

پس از اتمام فاز توسعه، جلسه اختتامیه، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ با حضور اعضای کارگاه مطالعات تشکیل و هشت گزینه منتخب فاز توسعه مندرج در جدول شماره ۲۰ مورد نقد و بررسی قرار گرفته و نهایتاً، پنج گزینه فوق الذکر در جدول ۲۰، مورد تأیید قرار گرفتند.

۲-۵ نتایج حاصله در محدوده تأسیسات سرچاهی و خطوط انتقال نفت آنها و مجموعه منیفولد

طی بررسی های انجام شده در فازهای مختلف بر ۷۷ ایده (از ۴۱۹ ایده ارائه شده در فاز خلاقیت) که متعلق به محدوده تأسیسات سرچاهی و خطوط انتقال نفت آنها و مجموعه منیفولد بوده، نتایج حاصله برخواسته از ۷۷ ایده (مشروحه در پیوست ۱)، موجب تأثیرگذاریهای موارد ذیل بر پروژه، گردیده اند:

❖ اخذ یک گزینه منتخب نهایی مشروحه زیر در محدوده فوق الذکر که بر ارتقاء اهداف تأثیر موثری دارند.

- کاهش ابعاد ساختمان سویچگیر چاه های W007S و W0046S و چاههای تعمیری

(جهت اطلاع بیشتر از وضعیت تأثیرگذاری گزینه فوق الذکر بر پروژه به نتایج مطالعات انجام شده در فاز توسعه برای هر یک از گزینه های فوق، به پیوست ۶ رجوع شود)

❖ اخذ ۳۲ توصیه به شرح پیوست ۴ که می توان به واحدهای مرتبط ابلاغ کردند تا بررسی بیشتر شده و در صورت صلاحدید، اقدامات لازم جهت اجرای آنها انجام گردد. مطمئناً در صورت بررسی توصیه ها، می توان به گزینه های موثری دست یافت که می توانند در ارتقاء پروژه ایفاگر نقش بسزایی باشند.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ – ۰۷۳ – ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۸۸ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

❖ اخذ ۹ تذکر به شرح پیوست ۳ که می توان به واحدهای مرتبط ابلاغ نمود تا بررسی بیشتر شده و در صورت اقدامات لازم جهت اجرای صحیح آنها، میتوان نقش موثری در ارتقاء پروژه اعمال نمود.

❖ اخذ ۳۶ ایده به شرح پیوست ۲ که به مقامی دست نیافته و توسط مسئولین و متخصصین مرتبط با پروژه ارائه گردیده، بدین علت بسیار قابل احترام بوده و در حد ایده و بدون هیچگونه اقدامی و فقط جهت اطلاع در گزارش مطالعات ثبت می گردند. البته قابل ذکر است که توسط متخصصین با تجربه گرو مطالعات خیلی از آنها در مراحل اولیه و حتی تا مراحل آخر فاز قضاوت از چند مرحله غربال گری توانسته عبور کنند و نهایتاً و مجدداً به وضعیت ایده نزول کرده اند، لذا پیشنهاد می گردد که یکبار دیگر ایده ها بررسی گردند و به احتمال قوی از بین آنها می توان به گزینه های خوبی دست یافت.

❖ ایجاد تجربه اجرای موفق یک کار گروهی و هدفمند با فضایی صمیمانه و آزاد.

❖ اخذ تجربه ایجاد یک فضای موفق خلاقیت تیمی و ایده پردازی و بررسی آنها به صورت گروهی، به همراه مدیریت زمان.

❖ افزایش دانش هر چه وسیع تر بر موضوع مورد مطالعه.

❖ ایجاد تجربه انجام مطالعات مهندسی ارزش به صورت موفقیت آمیز در شرکت

۵-۲-۱- تحلیل وضعیت تأثیر گذاری مالی گزینه بر CAPEX

طی اطلاعات مندرج در فرم های توسعه مربوطه (که در پیوست شماره ۶ درج گردیده اند)، تأثیرات مالی هر یک از گزینه ها، برآورد و محاسبه شده و در جدول شماره ۲۱ مورد تحلیل و جمع بندی قرار گرفته اند.

جدول ۲۱- بررسی تأثیر گزینه بر هزینه های اجرای EPC پروژه CAPEX

شرح گزینه نهایی شده	برآورد درصد کاهش هزینه های کل EPC
کاهش ابعاد ساختمان سویچگیر چاه های W0046S W007S و چاههای تعمیری	۰,۰۹۳٪
درصد کل تأثیر گزینه ها بر کاهش هزینه های EPC	۰,۰۹۳٪

۵-۲-۲- تحلیل وضعیت تأثیر گذاری گزینه بر هزینه های بهره برداری OPEX

گزینه های منتخب در فاز ارائه طی اطلاعات مندرج در فرم های توسعه مربوطه (که در پیوست شماره ۶ درج گردیده اند) و به شرح جدول شماره ۲۲ کلاً تأثیر مثبتی در وضعیت هزینه های بهره برداری (OPEX) داشته و موجب کاهش هزینه های فوق، خصوصاً از طریق کاهش هزینه های تعمیراتی خواهند شد ولی متأسفانه برآورد میزان تأثیر گذاری در چارچوب واحد ریالی امکان پذیر نبوده است

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ – ۰۷۳ – ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								شماره صفحه : ۸۹ از ۱۳۲
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	
	D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK	

جدول ۲۲ - بررسی تأثیر گزینه بر هزینه های بهره برداری (OPEX)

علل تأثیر گذاری گزینه بر کاهش هزینه های بهره برداری OPEX	شرح گزینه نهایی شده
تأثیری ندارد	کاهش ابعاد ساختمان سوییچگیر چاه های W007S و W0046S و چاههای تعمیری

۵-۲-۳- تحلیل وضعیت تأثیر گذاری گزینه بر زمان اجرای EPC

طی اطلاعات مندرج در فرم های توسعه مربوطه (که در پیوست شماره ۶ درج گردیده اند) ، تأثیرات زمانی هر یک از گزینه ها ، برآورد و محاسبه شده و در جدول شماره ۲۳ مورد تحلیل و جمع بندی قرار گرفته اند و نهایتاً تأثیر کل آنها بر زمان و تأخیرات پروژه برابر ۳ ماه می باشد .

ملاحظه : با توجه به اینکه مسیر بحرانی در حین کار بصورت دینامیکی متغیر خواهد بود ، لذا نصف جمع زمان های کاهشی محاسبه شده در جدول شماره ۲۳ به منظور کاهش کل زمان یا تأخیرات کل پروژه در نظر گرفته شده است

جدول ۲۳ - بررسی تأثیر گزینه بر زمان های اجرای EPC پروژه

میزان کاهش زمان اجرای EPC	شرح گزینه نهایی شده
۲ ماه	کاهش ابعاد ساختمان سوییچگیر چاه های W007S و W0046S و چاههای تعمیری
۲ ماه	جمع تأثیر کل گزینه ها بر کاهش زمان/تأخیرات اجرای EPC

۵-۲-۴- تحلیل وضعیت تأثیر گذاری گزینه بر اهداف تعیین شده برای مطالعات

جهت بررسی تأثیر گزینه ها بر اهداف موارد زیر انجام پذیرفته شده است :

- تعیین عدد ارزشی و تعیین میزان تأثیر گذاری هریک از ۳ گزینه ، برای هدف " بهینه سازی هزینه های اجرای پروژه CAPEX " طبق جدول شماره ۲۴ و درج آنها توسط گروه امکانسجی گزینه (طی فاز توسعه) ، در فرم توسعه مربوطه مندرج در پیوست شماره ۶

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ – ۰۷۳ – ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۹۰ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

- (۲) تعیین عدد ارزشی و تعیین میزان تأثیر گذاری هریک از ۳ گزینه ، برای هدف " بهینه سازی هزینه های بهره برداری پروژه OPEX " طبق جدول شماره ۲۵ و درج آنها توسط گروه امکانسجی گزینه (طی فاز توسعه) ، در فرم توسعه مربوطه مندرج در پیوست شماره ۶
- (۳) تعیین عدد ارزشی و تعیین میزان تأثیر گذاری هریک از ۳ گزینه ، برای هدف " بهینه سازی زمان اجرای EPC " طبق جدول شماره ۲۶ و درج آنها توسط گروه امکانسجی گزینه (طی فاز توسعه) ، در فرم توسعه مربوطه مندرج در پیوست شماره ۶
- (۴) تعیین عدد ارزشی و تعیین میزان تأثیر گذاری هریک از ۳ گزینه ، برای هدف " پایداری مجموعه و تسهیل بهره برداری " طبق جدول شماره ۲۷ و درج آنها توسط گروه امکانسجی گزینه (طی فاز توسعه) ، در فرم توسعه مربوطه مندرج در پیوست شماره ۶
- (۵) محدوده اعداد ارزشی از ۵- الی ۵+ می باشد ، بطوریکه اعداد منفی مشخص کننده ، نقاط ضعف و اعداد مثبت ، نقاط قوت می باشند.
- (۶) با توجه به بندهای ۱ الی ۵ بالا ، بررسی تأثیر گذاری گزینه ها بر اهداف بر پایه تحلیلی اعداد ارزشی در جدول شماره ۲۸ درج گردیده است . ضمناً قابل ذکر است که عدد ارزشی تجمیعی در هر ردیف جدول براساس میانگین موزون منتج به وزن اهداف بدست آمده است .
- (۷) در جمع بندی نتایج جدول شماره ۲۸ ، بمنظور پرهیز از دیدگاه های خوشبینانه ، حداقل ها برای اعداد حاصله از موقعیت های مثبت (قوت) و حداکثرها برای اعداد حاصله از موقعیت های منفی (ضعف) در نظر گرفته شده اند .
- جدول ۲۴ - برآورد میزان تأثیر مالی گزینه بر هزینه های اجرای EPC (CAPEX)**

عدد ارزشی	برآورد میزان تأثیر مالی گزینه بر هزینه های اجرای EPC CAPEX
۵	تأثیر گذاری مالی بیش از ۸۰ میلیارد تومان
۴/۵	تأثیر گذاری مالی بیش از ۶۵ میلیارد الی ۸۰ میلیارد تومان
۴	تأثیر گذاری مالی بیش از ۵۰ میلیارد الی ۶۵ میلیارد تومان
۳/۵	تأثیر گذاری مالی بیش از ۵۰ میلیارد الی ۴۵ میلیارد تومان
۳	تأثیر گذاری مالی بیش از ۳۸ میلیارد الی ۵۰ میلیارد تومان
۲/۵	تأثیر گذاری مالی بیش از ۲۸ میلیارد الی ۳۸ میلیارد تومان
۲	تأثیر گذاری مالی بیش از ۱۲ میلیارد الی ۲۸ میلیارد تومان
۱/۵	تأثیر گذاری مالی بیش از ۷ میلیارد الی ۱۲ میلیارد تومان
۱	تأثیر گذاری مالی بیش از ۴ میلیارد الی ۷ میلیارد تومان
۰/۸	تأثیر گذاری مالی بیش از ۱/۸ میلیارد الی ۴ میلیارد تومان
۰/۶	تأثیر گذاری مالی بیش از ۱ میلیارد الی ۱/۸ میلیارد تومان
۰/۴	تأثیر گذاری مالی بیش از ۴۰۰ میلیون الی ۱ میلیارد تومان
۰/۲	تأثیر گذاری مالی بیش از ۱۵۰ میلیون الی ۴۰۰ میلیون تومان
۰/۱	تأثیر گذاری مالی بیش از ۵۰ میلیون الی ۱۵۰ میلیون تومان
۰	تأثیر گذاری مالی کمتر از ۵۰ میلیون تومان

۱- در صورت تأثیر گذاری کاهشی اعداد مثبت و در صورت افزایشی اعداد منفی می باشند

۲- در صورت بررسی بر اساس درصد تأثیر گذاری ، میزان درصد تأثیر برابر با عدد ارزش می باشد

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">VALUE ENGINEERING STUDY REPORT</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادر کننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D03</td><td>0002</td><td>RT</td><td>GE</td><td>110</td><td>PEDCO</td><td>SSGRL</td><td>BK</td></tr></table>	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK	شماره صفحه : ۹۱ از ۱۳۲
VALUE ENGINEERING STUDY REPORT																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK																			

جدول ۲۵ - برآورد از میزان تاثیر مالی گزینه بر هزینه های بهره برداری (OPEX)

عدد ارزشی	برآورد از میزان تاثیر مالی گزینه بر هزینه های بهره برداری OPEX طی یک سال		
۵	تاثیر گذاری مالی بیش از ۸ میلیارد تومان	فوق العاده	در صورت تاثیر گذاری کاهشی اعداد مثبت و در صورت افزایشی اعداد منفی می باشند
۴	تاثیر گذاری مالی بیش از ۵ میلیارد الی ۸ میلیارد تومان	زیاد	
۳	تاثیر گذاری مالی بیش از ۳ میلیارد الی ۵ میلیارد تومان	نسبتاً زیاد	
۲	تاثیر گذاری مالی بیش از ۲ میلیارد الی ۳ میلیارد تومان	نسبتاً کم	
۱/۵	تاثیر گذاری مالی بیش از ۱ میلیارد الی ۲ میلیارد تومان	کم	
۱	تاثیر گذاری مالی بیش از ۵۰۰ میلیون الی ۱ میلیارد تومان	بسیار کم	
۰/۵	تاثیر گذاری مالی بیش از ۲۵۰ میلیون الی ۵۰۰ میلیون تومان	ناچیز	
۰/۲۵	تاثیر گذاری مالی بیش از ۵۰ میلیون الی ۲۵۰ میلیون تومان	هیچ	
۰	تاثیر گذاری مالی کمتر از ۵۰ میلیون تومان	برآورد کمی	
		برآورد وصفی	

جدول ۲۶ - برآورد از میزان تاثیر گزینه بر زمان اجرای EPC

عدد ارزشی	برآورد از میزان تاثیر گزینه بر زمان اجرای EPC	
۵	بیش از ۵ ماه تاثیر بر زمان / تأخیرات پروژه	در صورت تاثیر گذاری کاهشی اعداد مثبت و در صورت افزایشی اعداد منفی می باشند
۴	بالاتر از ۴ و حداکثر ۵ ماه تاثیر بر زمان / تأخیرات پروژه	
۳	بالاتر از ۳ و حداکثر ۴ ماه تاثیر بر زمان / تأخیرات پروژه	
۲	بالاتر از ۲ و حداکثر ۳ ماه تاثیر بر زمان / تأخیرات پروژه	
۱	بالاتر از ۱ و حداکثر ۲ ماه تاثیر بر زمان / تأخیرات پروژه	
۰	کمتر از ۱ ماه تاثیر بر زمان / تأخیرات پروژه	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ – ۰۷۳ – ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۹۲ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

جدول ۲۷- برآورد ازمیزان تاثیرگزینه برپایداری مجموعه و تسهیل بهره بردار

برآورد از میزان تأثیر گزینه بر سهولت بهره برداری				
عدد ارزشی بهینه سازی بهره برداری ناشی از تأثیر بر		محدوده تأثیر گزینه بر سهولت بهره برداری	میزان تأثیر گزینه بر سهولت فعالیت های بهره برداری	در صورت تأثیر گذاری افزایشی اعداد مثبت و در صورت کاهشی اعداد منفی می باشند عدد ارزشی سهولت در بهره برداری از جمع جبری اعداد ارزشی اپراتوری و نگهداری و تعمیرات حاصل می شود
تسهیل بر اپراتوری	تسهیل بر نگهداری و تعمیرات			
۲	۳	بر کل مجموعه	فوق العاده	
۱/۶	۲/۴	بر کل چند واحد	زیاد	
۱/۲	۱/۸	بر کل یک واحد	نسبتاً"	
۰/۸	۱/۲	بر یک فعالیت مشابه در چند واحد	کم	
۰/۴	۰/۶	بر یک فعالیت	ناچیز	
۰	۰	بدون تأثیر	هیچ	

جدول ۲۸- بررسی تأثیر گزینه بر اهداف پروژه (براساس اعداد ارزشی)

برآورد عدد ارزشی تأثیر تجمیعی موزون گزینه بر اهداف	برآورد میزان تأثیر گزینه بر هر یک از اهداف مطالعات ارزش				شرح گزینه نهایی شده
	پایداری مجموعه و تسهیل بهره برداری (وزن: ۲۰)	بهینه سازی زمان اجرا (وزن: ۲۸)	بهینه سازی هزینه بهره برداری OPEX (وزن: ۱۹)	بهینه سازی هزینه های اجرا CAPEX (وزن: ۳۳)	
۰/۳۱	۰	+۱	۰	+۰/۰۹۳	کاهش ابعاد ساختمان سوییچگیر چاه های W007S و W0046S و چاههای تعمیری
+۰,۳۱	۰	+۱	۰	+۰/۰۹۳	جمع بندی اعداد ارزشی
0.31 = (0×20 + 1×28 + 0×19 + 0.093×33) ÷ 100					فرمول جمع بندی اعداد ارزشی کل

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ – ۰۷۳ – ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								شماره صفحه : ۹۳ از ۱۳۲
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

۵-۲-۵- بررسی نقاط ضعف و قوت وضعیت تأثیر گذاری گزینه بر عملیات اجرایی EPC پروژه

طبق بررسی های انجام شده در فاز توسعه مبنی بر نقاط قوت و ضعف گزینه ها بر عملیات اجرایی پروژه که تماماً در فرم های توسعه (مندرج در پیوست ۶) درج گردیده اند ، بصورت خلاصه در جدول شماره ۲۹ شرح داده شده است .

جدول ۲۹- بررسی نقاط ضعف و قوت تأثیر گزینه ها بر عملیات اجرایی EPC پروژه

نقاط قوت تأثیر گزینه ها بر عملیات EPC	نقاط ضعف تأثیر گزینه ها بر عملیات EPC	شرح گزینه نهایی شده
		کاهش ابعاد ساختمان سوییچگیر چاه های W0046S و W007S و چاههای تعمیری

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ – ۰۷۳ – ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۹۴ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

۵-۲-۶- بررسی نقاط ضعف و قوت وضعیت تأثیر گذاری گزینه بر عملیات بهره برداری

طبق بررسی های انجام شده در فاز توسعه مبنی بر نقاط قوت و ضعف گزینه ها بر عملیات زمان بهره برداری که تماماً در فرم های توسعه (مندرج در پیوست ۶) درج گردیده اند ، بصورت خلاصه در جدول شماره ۳۰ شرح داده شده است .

جدول ۳۰- بررسی نقاط ضعف و قوت تأثیرگزینه ها بر عملیات بهره برداری

شرح گزینه نهایی شده	نقاط ضعف تأثیرگزینه ها بر عملیات بهره برداری	نقاط قوت تأثیرگزینه ها بر عملیات بهره برداری
کاهش ابعاد ساختمان سوییچگیر چاه های W0046S و W007S و چاههای تعمیری	در عملیات بهره برداری مشکل خاصی پیش نخواهد آمد.	

۵-۲-۷- تحلیل تأثیرگذاری گزینه بر امور تعاملی پروژه با ذینفعان

طبق بررسی های انجام شده در فاز توسعه مبنی بر نقاط قوت و ضعف گزینه ها بر نحوه تعامل پروژه با ذینفعان که تماماً در فرم های توسعه (مندرج در پیوست ۶) درج گردیده اند ، بصورت خلاصه در جدول شماره ۳۱ شرح داده شده است:

جدول ۳۱- بررسی نقاط ضعف و قوت تأثیرگزینه ها بر تعامل پروژه با ذینفعان

ذینفع		تأثیرات هر یک از گزینه نهایی بر موارد تعاملی پروژه با ذینفعان
شرکت مناطق نفت خیز جنوب		کاهش ابعاد ساختمان سوییچگیر چاه های W0046S و W007S و چاههای تعمیری
شرکت پترو ایران	نقاط قوت	کاهش زمان اجرای پروژه
	نقاط ضعف	
مشارکت هیرگان انرژی و طرح و بازرسی	نقاط قوت	کاهش زمان اجرای پروژه و سهولت در تحویل کار به کارفرما
	نقاط ضعف	افزایش کار طراحی
پیمانکاران	نقاط قوت	
	نقاط ضعف	
تأمین کنندگان	نقاط قوت	
	نقاط ضعف	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک							 
شماره پیمان: ۰۵۳ – ۰۷۳ – ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۹۵ از ۱۳۲
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	
	D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK

	نقاط قوت	بهره بردار
	نقاط ضعف	
	نقاط قوت	پدافند غیرعامل
	نقاط ضعف	
	نقاط قوت	ارگان های دولتی ذینفع
	نقاط ضعف	
	نقاط قوت	معارضین و افراد بومی
	نقاط ضعف	

۵-۲-۸- بررسی میزان امکان پذیری انجام گزینه ها

طبق بررسی های انجام شده در فاز توسعه ، مبنی بر میزان امکان پذیری گزینه ها که تماماً در فرم های توسعه (مندرج در پیوست ۶) درج گردیده اند، بصورت خلاصه در جدول شماره ۳۲ شرح داده شده است .

جدول ۳۲- بررسی میزان امکان پذیری گزینه

درصد احتمال امکان پذیری ایده و علل آن						شرح گزینه نهایی شده
کم تر از ۵٪	۵٪ الی ۲۰٪	۲۰٪ الی ۵۰٪	۵۰٪ الی ۷۰٪	۷۰٪ الی ۹۰٪	بیش از ۹۰٪	
				قابل دسترس		کاهش ابعاد ساختمان سویچگیر چاه های W0046S و W007S و چاههای تعمیری

۵-۲-۹- میزان تأثیرات گزینه بر ریسک های مشخص شده

طبق بررسی های انجام شده در فاز توسعه ، مبنی بر تأثیر گزینه نهایی شده در این مبحث ، بر ریسک های پروژه که تماماً در فرم های توسعه (مندرج در پیوست ۶) درج گردیده اند ، متأسفانه گزینه فوق ، تأثیر قابل ملاحظه ای بر شدت خطر ریسک های تعریف شده در مطالعات نداشته .

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۹۶ از ۱۳۲
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03

۵-۲-۱۰- محاسبه میزان تأثیرات گزینه بردرصد ارتقاء شاخص ارزش فعالیت ها

در این مبحث جهت مشخص شدن درصد ارتقاء شاخص ارزش فعالیت های پروژه در صورت اجرای یک گزینه منتخب مرتبط با ، موارد ذیل انجام گردیده است:

(۱) میزان شاخص ارزش فعالیت ها در وضعیت فعلی می باید طبق فرمول شماره ۱ محاسبه گردیده است:

فرمول شماره ۱:

$$V1 = \{(\sum_i (K_i \times K_i) / \sum_i K_i)\} / Q$$

(۲) سپس طبق فرمول شماره ۲ ذیل میزان شاخص ارزش فعالیت هادر صورت اجرای گزینه ها و ارتقاء اهداف بر اساس برآوردهای انجام شده در جدول شماره (۲۸) محاسبه گردیده است :

فرمول شماره ۲:

$$V2 = \{(\sum_i ((Y_i + P_i) \times K_i) / \sum_i K_i)\} / (Q - Q')$$

(۳) سپس در صورت اجرای گزینه ها و بر اساس فرمول شماره ۳ زیر میزان درصد ارتقاء شاخص ارزش فعالیت ها محاسبه می شود:

فرمول شماره ۳:

$$D = \left(\frac{V2}{V1}\right) - 1) \times 100$$

شرح متغیرها در سه فرمول بالا :

Y_i : میزان درصدتأمین نیازهای مورد انتظار ازهدف اام (منظور اهداف : " بهینه سازی OPEX " - " کاهش زمان/تأخیرات اجرای قرارداد " - " ارتقاء کیفیت (پایداری و سهولت بهره برداری " می باشد) تا قبل از اجرای گزینه ها و مطابق با جدول شماره (۴) بطوریکه میانگین درصد حداکثر و حداقل در هر ستون مربوطه در نظر گرفته شده است .

K_i : وزن هدف iام که در پیش کارگاه و طبق جدول شماره (۳) مشخص شده است .

Q : میزان درصدتأمین نیازهای مورد انتظار ازهدف "بهینه سازی CAPEX " تا قبل از اجرای گزینه ها و مطابق با جدول شماره (۴) بطوریکه میانگین درصد حداکثر و حداقل در هر ستون مربوطه در نظر گرفته شده است .

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ – ۰۷۳ – ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۹۷ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

V1 : میزان ارزش اولیه که با توجه فرمول شماره ۲ و محاسبات انجام شده در جدول شماره (۳۳) برابر است با ۱/۰۳۷۳

جدول ۳۳- محاسبات V1

شرح هدف	وزن هدف	میزان برآورد (طبق جدول ۴)
بهینه سازی هزینه های اجرا CAPEX	۳۳	Q=۴۰
بهینه شدن هزینه های بهره برداری OPEX	K1= ۱۹	Y1= ۴۰
کاهش زمان/تأخیرات اجرای قرارداد	K2= ۲۸	Y2= ۱۵
ارتقاء کیفیت (پایداری و سهولت بهره برداری)	K3= ۲۰	Y3= ۸۰
محاسبه V1		$V1 = \{ (\sum_i (Y_i \times K_i) / \sum_i K_i) \} / Q = 1.0373$

P_i : میزان درصد ارتقاء هدف i ام (منظور اهداف : " بهینه سازی OPEX " - " کاهش زمان/تأخیرات اجرای قرارداد " - " ارتقاء

کیفیت (پایداری و سهولت بهره برداری " می باشد) در صورت اجرای گزینه ها (بر اساس جدول ۲۸)

Q' :: میزان درصد ارتقاء هدف " بهینه سازی CAPEX در صورت اجرای گزینه (بر اساس جدول ۲۸)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ – ۰۷۳ – ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۹۸ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

جدول ۳۴- محاسبات V2


شرح هدف	وزن هدف	میزان برآورد اولیه (طبق جدول ۴)	میزان درصد تغییر (طبق جدول ۲۸)	محاسبه V2
بهینه سازی هزینه های اجرا CAPEX	۳۳	Q=۴۰	Q'= ۰/۰۹۳	$V2 = \{(\sum_i ((Y_i + P_i) \times K_i)) / \sum_i K_i\} / (Q - Q')$ $= 1.049$
بهینه شدن هزینه های بهره پرداری OPEX	K1= ۱۹	Y1= ۴۰	P1 = ۰	
کاهش زمان/تأخیرات اجرای قرارداد	K2= ۲۸	Y2= ۱۵	P2 = ۱	
ارتقاء کیفیت (پایداری و سهولت بهره پرداری)	K3= ۲۰	Y3= ۸۰	P3 = ۰	

D : درصد ارتقاء ارزش فعالیت های ناشی از اجرای گزینه ها که با قرار دهی مقادیر V1 و V2 در فرمول شماره ۳ برابر با ۱,۲۴٪ شده است، که رقم مربوط مشخص کننده موفقیت خوب مطالعات مهندسی ارزش بر فعالیت های موضوع مطالعات می باشد.

نتیجه نهایی مطالعات در این بخش = ۱,۲۴٪ افزایش شاخص ارزش



 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								شماره صفحه : ۹۹ از ۱۳۲
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

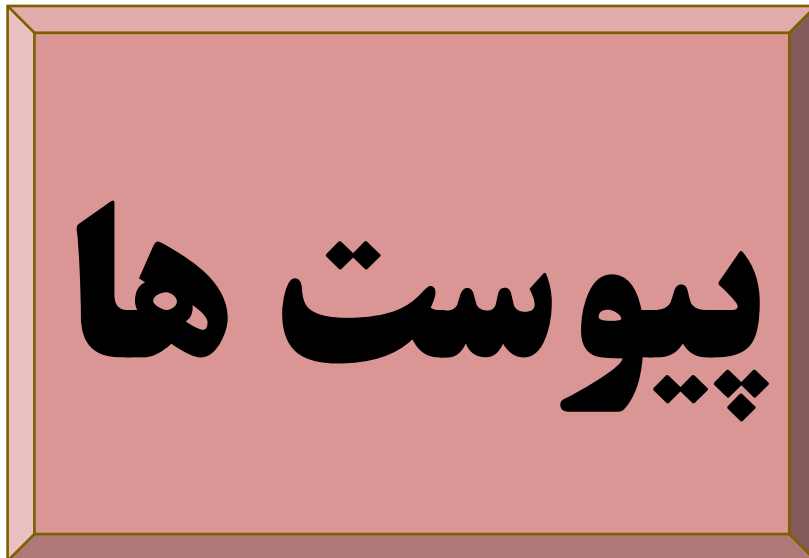

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۱۰۰ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

پیوست ۱ :

ایده های ارائه شده در فاز خلاقیت و مقام های نهایی
 شده آنها در محدوده تأسیسات سرچاهی و خطوط انتقال
 نفت آنها و مجموعه منیفولد

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک							 	
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۱۰۱ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

جدول ایده های ارائه شده در فاز خلاقیت و مقام های نهایی شده آنها در محدوده تأسیسات سرچاهی و خطوط انتقال نفت آنها و مجموعه منیفولد				
شرح ۷۷ ایده های ارائه شده در فاز خلاقیت در محدوده تأسیسات سرچاهی و خطوط انتقال نفت آنها و مجموعه منیفولد (به تفکیک حوزه های عملیاتی پروژه)	ایده بدون مقام	مقام کسب شده توسط ایده		
		تعداد کل	تجهیزات	تجهیزات
	تعداد کل			
	۱۸۲	۳۹	۱۹۰	۱
ایده های ارائه شده جهت بهینه سازی G&F در منیفولد				
در نظر گرفتن فلشر جهت هشدار بصری	*		*	
بهبود عملکرد دیتکتور های گاز در Air intake سیستم HVAC با افزایش تعداد دیتکتور و منطق فعال سازی			*	
انجام مطالعات Flare radiation and dispersion، QRA، Ram Study جهت افزایش ایمنی پلنت			*	
در نظر گرفتن سیستم EWSD برای ITR، اتاق برق			*	
کاهش ضریب ایمنی ۲۰٪ به ۱۰٪ جهت کاهش over design			*	
تامین برق اضطراری برای سیستم G&F	*			
استفاده از انرژی های تجدید پذیر جهت تامین برق سیستم G&F	*			
انجام مطالعات PSSR جهت افزایش ایمنی بخش راه اندازی			*	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک							 
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۱۰۲ از ۱۳۲
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03

جدول ایده های ارائه شده در فاز خلاقیت و مقام های نهایی شده آنها در محدوده تأسیسات سرچاهی و خطوط انتقال نفت آنها و مجموعه منیفولد				
شرح ۷۷ ایده های ارائه شده در فاز خلاقیت در محدوده تأسیسات سرچاهی و خطوط انتقال نفت آنها و مجموعه منیفولد (به تفکیک حوزه های عملیاتی پروژه)	ایده بدون مقام	مقام کسب شده توسط ایده		
		تجزیه	تفصیل	تجزیه
	تعداد کل			
	۱۸۲	۳۹	۱۹۰	۱
بهبود قابلیت اطمینان سیستم G&F	*			
افزایش فاصله دیتکتورها			*	
ایده های ارائه شده در راستای بهینه سازی تأسیسات لوله گشی در منیفولد				
کاهش سایز خطوط لوله داخل منیفولد از ۶ اینچ به ۴ اینچ			*	
حذف پمپ Oil Sump Pit (P-1701) منیفولد بینک و تخلیه مایعات داخل Oil Sump Pit بصورت دستی			*	
در نظر گیری شیب حداقل یک درصد جهت آبهای سطحی	*			
برنامه ریزی جهت انتقال اتصالات موقت از یک خط لوله جریانی به خط لوله دیگر	*			
بررسی کانکشن ها و خطوط فیس تو فیس جدید و قدیم			*	
استفاده از کمپرسور ایرلس به جای کمپرسور معمولی جهت رنگ آمیزی	*			
کاهش شیرآلات رشته های منیفولد	*			

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک							 	
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۱۰۳ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

جدول ایده های ارائه شده در فاز خلاقیت و مقام های نهایی شده آنها در محدوده تأسیسات سرچاهی و خطوط انتقال نفت آنها و مجموعه منیفولد				
شرح ۷۷ ایده های ارائه شده در فاز خلاقیت در محدوده تأسیسات سرچاهی و خطوط انتقال نفت آنها و مجموعه منیفولد (به تفکیک حوزه های عملیاتی پروژه)	ایده بدون مقام	مقام کسب شده توسط ایده		
		۱ ^{ام}	۲ ^{ام}	۳ ^{ام}
	تعداد کل			
	۱۸۲	۳۹	۱۹۰	۱
هماهنگی های لازم جهت اتصال فلولاین های در حال سرویس به منیفولد		*		
استفاده از لوپ های U شکل در اکسپنشن خطوط منیفولد بین کارخانه ای	*			
هماهنگی زمانی بین استخراج و راه اندازی منیفولد	*			
استفاده از برنچ به جای T در سائز های پایین	*			
برطرف کردن اختلاف ارتفاع دیچ ها به کمک روش سیفون	*			
در نظر گیری و هماهنگی و اخذ مجوزها جهت اتصال منیفولد موجود به منیفولد جدید		*		
حداقل نمودن زانوهای نود درجه جهت اروژن و کروژن	*			
استفاده از فونداسیون پیش ساخته به جای اجرا در محل	*			
در نظر گرفتن یدکی PSV ها جهت طراحی ایمن تر	*			
استفاده از گرتینگ های پیش ساخته جهت استراکچر	*			
استفاده از دکتور های خطی به جای دکتورهای نقطه ای	*			

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک							 	
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۱۰۴ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

جدول ایده های ارائه شده در فاز خلاقیت و مقام های نهایی شده آنها در محدوده تأسیسات سرچاهی و خطوط انتقال نفت آنها و مجموعه منیفولد				
شرح ۲۲ ایده های ارائه شده در فاز خلاقیت در محدوده تأسیسات سرچاهی و خطوط انتقال نفت آنها و مجموعه منیفولد (به تفکیک حوزه های عملیاتی پروژه)	ایده بدون مقام	مقام کسب شده توسط ایده		
		تجهیزات	تجهیزات	تجهیزات
	تعداد کل			
	۱۸۲	۳۹	۱۹۰	۱
استفاده از فیبرنوری به همراه خط لوله	*			
گریز از تغییر سایز یک مرحله ای جهت رعایت نمودن چوک لوله	*			
در نظر گیری جهت عدم حصول میزان نفت مورد انتظار جهت راه اندازی منیفولد جدید			*	
ایده های ارائه شده در راستای بهینه سازی سیستم های کنترلی در تأسیسات منیفولد				
در نظر گیری corrosion copon ها در ساعت ۱۲	*			
پرهیز از عبور کابلها از داخل ترنج و حداکثر استفاده از روزمینی و سینی	*			
در صورت استفاده از لدر از راه پله های پشت بند دار استفاده شود			*	
حتی الامکان استفاده از برند سیستم کنترلی موجود	*			
کوچک سازی اتاق کنترل	*			
کاهش فاصله اتاق کنترل از تجهیزات	*			
حذف سیستم اندازه گیری دبی جریان با توجه به ۳ فازي بودن آن	*			

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								 شرکت توسعه پتروایران 
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								شماره صفحه : ۱۰۵ از ۱۳۲
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

جدول ایده های ارائه شده در فاز خلاقیت و مقام های نهایی شده آنها در محدوده تأسیسات سرچاهی و خطوط انتقال نفت آنها و مجموعه منیفولد				
شرح ۷۷ ایده های ارائه شده در فاز خلاقیت در محدوده تأسیسات سرچاهی و خطوط انتقال نفت آنها و مجموعه منیفولد (به تفکیک حوزه های عملیاتی پروژه)	ایده بدون مقام	مقام کسب شده توسط ایده		
		تجزیه	تفصیل	تجزیه
	تعداد کل			
	۱۸۲	۳۹	۱۹۰	۱
طراحی تجهیزات متناسب با شرایط اقلیمی محل و لوکیشن نصب	*			
ایده های ارائه شده در راستای بهینه سازی محوطه منیفولد				
جهت تثبیت بستر استفاده از آهک کانکرید	*			
در نظر گرفتن آب بند یا سیل بند یا زه کش مناسب جهت هدایت سیلاب		*		
در نظر گرفتن چندین نقطه جهت جمع آوری آبهای روغنی به جهت پرهیز از عمق بیشتر OWS		*		
در محل های تجمع تجهیزات، استفاده از جرثقیل ریلی	*			
ایده های ارائه شده در راستای بهینه سازی تأسیسات سرچاهی و خطوط انتقال نفت به منیفولد				
تزریق ماده ضد خوردگی به ستون چاه			*	
بررسی ضخامت جداره استون ترپ خارج از استاندارد های پایپینگ			*	
لحاظ کردن میکسر روی CIP			*	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک							 	
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه: ۱۰۶ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

جدول ایده های ارائه شده در فاز خلاقیت و مقام های نهایی شده آنها در محدوده تأسیسات سرچاهی و خطوط انتقال نفت آنها و مجموعه مینیفولد				
شرح ۷۷ ایده های ارائه شده در فاز خلاقیت در محدوده تأسیسات سرچاهی و خطوط انتقال نفت آنها و مجموعه مینیفولد (به تفکیک حوزه های عملیاتی پروژه)	ایده بدون مقام	مقام کسب شده توسط ایده		
		بازرسی	تفحص	تایید
	تعداد کل			
	۱۸۲	۳۹	۱۹۰	۱
تعبیه سیستم SCADA جهت مانیتورینگ سیستم های ابزار دقیق			*	
انتخاب متریال کلاس EE	*			
کاهش عمق سلار			*	
کاهش فاصله کودال آتش تا مرکز چاه			*	
کاهش ابعاد بتونی Well Pad			*	
کاهش ابعاد سرچاهی			*	
کاهش ابعاد ساختمان سویچگیر چاه های W007S و W0046S و چاههای تعمیری				*
در نظر گرفتن UPS برای ابزار دقیق			*	
در نظر گرفتن پنل خورشیدی	*			
کاهش ابعاد Land Fill			*	
استفاده از دیزل ژنراتور بجای برق سراسری	*			

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه: ۱۰۷ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

جدول ایده های ارائه شده در فاز خلاقیت و مقام های نهایی شده آنها در محدوده تأسیسات سرچاهی و خطوط انتقال نفت آنها و مجموعه منیفولد				
شرح ۷۷ ایده های ارائه شده در فاز خلاقیت در محدوده تأسیسات سرچاهی و خطوط انتقال نفت آنها و مجموعه منیفولد (به تفکیک حوزه های عملیاتی پروژه)	ایده بدون مقام	مقام کسب شده توسط ایده		
		بازرسی	تجهیز	بازرسی
	تعداد کل			
	۱۸۲	۳۹	۱۹۰	۱
استفاده حداکثری از مستحدثات موجود	*			
کاهش عرض جاده ی گودال آتش تا حد امکان بر اساس استاندارد			*	
کاهش تعداد هلی پد متناسب با موقعیت های چاه			*	
حذف لوله ی درین داخل سلار و استفاده از پمپ تخلیه سیار			*	
احداث بریر اطراف گودال آتش			*	
اصلاح بلوکاز داخل سلار به روش های دیگر از جمله مسلح کردن خاک یا پایداری خاک			*	
تقویت زیر Well Pad با روش های جدید از جمله تزریق بتن و غیره			*	
استفاده از روش کوبش ساپورت بجای فونداسیون در جا برای خط آتش	*			
کاهش فاصله خط آتش از جاده دسترسی با رعایت حداقل فاصله ایمنی		*		
استفاده از لوله ERW برای خط آتش	*			
کاهش عمق گودال آتش			*	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک							 
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۱۰۸ از ۱۳۲
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03

جدول ایده های ارائه شده در فاز خلاقیت و مقام های نهایی شده آنها در محدوده تأسیسات سرچاهی و خطوط انتقال نفت آنها و مجموعه منیفولد

شرح ۷۷ ایده های ارائه شده در فاز خلاقیت در محدوده تأسیسات سرچاهی و خطوط انتقال نفت آنها و مجموعه منیفولد (به تفکیک حوزه های عملیاتی پروژه)	ایده بدون مقام	مقام کسب شده توسط ایده		
		بازرسی	تجهیز	تجهیزات
		تعداد کل		
	۱۸۲	۳۹	۱۹۰	۱
تغییر گودال آتش به Cold Vent		*		
احداث استخر نگهداری آب جهت اطفای حریق		*		
کاهش محدوده فنس سرچاهی			*	
بررسی رفتار زمین در اطراف موقعیت چاه ها از حیث معارضات طبیعی			*	
اصلاح جاده های خاکی موجود مربوط به دسترسی به چاه های جدید از نظر عرض و روسازی			*	
بررسی محل چاه ها از نظر معارضات محلی		*		
کاهش کانالهای داخل Well Pad با تایید بخش حفاری			*	
کاهش لایه های روسازی جاده خط آتش نسبت به جاده دسترسی	*			
به منظور کاهش پانچ های بهره برداری یا مهندسی انجام جلسات مشترک با بهره بردار	*			
ایجاد انشعاب از خط لوله آب حفاری برای سایت			*	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۱۰۹ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

پیوست ۲

ایده های که در محدوده تأسیسات
سرچاهی و خطوط انتقال نفت آنها و
مجموعه منیفولد ، مقام کسب ننموده اند

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۱۱۰ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

پیوست ۲: ایده های باقیمانده

شرح ایده های که در محدوده تأسیسات سرچاهی و خطوط انتقال نفت آنها و مجموعه منیفولد ، مقام کسب ننموده اند

ایده های ارائه شده جهت بهینه سازی G&F در منیفولد

در نظر گرفتن فلشر جهت هشدار بصری

تامین برق اضطراری برای سیستم G&F

استفاده از انرژی های تجدید پذیر جهت تامین برق سیستم G&F

بهبود قابلیت اطمینان سیستم G&F

ایده های ارائه شده در راستای بهینه سازی تأسیسات لوله کشی در منیفولد

در نظر گیری شیب حداقل یک درصد جهت آبهای سطحی

برنامه ریزی جهت انتقال اتصالات موقت از یک خط لوله جریانی به خط لوله دیگر

استفاده از کمپرسور ایرلس به جای کمپرسور معمولی جهت رنگ آمیزی

کاهش شیرآلات رشته های منیفولد

استفاده از لوپ های U شکل در اکسپنشن خطوط منیفولد بین کارخانه ای

هماهنگی زمانی بین استخراج و راه اندازی منیفولد

استفاده از برنج به جای T در سائز های پایین

برطرف کردن اختلاف ارتفاع دیچ ها به کمک روش سیفون

حداقل نمودن زانوهای نود درجه جهت اروژن و کروژن

استفاده از فونداسیون پیش ساخته به جای اجرا در محل

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">VALUE ENGINEERING STUDY REPORT</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D03</td><td>0002</td><td>RT</td><td>GE</td><td>110</td><td>PEDCO</td><td>SSGRL</td><td>BK</td></tr></table>	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK	شماره صفحه : ۱۱۱ از ۱۳۲
VALUE ENGINEERING STUDY REPORT																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK																			

پیوست ۲: ایده های باقیمانده شرح ایده های که در محدوده تأسیسات سرچاهی و خطوط انتقال نفت آنها و مجموعه منیفولد ، مقام کسب ننموده اند
در نظر گرفتن ید کی PSV ها جهت طراحی ایمن تر
استفاده از گرتینگ های پیش ساخته جهت استراکچر
استفاده از دتکتور های خطی به جای دتکتور های نقطه ای
استفاده از فیبر نوری به همراه خط لوله
گریز از تغییر سایز یک مرحله ای جهت رعایت نمودن چوک لوله
ایده های ارائه شده در راستای بهینه سازی سیستم های کنترلی در تأسیسات منیفولد
در نظر گیری corossion copon ها در ساعت ۱۲
پرهیز از عبور کابلها از داخل ترنج و حداکثر استفاده از روزمینی و سینی
حتی الامکان استفاده از برند سیستم کنترلی موجود
کوچک سازی اتاق کنترل
کاهش فاصله اتاق کنترل از تجهیزات
حذف سیستم اندازه گیری دبی جریان با توجه به ۳ فاز بودن آن
طراحی تجهیزات متناسب با شرایط اقلیمی محل و لوکیشن نصب
ایده های ارائه شده در راستای بهینه سازی محوطه منیفولد
جهت تثبیت بستر استفاده از آهک کانکرید
در محل های تجمع تجهیزات، استفاده از جرثقیل ریلی

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								شماره صفحه : ۱۱۲ از ۱۳۲
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	
	D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK	

پیوست ۲: ایده های باقیمانده	
شرح ایده های که در محدوده تأسیسات سرچاهی و خطوط انتقال نفت آنها و مجموعه منیفولد ، مقام کسب ننموده اند	
ایده های ارائه شده در راستای بهینه سازی تأسیسات سرچاهی و خطوط انتقال نفت به منیفولد	
انتخاب متریال کلاس EE	
در نظر گرفتن پنل خورشیدی	
استفاده از دیزل ژنراتور بجای برق سراسری	
استفاده حداکثری از مستحذات موجود	
استفاده از روش کوبش ساپورت بجای فونداسیون در جا برای خط آتش	
استفاده از لوله ERW برای خط آتش	
کاهش لایه های روسازی جاده خط آتش نسبت به جاده دسترسی	
به منظور کاهش پانچ های بهره برداری یا مهندسی انجام جلسات مشترک با بهره بردار	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								شماره صفحه : ۱۱۳ از ۱۳۲
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

پیوست ۳ : تذکرها

ایده های که در نهایت مقام تذکر را در
محدوده تأسیسات سرچاهی و خطوط
انتقال نفت آنها و مجموعه منیفولد
کسب نموده اند

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۱۱۴ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

پیوست ۳: تذکرها شرح ایده های که در نهایت مقام تذکر را در محدوده تأسیسات سرچاهی و خطوط انتقال نفت آنها و مجموعه منیفولد کسب نموده اند
ایده های ارائه شده در راستای بهینه سازی تأسیسات لوله کشی در منیفولد
هماهنگی های لازم جهت اتصال فلولاین های در حال سرویس به منیفولد
در نظر گیری و هماهنگی و اخذ مجوزها جهت اتصال منیفولد موجود به منیفولد جدید
ایده های ارائه شده در راستای بهینه سازی محوطه منیفولد
در نظر گرفتن آب بند یا سیل بند یا زه کش مناسب جهت هدایت سیلاب
در نظر گرفتن چندین نقطه جهت جمع آوری آبهای روغنی به جهت پرهیز از عمق بیشتر OWS
ایده های ارائه شده در راستای بهینه سازی تأسیسات سرچاهی و خطوط انتقال نفت به منیفولد
کاهش فاصله خط آتش از جاده دسترسی با رعایت حداقل فاصله ایمنی
تغییر گودال آتش به Cold Vent
احداث استخر نگهداری آب جهت اطفای حریق
بررسی محل چاه ها از نظر معارضات محلی

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۱۱۵ از ۱۳۲
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03

پیوست ۴ : توصیه ها

ایده های که در نهایت مقام توصیه را در
محدوده تأسیسات سرچاهی و خطوط
انتقال نفت آنها و مجموعه منیفولد
کسب نموده اند

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک							 	
شماره پیمان: ۰۵۳ – ۰۷۳ – ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۱۱۶ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

پیوست ۴ : توصیه ها

شرح ایده های که در نهایت مقام توصیه را در محدوده تأسیسات سرچاهی و خطوط انتقال نفت آنها و مجموعه منیفولد کسب نموده اند

(به تفکیک حوزه های عملیاتی پروژه)

ایده های ارائه شده جهت بهینه سازی G&F در منیفولد

در نظر گرفتن فلشر جهت هشدار بصری

بهبود عملکرد دیتکتور های گاز در Air intake سیستم HVAC با افزایش تعداد دیتکتور و منطق فعال سازی

انجام مطالعات Flare radiation and dispersion, QRA, Ram Study جهت افزایش ایمنی پلنت

در نظر گرفتن سیستم EWSD برای ITR, اتاق برق

کاهش ضریب ایمنی ۲۰٪ به ۱۰٪ جهت کاهش over design

انجام مطالعات PSSR جهت افزایش ایمنی بخش راه اندازی

افزایش فاصله دیتکتورها

ایده های ارائه شده در راستای بهینه سازی تأسیسات لوله کشی در منیفولد

بررسی کانکشن ها و خطوط فیس تو فیس جدید و قدیم

در نظر گیری جهت عدم حصول میزان نفت مورد انتظار جهت راه اندازی منیفولد جدید

ایده های ارائه شده در راستای بهینه سازی سیستم های کنترلی در تأسیسات منیفولد

در صورت استفاده از لدر از راه پله های پشت بند دار استفاده شود

ایده های ارائه شده در راستای بهینه سازی تأسیسات سرچاهی و خطوط انتقال نفت به منیفولد

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ – ۰۷۳ – ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۱۱۷ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

پیوست ۴ : توصیه ها

شرح ایده های که در نهایت مقام توصیه را در محدوده تأسیسات سرچاهی و خطوط انتقال نفت آنها و مجموعه مینیفولد کسب نموده اند

(به تفکیک حوزه های عملیاتی پروژه)

تزریق ماده ضد خوردگی به ستون چاه
بررسی ضخامت جداره استون ترپ خارج از استاندارد های پایپینگ
لحاظ کردن میکسر روی CIP
تعبیه سیستم SCADA جهت مانیتورینگ سیستم های ابزار دقیق
کاهش عمق سلار
کاهش فاصله گودال آتش تا مرکز چاه
کاهش ابعاد بتونی Well Pad
کاهش ابعاد سرچاهی
در نظر گرفتن UPS برای ابزار دقیق
کاهش ابعاد Land Fill
کاهش عرض جاده ی گودال آتش تا حد امکان بر اساس استاندارد
کاهش تعداد هلی پد متناسب با موقعیت های چاه
حذف لوله ی درین داخل سلار و استفاده از پمپ تخلیه سیار
احداث بریر اطراف گودال آتش

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								شماره صفحه : ۱۱۸ از ۱۳۲
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	
	D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK	

پیوست ۴ : توصیه ها

شرح ایده های که در نهایت مقام توصیه را در محدوده تأسیسات سرچاهی و خطوط انتقال نفت آنها و مجموعه منیفولد کسب نموده اند

(به تفکیک حوزه های عملیاتی پروژه)

اصلاح بلوکاژ داخل سلار به روش های دیگر از جمله مسلح کردن خاک یا پایداری خاک

تقویت زیر Well Pad با روش های جدید از جمله تزریق بتن و غیره

کاهش عمق گودال آتش

کاهش محدوده فنس سرچاهی

بررسی رفتار زمین در اطراف موقعیت چاه ها از حیث معارضات طبیعی

اصلاح جاده های خاکی موجود مربوط به دسترسی به چاه های جدید از نظر عرض و روسازی

کاهش کانالهای داخل Well Pad با تایید بخش حفاری

ایجاد انشعاب از خط لوله آب حفاری برای سایت

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">VALUE ENGINEERING STUDY REPORT</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادر کننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D03</td><td>0002</td><td>RT</td><td>GE</td><td>110</td><td>PEDCO</td><td>SSGRL</td><td>BK</td></tr></table>	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK	شماره صفحه : ۱۱۹ از ۱۳۲
VALUE ENGINEERING STUDY REPORT																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK																			

پیوست ۵: گزینه

ایده ای که در نهایت مقام گزینه را در
محدوده تأسیسات سرچاهی و خطوط
انتقال نفت آنها و مجموعه منیفولد
کسب نموده اند

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۱۲۰ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

پیوست ۵: گزینه

شرح ایده ای که در نهایت مقام گزینه را در محدوده محدوده تأسیسات سرچاهی و خطوط انتقال نفت آنها و مجموعه منیفولد کسب نموده اند

کاهش ابعاد ساختمان سوییچگیر چاه های W007S و W0046S و چاههای تعمیری

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک	 																								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">VALUE ENGINEERING STUDY REPORT</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادر کننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D03</td><td>0002</td><td>RT</td><td>GE</td><td>110</td><td>PEDCO</td><td>SSGRL</td><td>BK</td></tr></table>	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK	شماره صفحه : ۱۲۱ از ۱۳۲
VALUE ENGINEERING STUDY REPORT																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK																			

پیوست ۶

فرم توسعه

(تکمیل شده در فاز توسعه)

گزینه نهایی شده در در محدوده تأسیسات

سرچاهی و خطوط انتقال نفت آنها و

مجموعه منیفولد

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								شماره صفحه : ۱۲۲ از ۱۳۲
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

فرم توسعه گزینه های نهایی:

کاهش ابعاد ساختمان سویچگیر چاه های W007S و
W0046S و چاههای تعمیری

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک	 																								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table border="1"> <tr> <th colspan="8">VALUE ENGINEERING STUDY REPORT</th> </tr> <tr> <td>نسخه</td> <td>سریال</td> <td>نوع مدرک</td> <td>رشته</td> <td>تسهیلات</td> <td>صادر کننده</td> <td>بسته کاری</td> <td>پروژه</td> </tr> <tr> <td>D03</td> <td>0002</td> <td>RT</td> <td>GE</td> <td>110</td> <td>PEDCO</td> <td>SSGRL</td> <td>BK</td> </tr> </table>	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK	شماره صفحه : ۱۲۳ از ۱۳۲
VALUE ENGINEERING STUDY REPORT																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK																			

عنوان گزینه اصلی : کاهش ابعاد ساختمان سویچگیر چاه های , W007S W0046S, BK - 05

BK - 12 , BK - 14, BK - 15

بررسی کننده : مشارکت هیرگان انرژی/طرح و بازرسی

نظریه نهایی بر اساس بررسی های انجام و درج شده در فرم:

☐ گزینه اصلی مورد قبول می باشد.

گزینه بعلت مشروحه زیر به مقام ☐ توصیه ☐ اصلاح فاز ۱ ☐ تذکر ☐ ایده تغییر می کند.

نام بررسی کنندگان گزینه

محسن آریافر

سعید قنبری

پریسا حاجی صادقی

امیر خسروی

حمید آدینه

رضا برلویی

پیوست ها : ندارد

نام بازبینی و تایید کننده: مسعود اصغر نژاد

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ – ۰۷۳ – ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۱۲۴ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

توضیح کامل گزینه و شرح روش اجرایی آن:

براساس شرح کار ابعاد ساختمان سویچ گیر ۱۷۳ مترمربع بود که مطابق با نیازمندیهای پروژه این ابعاد مورد بازنگری قرار گرفت و در حدود ۸۰ متر مربع کاهش یافت. نقشه های مربوطه ارسال گردید و نقطه نظر فنی مهمی روی ابعاد پیشنهادی دریافت نگردید. در راستای کاهش هزینه های کل مهندسی و ساخت، این پیمانکار گزینه مورد نظر را در قالب مهندسی ارزش پیشنهاد می نماید.

شرح نقاط ضعف تأثیر گذار گزینه بر عملیات اجرایی EPC:

نیاز به باز طراحی ساختمان سویچگیر چاه های W007S , W0046S, BK - 05 , BK - 12 , BK - 14, BK - 15
تأثیرات زمانی در خصوص طراحی مجدد

شرح نقاط قوت تأثیر گذار گزینه بر عملیات اجرایی EPC :

کاهش ابعاد ساختمان سویچگیر چاه های W007S , W0046S, BK - 05 , BK - 12 , BK - 14, BK - 15

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">VALUE ENGINEERING STUDY REPORT</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادر کننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>SSGRL</td><td>PEDCO</td><td>110</td><td>GE</td><td>RT</td><td>0002</td><td>D03</td></tr></table>	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	شماره صفحه : ۱۲۵ از ۱۳۲
VALUE ENGINEERING STUDY REPORT																										
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03																			

شرح نقاط ضعف تأثیرگذار گزینه بر عملیات بهره برداری:

در عملیات بهره برداری مشکل خاصی پیش نخواهد آمد.

شرح نقاط قوت تأثیرگذار گزینه بر عملیات بهره برداری:

کاهش هزینه های بهره برداری بصورت بسیار ناچیز

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ – ۰۷۳ – ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۱۲۶ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

راه حل های پیشنهادی جهت رفع مشکلات و موانع	مشکلات و موانع موجود در اجرای گزینه ، اعم از: مشکلاتی که موجب افزایش شدت خطر ریسک ها می گردند مشکلات حاصله با ذینفعان موانع برون سازمانی سایر مشکلات
---	---

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ – ۰۷۳ – ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۱۲۷ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

میزان امکان پذیری اجرای گزینه :

(با توجه به شرح جدول ۳ فرم راهنما و با درج ذکر علت ، میزان امکان پذیری را با یک علامت ضربدر مشخص فرمایید)

☐ امکان پذیر نیست
☐ اجرا بسیار دشوار و نامحتمل است
☐ اجرا سخت است
☐ اجرا نسبتاً امکان پذیر است

☐ اجرا قابل دسترس است
☐ اجرابدون هیچ مانعی و یا پیش نیازی کاملاً امکان پذیر است

ذکر علت : اخذ تاییدیه از کارفرما

برآورد میزان تأثیر گذاری گزینه بر هزینه های بهره برداری (OPEX)

برآورد درصد تأثیر گذاری بر هزینه های یکسال فاز مورد قرارداد(در صورت امکان)	شرح موارد تأثیر گذاری گزینه بر OPEX
کاهش بسیار ناچیز	به دلایل زیر در کاهش هزینه های بهره برداری تأثیر گذار است: کاهش ابعاد ساختمان سوییچگیر چاه های W007S ,W0046S, BK - 05 , BK - 12 , BK - 14, BK - 15

برآورد میزان تأثیر گذاری گزینه بر زمان اجرای

برآورد تعداد ماه کاهش/افزایش زمان	شرح نحوه تأثیر گذاری گزینه بر زمان اجرای پروژه در مرحله EPC
حدود ۲ ماه زمان اجرایی کاهش می یابد.	با توجه به کاهش ابعاد ساختمان سوییچگیر چاه های W007S ,W0046S, BK - 05 , BK - 12 , BK - 14, BK - 15 این تغییر تأثیر قابل توجهی در زمان اجرا خواهد گذاشت .

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">VALUE ENGINEERING STUDY REPORT</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادر کننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>SSGRL</td><td>PEDCO</td><td>110</td><td>GE</td><td>RT</td><td>0002</td><td>D03</td></tr></table>	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	شماره صفحه : ۱۲۹ از ۱۳۲
VALUE ENGINEERING STUDY REPORT																										
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03																			

جدول چگونگی تأثیر گذاری گزینه بر اهداف تعریف شده برای مطالعات			
شرح چگونگی تأثیر گزینه بر هدف		شرح هدف	
موجب کاهش هزینه های EPC می شود	مؤثر	بهینه سازی هزینه های اجرای EPC (CAPEX) (ضریب وزنی: ۳۳) عدد ارزشی (طبق جدول ۴ پیوست) ۰/۰۹۳	
	ضعیف		
	مؤثر	بهینه سازی هزینه های بهره برداری (OPEX) (ضریب وزنی: ۱۹) عدد ارزشی (طبق جدول ۵ پیوست) ۰	
	ضعیف		
زمان اجرایی کاهش می یابد	مؤثر	بهینه سازی زمان EPC (ضریب وزنی: ۲۸) عدد ارزشی (طبق جدول ۶ پیوست) ۱	
	ضعیف		
	مؤثر	پایداری عملکرد مجموعه و تسهیل بهره برداری (ضریب وزنی: ۲۰) عدد ارزشی (طبق جدول ۷ پیوست) ۰	
	ضعیف		

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های روزمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								شماره صفحه : ۱۳۰ از ۱۳۲
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	
	D03	0002	RT	GE	110	PEDCO	SSGRL	BK	

تأثیرات گزینه بر موارد تعاملی پروژه با ذینفعان		
شرح تأثیرات گزینه بر موارد تعاملی با ذینفع		ذینفع
کاهش CAPEX	نقاط قوت	شرکت مناطق نفت خیز جنوب
	نقاط ضعف	
	نقاط قوت	شرکت پترو ایران
	نقاط ضعف	
افزایش کار طراحی	نقاط قوت	مشارکت هیبرگان انرژی و طرح و بازرسی
	نقاط ضعف	
	نقاط قوت	پیمانکاران
	نقاط ضعف	
	نقاط قوت	تأمین کنندگان
	نقاط ضعف	
تسهیل بهره برداری	نقاط قوت	بهره بردار
	نقاط ضعف	
	نقاط قوت	پدافند غیرعامل
	نقاط ضعف	
	نقاط قوت	ارگان های دولتی ذینفع
	نقاط ضعف	
	نقاط قوت	معارضین و افراد بومی
	نقاط ضعف	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک							 	
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT							شماره صفحه : ۱۳۱ از ۱۳۲	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

جدول چگونگی تأثیر گذاری گزینه بر ریسک های تعریف شده		
شرح چگونگی تأثیر گزینه بر ریسک	شرح ریسک	
فوت ضعف	عدم امکان تأمین / مشکلات تأمینی بعضی از اقلام موثر بر پروژه	
فوت ضعف	موانع ناشی از عوامل طبیعی و محیطی	
فوت ضعف	به نفت نرسیدن	
فوت ضعف	توقف /فسخ قرارداد	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض عمومی و مشترک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	VALUE ENGINEERING STUDY REPORT								شماره صفحه : ۱۳۲ از ۱۳۲
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	SSGRL	PEDCO	110	GE	RT	0002	D03	

پایان
